



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

Enero - Abril 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento Energético en el Sector Industrial			
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO			
Código SNIP N°	784			
Financiamiento	BID , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	40.000.000	GS.	240.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		240.000.000.000	0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/06/2022		23/06/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			0,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
14.800.000.000		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

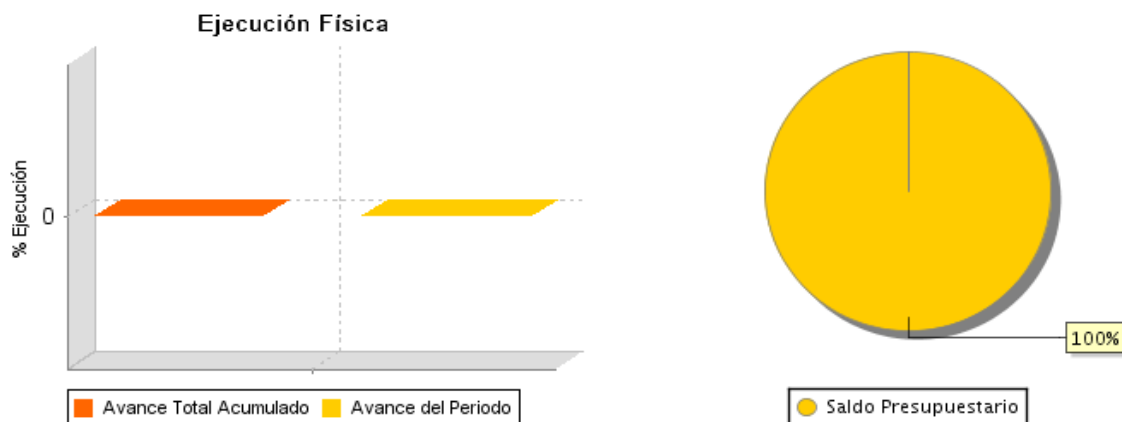

SITUACIÓN ACTUAL

la entidad informó que al cierre del primer cuatrimestre del periodo 2024, no se han registrado aun avances desde su ratificación parlamentaria.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE URBANISMO, VIVIENDA Y HABITAT

Enero - Abril 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento y Ampliación de las Viviendas en el Área Metropolitana de Asunción (AMA)			
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT			
Código SNIP N°	446			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	16.000.000	GS.	136.610.282.335
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
94.009.431.229		42.600.851.106		68,82 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/10/2016		20/10/2022		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,13 %			92,97 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
10.838.024.154		6.019.031.301		55,54 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

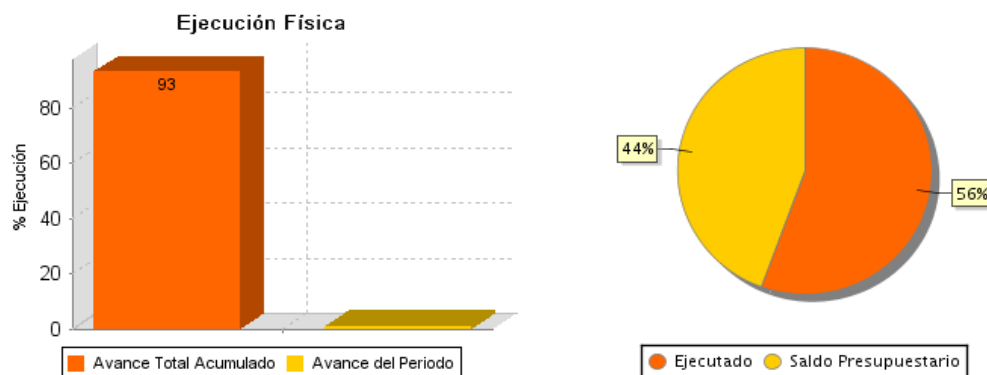


SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances obtenidos en el presente cuatrimestre: Se entregaron 192 viviendas culminadas, acumulando al cierre del primer cuatrimestre de 2024 un total de 2014 obras, estas obras se ejecutaron en los siguientes distritos: Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa. Así mismo, 86 viviendas se encuentran en etapa de ejecución.

Se han otorgado 60 subsidios a beneficiarios, totalizando 2.262 de subsidios otorgados. Se capacitaron 25 nuevas Asistencias Técnicas Constructivas (ATC) a grupos focales. Por otra parte, se concretó la transferencia a la AFD por valor de Gs. 4.794.000.000 para la entrega de 141 subsidios. Se realizó la contratación de nuevos consultores para apoyo a la UEP.

Proyecto	Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad del Barrio Chacarita Alta de Asunción			
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT			
Código SNIP N°	447			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	14.000.000	GS.	121.012.783.973
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
68.406.358.676		52.606.425.297		56,53 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
14/10/2016		20/10/2022		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,02 %			82,27 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
17.907.500.000		4.822.875.077		26,93 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

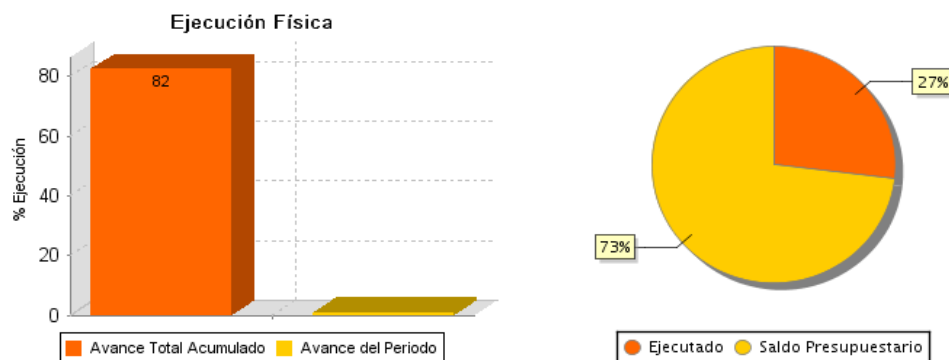

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances obtenidos en el presente cuatrimestre:

Se ha culminado el diseño ejecutivo, correspondiente a los sectores 1 y 2 quedando pendiente la entrega del sector 3 para el siguiente cuatrimestre (a cargo de la firma Puntal Construcciones). Así mismo, se cuenta con la aprobación por parte de la ANDE de las instalaciones eléctricas para el sector 1. Se prevé para el siguiente cuatrimestre, el inicio de las obras en el sector 1, así como la aprobación de las instalaciones para los sectores 2 y 3. Se iniciaron las obras de desagüe pluvial y cloacal en la calle Comuneros. Luego de la culminación de las obras señaladas, se prevé su pavimentación.

Se realizaron trabajos preliminares de en la Zona de FEPASA, se tiene previsto continuar con los trabajos de tendido de cañería en la zona de los cauces Antequera y Tacuarí y la calle Gondra.


Continúan las obras de contención del Cauce México ejecutado (a cargo de la empresa Caldetec). Se realizan paralelamente las fiscalizaciones de dichas obras.

Se suscribieron adendas por extensión de plazo de los Contratos de OPADES, CALDETEC Y CEAMSO.

Se desarrollaron cursos y talleres de capacitación a los miembros de la comunidad en diferentes temas de relevancia para el desarrollo comunitario.

Proyecto	Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blas de Mariano Roque Alonso			
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT			
Código SNIP N°	885			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	18.639.560	GS.	130.566.951.878
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
95.234.529.030		35.332.422.848		72,94 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
15/11/2019		15/11/2021		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Mariano Roque Alonso			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,36 %			86,04 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
30.084.973.199		1.499.502.678		4,98 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

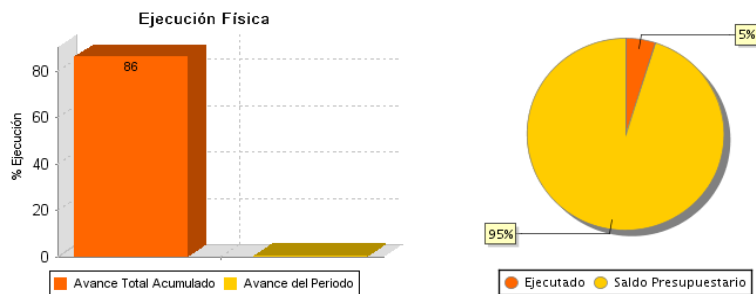

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reportan los siguientes avances:


I- En cuanto al Componente de Obras de infraestructura básica, se procedió a la suscripción del Convenio Modificatorio que amplía el plazo de ejecución de obras, y se da curso al proceso del certificado de obras N° 30. Cabe señalar que los últimos avances reportados fueron los correspondientes a obras de instalaciones hidrosanitarias: conexiones domiciliarias, prueba hidráulica de tuberías e instalación de cañerías. Por otra parte, fue subsanado el inconveniente de falta de provisión de agua potable a la Comunidad. En cuanto a la fiscalización de obras, en la fecha 15 de marzo de 2024 se suscribió el Convenio Modificatorio N° 01/2024.

II- En lo referente al Componente Plan de Desarrollo social, ambiental y económico, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

- Seguimiento social y verificación ocupacional, en casos puntuales.
- Notificaciones por incumplimiento del Reglamento Interno Resolución N° 1.220/21, en casos puntuales.
- Transcripción y actualización de formularios obrantes en el legajo de beneficiarios del Proyecto San Blas. Carga de datos en planilla: del grupo familiar, situación de notificación, seguimientos y verificaciones de ocupación y cumplimiento del Acuerdo de Buena Convivencia.
- Reunión interinstitucional con representantes de la Justicia Electoral con el fin de articular acciones, previa firma de convenio para actividades correspondientes al traslado e inscripción de los beneficiarios del proyecto San Blas al distrito de Mariano R. Alonso.
- Comunicación con referente del MEC, Supervisión de la zona de Mariano R. Alonso, para reforzar el pedido de lugares vacantes para acceder a las Instituciones Educativas que se encuentran cercanas al barrio San Blas, de manera a facilitar el acceso a los pobladores.
- Reunión interinstitucional con representantes de la Municipalidad de Mariano R. Alonso y Registro Electoral con el fin de articular acciones tendientes a la conformación de las Comisión de Base en el marco del proyecto San Blas.
- Reunión interinstitucional con representantes de la Policía Nacional (Comisaría 10° de Mariano R. Alonso) y el MUVH, con el fin de articular acciones para la instalación de la Subcomisaría 21° barrio San Blas según Resolución N° 237 emitida por la Comandancia de la Policía Nacional.
- Elaboración del TDR para el llamado a Consultoría de los Trabajos Sociales y Rediseño, actualización e impresión de materiales para el barrio San Blas.
- Firma de convenio entre la Federación de Entidades Vecinalitas del Paraguay – FEDEM y la Comisión Administradora de Agua del barrio San Blas, para el usufructo del Centro Comunitario para desarrollar cursos de capacitaciones laborales para los pobladores.

Proyecto	Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales para Pueblos Originarios			
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT			
Código SNIP N°	916			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	18.199.042	GS.	144.602.368.545
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
71.405.519.802		73.196.848.743		49,38 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
30/06/2020		30/06/2022		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6,91 %			42,64 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
63.681.307.580		10.326.846.523		16,22 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

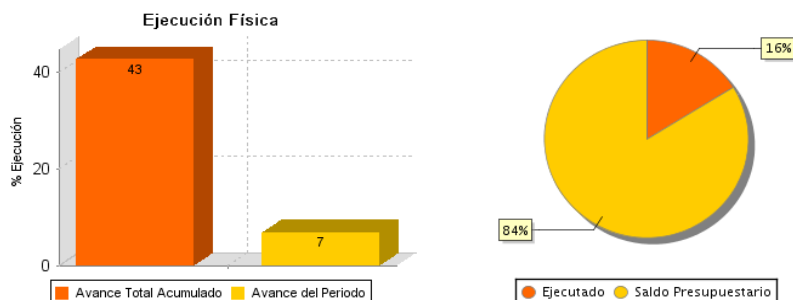

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reportan los siguientes avances en Obras :

- "CONSTRUCCIÓN DE 123 VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS ANACONDA Y SARIA CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – PUEBLOS ORIGINARIOS" LPN N° 01/2023. ID N° 1275. Contratista: Ritter Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras: 31,13 %. - Construcción de 123 viviendas: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Consultorio Ambulatorio: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.
- "CONSTRUCCIÓN DE 50 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD INDIGENA YAKYE AXA CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – PUEBLOS ORIGINARIOS" LPN N° 05/2023. ID N° 1814. Contratista: Spazio Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras: 20,22 %. - Construcción de 50 viviendas: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Consultorio Ambulatorio: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.
- "CONSTRUCCIÓN DE 65 VIVIENDAS, COMUNIDAD INDIGENA PUERTO MARIA ELENA CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY – PUEBLOS ORIGINARIOS" LPN N° 04/2023. ID N° 1815. Contratista: Spazio Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras: 28,74 %. - Construcción de 65 viviendas: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario: Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Obs.: Este lote no contempla la construcción de Consultorio Ambulatorio debido a que en la comunidad existe una Unidad de Salud Familiar construida por la Entidad Binacional Itaipú.
- "CONSTRUCCIÓN DE 90 VIVIENDAS COMUNIDAD INDIGENA KELYENMAGATEGMA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES – PUEBLOS ORIGINARIOS" LPN N° 02/2023. ID N° 1400. Contratista: ALMEGA CIA. Avance Físico de Obras: 12,09 %. - Construcción de 90 viviendas, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Obs: Este lote no contempla la construcción de Centro Comunitario ni de Consultorio Ambulatorio debido a que en la comunidad existe una Unidad de Salud Familiar construida por la Entidad Binacional Itaipú.
- "CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS WONTA MISION SANTA ROSA CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN – PUEBLOS ORIGINARIOS" LPN N° 06/2023. ID N° 1862". Contratista: Ritter Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras: 12,95 %. - Construcción de 100 viviendas, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación. Centro Comunitario, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.- Consultorio Ambulatorio, Replanteo y Marcación, Viga de Fundación, Mampostería de Nivelación, Mampostería de Elevación.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Enero - Abril 2024



Proyecto		Sp Programa Nacional Caminos Rurales 2° Etapa Fase II BID 2163/Oc-2164/BI-OFID			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		36			
Financiamiento		BID, JICA , LOCAL, OFID			
Costo del Proyecto		USD	170.000.000	GS.	925.666.587.755
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
837.661.854.130		88.004.733.625		90,49 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2011		04/01/2016		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,91 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
2.856.245.387		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras del proyecto han culminado. Queda pendiente el pago de certificados, adendas, reajuste e intereses moratorios.

Proyecto	SP Construcción Avenida Costanera, Centro Histórico y Parque Bicentenario			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	67			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	533.875.437.551
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
529.279.114.406		4.596.323.145		99,14 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2012		31/12/2023		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,35 %			99,34 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
4.684.251.431		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras referentes a la construcción y equipamiento del Parque Lineal Costero de Asunción se encuentran culminadas y en trámite los procesos para la recepción provisoria, en atención a lo establecido en la Cláusula 46 "Recepción Provisoria de Obras" de las Condiciones Generales del Contrato.

Proyecto	SP Proyecto Acueducto			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	80			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	506.204.353.201
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
435.491.513.810		70.712.839.391		86,03 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/10/2012		26/01/2015		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,78 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.582.306.393		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

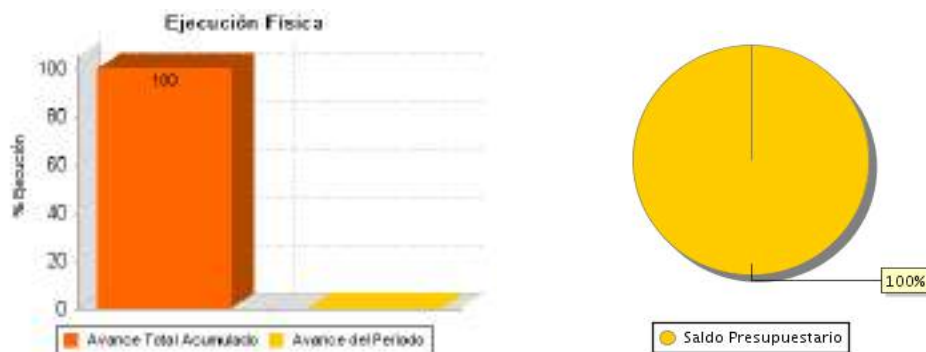

SITUACIÓN ACTUAL

El Montaje del Sistema de Automatización y Operación del Acueducto Principal tramo Puerto Casado – Loma Plata, ha concluido, se encuentra en proceso de recepción definitiva, una vez que se le otorgue la recepción definitiva, se dará inicio al proceso de pago del fondo de Reparación. Actualmente la ESSAP S.A. se encarga de la operación, distribución y mantenimiento de la toma de agua cruda y de la planta de tratamiento de la ciudad de Puerto Casado, donde distribuyen agua a dicha ciudad.

Teniendo en cuenta lo de ESSAP que no cubre todo el acueducto se necesita prever actividades de mitigación para el mantenimiento y operación de las obras del acueducto, haciendo lugar a las recomendaciones recibidas por la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna Institucional.

Proyecto		SP Reconversión Zona Puerto de Asunción Centro Oficinas CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		83		
Financiamiento		BID , LOCAL, OFID		
Costo del Proyecto		USD	359.837.510	GS. 1.102.749.246.391
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.060.696.855.255		42.052.391.136		96,19 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/12/2013		27/12/2018		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,03 %			57,81 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
48.850.402.549		2.947.608.864		6,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

La Obras de Restauración del Edificio Histórico del Puerto de Asunción, cuenta con un avance físico, incluyendo sus convenios modificatorios del 100%. La recepción provisoria de obras, fue firmada con sus respectivas observaciones en julio del 2023. En la actualidad las obras se encuentran en el periodo de garantía, la contratista ha subsanado los pendientes observados en la recepción provisoria. La inauguración del edificio se llevó a cabo en el mes de diciembre del 2023. El edificio fue entregado en fecha 31 de enero del 2024, por Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), para las diferentes actividades turísticas y culturales, y de participación de la ciudadanía. Por falta de recursos presupuestarios en fondo local, se cuenta aún con saldos pendientes de pago. La Obras de las Oficinas de Gobierno ya cuentan con recepción provisoria en su totalidad. La torre del MEC, MOPC, MUVH, MTESS-SET, DNIT, Auditorio, Comedor e Instalaciones en general, cuentan con un avance del 100%, como así también el sub-suelo con un avance del 100% y el Eje Cívico en General con un avance del 100%. Se entregaron todos los informes finales de la fiscalización, correspondiente a las obras de las Oficinas de Gobierno, quedando pendiente el informe final con la recepción definitiva a partir de fines de mayo del 2024. Sigue pendiente la aprobación final de toda la obra por parte de la Municipalidad de Asunción hasta tanto se realicen la implementación de las medidas de mitigación de acceso vial y tránsito ordenadas por la misma. Actualmente con las ODG sigue en el periodo de garantía con TBI hasta mayo del año 2024, la contratista se encuentra subsanando los reclamos que van apareciendo con el uso de las instalaciones (vicios ocultos), quedando pendiente recepción definitiva de las obras. Se obtuvo la resolución de la recepción definitiva y se firmó el acta en fecha 11 de abril del corriente de la obra línea 23.000 Voltios, teniendo así un avance del 100%. Por su parte, el proceso de Arbitraje Internacional con respecto al Programa BTR, ya está concluido, con un resultado no favorable para el MOPC. La Procuraduría General de la República (PGR), comunicó que apelaría la decisión del Juzgado Internacional.

Proyecto	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco´i - General Bruguez			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	882			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	215.000.000	GS.	1.485.662.900.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
178.430.414.637		1.307.232.485.363	12,01%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
09/09/2022		9/9/2028	N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,02 %			11,39 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024	Porcentaje Ejecutado	
88.614.000.000		3.865.436.335	4,36 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

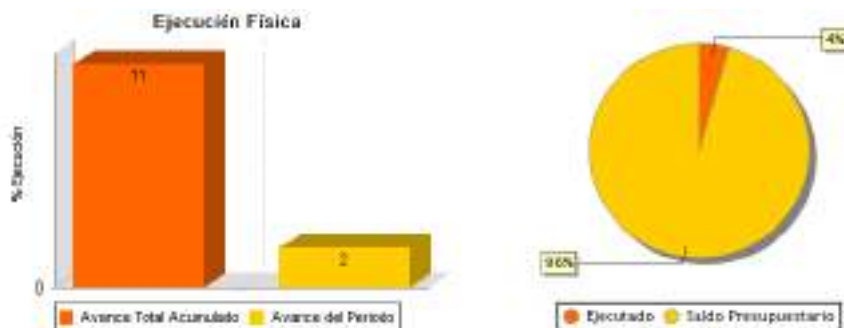

SITUACIÓN ACTUAL


"Proyecto de construcción de la Ruta Py 12 Tramo Chaco'í-I-Gral Bruguez. A continuación, detallamos el avance: a. se realizó el llamado de obra ID N° 418.689/2023, Llamado Mopc N° 83/2022 Licitación Pública Internacional para la contratación de empresas constructoras para la ejecución de obras viales de habilitación y mantenimiento de la Ruta Nacional 12 (PY12). Tramo Cruce Nanawa - Gral Bruguez y Accesos Región Occidental; fueron adjudicados los 4 lotes, la orden de inicio se emitió para el lote 3 en el mes de febrero, los otros lotes están sujetos la emisión de la orden de inicio una vez que sea firmado los contratos de las fiscalizaciones.

En el 1er cuatrimestre los llamados de Fiscalizaciones se encuentran en proceso de Firma de Contrato 1. ID N° 430.352 Llamado MOPC LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 1 de obras del Tramo Cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12), 2. ID 430.356 llamado MOPC LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 2 de obras del tramo cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12) 3. ID N° 430.360 Llamado MOPC LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 4 de obras del Tramo Cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12).

El llamado MOPC ID N° 430.358 para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 3 de obras del tramo Cruce Nanawa- Gral Bruguez y accesos (PY12) fue adjudicado y firmaron contrato, ya se emitió orden de proceder.

Proyecto	SP MejorasTravesias Urbana Cuidades de Paraguari-Carapegua-Quiindy-Caapucu			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	91			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	153.606.820.275
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
155.960.458.418		-2.353.638.143		101,53%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A		N/A		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Caapucú, Carapeguá, Paraguari, Quiindy			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
530.823.440		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

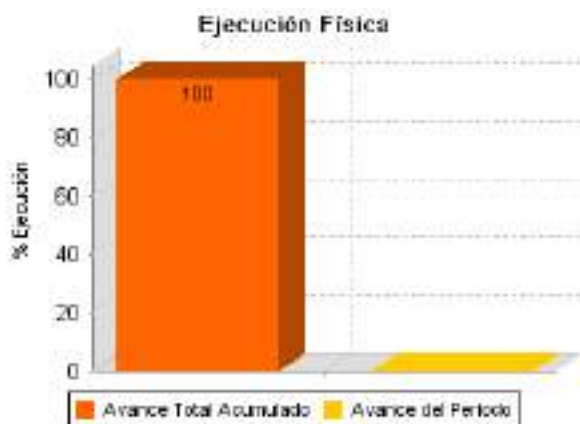

SITUACIÓN ACTUAL

Es un proyecto previo a la vigencia del SNIP. La obras que abarca el proyecto han culminado. Actualmente pendiente el pago a frentistas por indemnización.

Proyecto		Sp Programa Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		149			
Financiamiento		AECID, BID , LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	88.000.000	GS.	635.532.769.647
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
550.074.205.259		85.458.564.388		86,55 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/11/2012		23/11/2017		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,67 %			93,22 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
88.180.369.839		14.712.309.436		16,68 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto se encuentran en ejecución. A continuación se detallan los avances obtenidos al cabo de éste primer cuatrimestre:

1. Las obras de Construcción de Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central y la Construcción de Redes de abastecimiento de Agua Potable a comunidades indígenas y localidades menores beneficiarios con el proyecto del Acueducto del Chaco Central: han concluido y cuenta con recepción definitiva. Se se realizaron los pagos de reajustes, y se continuaron con los tramites inherentes a la cancelación del fondo de reparo, que serán pagados durante el segundo cuatrimestre del 2024.

2. El avance de las Obras de Ciudades Intermedias Región Oriental que consiste en Infraestructura para Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable de las siguientes localidades:


2.1. Caacupé: Construcción redes nuevas: 100% Revisión de Red preexistente: 100%, Línea de Impulsión de EB1 a PTAR: 85,61%, Movimiento de suelo en PTAR: 100%. Se continuo con las obras de las conexiones domiciliarias con un total acumulado de 1700 conexiones quedando pendiente 1100, adicionalmente se tiene previsto 6 meses de periodo de operación y mantenimiento.

2.2. Tobati: Redes Básicas 87%, Redes Condominiales 85%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión 15%, PTAR 30,15%. Se completó el legajo para el Convenio Modificadorio que habilita las cantidades y plazo suficientes para la culminación de la PTAR cuyo financiamiento esta previsto con contrapartida local, teniendo en cuenta que las cantidades hoy existentes no son suficientes para la culminación de la mismo aparte de cuestiones presupuestarias.

2.3. Horqueta: Redes Básicas 106%, Redes Condominiales 109%, Mejoramiento del Agua 100%, PTAR 99.8%, Estaciones de Bombeo N° 1= 95% y N°5= 95%. Se estima concluir en el mes de mayo/2024. También se tiene previsto un plan de incentivo para las conexiones efectivas que iniciará con el periodo de operación y mantenimiento que durará 6 meses.

Proyecto		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		154		
Financiamiento		BID , JICA , LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	332.984.000	GS. 2.026.829.087.180
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.459.752.436.239		567.076.650.941		72,02 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/10/2014		28/10/2021		28/10/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,76 %			91,06 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
295.997.219.680		18.833.105.365		6,36 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

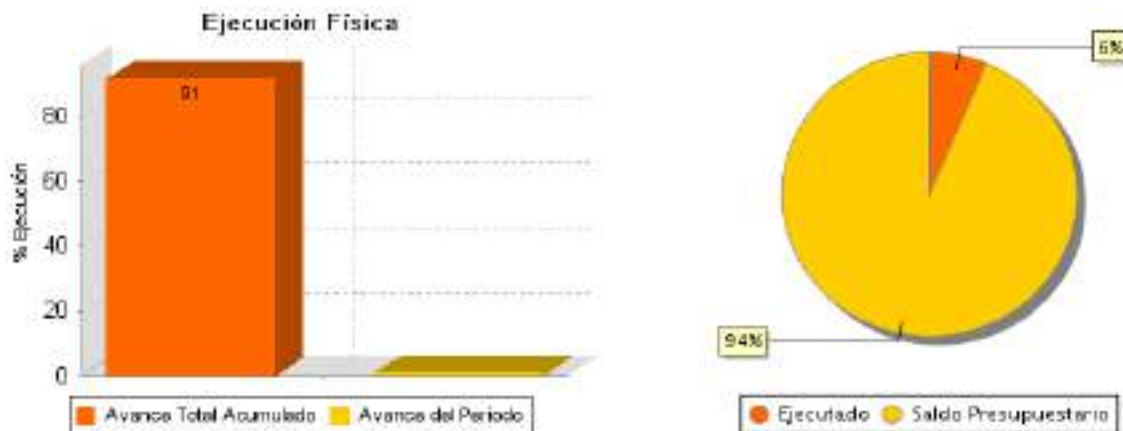

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	162			
Financiamiento	CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	285.000.000	GS.	1.643.841.538.888
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.569.086.838.124		74.754.700.764		95,54 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
29/10/2014		31/12/2018		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,51 %			91,40 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
151.961.330.429		8.036.537.365		5,29 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el presente periodo se reportaron los siguientes avances:

- 1) Mantenimiento de rutas pavimentadas; se ha mantenido 57,9 km. en el tramo Mariscal Estigarribia - La Patria, siendo las principales actividades la limpieza de franja de dominio, sellado de fisuras entre otros.
- 2) Construcción de la Circunvalación de Acceso a la Ciudad de Curuguaty; aun no presenta avances en la capa asfáltica, sin embargo se trabajó en el terraplenado.
- 3) Construcción del Puesto de Peaje en el tramo Villeta - Alberdi, se encuentra adjudicada a la espera de la Orden de Inicio de los trabajos.
- 4) Construcción de Peaje en Curuguaty; se encuentra en etapa de actualización de precios en el Pliego, Base y Condiciones (Pbc). para la realización del llamado.
- 5) Construcción de Obras Complementarias Villeta Alberdi; la ejecución de la obra ha concluido. Actualmente en proceso de recepción definitiva y devolución de las retenciones.

En cuanto a la consultoría de Monitoreo Ambiental y Social del Proyecto; fue rescindido el contrato por Resolución Ministerial N° 1299.

Proyecto	Mejoramiento Pavimentación Corredor Integral Rehabilitación Mantenimiento Red Vial (Fase II)			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	195			
Financiamiento	BID , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	200.800.000	GS.	1.399.274.027.789
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.399.200.291.050		73.736.739		99,99 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/11/2013		16/09/2021		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,27 %			99,73 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
143.855.107.233		26.365.586.522		18,33 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO


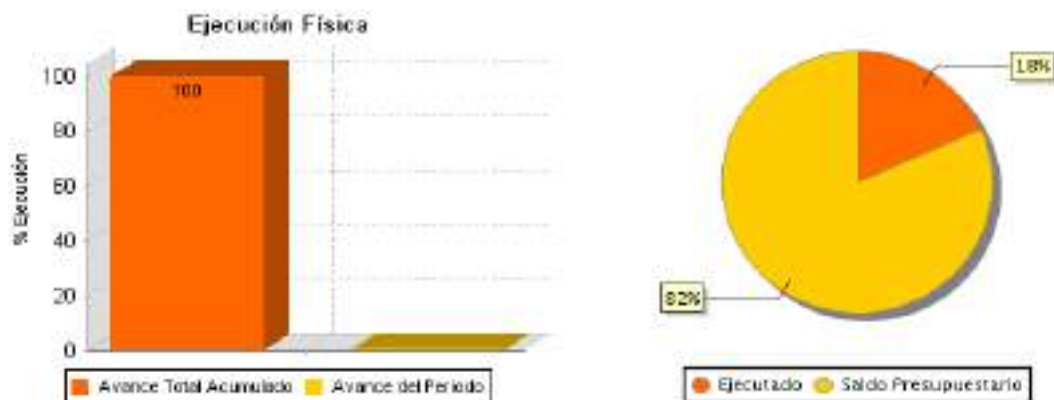


SITUACIÓN ACTUAL

En este cuatrimestre se informa que la totalidad de las obras que abarca éste proyecto ha culminado. Quedan pendientes la culminación de la auditoría y la cancelación de las deudas pendientes de los certificados de obras.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		219		
Financiamiento		CAF, LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	71.706.681	GS. 311.671.052.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
293.933.764.756		17.737.287.244		94,31 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
20/10/2014		20/10/2014		22/7/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.732.246.870		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

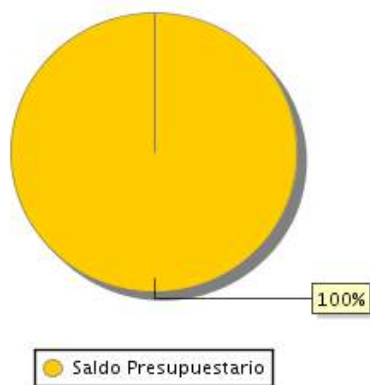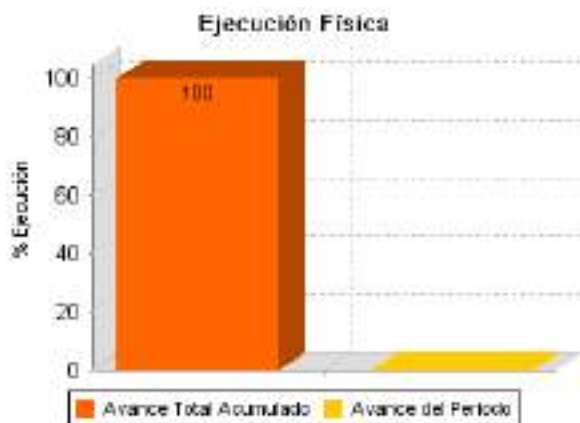


SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto concluido. Existen deuda pendientes en concepto de Reajuste, Devoluciones de Retenciones y Devolución de pagos de IVA.

Proyecto		Construcción de Sistema Agua Potable y Acceso Vial Penitenciaria Minga Guazu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		245			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	12.710.486	GS.	87.702.350.260
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
20317707520		67384642740			23,17 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
01/10/2022		01/10/2023			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Minga Guazú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			50,96 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
1.271.721.342		141.944.668			11,16 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

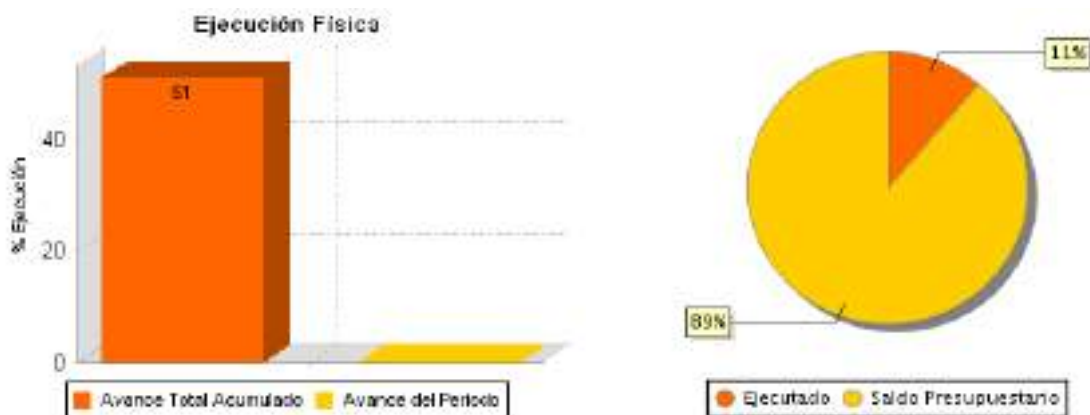


SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en cuanto a lo que respecta a la Planta de agua potable, la red de distribución, cámara frigorífica y montacargas, obras menores de mampostería, revoque y pintura ya cuenta con Recepción Definitiva de fecha 14/03/2024. Igualmente la Actividad correspondiente al Sistema de Vigilancia electrónica, equipamientos de informática, mobiliarios de oficina, de sanidad, también ya fue recibida con documentos .

Proyecto		Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		259		
Financiamiento		FONPLATA, LOCAL, OFID		
Costo del Proyecto		USD	125.250.000	GS. 1.088.311.181.109
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.044.622.877.128		43.688.303.981		95,99 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
16/05/2016		22/06/2021		30/06/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Alberdi, Guazú Cuá, Pilar, San Juan B. de Ñeembucú, Villa Franca			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,21 %			94 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
76.071.923.288		19.779.621.274		26,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

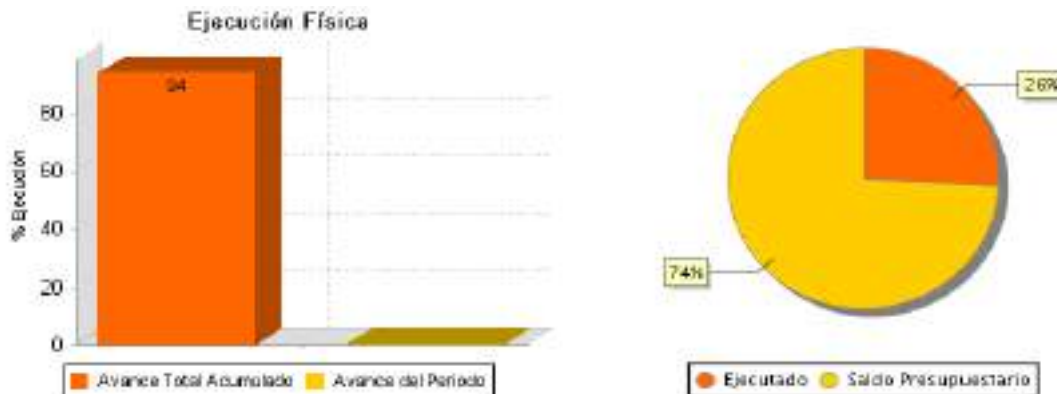


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reporta que la Obra 1: Que abarca desde el desvío de Albedriar hasta el Río Tebicuary y la Travesía Urbana de Villa Franca, se encuentra en etapa de culminación las obras complementarias, como señalización horizontal repintado, trabajos de mantenimiento como protección y reconfirmación de taludes y a la espera de colocación de verandas metálicas en el lugar previsto. Con respecto a la Obra 2: Que se extiende desde el Río Tebicuary hasta Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar, la misma cuenta con recepción final.

Proyecto	Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	260			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	68.385.986	GS.	758.974.498.622
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
697.623.639.171		61.350.859.451		91,91 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
09/06/2015		26/11/2020		26/11/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,64 %			96,81 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
26.368.656.953		593.384.862		2,25 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

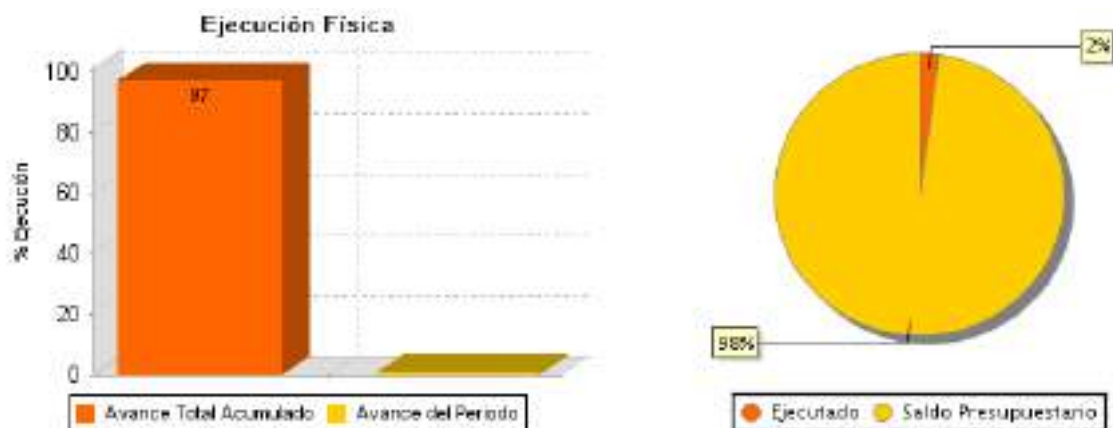


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción del Centro Integral de Rehabilitación Social (CIRS) de Emboscada			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	273			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	49.800.000	GS.	278.880.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
170.010.920.096		108.869.079.904	60,96 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
16/02/2016		16/02/2018		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			89,75 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
10.603.443.253		947.050.969		8,93 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

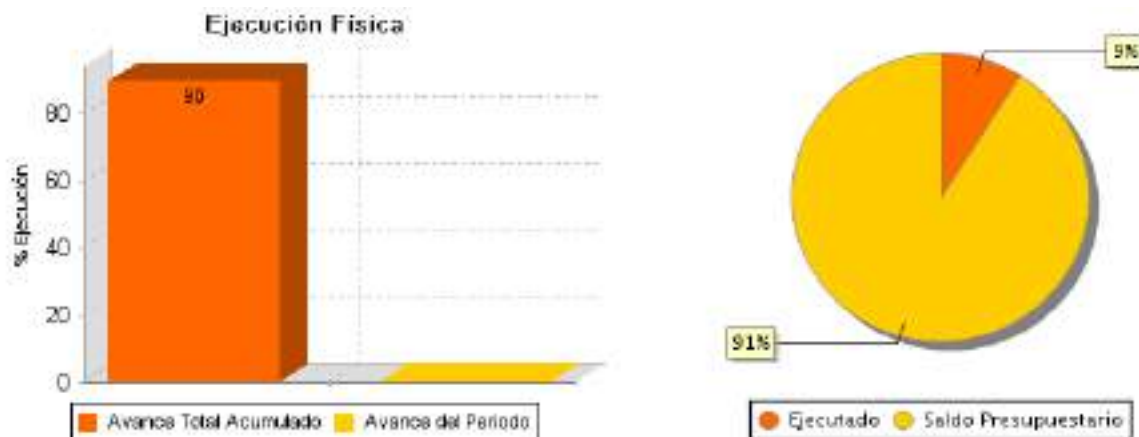


SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que el Complejo Penitenciario del Bloque A 1 se encuentra en etapa de Recepción Provisoria, mientras que del Bloque B 1 y 2 cuentan con recepción definitiva al término del primer cuatrimestre y se han realizado desembolsos para pago de deudas.

Proyecto		Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado de la Bahía Asunción			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		310			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	62.317.000	GS.	491.585.661.429
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
439.070.249.450		52.515.411.979			89,32 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
16/06/2016		23/06/2021			24/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %				96,29 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
48.204.890.578		60.196.500			0,12 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

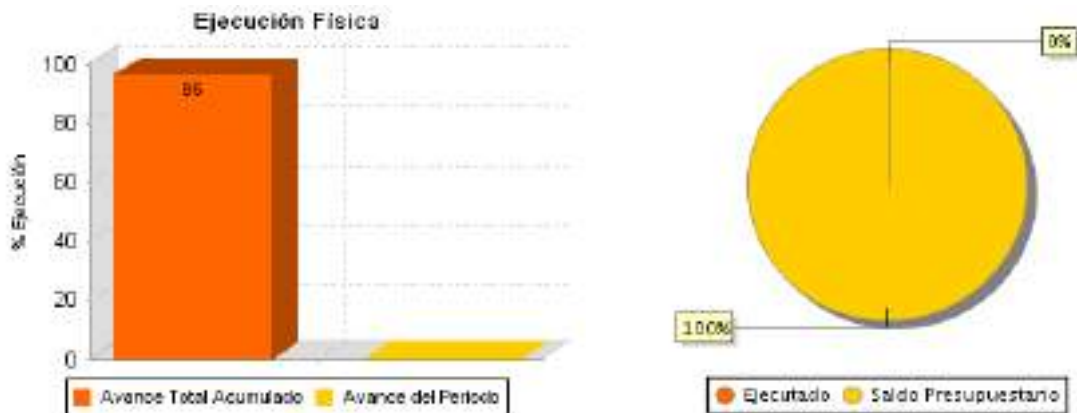


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del Proyecto han concluido. La PTAR de Bella Vista de Asunción cuenta con Recepción Definitiva y está en etapa de traspaso a la ESSAP.

Por otra parte, se encuentra en periodo de justificación del Ultimo Desembolso. El inconveniente principal es disponibilidad presupuestaria necesaria para realizar pagos de los contratos a fin de poder realizar las ultimas justificaciones de desembolso.

Proyecto	Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	311			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	48.120.000	GS.	312.293.363.651
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
273.156.113.689		39.137.249.962		87,47 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
16/06/2016		23/06/2021		24/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	San Lorenzo			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,24 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
47.566.754.835		8.434.783.994		17,73 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

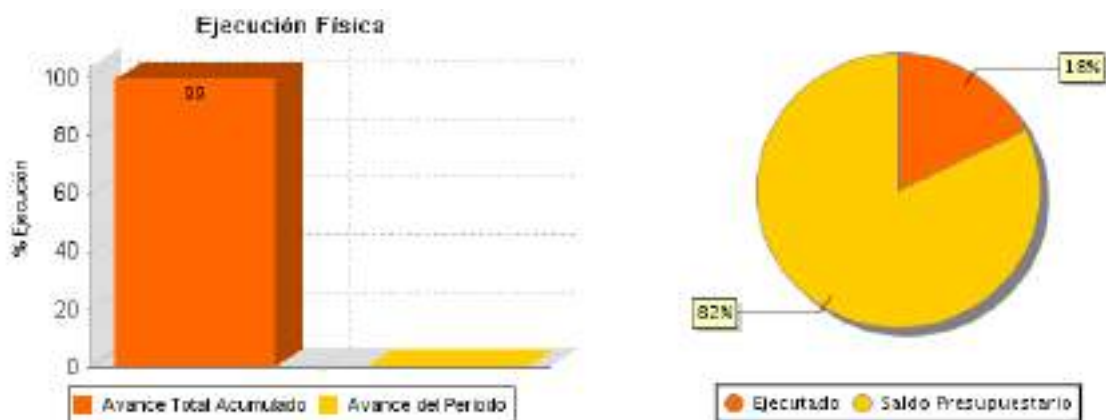


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han culminado. Se encuentra en etapa de cierre; y el principal inconveniente por el cual atraviesa el proyecto es la realización de la última justificación de desembolso, debido a la falta de disponibilidad presupuesta, la cual se está gestionando para honrar con los compromisos.

Así mismo se informa que la PTAR de la Ciudad de San Lorenzo se encuentra en periodo de Mantenimiento y Operación y se tiene previsto su recepción definitiva en el mes de julio del presente ejercicio.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	329			
Financiamiento	BID , ICO			
Costo del Proyecto	USD	125.000.000	GS.	805.881.066.227
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
784.200.922.166		21.680.144.061		97,31 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2015		25/11/2020		30/11/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,06 %			87,82 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
14.217.453.701		1.489.804.211		10,48 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

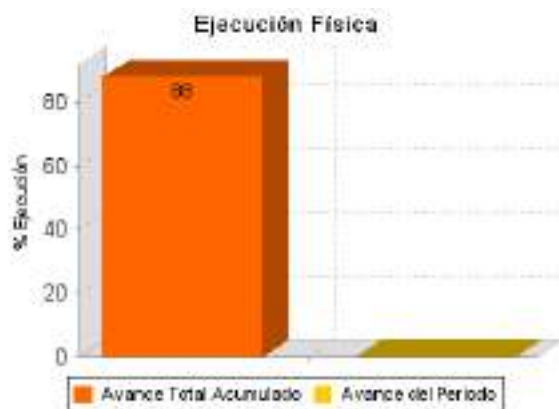


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del Primer Cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para Caminos Rehabilitados, Puentes construidos ambas con sus Fiscalizaciones y Consultorías, se encuentran en proceso de finalización. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones fueron ejecutados en su totalidad conforme al cronograma previsto.

Proyecto		Habilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 9 y Acceso a Colonia Menonitas			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		383			
Financiamiento		BID , CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	670.386.143	GS.	4.688.049.304.307
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
4.012.940.787.004		675.108.517.303			85,60 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
18/09/2018		04/05/2026			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,71 %			88,82 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
321.983.592.126		126.620.028.188			39,32 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

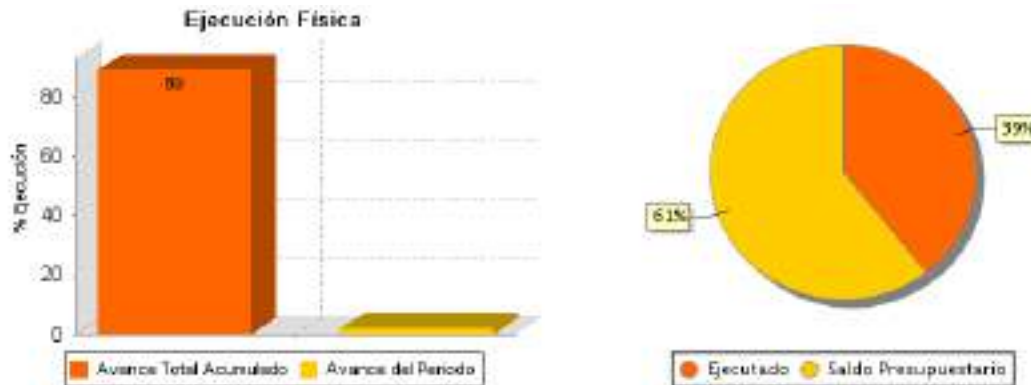

SITUACIÓN ACTUAL

El estado de las obras es el siguiente: Supervisión y Aprobación de los Certificados de Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y accesos: Tramo 1, Lote 1 (PROG. 50+000 a PROG. 112+000). tiene un avance físico de 98,93%, con una pavimentación asfáltica de 60 kilómetros., Lote 2 (PROG. 112+000 a PROG. 173+000), tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 61 kilómetros, el Lote 2 se encuentra en la Etapa de recepción provisoria. Tramo 2, Lote 3 (PROG. 173+000 a PROG. 250+000). tiene un avance físico de 96,25% con una pavimentación asfáltica de 74 kilómetros, Lote 4 (PROG. 250+000 a PROG. 326+000). tiene un avance físico de 98,56% con una pavimentación asfáltica de 73 kilómetros. Tramo 3, Lote 5 (PROG. 326+000 a PROG. 390+000). tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 6 (PROG. 390+000 a PROG 450+000), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento. Tramo 4, Lote 7 (PROG. 450+000 a PROG. 525+000)., tiene un avance físico de 100% 8. Habilitación y Mantenimiento de la Ruta N° 9 y accesos, Lote 8 (Accesos), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en la Etapa de Recepción Provisoria.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		384			
Financiamiento		CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	142.911.000	GS.	1.001.545.257.053
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
776.793.984.104		224.751.272.949			77,56 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
31/12/2018		31/12/2022			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,04 %			82,99 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
206.731.851.192		35.435.616.014			17,14 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto comprende la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales y Rurales, también la Construcción de Puentes de Hormigón Armado (HºAº) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente en etapa de ejecución. A continuación se detalla los avances obtenidos en el primer cuatrimestre:


1. Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales; varias obras poseen Recepción Provisoria y Recepción Definitiva. El último contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance de 6.34 Km de caminos rehabilitados.

2. Construcción de Puentes de Hormigón Armado; varias obras se encuentran culminada y poseen Recepción Provisoria y otras con Recepción Definitiva. En cuanto a contratos en ejecución en varios departamento de la Región Oriental tiene un avance de 21,29 ml de puentes construidos al cabo del primer cuatrimestre.

Por otra parte, el servicio de consultoría para el apoyo técnico y fiduciario al proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental tiene un avance del 35%; El contrato de la Auditoría externa se encuentra en etapa de licitación.

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en CORDILLERA, PARAGUARÍ, CAAGGUAZÚ, GUAIRÁ, CAAZAPÁ			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	451			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	201.878.982.976	GS.	593.091.656.828
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
528.678.559.050		64.413.097.778		89,14 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguarí			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,54 %			83,86 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
58.622.148.974		13.683.964.444		23,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

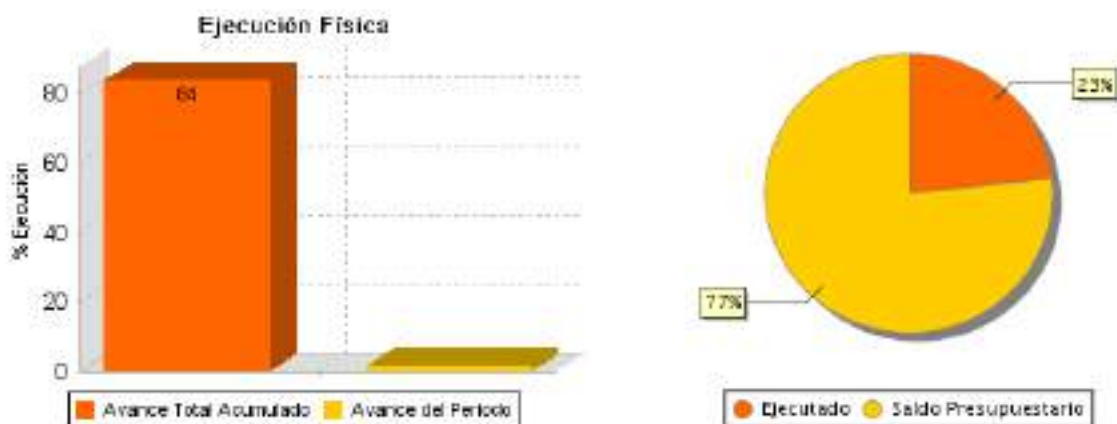


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Departamento de San Pedro			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		454			
Financiamiento		CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	34.157.721	GS.	251.942.708.325
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
187.277.954.287		64.664.754.038			74,33 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,93 %			89,04 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
23.682.613.948		8.701.172.057			36,74 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

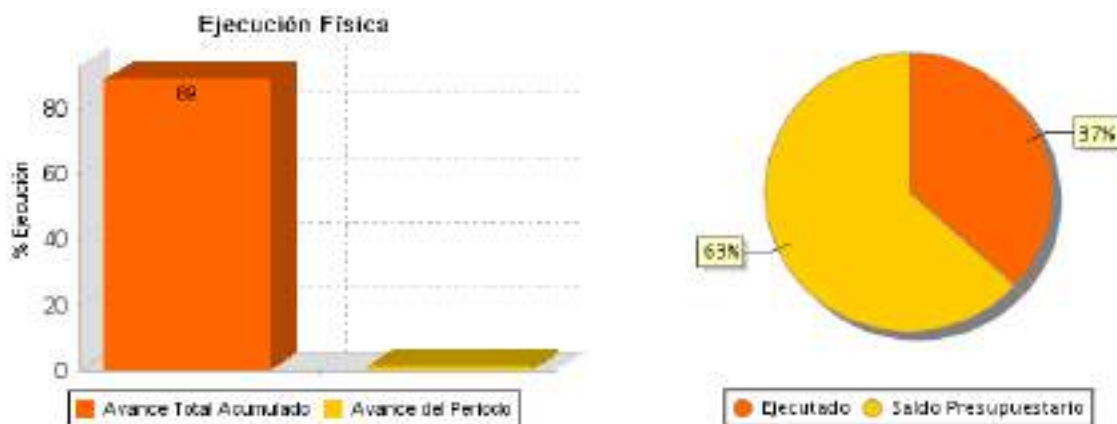


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		455		
Financiamiento		CAF, FONPLATA		
Costo del Proyecto		USD	31.889.950	GS. 189.562.926.102
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
153.993.715.055		35.569.211.047		81,24 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,00 %			86,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
10.608.576.888		2.935.903.201		27,67 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

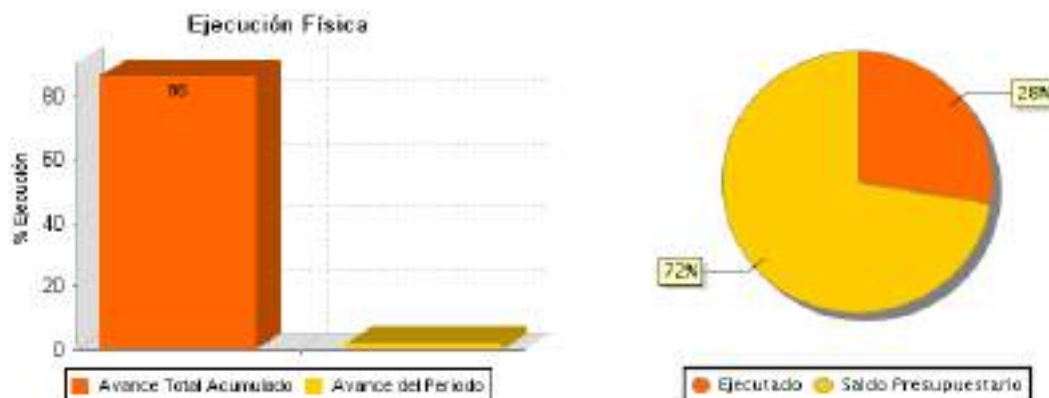

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre las obras que componen el SNIP 455 presenta los siguientes avances:

En cuanto a la Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA); se encuentra culminada la etapa de rehabilitación. Actualmente se encuentra en etapa de mantenimiento de 40 km de rutas pavimentadas con trabajos de limpieza de franja de dominio, sellado de fisuras y bacheo superficial.

Proyecto		Mejoramiento de 160 Km de Caminos Vecinales en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		564			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	62.000.000	GS.	419.173.251.031
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
320.662.509.772		98.510.741.259			76,50 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/01/2018		05/01/2023			17/1/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,66 %			70,80 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
80.658.640.436		20.155.746.581			24,99 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


Al cierre de este Primer Cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto han avanzado conforme a lo planificado, tanto para el proyecto Caminos Rehabilitados y Puentes Construidos, ambas con sus Fiscalizaciones y Consultorías. A continuación se detalla los siguientes avances de las obras en ejecución:

- 1. Caminos Rehabilitados;** se registran un total de 5,79 km realizados de 21,08 km programados en varios departamentos de la Región Oriental.
- 2. Mantenimiento de Caminos Vecinales;** se ejecutaron 724,29,76 km de caminos programados en varios departamentos de la Región Oriental.
- 3; Construcción de Puentes de H°A°;** 13,63 ml de Puentes construidos de 72,22 ml programados en la Región Oriental, todos conforme a la meta física prevista dentro del periodo fiscal 2024.

Así también las empresas fiscalizadoras acompañan a cabalidad todo lo concerniente a las aprobaciones de las obras construidas. Cabe mencionar también que los certificados correspondientes a las consultorías se procesan con normalidad honrando el pago de acuerdo al V° B° de la Dirección de Caminos Vecinales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones dentro del proyecto siguen su curso conforme al cronograma previsto.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada Departamentos de San Pedro, Caaguazu y Canindeyu.			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	594			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	53.057.700	GS.	411.614.354.995
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
143.609.127.148		268.005.227.847		34,89%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		05/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Canindeyú, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4,10 %			42,58 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
94.522.452.792		26.771.148.314		28,32 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

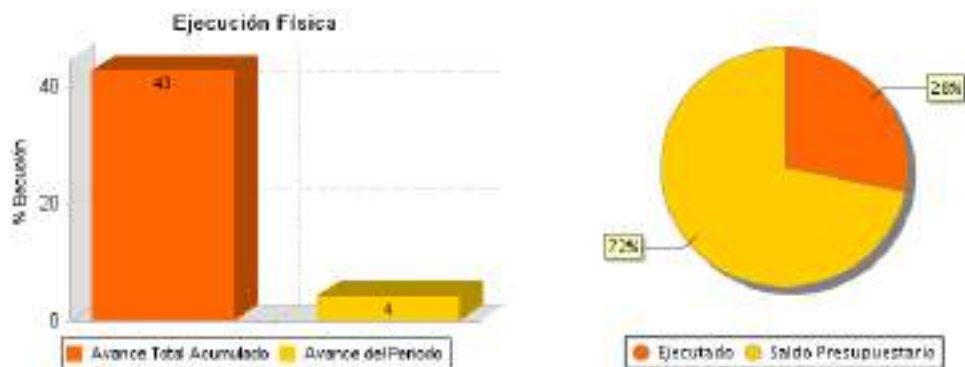

SITUACIÓN ACTUAL


La etapa de rehabilitación de Rutas pavimentada no han culminado se encuentra con problemas con la constructora para la ejecución normal de las obras, por lo tanto se encuentra muy retrasada las obras. Entre las intervenciones realizadas al cabo de éste cuatrimestre fueron las siguientes: Limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para control de peso, bacheo superficial, limpieza de franja y obstrucción del escurrimiento, materiales sueltos.

En cuanto al llamado a licitación de adquisición de chalecos reflectivos para campañas de seguridad vial concluyó con la adjudicación y firma del contrato al cabo del primer cuatrimestre.

También se procedió por segunda vez el proceso de Licitación para la adquisición de equipos educativos para campañas de seguridad vial, estado en convocatoria.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada Departamentos de Misiones e Itapúa			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	595			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	46.540.241	GS.	383.046.126.088
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
187.275.190.582		195.770.935.506		48,89%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		05/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Itapúa, Misiones			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,23 %			60,24 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
71.505.414.522		11.123.712.009		15,56 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

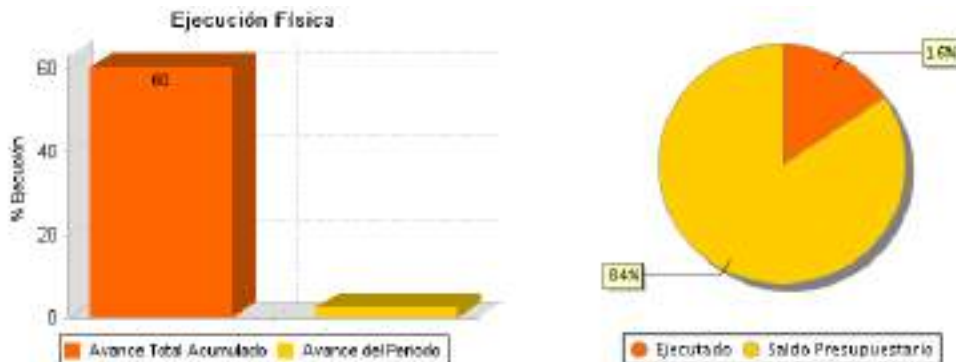

SITUACIÓN ACTUAL


Las obras de rehabilitación de la Ruta PY 1 ha culminado, actualmente en etapa de mantenimiento que se ejecuta a lo largo de la ruta. No presenta mayores retrasos. A continuación se detalla las siguientes intervenciones: reparación del desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, eliminación materiales sueltos y exceso de vegetación, pozos, entre otros.

El llamado a Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría de Implementación y operación del sistema de planificación y gestión vial a fin de completar el inventario vial, continua en etapa de evaluación.

La consultoría de Auditoría Financiera y Contable que se encuentra actualmente adjudicada y ejecutando, según la UEP no han cumplido con la presentación de informes correspondiente al periodo auditado 2023

Proyecto	Mejoramiento y Conservación tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N° 6			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	646			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	48.747.500	GS.	342.424.871.123
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
288.984.231.770		53.440.639.353		84,39 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/11/2018		23/11/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Guairá			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,65 %			83,57 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
32.471.551.502		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

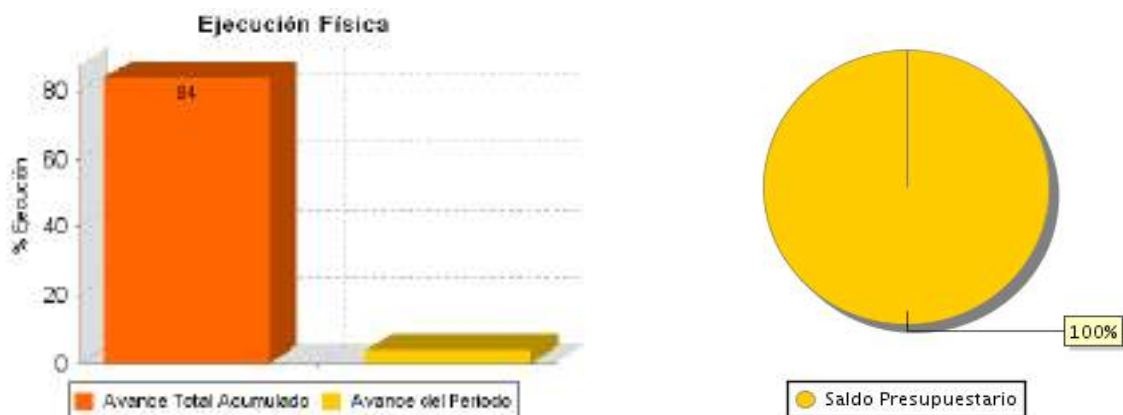


SITUACIÓN ACTUAL

Las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6, se encuentra en etapa de mantenimiento, con un avance físico real de la Capa de Rodadura de 60 km. Las actividades realizadas en el periodo fueron, Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas rehabilitadas y la Operaciones de Bascula Móvil. Además, se continúa trabajando en los TDRs de los Servicios de Consultoría para el Plan de Gestión Ambiental. Se encuentra en ejecución la Consultoría de la ECATEF y el contrato de Pago de Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno Programa de Mejoramiento y Conservación de Corredores Viales.

Proyecto	Mejoramiento y Conservación tramo Caaguazu - Yhu. - Empalme Ruta N° 10			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	647			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	6.994.000	GS.	52.153.436.228
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
36.799.074.843		15.354.361.385		70,56 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/11/2018		23/11/2024		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,00 %			92,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
6.570.702.616		705.831.288		10,74 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

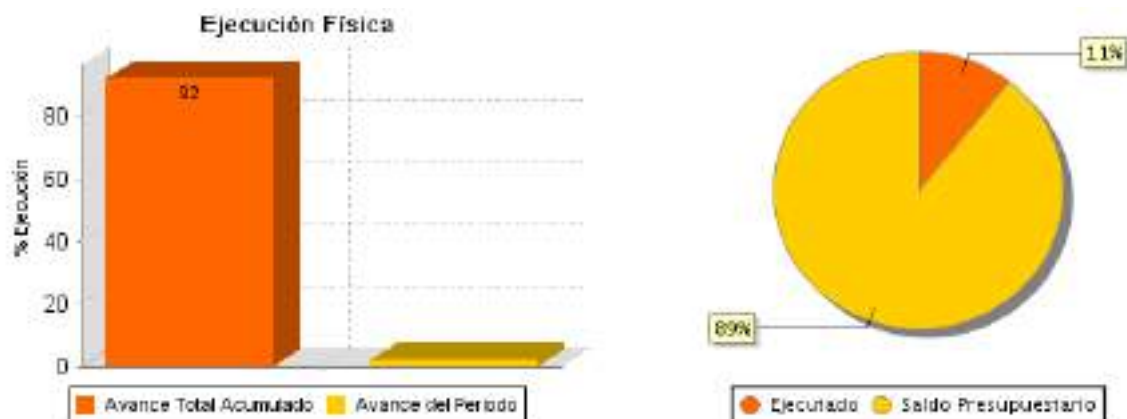


SITUACIÓN ACTUAL

La obra de mejoramiento y conservación por niveles de servicio de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N° 10, actualmente se encuentra en etapa de mantenimiento y los trabajos realizados en el periodo fueron. Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas rehabilitada, calzada existente y las Operaciones de Bascula Móvil.

Proyecto		Construcción Caminos Rurales no Pavimentados Region Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		720			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 1.059.459.065.024
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
1.047.032.755.447		12.426.309.577			98,83 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
20.473.908.082		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

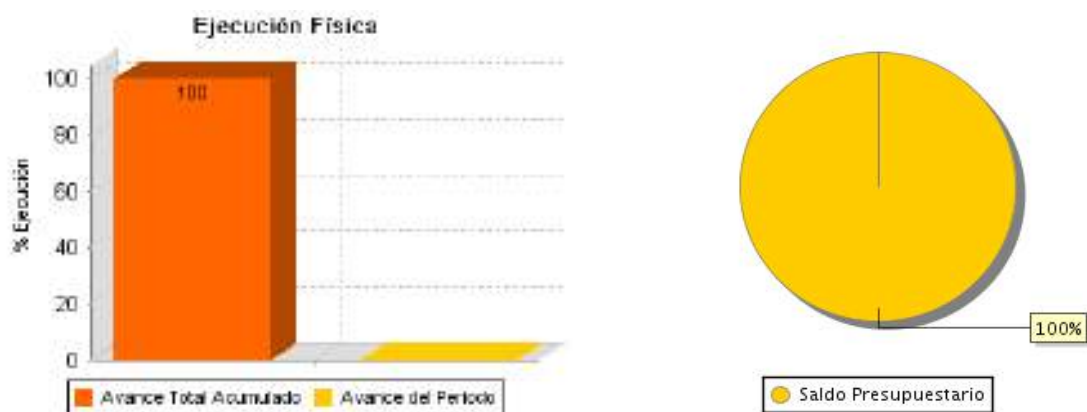

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción de Pavimentación sobre mpedrados en Región Centro			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	722			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	296.215.158.010
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
254.671.517.592		41.543.640.418		85,98 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,10 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
1.543.640.418		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que no se registraron avances en el periodo de referencia debido a la falta de disponibilidad presupuestaria para honrar los compromisos pendientes (reajustes, intereses moratorios) que se encuentran enmarcados en los Decretos N° 4614/2020 y 9.543/2023. Al respecto, cabe mencionar que al cierre del primer cuatrimestre del año no cuenta con Plan Financiero a ejecutar.

Proyecto	Construcción Asfalto sobre Empedrado Región Sur			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	724			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	21.884.404.330
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
21.364.292.276		520.112.054		97,62 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Itapúa, Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,50 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
105.755.141		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Construcción de Pavimento sobre Empedrados en Región Este.		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		725		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	37.686.822.499
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
36.631.678.571		1.055.143.928		97,20%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			98,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
3.883.228.228		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

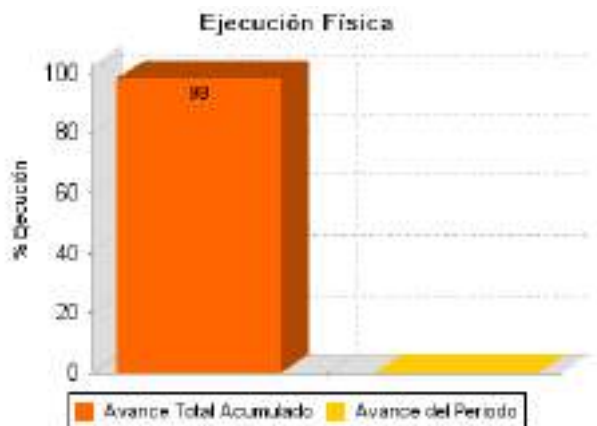

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en REGION CENTRO			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	729			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	530.310.336.320
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
440.189.155.151		90.121.181.169		83,01 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Guairá, Paraguarí			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,44 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
17.422.362.163		7.541.106.745		43,28 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Construcción y Pavimentada Asfáltica de Tramos Camineros en Región Este		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		730		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 161.967.754.975
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
160.887.188.373		1.080.566.602		99,33%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			98,80 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
704.596.698		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Centro Sur			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	731			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	194.288.417.303
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
185.542.775.390		8.745.641.913		95,50 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Guairá, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			94,20 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
4.455.641.375		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

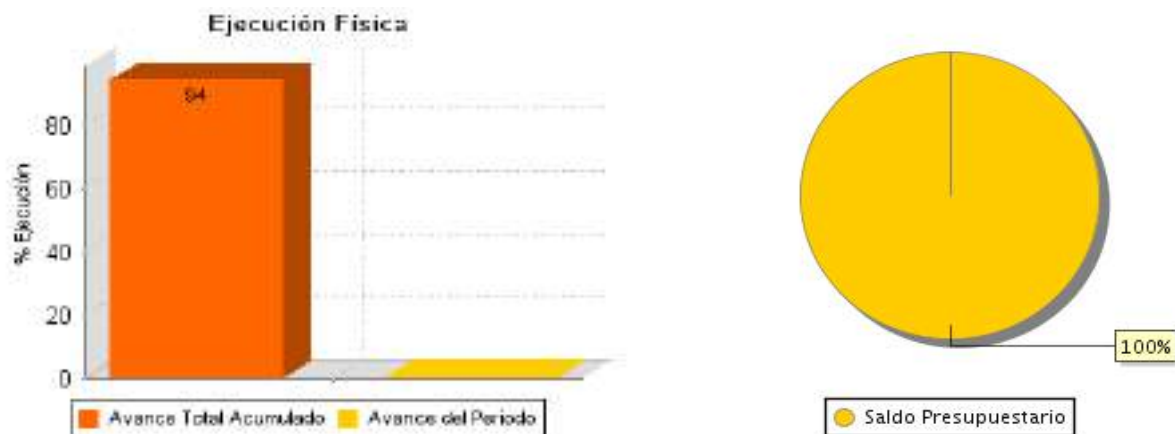

SITUACIÓN ACTUAL

No se registran avances debido a la falta de disponibilidad presupuestaria para el pago de compromisos pendientes (reajustes, intereses moratorios). Es importante mencionar que según reporte del SICO al final del primer cuatrimestre no cuenta con ejecución presupuestaria. Al respecto, el MOPC manifiesta que el Plan Financiero Vigente resulta insuficiente para el cumplimiento de los compromisos mencionados. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro del Decreto N° 4770/2021.

Proyecto	Construcción y Pavimentada Asfáltica de Tramos Camineros en Región Noreste			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	732			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	385.410.314.167
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
268.615.685.907		116.794.628.260		69,70%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			90,96 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
4.677.334.918		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Pavimentacion tipo Empedrados y Puentes - Región Centro			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	736			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	28.060.365.090
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
26.214.560.425		1.845.804.665		93,42 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Cordillera, Guairá, Paraguari			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,36 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
3.180.254.770		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

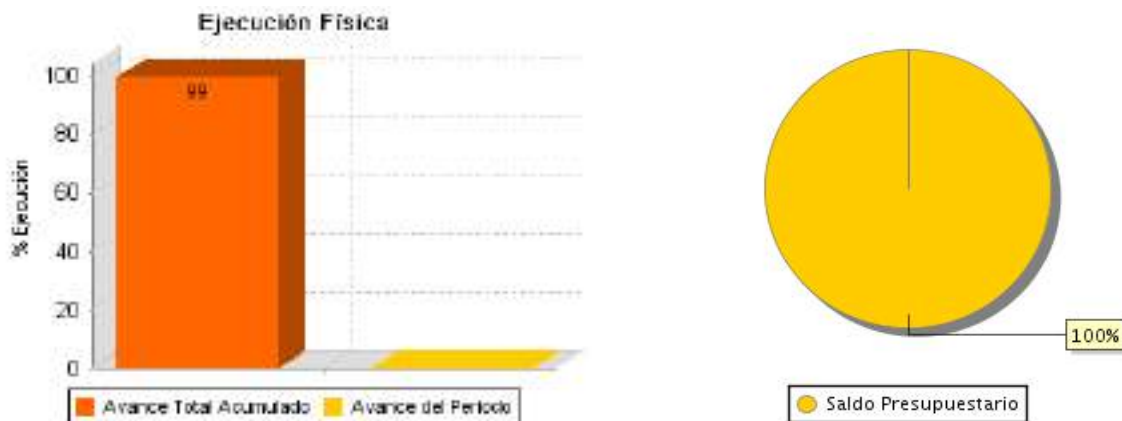


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción Pavimentada Tipo Empedrados y Puentes - Región Sur			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	737			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	435.991.771.762
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
35.334.543.924		400.657.227.838		8,10%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			98,80 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
0		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

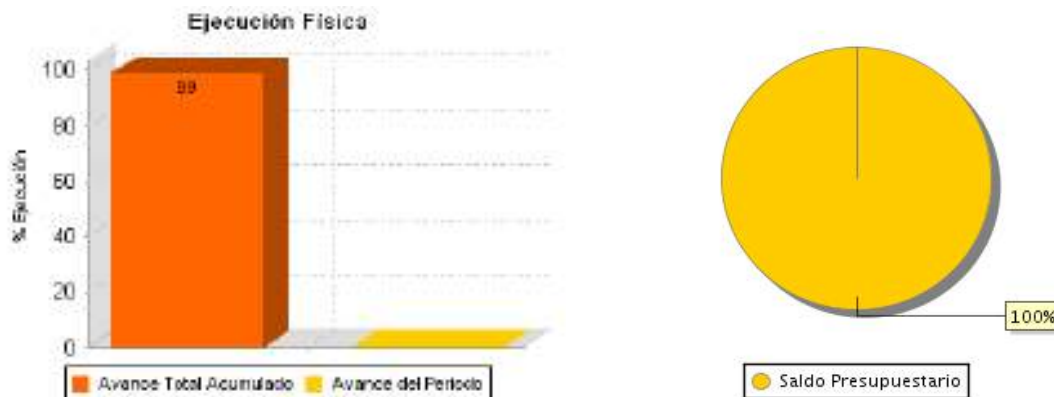

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de contrato de obra de construcción de puentes de hormigón armado, en concepto de reajuste de precios.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Conservación de rutas pavimentadas por administracion		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		746		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 178.839.008.464
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
177.671.766.399		1.167.242.065		99,35 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			76,59 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
9.953.171.547		3.027.536.362		30,42 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre del año 2024, se realizaron pagos de facturas adeudadas a contratistas por la provisión de asfalto, en el marco al Llamado 32/2019 "Licitación Pública Nacional - Subasta a la baja electrónica para la Adquisición de Materiales para Plantas Asfálticas ubicadas en la Región Oriental. Se espera contar con recursos suficientes para saldar deudas por la provisión de productos bituminosos. También se encuentra en proceso la actualización de documentaciones como actualizaciones de póliza, facturas (timbrados vencidos), actualizaciones de los certificados de cumplimiento tributarios de la SET, informes técnicos de manera a procesar el pago de deudas pendientes según disponibilidad presupuestaria.-

Proyecto		Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		758			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	193.600.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
20.239.610.647		173.360.389.353			10,45 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
196.628.411		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 1 tramo Carapegua - San Juan Bautista			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	760			
Financiamiento	CAF, FONPLATA, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	53.501.521	GS.	280.884.636.738
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
186.586.642.334		94.297.994.404		66,43 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones, Paraguarí			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,99 %			81,89 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
28.007.845.135		9.406.177.084		33,58 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

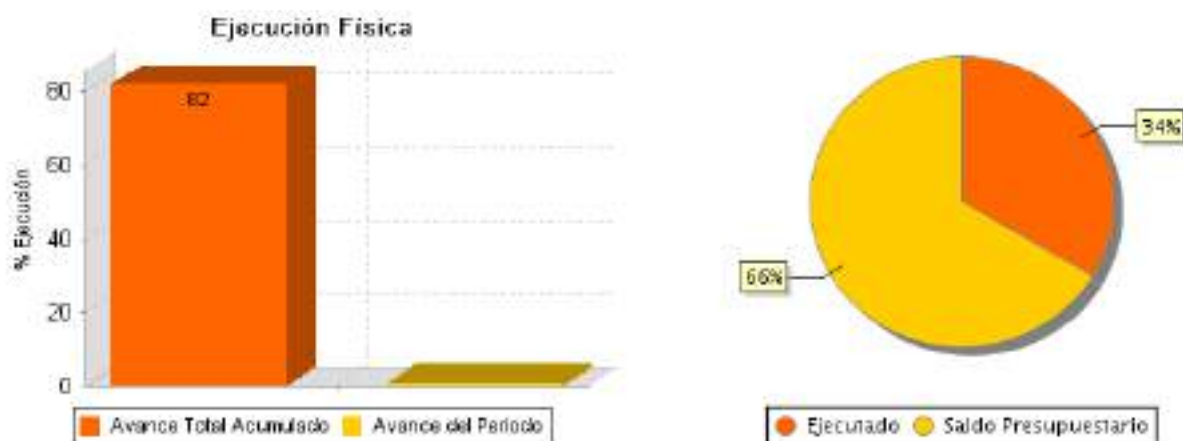


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que las obras ejecutadas en este periodo fueron las de mantenimiento de los elementos de la carretera y Limpieza de la Franja de Dominio con tractores con rotativa y personal con desmalezadora. Cabe mencionar que las obras de puesta en punto finalizaron y actualmente se encuentra en Fase de Mantenimiento..

Proyecto	Construcción y mantenimiento Ruta N° 3 tramo km 21.8-170.3			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	761			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	378.545.281.810
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
107.073.306.908		271.471.974.902		28,29%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Cordillera, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
33.005.350.720		3.846.261.572		11,65 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

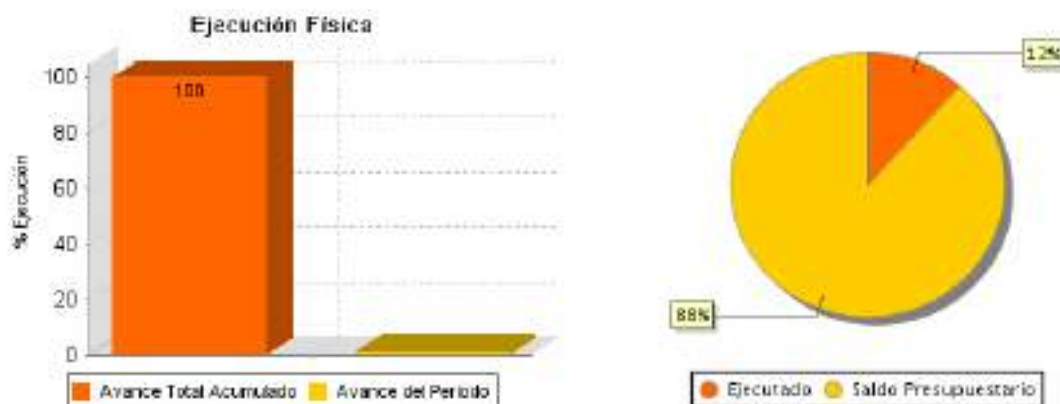


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Construcción y mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		762		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 403.343.600.758
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
116.952.790.835		286.390.809.923		29,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
35.114.637.349		205.670.304		0,59 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

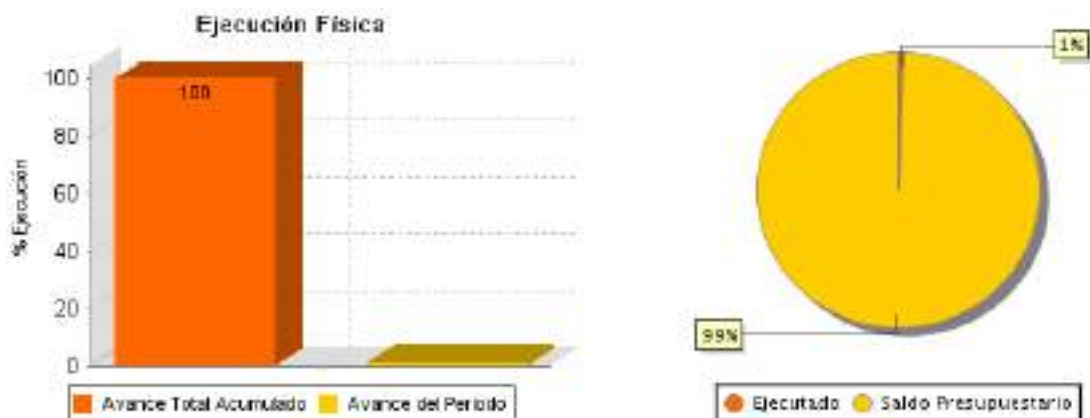


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	764			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	194.800.960.023
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
191.878.397.930		2.922.562.093		98,50%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.186.293.317		225.479.368		10,31 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

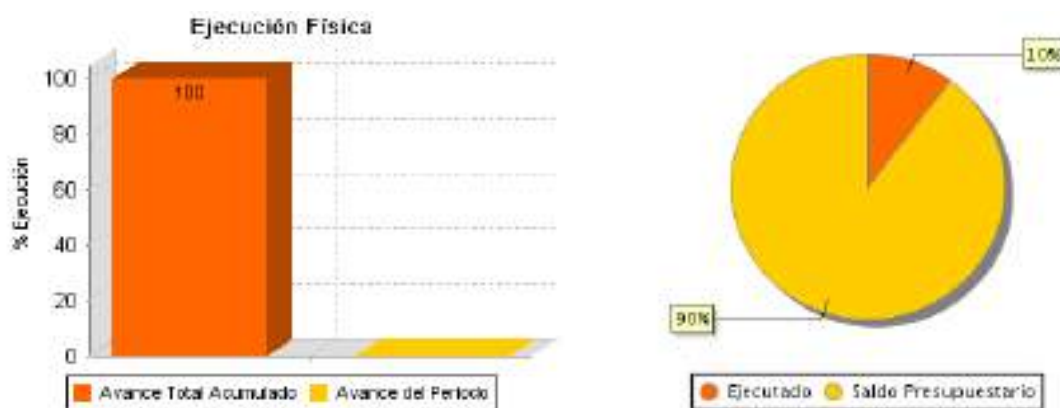


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Conservación Caminos Rurales no Pavimentada Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	766			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	273.331.128.503
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
266.127.690.303		7.203.438.200		97,36%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
5.267.147.967		544.874.336		10,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

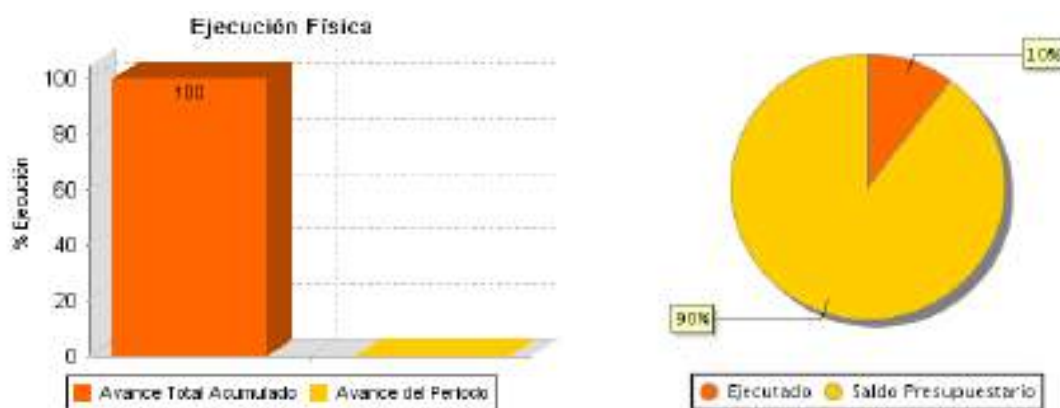


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contratos de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero - Capitan Bado - Ypejhu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		796			
Financiamiento		FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	220.000.000	GS.	1.638.315.800.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		1.638.315.800.000		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
12/9/2023		N/A		31/12/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,96 %			1,92 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
100.857.993.548		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

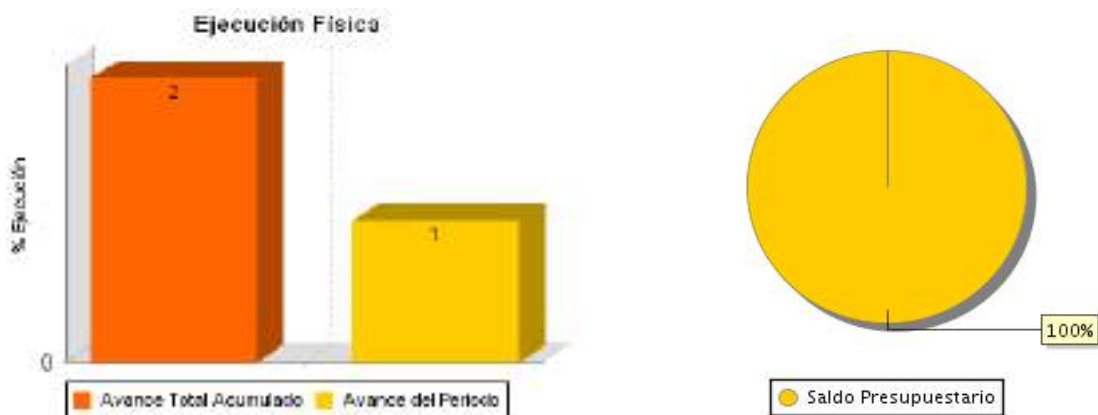


SITUACIÓN ACTUAL

Es un proyecto nuevo, en setiembre del 2023 obtuvo su ratificación parlamentaria. Al cabo del primer cuatrimestre, la obra se encuentra en proceso de licitación, específicamente en etapa de evaluación, también la fiscalización. Se prevé en el próximo cuatrimestre se adjudique la obra.

Proyecto		Construcción de 1500 viviendas en el Bañado Sur			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		797			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	100.000.000	GS.	551.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
27.643.205.388		523.356.794.612			5,02 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
11/11/2019		11/11/2025			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
0,43 %				7,65 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
34.043.679.896		2.888.472.813			8,48 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

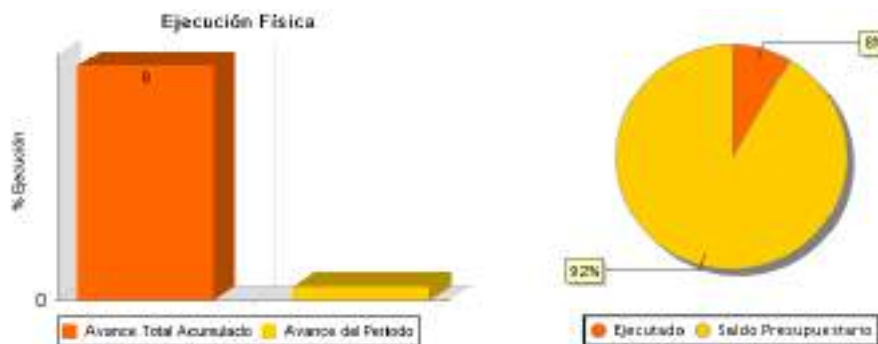


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se han obtenido los siguientes avances en el marco de los productos de Consultorías en ejecución:

- Desarrollo del Master Plan y Diseño Ejecutivo de Infraestructura Urbana: La firma consultora ha entregado el Producto N° 3 – Anteproyecto. Se han remitido desde la UEP las observaciones a ser subsanadas para el avance del Proyecto N° 4 – Proyecto Ejecutivo.
- Estudios de Saneamiento de la Laguna Yrupé y recuperación de Zonas naturales de amortiguamiento, y Elaboración de Diseño ejecutivo y permisos de Infraestructura para construcción de parque lineal Yrupé: Durante el año 2024, la firma ha presentado el Producto N° 3 Alternativas, el cual se encuentra en análisis y se ha instalado una mesa de conflicto en la que se está tratando las divergencias en cuanto al Producto.
- Proyecto Ejecutivo de viviendas sociales sostenibles: Se aprobó el Producto N° 2 - Estudios Preliminares. El Consorcio ha presentado el Producto N° 3, el cual se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Apoyo técnico y logístico a las acciones sociales del Programa. Acompañamiento a las familias beneficiarias, en el marco del Plan de Reasentamiento Temporal.
- Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur de Asunción (Barrio Tacumbú) Coberturas de prensa y elaboración de Gacetillas. Supervisión y aprobación de los posteos en las redes. Co-producción y supervisión de guión y acompañamiento del Bloque del PRVBT en el Programa de radio.

Proyecto	Capacitación y Mejororamiento en Formulación y Ejecucion de Proyectos de la DIPE			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	798			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	138.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
34.366.191.391		103.633.808.609		24,90%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
22/11/2018		22/11/2023		22/11/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,27 %			99,37 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
5.601.979.826		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

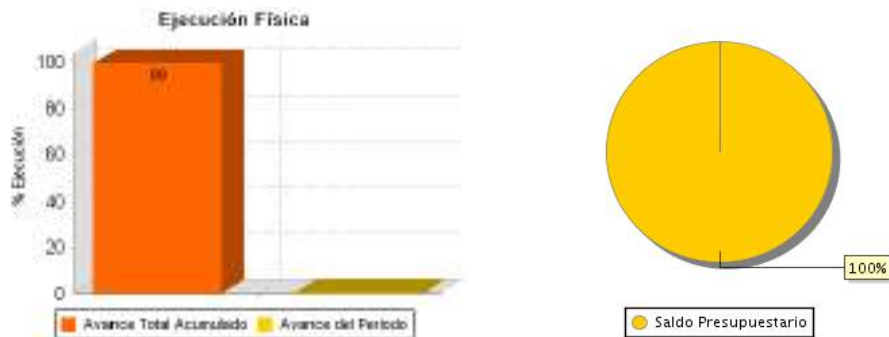


SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre, en el marco del Convenio de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura, se ha llevado a cabo una colaboración para fortalecer las capacidades técnicas y operativas del MOPC. Como parte de este proceso, se ha realizado la contratación de profesionales especializados en las distintas áreas conforme a requerimientos de los procesos de Estructuración de Proyectos estratégicos a cargo de la DIPE, lo cual incluye el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la Ruta PY 01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy (108 km), Proyecto de rehabilitación y Pavimentación de la Ruta PY10 Tramo San Cristobal - Paso Yobai, a ser desarrollado por la modalidad de llave en mano, Proyecto de Equipamiento y Puesta en marcha de las Oficinas de Gobierno y mejoramiento del Puerto de Asunción, Mejoramiento de la Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, Proyecto de Mejoramiento y Modernización del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettrrossi y el Proyecto de Construcción e implementación del Tren de Cercanía entre Asunción e Ypacarai.

Asi mismo, para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy 108 Km se ha logrado el hito en cuanto al Proceso de diálogo Competitivo iniciado entre 5 los precalificados.o entrega a los participantes del borrador del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y el borrador del Contrato PPP. Para el Proyecto Modernización y Ampliación del Aeropuerto Silvio Pettrrossi se ha realizado la elaboración de las especificaciones técnicas para los estudios de estructuración del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	806			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	827.729.290.861
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
584.479.175.481		243.250.115.380		70,61 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2019		24/05/2023		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,83 %			73,66 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
151.518.370.429		12.707.391.087		8,39 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

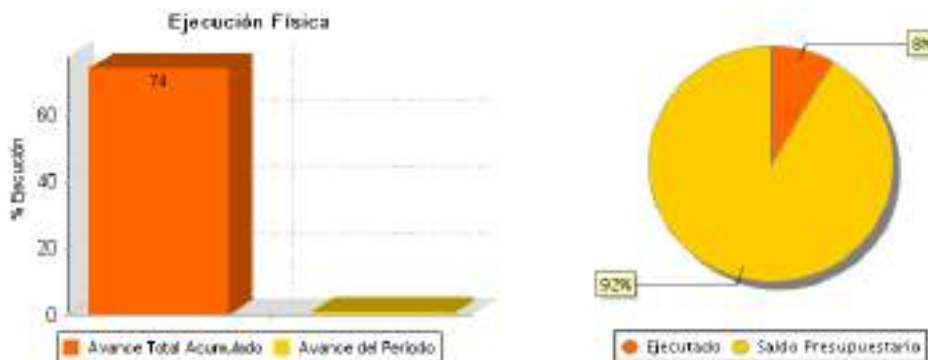

SITUACIÓN ACTUAL



Las actividades de éste proyecto se encuentran en ejecución. A continuación se detalla el avance obtenido al cabo del primer cuatrimestre:

1. Se realizó el llamado para Adquisición de Elementos Prefabricados de Hormigon Armado, así como la Adquisición de Cemento para mantenimiento de obras viales;
2. Para la Construcción de Puentes y Obras de Arte; se encuentran en etapa de elaboración de los proyectos ejecutivos de puentes mixtos a construir.
3. Se registraron avances y pagos de Contratos de Adquisición de baterías, mantenimientos menores, mayores de maquinarias, provisión de combustibles y lubricantes.

Por otra parte, se realizaron pagos de viáticos por trabajos de supervisión de obras administradas por la Dirección de Caminos Vecinales, con financiación de recursos locales.

Proyecto	Mejoramiento Intersección Tres Bocas			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	807			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	24.096.276	GS.	181.858.228.583
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
173.103.244.760		8.754.983.823		95,19 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/12/2018		26/12/2021		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,34 %			98,58 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
11.319.791.762		5.320.315.400		47,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

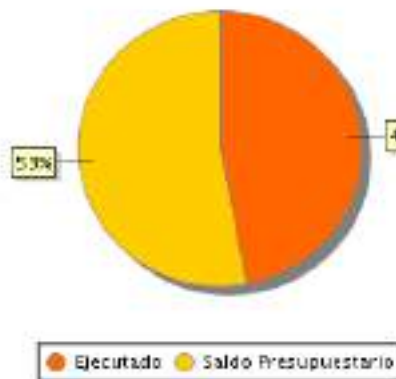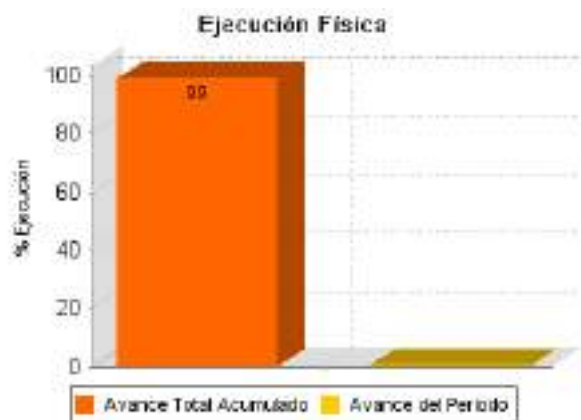


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo de éste cuatrimestre los trabajos del paso a desnivel sobre Acceso Sur se han ejecutado en su totalidad, se aclara que la misma ha concluido. Queda pendiente pagos de certificados de obras, reajustes, adendas e indemnizaciones a frentistas.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	815			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	180.955.638.079
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
166.051.829.391		14.903.808.688		91,76 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			89,88 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.592.413.979		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO


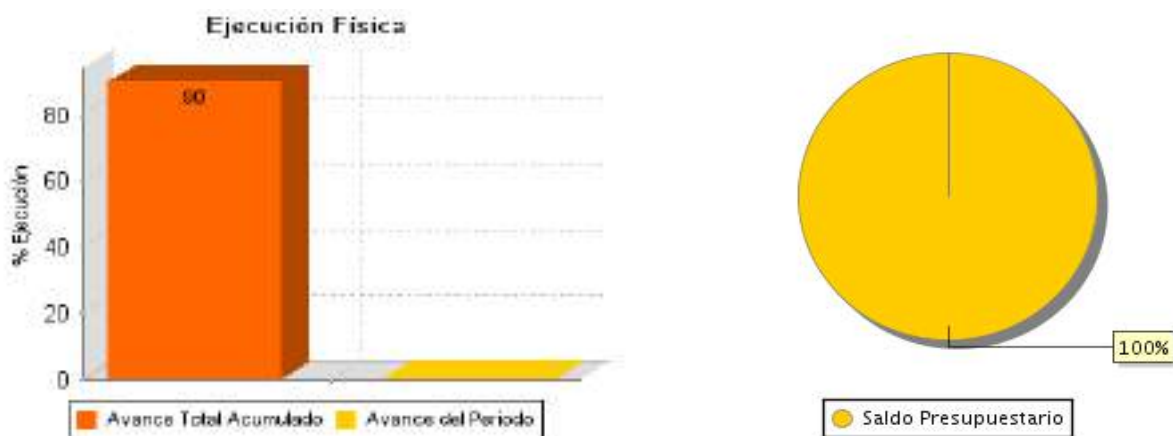


SITUACIÓN ACTUAL

Al momento del cierre del presente informe el MOPC no ha remitido respuesta a la observación realizada en el Banco de Proyectos de indicar el motivo por el cual no presenta ejecución presupuestaria atendiendo que cuenta con recursos en el Plan Financiero según reporte del SICO al cierre del mes de abril. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9.543/2023.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Alto Parana		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		817		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 146.006.682.452
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
145.194.761.116		811921336		99,44 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			85,72 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
59.819.669		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

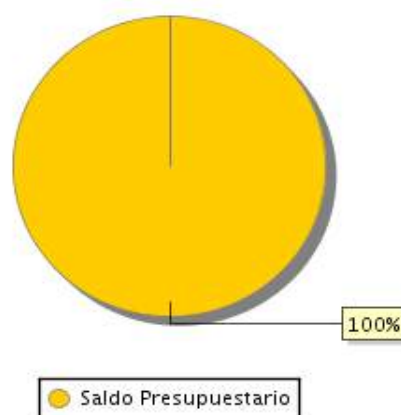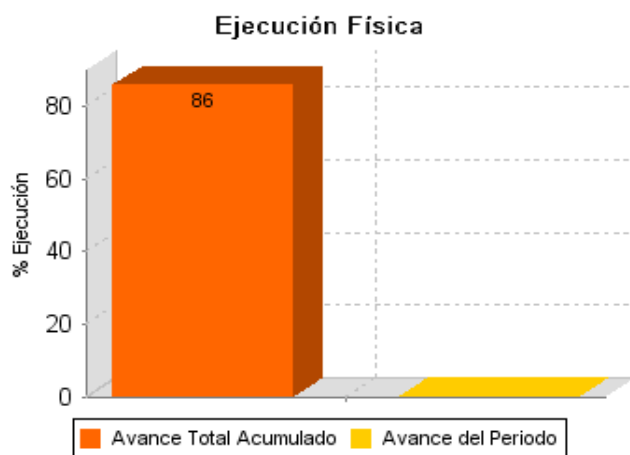

SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en el presente periodo que no se registran avances en referencia al pago de deudas, indicando que si bien se cuenta con presupuesto vigente al cierre del mes de abril, es insuficiente para honrar las deudas activas. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	818			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	120.199.268.503
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
116.439.555.126		3.759.713.377		96,87 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			79,20 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
726.597.532		53.330.580		7,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en el periodo de referencia se ha registrado pago de certificados por deudas correspondientes a las obras Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica de varios Tramos de la Región Oriental, 6ª Tanda – Lote N° 4: Santa María - Santa Rosa. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	820			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	154.593.491.989
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
149.755.324.196		4.838.167.793		96,87 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Cordillera			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			77,40 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
30		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en el presente periodo que no se registran avances en referencia al pago de deudas, debido a que no se cuenta con apertura presupuestaria. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		821		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 181.981.991.824
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
178.207.726.045		3.774.265.779		97,93 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			97,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
1.704.053.101		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

El el periodo de referencia el MOPC reporta que no se registran avances en referencia al pago de deudas. Cabe mencionar que según reporte del SICO cuenta con recursos en el Plan Financiero, al respecto el MOPC manifiesta que el presupuesto es insuficiente para el pago de las deudas. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/20 y 9543/2023

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		822		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 110.267.520.130
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
65.399.517.724		44.868.002.406		59,31 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
24.121.947.715		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

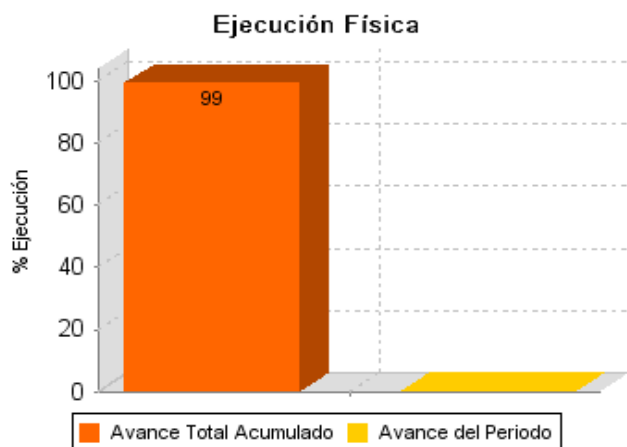


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que se encuentra en proceso administrativo el acta de liquidación de la obra. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los Decretos N° 4614/20 y 9543/2023

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		825			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	233.581.015.840
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
221.287.863.716		12.293.152.124			94,74 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			71,05 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
17.824.843.923		830.292.453			4,66 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

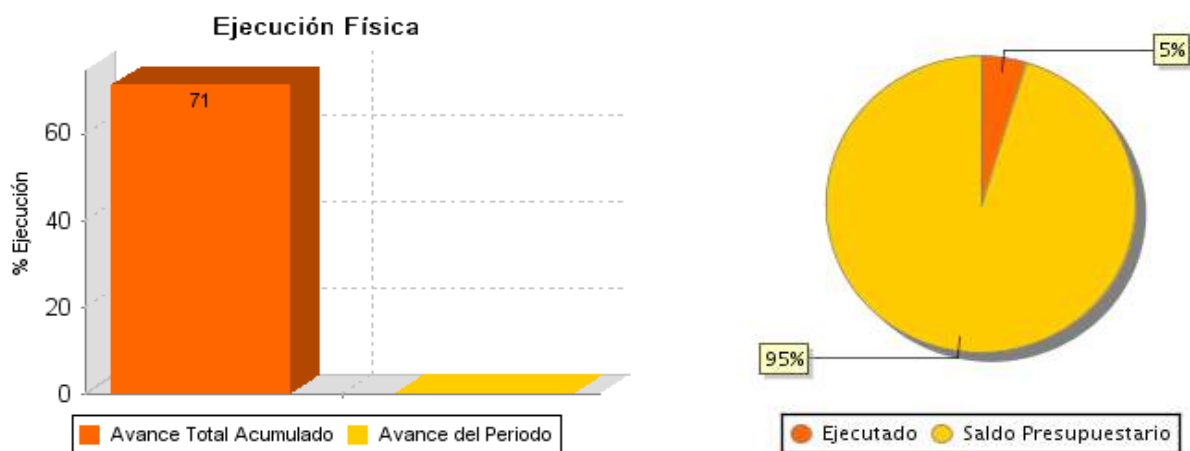


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reporta que se ha registrado pago de certificados correspondientes a las obras de Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental, 6ª Tanda – Lote N° 1: San José de los Arroyos - Tebicuary. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		826			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	56.605.555.891
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
53.423.418.873		3.182.137.018			94,38 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Concepción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			92,50 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
9.857.865.966		5.629.495.552			57,11 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

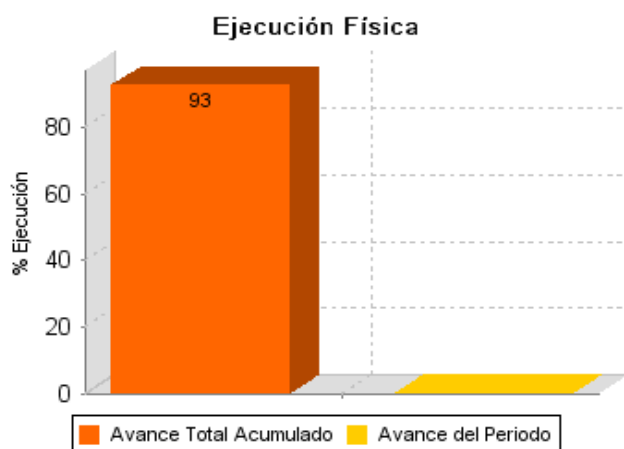


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia se reporta que se ha registrado pago de certificados correspondientes a las obras de Pavimentación Asfáltica de varios tramos de la Región Oriental 5ª Tanda – Lote N° 3: Ruta Nacional N° 5 Jhuguá Ocampos - Ykua Jhovv - San Blas. Cabe mencionar que el proyecto se encuentra enmarcado en los Decretos N° 4614/2020 y 9543/2023

Proyecto		Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km)				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		857				
Financiamiento		CAF				
Costo del Proyecto		USD	99.100.000		GS.	633.712.360.978
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
74.601.908.648			559.110.452.330			11,77 %
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
01/04/2022			03/03/2028			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Alto Paraná					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
5,10 %				15,06 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
157.105.263.286			9.007.505.797			5,73 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

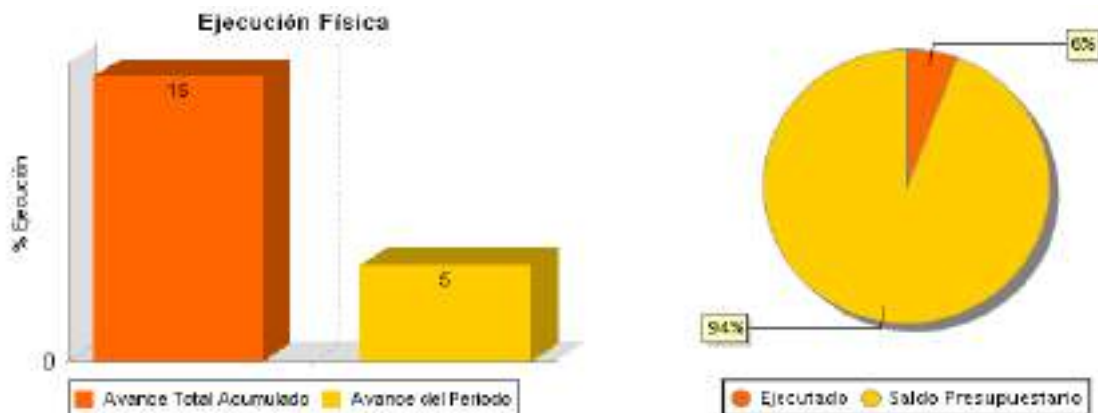

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se registraron los siguientes avances: Componente 1: Obras Civiles: Actividad 1: Construcción y Mantenimiento de la Ruta PY 21, Tramo: Ruta PY 07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, en los Lotes N° 1 y 2, presenta 7% de avance general, no registrando todavía avances en la capa asfáltica, se resaltan los trabajos de terraplén y excavaciones varias. Actividad 2: Obras Complementarias, en etapa de elaboración del PBC. Componente 2: Gestión Socio Ambiental: las actividades de este Componente no registran avances, se encuentra en etapa de adjudicación. Componente 3: Gestión del Proyecto: Actividad 2 - Fiscalización de las obras de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta PY 21, Tramo: Ruta PY 07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, las fiscalizadoras presentaron 3 informes mensuales en el presente cuatrimestre, las demás actividades no presentan avances.

Proyecto	Ampliación Defensa Costera Ciudad de Pilar			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	860			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	759.815.980.019
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
701.438.488.521		58.377.491.498		92,32 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
08/08/2019		08/08/2023		31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Pilar			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			95,76 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
53.720.440.165		4.769.140.042		8,88 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del año 2024, el MOPC reporta que los trabajos correspondientes a la primera fase del proyecto, se encuentran con recepción provisoria de obras, como así también se reporta el comienzo de la etapa de operación de mantenimiento.

Proyecto		Mejoramiento Corredor Agroindustrial Región Occidental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		863			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	134.342.866	GS.	1.288.128.933.825
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
873.373.458.429		414.755.475.396		67,80 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020		23/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
7,41 %			60,79 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
236.883.925.138		101.560.608.140		42,87 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

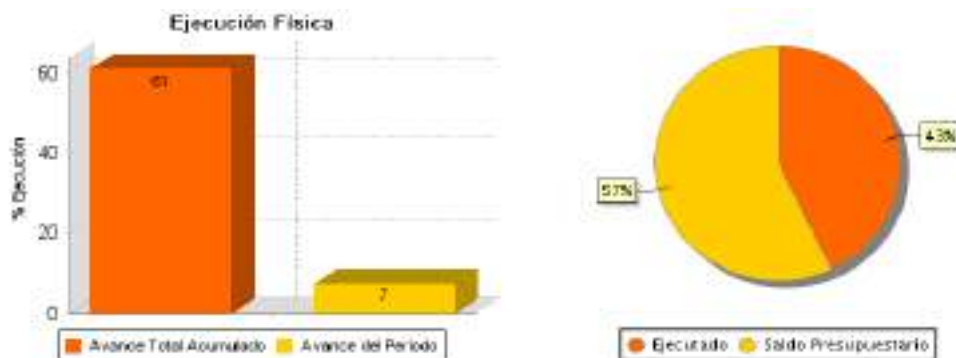

SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Occidental, a continuación, detallamos el avance:


Componente 1 - Obras de Mantenimiento y Pavimentación Asfáltica: 1) Lote 1 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76Km), tiene un avance acumulado real de 93,24%. Los ítems de obra trabajado son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües, Drenajes y Pavimentación; 2) Lote 2 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo – Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100, el acceso a Campo Aceval y el tramo Campo Aceval - Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 0+000 hasta progresiva 29+500 (71,47 Km), tiene un avance real de 90,69%. Los ítems de obra trabajado son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües y Drenajes, Interferencias, Obras Complementarias, Instalaciones y Pavimentación Asfáltica.

Componente 2 - Construcciones y Mantenimiento de Obras Básicas; Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y Tramo Campo Aceval – Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500, tiene un avance real de 100%. Los ítems de obra trabajado son; Obras básicas (terraplén, Excavación no Clasificada), Desagües, Drenajes, Obras Complementarias y pavimentación Asfáltica.

Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto	Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial Region Oriental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	864			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	100.657.134	GS.	685.804.896.001
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
233.724.587.273		452.080.308.728		34,08 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/12/2020		23/12/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
9,92 %			70,72 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
206.906.324.047		33.312.280.958		16,10 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

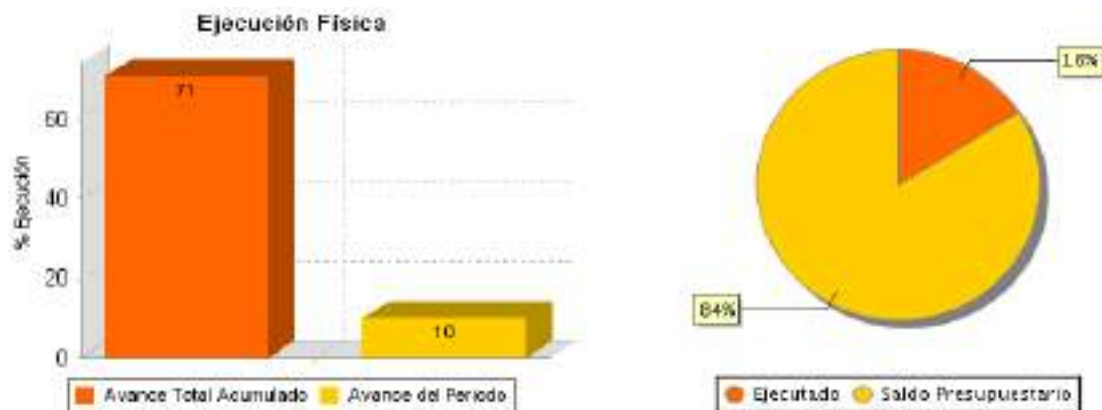


SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Oriental a continuación detallamos el avance: 1. Lote 1: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo (Incluye Accesos a Volendam (4 Km Zona Urbana) y Puerto Mbopicua (6 Km) y Volendam San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Rio Jejui e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (77,9 Km). cuenta con un Avance Físico Real del 50,85% - 2. Lote 2: San Pablo - Empalme PY 11 (Cruce Yacaré Ñe'e). tiene un Avance Físico Real 44,95% y. 3. Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales / Sistema de Agua San Ignacio			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		871			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	13.364.200	GS.	99.394.366.512
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		99.394.366.512			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
07/07/2023		07/07/2023			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Misiones				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			0,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
12.500.000.000		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

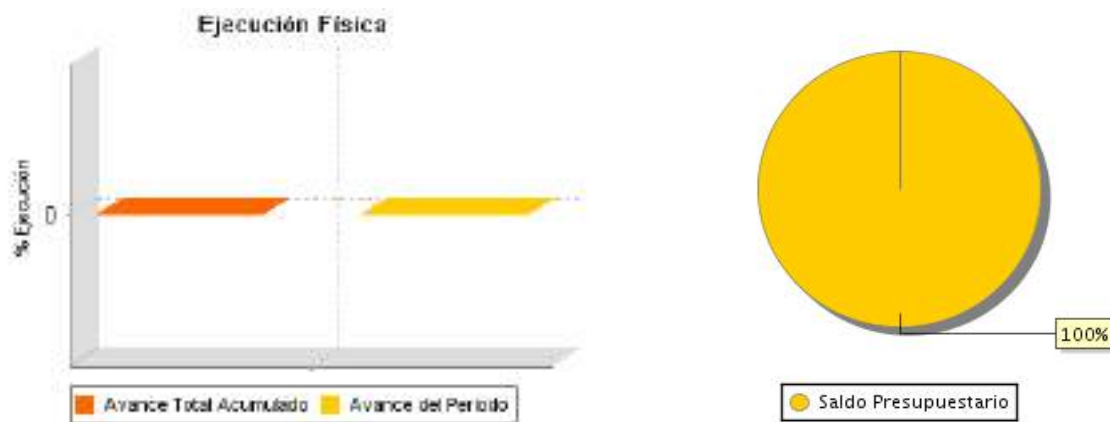


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de San Ignacio, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto		Construcción Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Agua Residuales / Sistema de Agua Santa Rita			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		874			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	15.952.010	GS.	118.640.841.094
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		118.640.841.094			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
07/07/2023		07/07/2023			31/12/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %				0,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
12.500.000.000		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

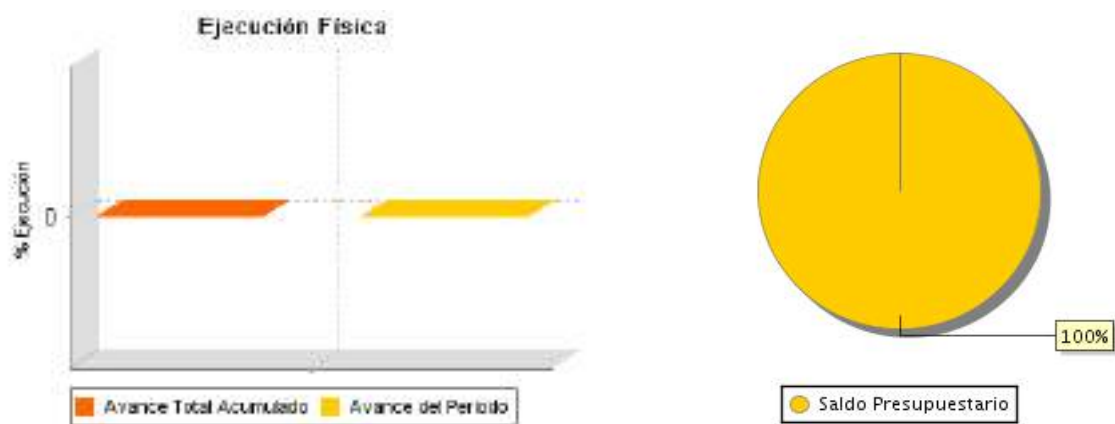


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de Santa Rita, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto		Construcción Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales / Sistema de Agua Carapeguá			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		875			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	13.089.763	GS.	97.353.279.746
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0,00		97.353.279.746			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
07/07/2023		07/07/2023			31/12/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Paraguarí				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			0,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
12.500.000.000		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

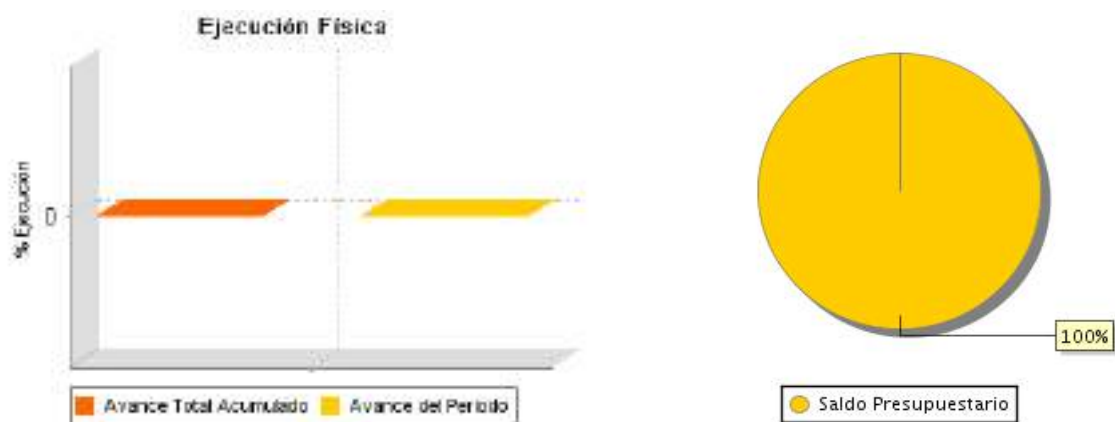


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de Carapeguá, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto		Mejoramiento Sistemas de Agua y alcantarillado Sanitario de Ciudad del Este y Presidente Franco			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		883			
Financiamiento		BID , JICA			
Costo del Proyecto		USD	200.000.000	GS.	1.276.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		1.276.400.000.000			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
11/05/2023		11/05/2029			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
0,82 %				0,82 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
48.589.351.420		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

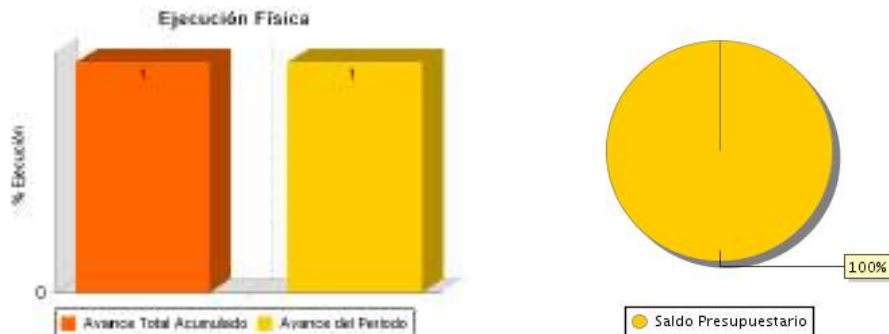

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del presente cuatrimestre se ha realizado una Solicitud de Prórroga según Nota MOPC N° 386 / 2024 por 180 días contados a partir del 02/05/24, atendiendo a que están pendientes 2 requisitos de las condiciones previas:

1. Entrada en vigor del acuerdo entre la JICA y el prestatario, en trámites por falta de la aprobación de JICA.
2. Cuarta cuenta solicitada por JICA, que ya está en trámites del MEF;


Se ha publicado el llamado de Precalificación para la Contratación de Diseño y Construcción de Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este. Se estima que dentro del segundo cuatrimestre será publicado el PBC para la Contratación de Diseño y Construcción de Obras.

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el PBC para el llamado del Diseño y Construcción de Sistema de Tratamiento y Disposición final de Aguas Residuales, Construcción de Estaciones de Bombeo, el cual se encuentra en el BID para su no objeción y posterior publicación en el portal de la DNCP dentro del segundo cuatrimestre del año.

Se ha recibido la manifestación de interés del Llamado MOPC N° 58/2023 para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Fiscalización, la cual se está evaluando para la conformación de la lista corta.

Proyecto		Construcción de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales / Sistema de agua Santa Rosa del Aguaray		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		889		
Financiamiento		CAF		
Costo del Proyecto		USD	9.886.028	GS. 73.525.949.206
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		73.525.949.206		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A		-		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			0,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
12.500.000.000		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

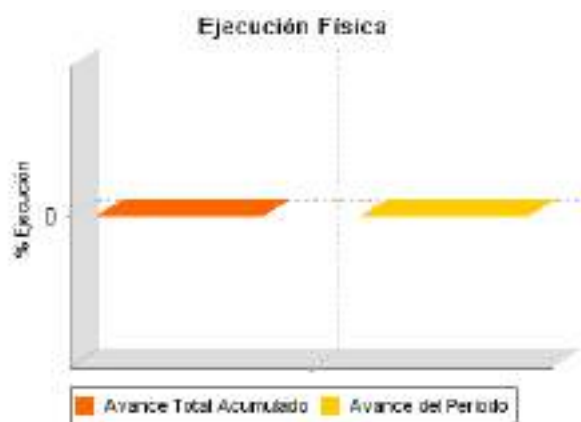


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del primer cuatrimestre se ha elaborado el borrador de PBC de las obras Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable para la ciudad de Santa Rosa, que se encuentra en proceso de revisión en la UOC del MOPC y cumpliendo con todos los requisitos para su publicación en el portal de la DNCP. Se espera dentro del segundo cuatrimestre publicar dicho llamado.

Proyecto	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	892			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	51.611.968.238
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
49.713.416.123		1.898.552.115		96,32%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2019		25/11/2022		25/11/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/2024		Porcentaje Ejecutado
11.871.359.178		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto están prácticamente culminada. En este cuatrimestre se realizaron trabajos de terminación de pisos, trabajos de Instalaciones eléctricas, pluviales y agua corriente, además de terminación y ajuste de aberturas. En proceso la gestión de ajuste del costo total antes la DGIP.

Proyecto	Mejoramiento del edificio central del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA)			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	957			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	10.905.509.073
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
8.719.972.546		2.185.536.527		79,96 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/06/2022		01/06/2023		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			52,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
3.597.384.483		694.280.715		19,30 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

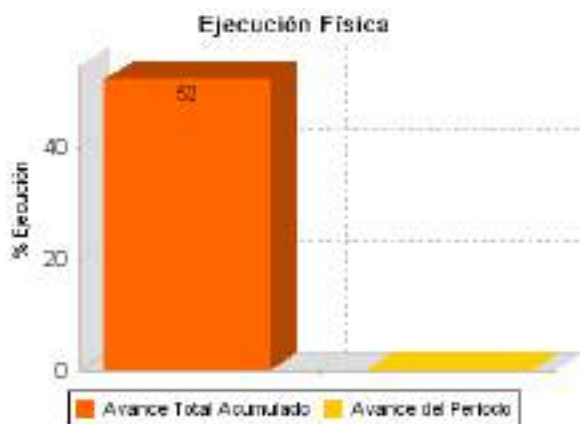

SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en este primer cuatrimestre las obras de mejoramiento del Edificio Central del MINNA se encuentra en proceso de obtención de la recepción provisoria, se están realizando arreglos en manpostería, pisos, ventanas, plomería, electricidad y otras obras menores más.

Proyecto		Construcción de Instalaciones Turísticas en la Reserva Ecológica Banco San Miguel, Asunción				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		982				
Financiamiento		BIRF				
Costo del Proyecto		USD	11.137.827		GS.	77.964.786.690
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0			77.964.786.690		0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/11/2023			29/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Municipal	Asunción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,88 %				1,88 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
73.000.000			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.

Proyecto		Construcción del Distrito Eco Inclusivo de Asunción			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		983			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	66.761.641	GS.	467.331.485.250
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		467.331.485.250			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/11/2023		29/12/2028			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,62 %			1,62 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
7.559.450.000		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

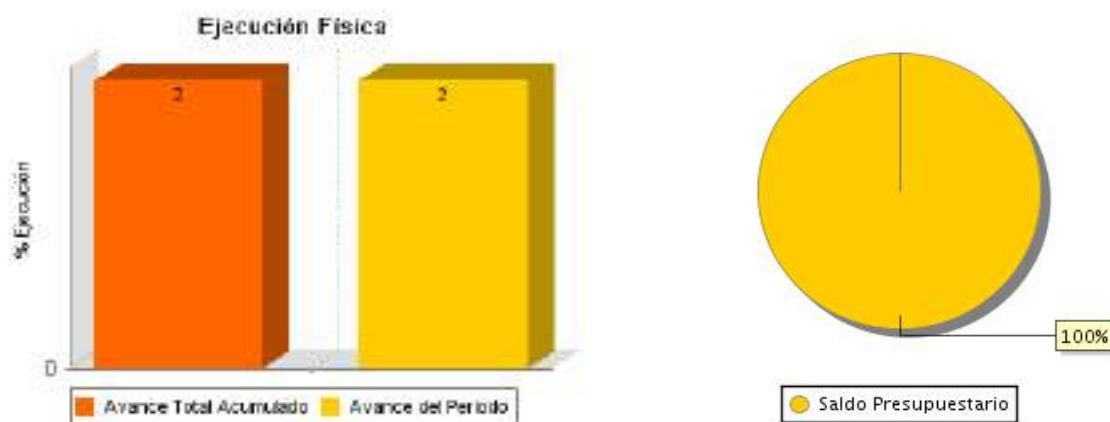


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.

Proyecto		Mejoramiento y Revitalización Urbanística del Centro Histórico de Asunción (CHA)			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		985			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	20.958.011	GS.	146.706.073.500
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		146.706.073.500			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/11/2023		29/12/2028			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,88 %			1,88 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
897.900.000		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

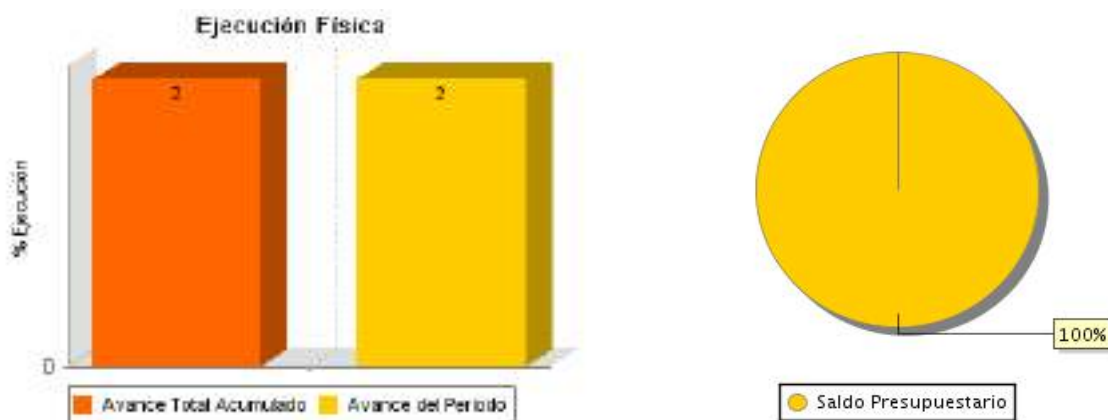


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.

Proyecto		Mejoramiento del Parque Caballero en Asunción			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		987			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	13.726.991	GS.	96.088.938.750
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		96.088.938.750			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/11/2023		29/12/2028			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,87 %			1,87 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
970.900.000		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

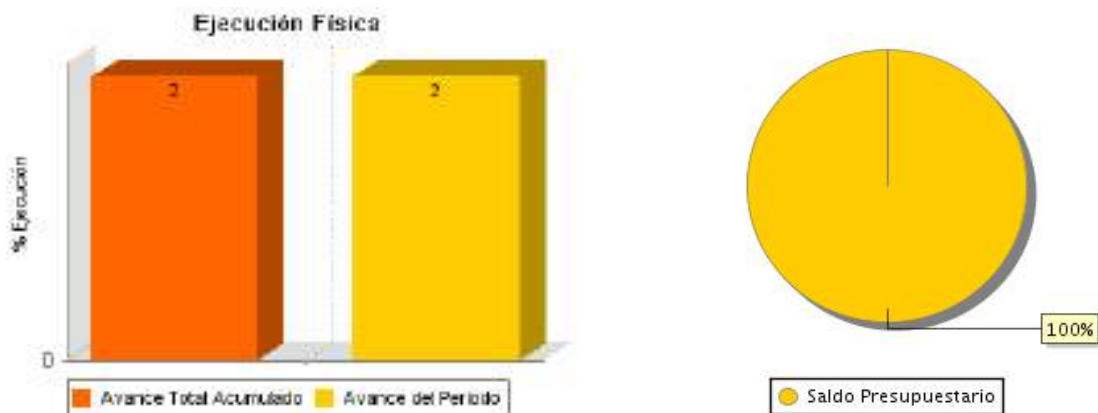

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reporta que se realizaron las gestiones para prever los créditos presupuestarios a través de una modificación presupuestaria a fin de realizar la regularización el pago directo en concepto de Comisión Inicial, conforme a lo establecido en la sección 2.03 del Contrato de Préstamo, que al cierre del cuatrimestre aún no se hizo efectiva. Así mismo, se encuentra en etapa de elaboración y revisión de Pliegos de Bases y Condiciones y Términos de Referencia para los distintos procesos de licitaciones y contratos.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Enero - Abril 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay			
OEE	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Código SNIP N°	793			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	130.000.000	GS.	747.370.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
176.847.912.778		570.522.087.222		23,66 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
06/05/2019		06/05/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6,48 %			47,83 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
407.983.234.897		16.421.674.751		4,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

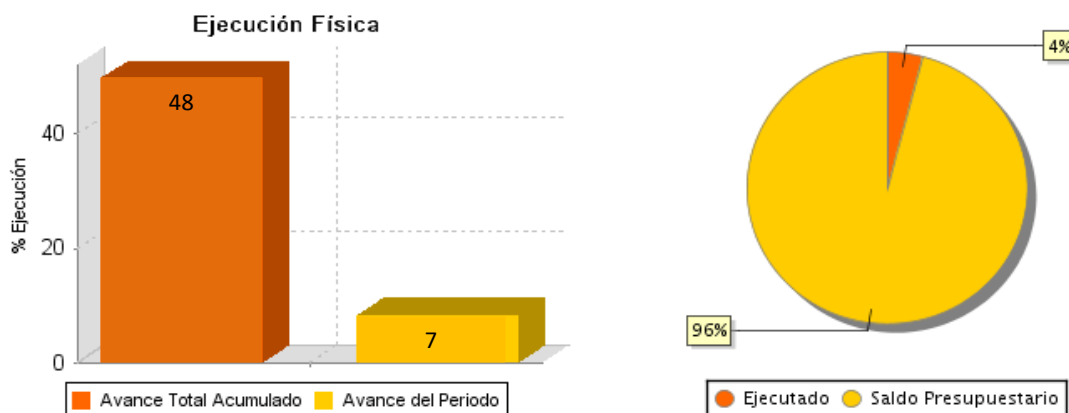


SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer cuatrimestre se cuenta con 4 análisis jurídicos y/o propuestas normativas en cuanto al apoyo al gobierno digital y a sectores estratégicos, 110 establecimientos de salud cuentan con el Sistema de Información de Salud (HIS); en cuanto a los Sistemas de gobierno digital, se tienen 5 sistemas de gobierno electrónico implementados e incluye plataformas para la autenticación de identidad, firma digital y notificación electrónica, la gestión administrativa para municipios; el Portal Nacional de Trámites y Servicios Transaccionales; la pasarela de pago en línea; y el Geoportal Nacional y la actualización de elementos de la plataforma de interoperabilidad, entre otros.

Proyecto		Construcción de una red para instituciones educativas			
OEE		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Código SNIP N°		856			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	62.145.436	GS.	240.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
198.602.134.655		41.397.865.345			83,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
16/04/2020		16/04/2025			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,12 %			67,13 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
130.764.660.435		625.795.347			0,48 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

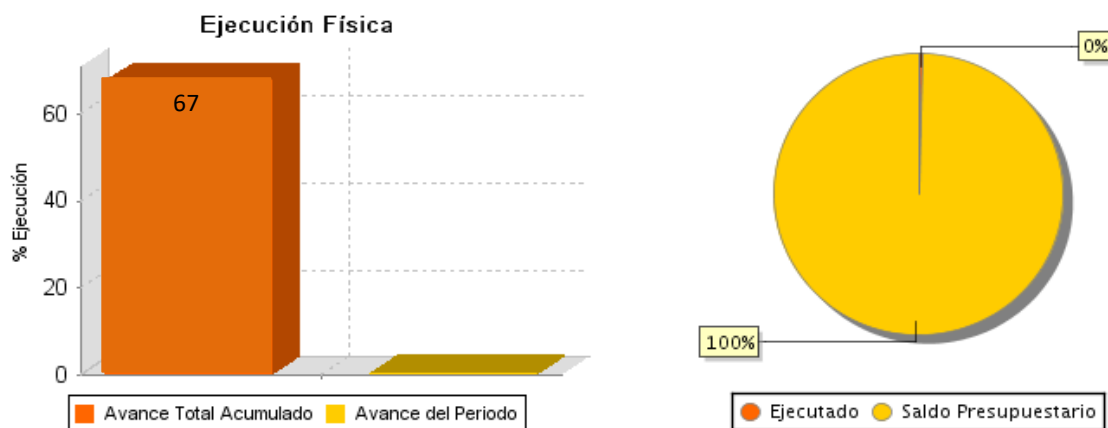

SITUACIÓN ACTUAL

En este 1er cuatrimestre la entidad informó que no se han realizado mayores actividades y se ha procedido a realizar pagos por servicios.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Enero - Abril 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exportadoras Paraguay			
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
Código SNIP N°	707			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS.	68.919.969.211
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
39.224.582.353		29.695.386.858		56,91 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
03/07/2018		03/07/2023		03/07/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,14 %			75,93 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
17.007.122.600		5.523.236.967		32,48 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

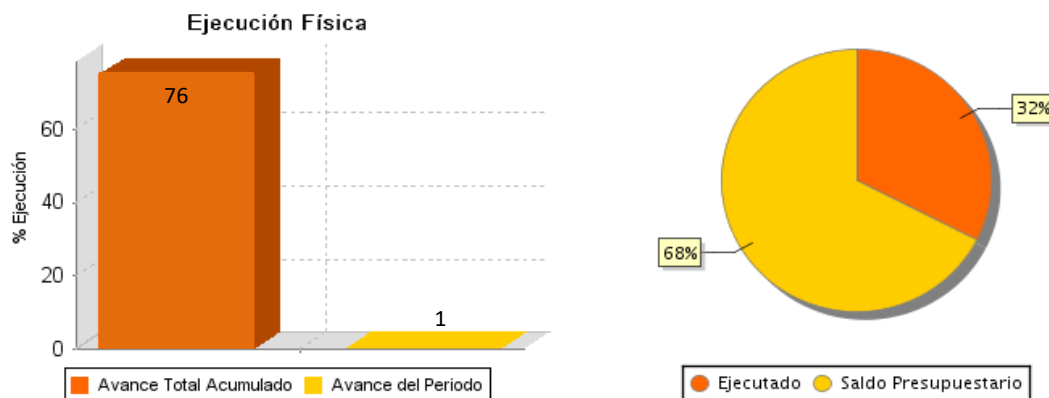

SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el periodo reportado han finalizado 5 SDE del tipo A3 (C), siendo estos: UNION DE PRODUCTORES DE ITAPUA S.A. INDUSTRIA FRIGORIFICA(UPISA), AGRICOLA KNELSEN SOCIEDAD ANONIMA, Avanza Paraguay S.A, La Misericordia SA, Produsur Productores Unidos del Sur SA. Por otro lado, se ha abonado en forma parcial 1 SDE correspondiente al subproyecto LA BOMBILLA S.R.L. también se realizaron 10 cursos de capacitación técnica en zona de frontera



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Enero - Abril 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC, en Asunción y los 17 Departamentos Geográficos del País.			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	325			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	578.568.001.943
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
519.450.737.205		59.117.264.738		89,78 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
11/09/2014		11/09/2017		30/06/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,31 %			92,83 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
63.733.322.069		5.338.509.736		8,38 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

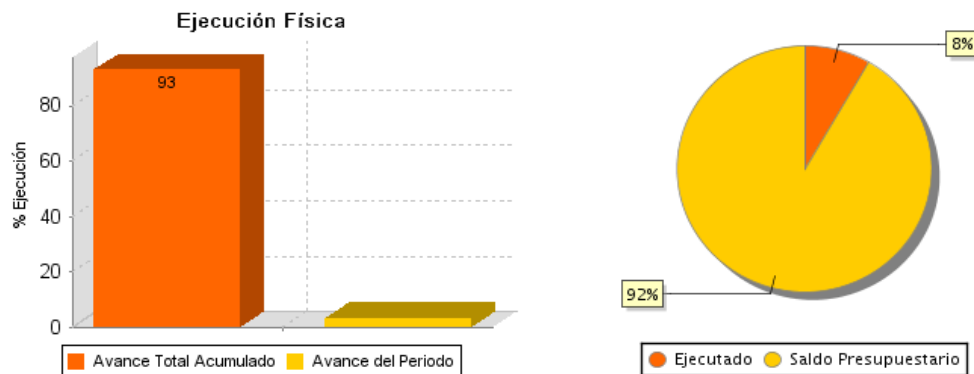

SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se realizó la supervisión y fiscalización de 47 obras en las Instituciones escolares en los Departamentos de: Concepción 12, Canindeyú 19, Amambay 11, Misiones 4 y Paraguarí 1.

Asi también, culminaron 13 obras en Instituciones Escolares en los Departamentos de Canindeyú 6, Concepción 5, Misiones 2. Dichas obras terminadas incluyen: 6 aulas generales simples, 2 aulas generales dobles, 5 aulas simples, 1° ciclo Enseñanza Escolar Básica con sanitario higiénico integrado. Las obras cuentan con sus respectivas actas de recepción definitivas.

Por otro lado se realizó la entrega de muebles consistentes en: armarios, estantes, escritorios, mesas de trabajos, mesas, sillas y mesas de clase, en Instituciones Escolares de los siguientes Departamentos: Asunción 7, Caazapá 19, Itapúa 19, Alto Paraná 19, Misiones 15, Central 15, Cordillera 18, Ñeembucú 12, y Paraguarí 14.

Proyecto	Ampliación en la atención educativa desde la gestación hasta 5 años			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	388			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	591.638.288.812
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
375.161.788.502		216.476.500.310		63,41 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2015		31/12/2018		30/06/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,27 %			76,13 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
72.639.815.853		3.717.296.268		5,12 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

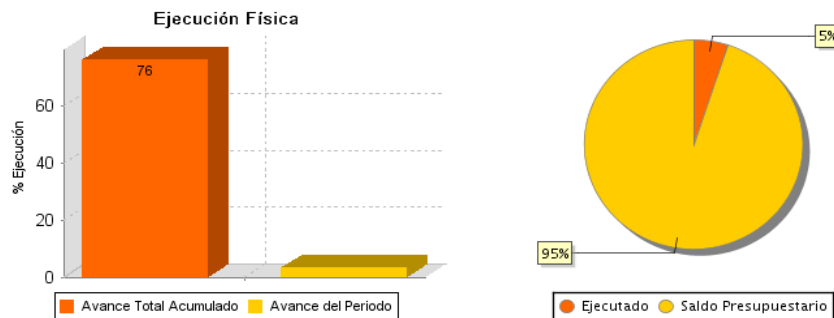

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal la Unidad Ejecutora reportó que culminaron 15 obras adjudicadas a la firma CONSTRUTEX a través del ID N° 406.836. Es importante destacar que algunas instituciones cuentan con el prototipo I que implica una sala, con depósito, baño y galería y el prototipo doble sala con depósito, sanitario y galería.

Así también, se contrató a 45 educadoras comunitarias para prestar servicios en instituciones educativas de comunidades indígenas de los departamentos de: Alto Paraná, Alto Paraguay, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Guairá, Itapúa, Presidente Hayes y San Pedro.

Se adjudicó a la una firma consultora del proceso de CD N° 01/2024 "CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, PERIODO 2023 DEL PROGRAMA EDUCATIVO PRIMERA INFANCIA" – AD REFERENDUM ID N° 423.814, mediante Resolución UEPP N° 109/2024.


Se realizó la distribución de 57 kit de mobiliario (armario para docente bajo, armario para docente alto, estante con cubetas de plástico, perchero con colgador, mesa para grupos de 4 niños, sillas para niños y para docentes), para espacios educativos de primera infancia, en los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Presidente Hayes y San Pedro.

Por otr aparte se distribuyó 61 kit de materiales didácticos, de los cuales 3 kit se entregaron en los espacios de atención socioeducativo para contexto de encierro en los departamentos de Itapúa, Caaguazú y Asunción y 58 para espacios de prejardín y jardín de los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Presidente Hayes y San Pedro.

Los materiales didácticos se citan a continuación: pelotas, kit de muñecos sexados, kit de juegos de playa y de encastre, prono supinador didáctico, juegos simbólicos de doctor, hogar, carpintería, supermercado, titiritero, títeres de dedos, juegos didácticos de enhebrado, mesa de agua y arena, casa para jugar, set de instrumentos musicales y de seguridad vial, tarjetas con números, balanza didáctica, kit de ciencias para niños, rompecabezas, set de cubos para apilar, bloques lógicos, dominó, colchonetas, alfombras y mini basquet, peluche antialérgico, alfombras, entre otros.

Proyecto		Investigación Evaluación estandarizadas de desempeño a estudiantes			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		389			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	63.790.750.573
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
62.890.490.793		900.259.780			98,59 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
30/12/2014		30/12/2021			31/07/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,03 %			97,21 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
1.250.000.000		721.292.539			57,70 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

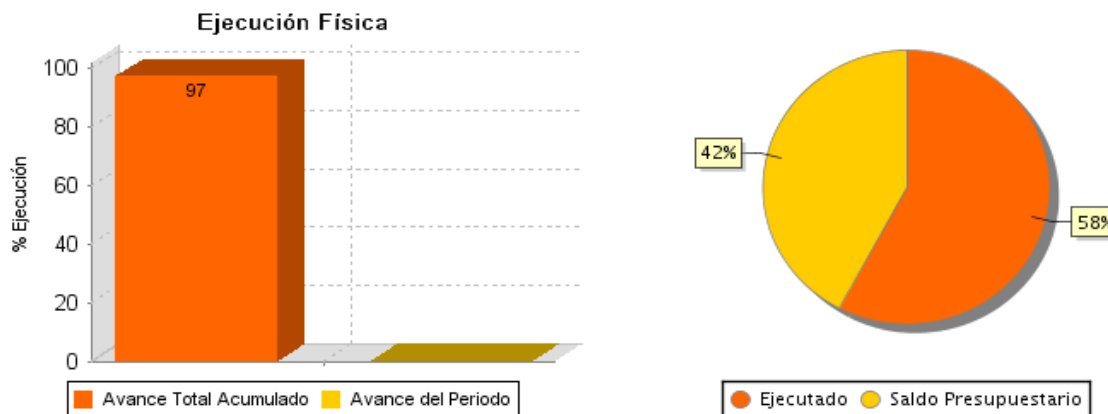

SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre del presente periodo fiscal la Unidad Ejecutora reportó que se realizó la verificación de los instrumentos aplicados en los 17 departamentos y la capital del país.

Además, finalizó la revisión y consistencia de la base de datos de los cuestionarios y rendimiento académico de los 17 departamentos aplicados en 4° y 7° grado de la Enseñanza Escolar Básica y 1° y 3° Curso de la Enseñanza Media.

Se realizó la auditoria externa financiera y de gestión del ejercicio 2023.

Proyecto		Mejoramiento de condiciones de aprendizaje con incorporación de TIC		
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°		394		
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 639.856.204.101
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
583.310.764.692		56.545.439.409		91,16 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2015		25/12/2019		30/06/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,50 %			79,02 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
43.051.032.610		3.505.285.880		8,14 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

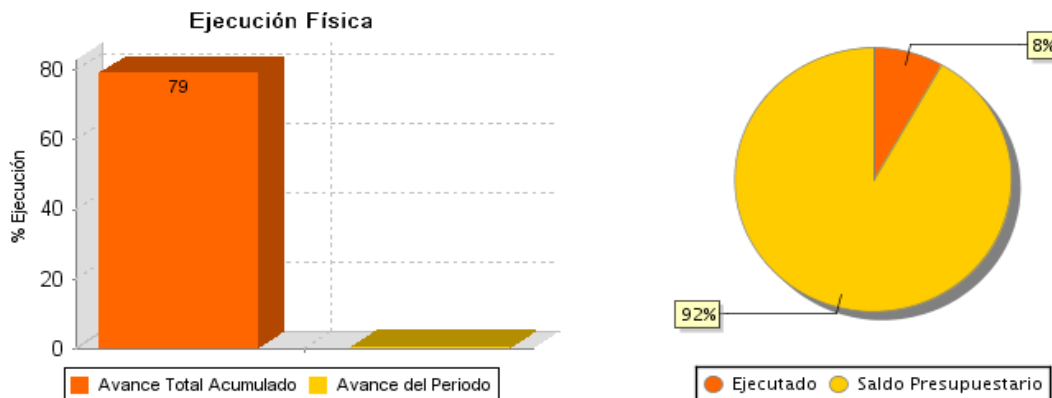

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se proveyó de señal de internet satelital a 199 instituciones educativas de alcance nacional a través del llamado ID N° 419.352.


Por otro lado, culminó la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos de infraestructura de conectividad en el marco del llamado ID N° 417.928 "AMPLIACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY", benefició a 1060 establecimientos educativos en los 17 departamentos del país y Capital.

Así también, se realizaron los cursos de capacitaciones para gestores de TIC, con 2596 docentes inscriptos.

Se realizó la auditoría externa financiera y de gestión del periodo 2023.

Proyecto	Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	570				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	19.720.000		GS.	141.761.952.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
98.383.165.099		43.378.787.701		69,40 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/5/2024		10/05/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,63 %			62,07 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
26.356.513.992		6.526.246.187		24,76 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

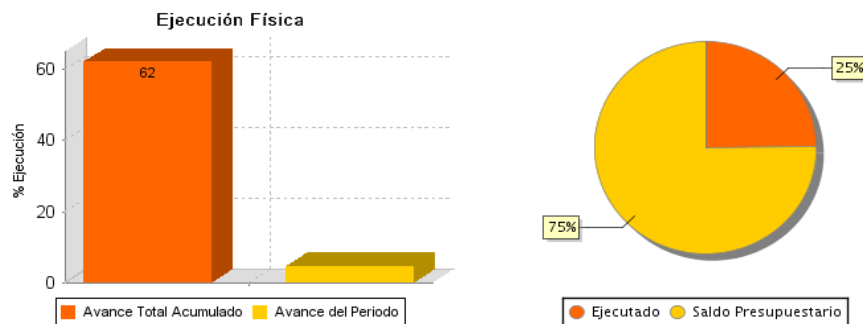

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre 2024 la Unidad Ejecutora reportó que se ejecutaron los contratos individuales para "Edición de contenidos de cuadernos de aprendizajes y de guías didácticas de lengua guaraní del 1º al 6º grado de la Escuela Escolar Básica" y para "Elaboración de materiales educativos para el área de comunicación (guaraní como lengua materna) para el 1º y 2º grado de la EEB". Así también siguen en ejecución el contrato con el Centro Cultural Paraguayo Americano para la implementación de inglés sin límites y los contratos con los proveedores Mercurio y Frigon a través del llamado ID N° 424.449 para el servicio de impresión de materiales didácticos para el 1º y 2º ciclo de EEB, concluidos los lotes a cargo de las empresas Servipress y Alamo.

Se realizó el Convenio interinstitucional con DINACOPA para el servicio de distribución de materiales didácticos en la Capital y los departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Neembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.

Además, se llevó a cabo la implementación de Escuelas Abiertas en 150 instituciones educativas focalizadas en el proyecto en Capital y 15 departamentos del país, Capital 9, Concepción 5, San Pedro 5, Cordillera 17, Guairá 12, Caaguazú 12, Caazapá 4, Itapúa 12, Misiones 8, Paraguari 19, Alto Paraná 5, Central 17, Neembucú 7, Canindeyú 2, Presidente Hayes 4, y Boquerón 2.


Entre las actividades desarrolladas por la organización se encontraban: realizar el proceso de selección de facilitadores, capacitar en forma presencial a los facilitadores, proveer los insumos deportivos, educativos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, en base al programa de actividades propuesto que incluían actividades dentro y fuera del aula, en base a los tres ejes del proyecto: el arte, el deporte y la lecto-escritura.

Por otro lado, se obtuvo la no objeción y se autorizaron por resolución la contratación para las consultorías individuales para la selección de títulos de libros de las áreas de lengua (Castellano – Guaraní), Matemática y Ciencias (Naturales y Sociales), para la adquisición de libros para las bibliotecas de aula.

Las actividades de la auditoría externa del proyecto concluyeron en el primer cuatrimestre con la entrega del informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2023, con la remisión de dicho informe al BID.

Proyecto	Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	571			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	280.000	GS.	2.012.847.200
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
744.739.141		1.268.108.059		37,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2017		10/05/2025		10/06/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,92 %			6,63 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
530.317.208		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

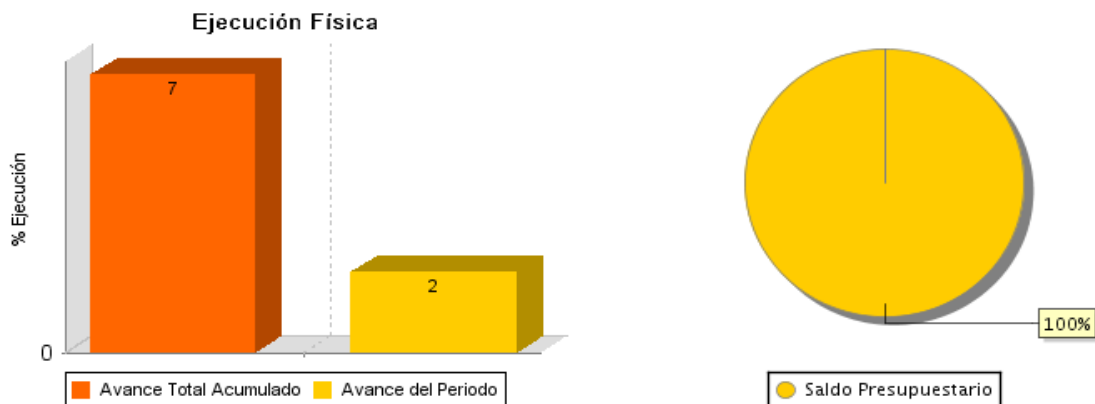


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el primer cuatrimestre se realizaron las invitaciones para presentación de ofertas para la adquisición de boleto estudiantil en medios magnéticos (tarjetas) para transporte público a las siguientes empresas: Empresa Paraguaya de Servicios S.A.E y Technologies Development of Paraguay S.A.

Conforme a las recomendaciones de las consultorías de viabilidad, (Contrato Nro. 15/2023 Ernest & Young), se iniciarán las gestiones para la contratación del servicio de alquiler de buses escolares para llevar a cabo el programa piloto.

Proyecto		Capacitación y Evaluación de Educación Superior			
OEE		AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR			
Código SNIP N°		644			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 23.167.811.280
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
22.333.448.197		834.363.083		96,40 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/05/2016		27/05/2019		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			83,98 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
1.383.695.299		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

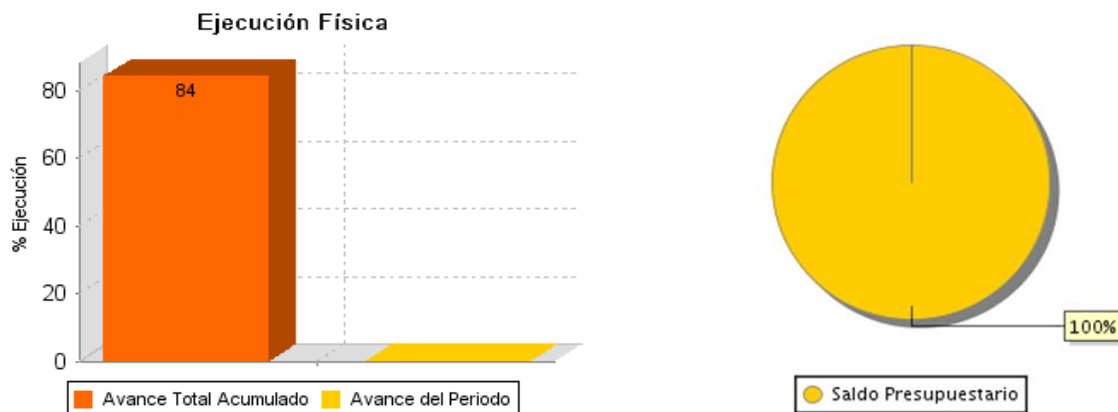


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que no se ejecutó en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal debido a que el plazo del programa se extendió según Resolución CAFFEI N° 16/2022 hasta el 31-12-2025 a efectos de culminar el sistema informático, el cual fue adjudicado a la empresa CIBYRA CONSULTING, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2022. El pago está previsto para el tercer cuatrimestre contra entrega de producto.

Así también, se prevé a partir segundo cuatrimestre del presente año la contratación de profesional especialista informático para el control y monitoreo del desarrollo del Sistema de Información, diagnóstico, evaluación, acreditación y seguimiento de la ANEAES. Además se tiene previsto el pago por la auditoría del programa del ejercicio 2023, contra entrega de producto.

Proyecto	Fomento y apoyo operativo para la ejecución de proyectos del MEC			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	709			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	58.994.841.017
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
45.983.749.372		13.011.091.645		77,95 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/01/2017		30/06/2019		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,27 %			80,38 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
10.016.360.000		2.003.651.265		20,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

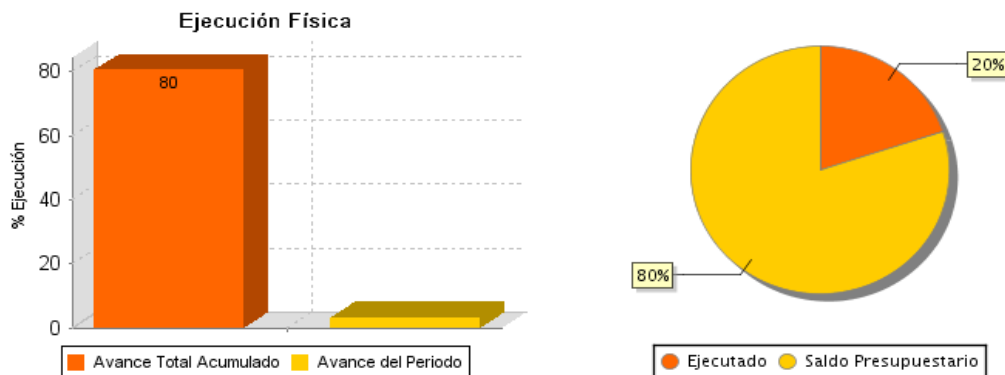

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se realizó el comisionamiento de los funcionarios que conforman esta dependencia para realizar las gestiones administrativas pertinentes (Asesoría Legal y Secretaría). De igual forma, se renovaron los contratos de los personales contratados y se solicitó el comisionamiento de los funcionarios que conforman parte de la Coordinación de Apoyo a la Gestión.

Además, se abonaron los contratos de servicios de mantenimiento de vehículos, limpieza, servicios básicos y combustibles.


Así también, se adjudicó el llamado del ID N° 423.869 "Adquisición de Tóner", además se realizó el pago del alquiler de las oficinas administrativas de la UEPP (edificio Natura -. edificio Presto), correspondiente a los primeros 6 meses de alquiler para el año 2024.

Por otro lado, se gestionó el pago de la patente del parque automotor de la UEPP correspondiente al año 2024.

Se realizó el informe de rendición de cuentas del periodo julio a diciembre 2023.

Proyecto		Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.		
OEE		SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL		
Código SNIP N°		710		
Financiamiento		BID , LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	16.306.294	GS.	91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
42.234.516.919		49.080.729.481		46,25 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/03/2020		27/03/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
5,82 %			62,92 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
21.563.877.401		3.226.686.289		14,96 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

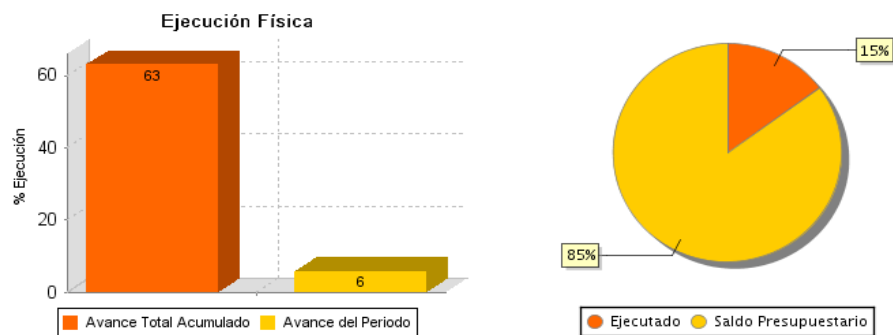

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, la Empresa IDEATI S.A entregó el informe aprobado por la Dirección General de Sanidad, Identidad y Trazabilidad (DIGESIT), que contempla la gestión de información de brotes de enfermedades y eventos de emergencia sanitaria. Además, se realizaron las gestiones administrativas para la firma del Convenio con el INCAE para realizar la consultoría referente al análisis de costo beneficio del levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa y la situación actual del mercado a nivel internacional.

En lo referente a la consultoría para la red de laboratorio nacional y el SENACSA, se recibió el plan de Trabajo, aprobado por la Dirección General de Laboratorios. Así también, la consultoría de la elaboración del plan sanitario apícola para el aumento de la competitividad a nivel nacional e internacional del sector, se desarrolló por un consultor bajo la supervisión técnica de la (DIGESIT) y finalizó la consultoría de la asistencia al plan maestro de TIC con un informe final.

Por otro lado, las obras ejecutadas por el Proyecto tuvieron los siguientes avances:

En la Construcción de la Unidad Zonal del SENACSA en Agua Dulce, los avances fueron relacionados a la culminación del techo, mampostería, muralla perimetral, aljibe, tanque elevado, revoque de paredes internas.


En la Construcción de la Unidad Zonal del SENACSA en Ypejhu, se cuenta con avance de techo culminado, mampostería, muralla perimetral, revoque interior.

En la Construcción de la Coordinación de Región del SENACSA en San Estanislao, los avances son correspondiente a los rubros de mampostería planta baja y planta alta, techos, muralla perimetral, revoque de paredes interiores.

En cuanto a la Implementación del nuevo DATACENTER para el SENACSA, se realizaron las socializaciones y capacitaciones referente a la migración e instrucciones de uso. Se entregó un informe de auditoría externa al proyecto por la empresa consultora AUDICON al ejercicio 2023, el cual cuenta con la No Objeción del BID

Proyecto		Mejoramiento de Investigación Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria.			
OEE		INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA			
Código SNIP N°		786			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	20.000.000	GS.	134.303.639.056
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
22.095.089.519		112.208.549.537			16,45 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/04/2022		24/04/2027			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,23 %			18,45 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
14.610.868.800		1.415.030.746			9,68 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

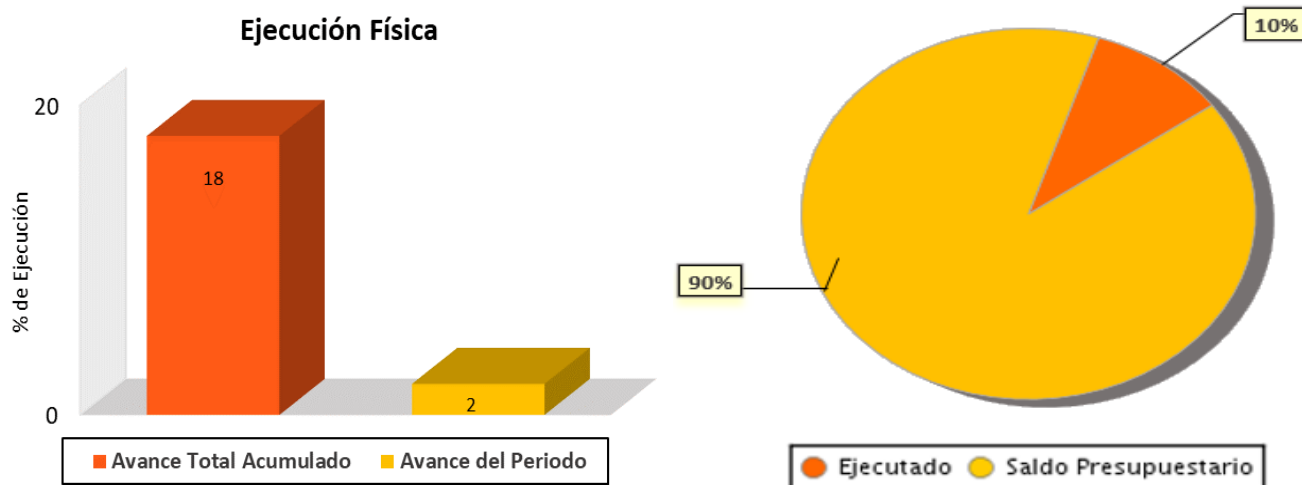


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto		Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Colegios Técnicos		
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°		972		
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 202.172.259.397
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.779.309.390		200.392.950.007		0,88 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/01/2022		31/07/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,11 %			3,25 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
58.455.292.815		904.940.652		1,55 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

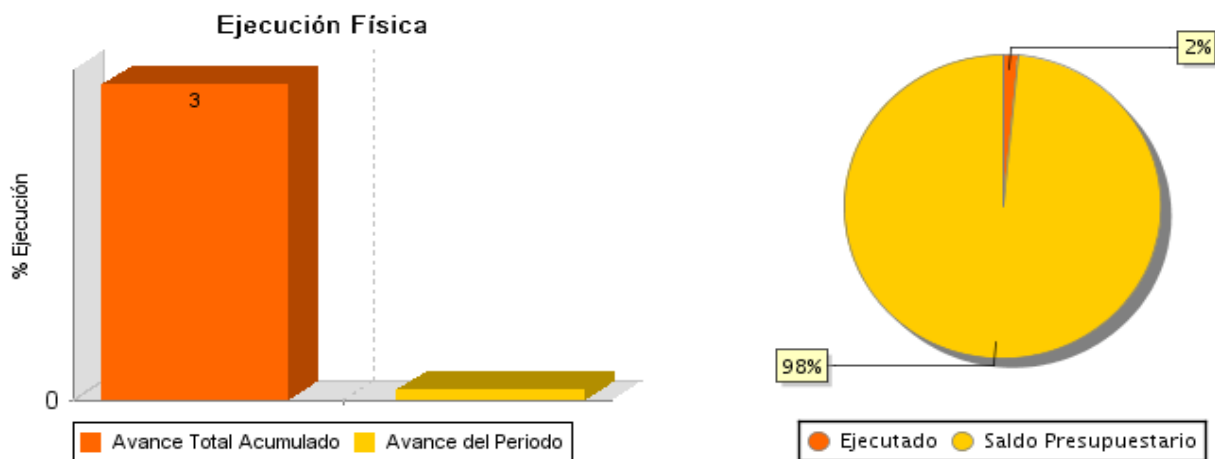


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reportó que en el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se realizó el relevamiento y desarrollo de proyecto ejecutivo en 30 Instituciones Escolares en los distintos Departamentos Geográficos de País.

Proyecto		Capacitación de las competencias profesionales de educadores				
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°		1071				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	175.000.000.000
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
600.000.000			174.400.000.000			0,34 %
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
21/04/2023			21/04/2026			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional		N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,83 %				4,97 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
37.490.000.000			600.000.000			1,60 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

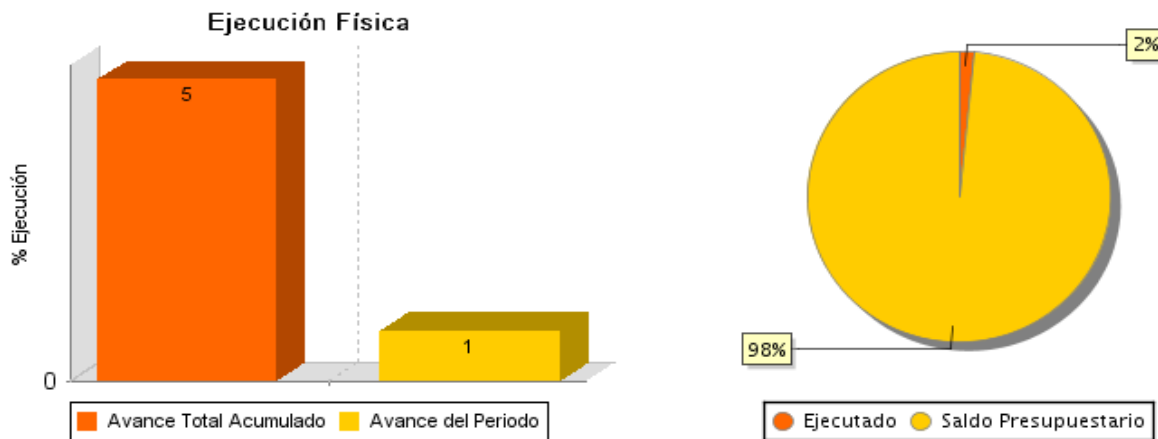

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal la Unidad Ejecutora reportó que se inició el curso de "Capacitación para la formación de docentes en servicio del 1er y 2do ciclo de la Enseñanza Escolar Básica en estrategias de enseñanza de lectura y escritura" para 2.000 coordinadores pedagógicos y 12.000 docentes de instituciones educativas oficiales de todos los departamentos del país y Asunción.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Enero - Abril 2024



Proyecto		Mejoramiento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) e Indígena en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		567			
Financiamiento		FIDA			
Costo del Proyecto		USD	22.468.000	GS.	121.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
40.100.490.544		81.299.509.456		33,03 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018		08/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
11,32 %			54,95 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
49.318.974.713		416.100.660		0,83 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

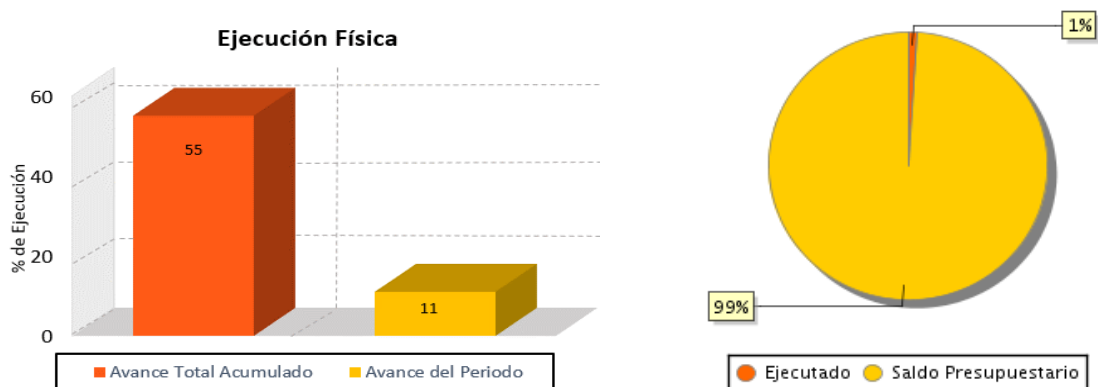

SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre de 2024 se aprobaron 21 Planes de Desarrollos beneficiando a 708 Productores de la Agricultura Familiar Campesina, distribuidos en los siguientes Dptos: Concepción, Caaguazú, San Pedro, Canindeyú.

Asi también, fueron aprobados 12 Planes de Desarrollos, en los Dptos. de Caaguazú, Concepción, San Pedro y Canindeyú para la implementación de actividades comerciales productivas por parte de las Organizaciones Rurales. Por otro lado, se aprobaron 9 Planes de Desarrollos con adaptación al cambio climático en los Dptos de Caaguazú, San Pedro, Canindeyú y Concepción.

Las transferencias de fondos y ejecución, se realizarán en el segundo cuatrimestre del año.

Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	664			
Financiamiento	KFW			
Costo del Proyecto	USD	8.463.250	GS.	52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
5.221.718.224		46.861.121.768		10,03 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
13/09/2017		13/02/2022		31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
5,76 %			29,98 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
11.705.947.396		118.466.327		1,01 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

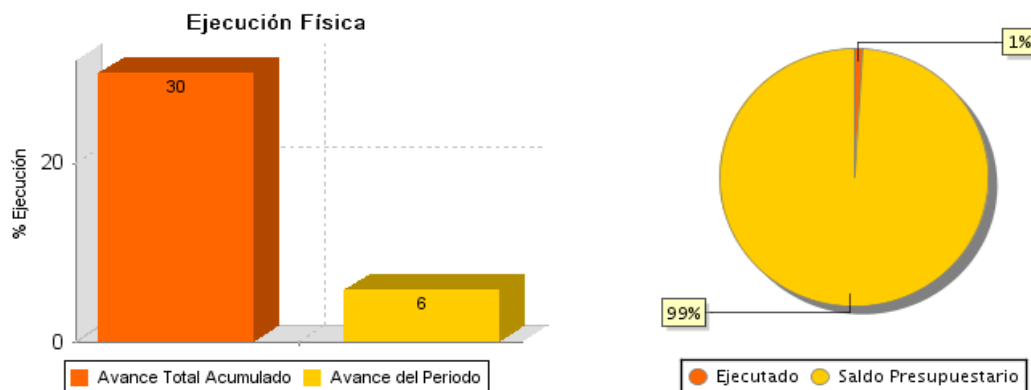

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre de 2024 se realizó la entrega de incentivos financieros para la adquisición de maquinarias, implementos e insumos (tractor, pulverizadora, sembradora, rolo cuchillo, semillas de abono verde, maíz, hervidas, fertilizantes, cal agrícola), para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada, a tres organizaciones de productores a citar:


1)- Comité Santa Elena, con 15 beneficiarios, 2)-Comité Algodonero Santa Maria, con 21 beneficiarios 3)-Asociación de Productores San Francisco, con 15 beneficiarios.

Se realizaron socializaciones con extensionistas y representantes de Organizaciones de Productores sobre los objetivos del proyecto y los criterios de elegibilidad para 7 comités de productores en los Departamentos de San Pedro (4), Caaguazú (2), Paraguari (1).

Asimismo, se realizó la fiscalización de las adquisiciones y posterior rendición de cuentas.

Proyecto		Mejoramiento de Agricultura Familiar Campesina e Indígena			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		708			
Financiamiento		FIDA			
Costo del Proyecto		USD	14.714.000	GS.	82.398.400.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
41.207.335.022		41.191.064.978			50,01 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
31/10/2018		31/10/2023			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,72 %			83,67 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
6.560.325.287		62.561.417			1,12 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

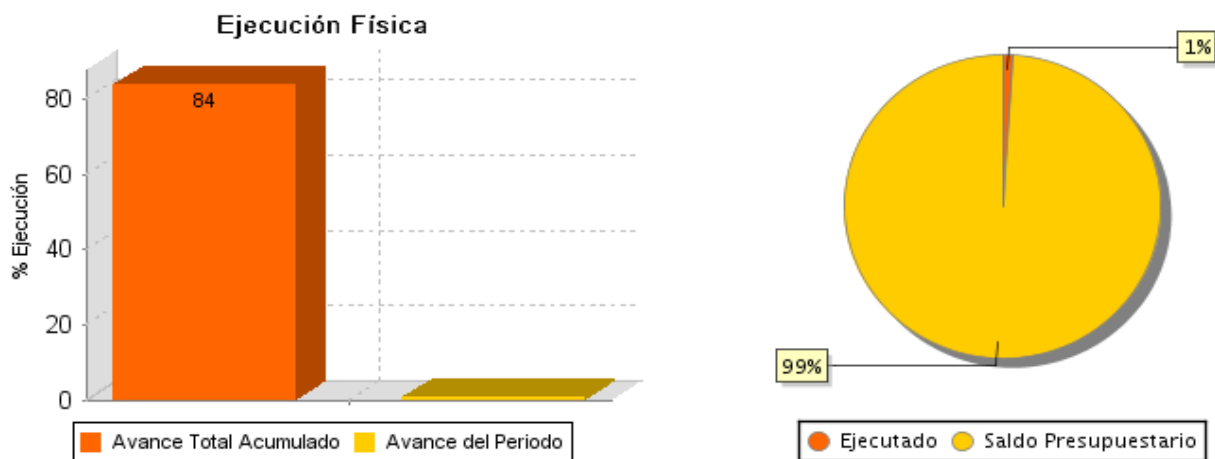


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre de 2024 se elaboraron informes de avances del Plan Operativo Anual, se realizaron pagos de bienes y servicios contratados. La evaluación final del proyecto, se prevé para el siguiente cuatrimestre, en atención a la etapa de cierre del proyecto.

Proyecto		Censo y Encuestas Agropecuarias		
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°		714		
Financiamiento		BID		
Costo del Proyecto		USD	12.315.661	GS. 101.743.839.412
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
70.034.108.732		31.709.730.680		68,83 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/05/2019		25/5/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			80,01 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
20.236.173.116		585.347.750		2,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

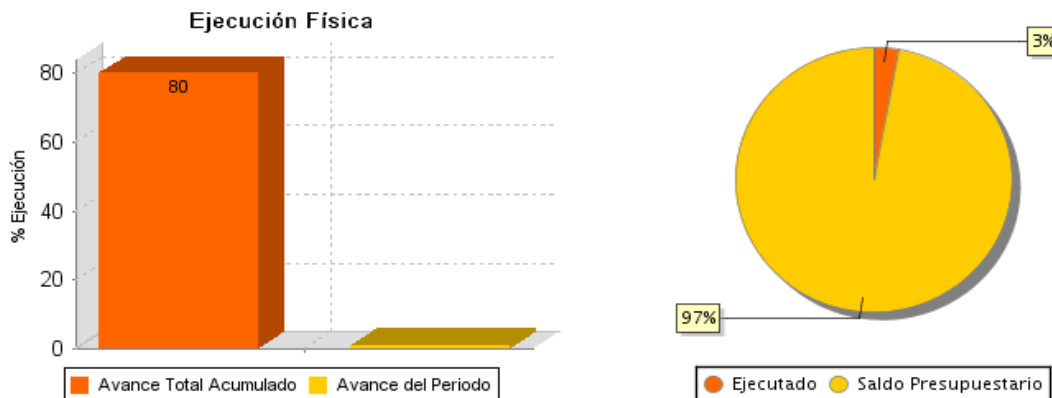

SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre de 2024 se iniciaron los procesos para la contratación de: un especialista en comunicación, una consultoría encargada de llevar adelante los estudios temáticos en base a los resultados del Censo Agropecuario Nacional CAN 2022; y servicios de publicidad y difusión de los resultados de Censo y las encuestas agropecuarias.

Asi también, se realizó la firma del contrato para la consultoría "Soporte técnico gabinete y campo". Por otro lado, se mantiene vigente los trabajos correspondientes a la consultoría "Especialista en Procesamiento de Imágenes Satelitales"

La empresa "Gestión Empresarial", presentó su informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2023, en el marco de la Auditoría Externa del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento de inserción a mercados Región Oriental y Occidental			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	904			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	100.000.000	GS.	635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
319.511.204.730		315.488.795.270		50,32 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/03/2020		30/06/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,61 %			64,28 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
87.487.339.638		8.710.367.761		9,96 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

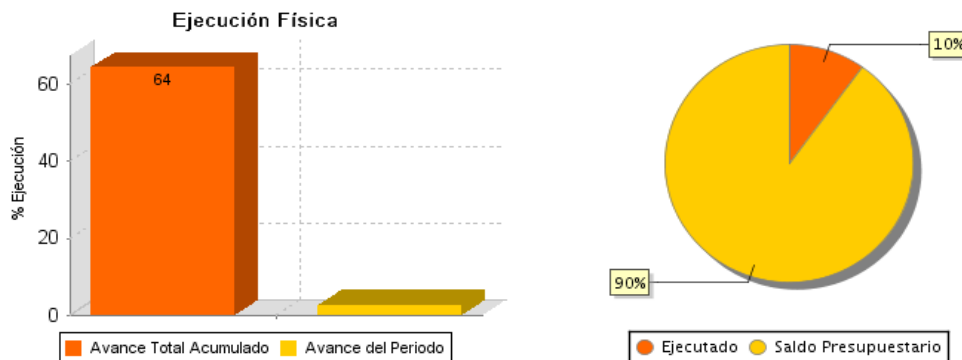


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre de 2024 se financiaron 4 subproyectos de inversión que beneficiaron a 161 productores agrarios organizados en los Departamentos de: Caaguazú, Caazapá, Itapúa y San Pedro destinados a la producción de granos, leche y producción agrícola, Además, se financiaron 4 Planes de Asistencia de Emergencia destinados a la producción de aves, cabras, ovejas y cerdos que beneficiaron a 388 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas en los departamentos de :Boquerón y Presidente Hayes. Asi tambien,se aprobaron 5 Subproyectos de Inversión destinados a la producción de granos, leche, frutihortícola y apoyo para las ferias agropecuarias,correspondientes a los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Concepción.

Fueron capacitados 2.230 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas de los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.Tambien,se realizaron capacitaciones a 669 productores y miembros de comunidades indígenas de los departamentos de Guairá,Caazapá, Misiones, Itapúa, Alto Paraná y Concepción; en temas de buenas prácticas agrícolas,cambio climático, gestión de residuos, conservación de la biodiversidad, uso adecuado de plaguicidas, seguridad alimentaria y sistema alimentario indígena,

Proyecto	Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar			
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°	984			
Financiamiento	COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	13.500.000	GS.	94.500.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
31.087.444.068		63.412.555.932		32,90 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/10/2022		25/10/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			27,39 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
16.500.000.000		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

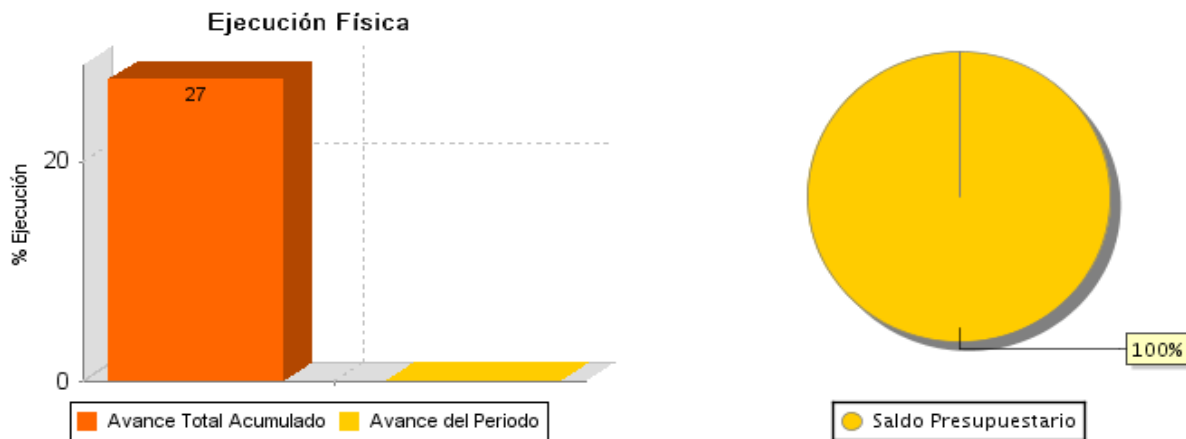

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, no hubo ejecución debido a la falta de presupuesto asignado para la ejecución del proyecto.

Se encuentra en trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas un solicitud de ampliación presupuestaria.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS

Enero - Abril 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Censo Poblacional de Paraguay			
OEE	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA			
Código SNIP N°	869			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	43.000.000	GS.	282.208.601.709
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
229.938.525.027		52.270.076.682		81,48 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A		N/A		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,29 %			97,35 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
32.200.708.462		6.690.011.935		20,78 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

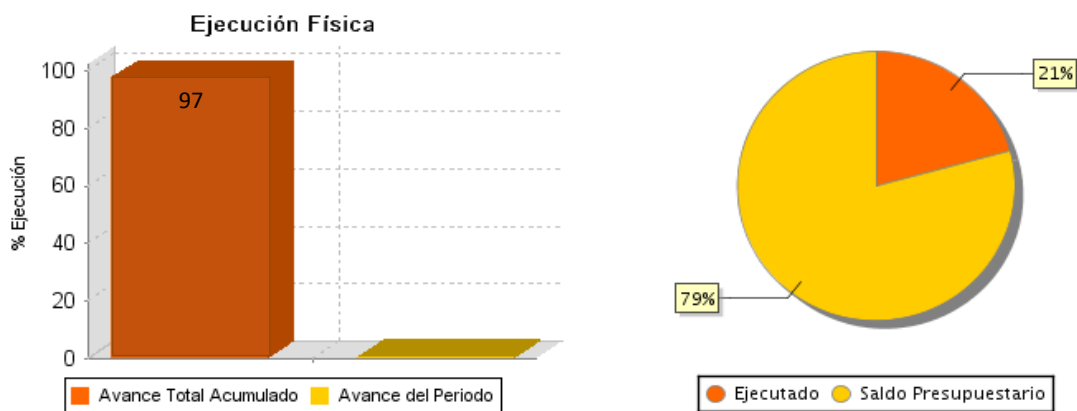

SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer cuatrimestre se realizaron trabajos para la validación de la base de datos del Censo Indígena, validación de la base de datos del Censo Nacional; Codificación de las variables abiertas correspondientes al Censo Indígena y de las variables abiertas Censo Nacional 2022 entre otros.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Enero - Abril 2024



Proyecto	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia			
OEE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA			
Código SNIP N°	155			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	122.000.000	GS.	1.038.323.935.698
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
712.760.001.160		325.563.934.538		68,65 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
11/03/1996		11/03/2016		30/11/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			49,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
101.206.539.759		486.552.000		0,48 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

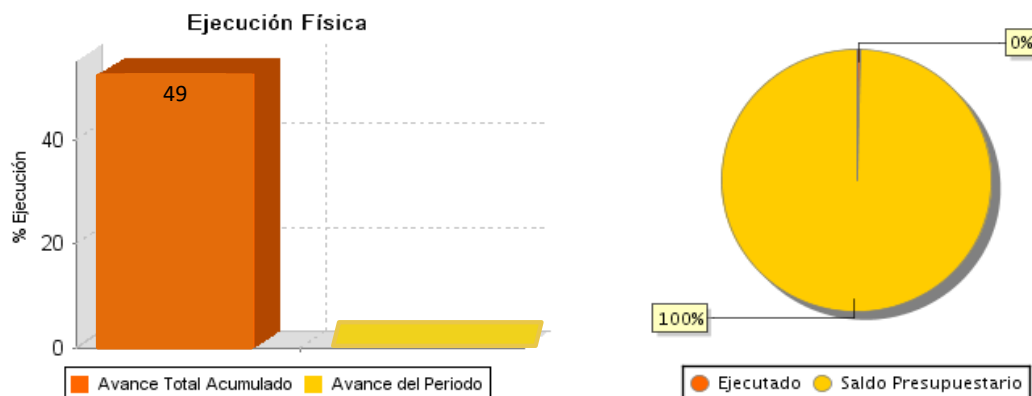

SITUACIÓN ACTUAL

El Proyecto se encuentra en ejecución; la construcción y el mantenimiento del Palacio de Justicia de Ciudad del Este ha terminado. La entidad ha informado que la construcción del Palacio de Saltos del Guairá ha culminado, actualmente en etapa de mantenimiento.

En cuanto a la construcción de Juzgado de 1era Instancia de Capiatá y de Fernando de la Mora, se encuentran ejecutando en éste cuatrimestre 5% y 4,51% respectivamente.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Enero - Abril 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Innovación en Empresas del Paraguay			
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°	568			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	10.000.000	GS.	74.701.408.760
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
57.807.961.774		16.893.446.986		77,39 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/09/2017		21/09/2022		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,41 %			91,17 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
24.662.558.093		6.161.482.619		24,98 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

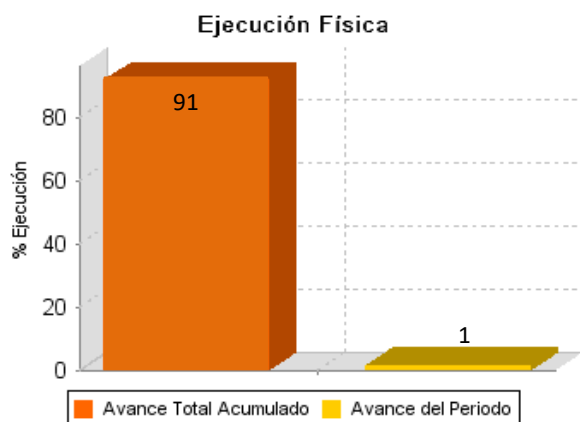


SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer cuatrimestre se realizaron visitas de Monitoreo in situ a proyectos en ejecución, Gestión de contratos para Proyectos individuales de innovación, incorporación de gestores de innovación y Misiones tecnológicas. Se realizó la primera feria de innovación "PARAGUAY INNOVA", el día 14 de marzo.

Proyecto	Transferencia PROCENCIA II			
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°	958			
Financiamiento	Aplicación Fondo para la excelencia de la Educación e Investigación.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	599.274.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
116.315.222.507		482.958.777.493		19,41 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/06/2021		22/06/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4,65 %			31,84 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
142.091.585.000		38.759.700.457		27,28 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

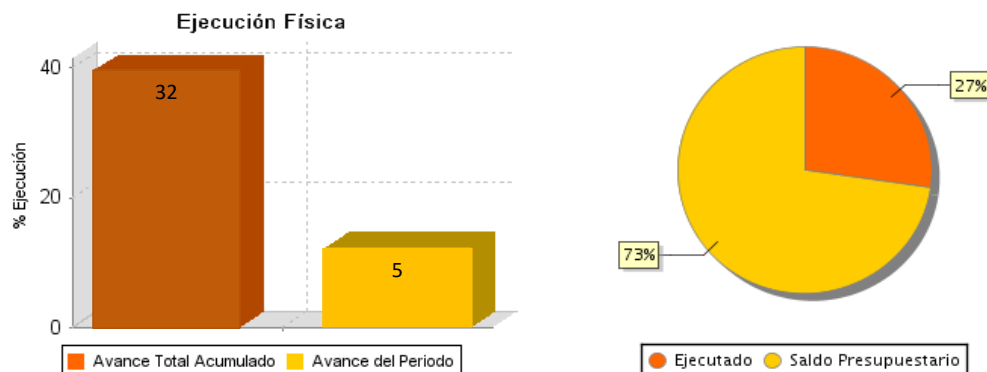

SITUACIÓN ACTUAL

La entidad informó que en el primer semestre se adjudicó el segundo lote de 38 proyectos (9 INIC01 y 29 PINV01), se firmaron contratos para 210 proyectos correspondientes al primer lote, de los cuales 82 ya han recibido su desembolso.

Se cerraron 2 actas de eventos (VEVE02) y se lanzó la convocatoria VEVE03, con 75 postulaciones, 6 preseleccionadas y 3 finalizadas.

Se gestionaron becas para 89 becarios y se realizó el seguimiento de 27 informes técnicos de becas BINV02. Se recibieron 80 postulaciones para la convocatoria BINV03.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Enero - Abril 2024



Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión de 500kv Yacyreta - Villa Hayes			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	159			
Financiamiento	BEI, BID , CAF			
Costo del Proyecto	USD	227.285.710	GS.	1.418.117.767.775
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.213.686.279.683		204.431.488.092		85,58 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/07/2014		31/07/2021		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
17.639.786.527		29.941.793		0,17 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

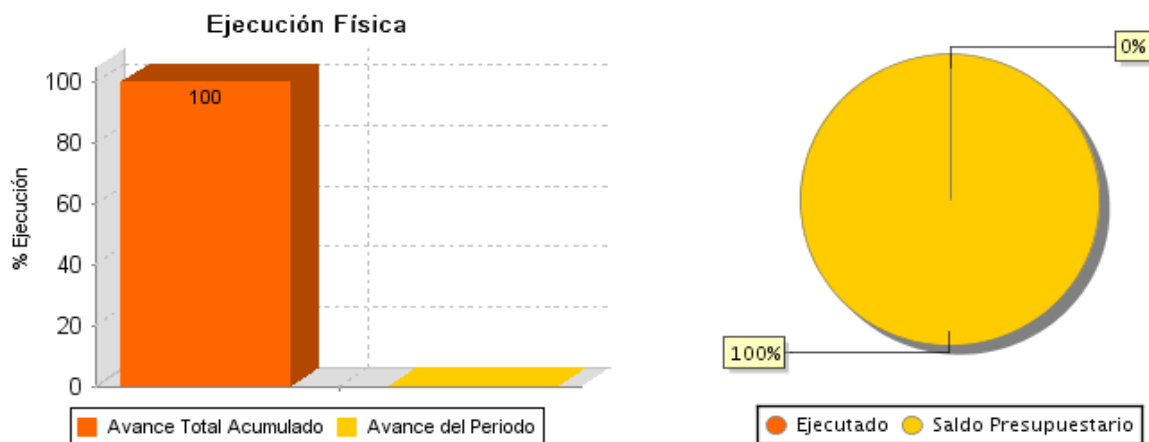


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme al cronograma previsto por las unidades administradoras de los contratos, las obras físicas han sido concluidas en su totalidad, no obstante, quedan pendientes los pagos finales de contratos y adendas, pagos de indemnizaciones de casos judicializados y cierre del proyecto.

Proyecto	Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléctrico de la Ande			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	160			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	5.286.000	GS.	53.708.085.988
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
20.096.303.334		33.611.782.654		37,42 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/07/2014		30/06/2022		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
3.400.000.000		233.923.135		6,88 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

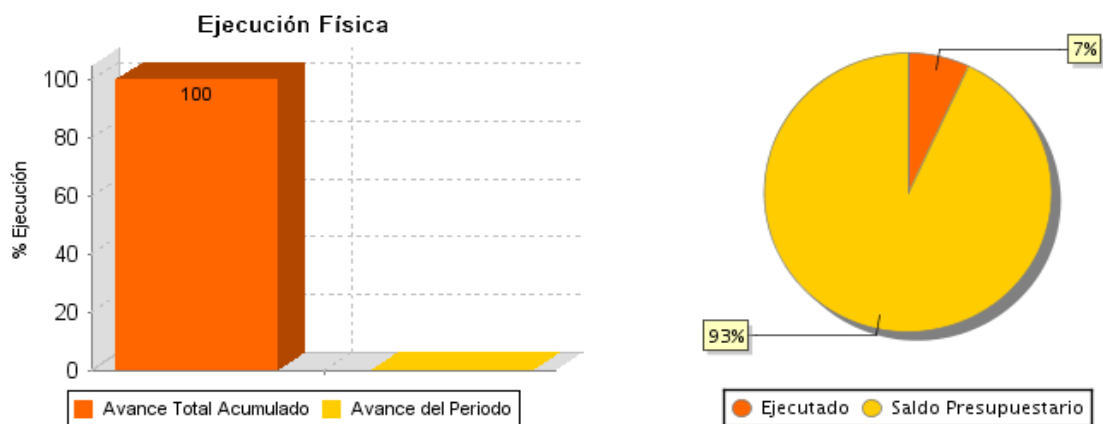


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme al cronograma previsto por las unidades administradoras de los contratos, las obras físicas han sido concluidas en su totalidad, no obstante, se encuentra pendiente la cancelación de estados de cuentas finales y el cierre del proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	275			
Financiamiento	CAF, OFID			
Costo del Proyecto	USD	121.195.993	GS.	811.546.014.559
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
707.023.926.193		104.522.088.366		87,12 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		24/03/2021		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
34.020.000.000		975.022.074		2,87 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

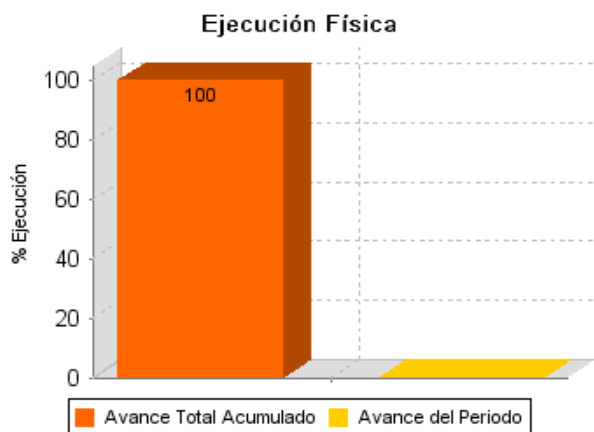


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, las obras se encuentran en etapa de finalización y recepción provisoria. Las Unidades Administradoras de los Contratos se encuentran procesando los cierres de los Contratos y la elaboración de los Estados de Cuentas Finales del Proyecto.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema Eléctrico de la Ciudad de Asunción			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		276			
Financiamiento		BEI, CAF			
Costo del Proyecto		USD	51.279.624	GS.	347.753.380.585
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
301.916.571.515		45.836.809.070		86,82 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
12/12/2018		12/11/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,90 %			96,35 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
30.597.291.867		816.034.859		2,67 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

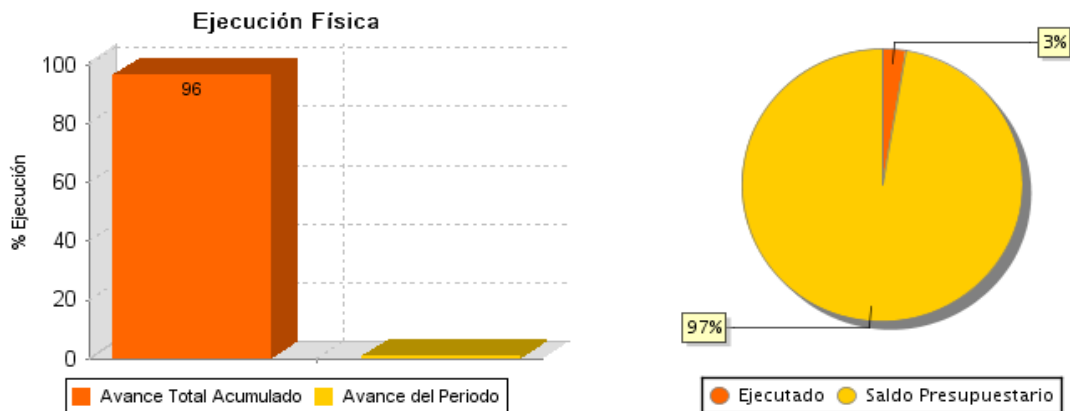


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, en lo referente al Componente 2 “Repotenciación de Líneas de Transmisión Subterráneas de 66 kV General Díaz-Central y Gral. Díaz-Republicano”, la ANDE se encuentra realizando las gestiones para la cancelación del Contrato. En lo concerniente al Componente 3 “Ampliación de la Subestación del Parque Caballero”, cabe señalar que las obras de ampliación de la Subestación, se encuentran muy avanzadas en la etapa final de la ejecución. Por otra parte, cabe señalar que en el marco de LPI 1484/2019 “Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico y la Construcción de la LT 220 KV Villa Hayes, Puerto Botánico”, Lotes 1 y 2, se encuentran en trámite los reajustes de precios en ambos Lotes.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	277			
Financiamiento	BEI, CAF			
Costo del Proyecto	USD	66.239.968	GS.	665.128.214.159
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
465.501.292.848		199.626.921.311		69,99 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
12/12/2018		12/11/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,27 %			96,82 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
60.622.364.850		6.660.022.555		10,99 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

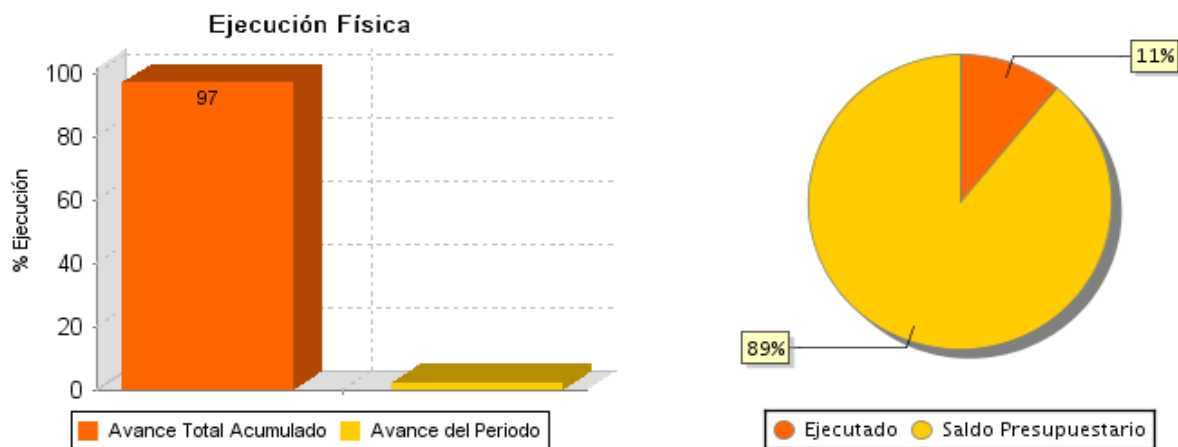


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Departamento Central			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		278			
Financiamiento		CAF, OFID			
Costo del Proyecto		USD	93.467.494	GS.	744.055.872.702
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
545.312.423.262		198.743.449.440			73,29 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/01/2018		31/12/2020			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,15 %			94,55 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
70.963.138.024		6.495.559.682			9,15 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

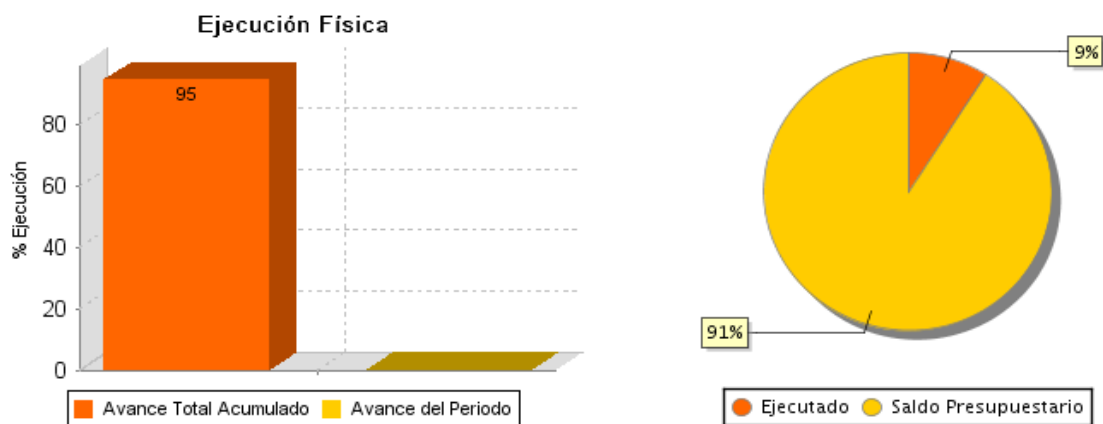


SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances obtenidos en el presente cuatrimestre: En cuanto a la última Actividad en ejecución "Ampliación de la Subestaciones Luque y Capiatá" (LPI 1600/2021- ID 388095), las obras de la Subestación de Luque (adecuación para la instalación de los transformadores de potencia), cuentan con un avance físico del 13%. Sin embargo, el inicio de las obras de ampliación de la ampliación de la Subestación de Capiatá se encuentra supeditada a la aprobación de los planos municipales.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	560			
Financiamiento	BONOS SOBERANOS			
Costo del Proyecto	USD	9.037.096	GS.	47.029.047.584
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
42.038.207.436		4.990.840.148		89,39 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
06/01/2014		06/02/2016		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
4.677.103.254		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

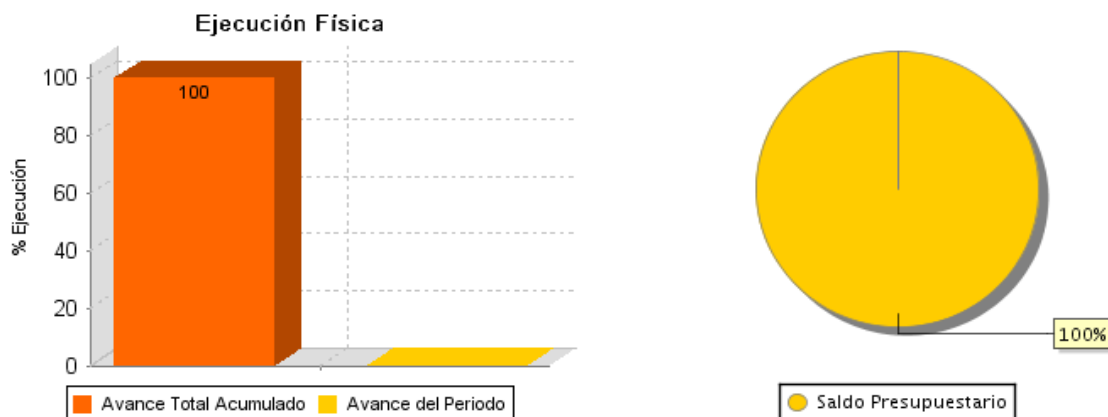


SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que, al inicio del presente año, las obras físicas se encuentran concluidas en su totalidad. En el periodo de referencia, se ha solicitado al MEF la ampliación presupuestaria para dar cobertura al pago de Estados de Cuentas Finales pendientes, a través de la Nota P. 1410/24 - Expediente SIME 31.942/2024 . Una vez que se cuente con los créditos presupuestarios, será procederá a la cancelación de los Estados de Cuentas Finales y el cierre efectivo del proyecto.

Proyecto	Construcción de la Subestación Altos 220 KV en Cordillera			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	561			
Financiamiento	BONOS SOBERANOS			
Costo del Proyecto	USD	7.197.275	GS.	37.065.966.250
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
19.474.894.105		17.591.072.145		52,54 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
06/01/2014		31/10/2016		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Cordillera			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
1.237.103.411		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

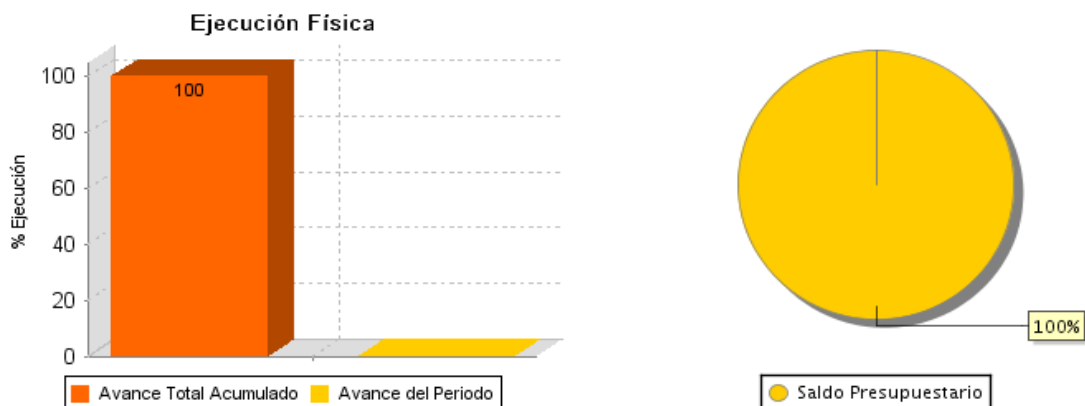


SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que, al inicio del presente año, las obras físicas se encuentran concluidas en su totalidad. En el periodo de referencia, se ha solicitado al MEF la ampliación presupuestaria para dar cobertura al pago de Estados de Cuentas Finales pendientes, a través de las Notas P. 1410/24 - SIME 31.942/2024 y Nota P. 1541/24 - Expediente SIME 37.297/2024. Una vez que se cuente con los créditos presupuestarios, será procederá a la cancelación de los Estados de Cuentas Finales y el cierre efectivo del proyecto.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica. Fase II		
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°		621		
Financiamiento		BEI, CAF		
Costo del Proyecto	USD	152.075.474	GS.	897.171.989.896
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
311.026.855.811		586.145.134.085		34,67 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
12/12/2018		12/12/2021		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,61 %			23,21 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
446.023.479.762		26.309.942.813		5,90 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

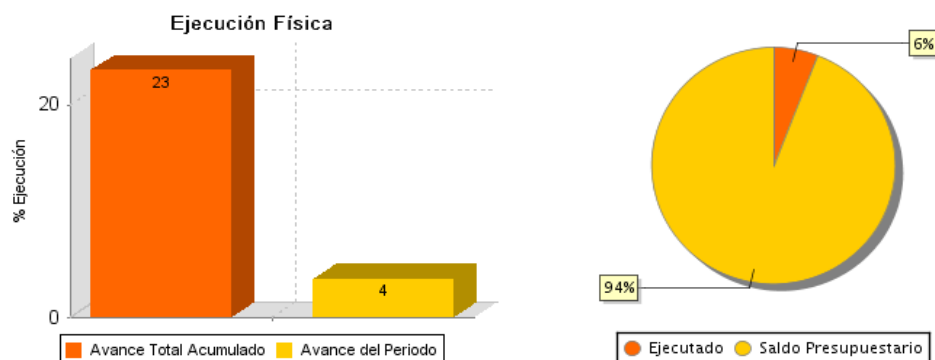


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo, cabe señalar con respecto a los trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del sistema de Distribución del área metropolitana, en distritos del Dpto. Central y Coordillera en media y baja tensión llevado a cabo en el marco de la LPI 1551/2021, que no se han relevado avances en obras, no obstante, se encuentra en proceso la emisión de reajustes de precios, referente a los Lotes 3- Centro de Distribución Itauguá (ITG), y 5- Centros de Distribución Caacupé (CAE) – Ciudad Nueva (CNU). Por otra parte, la LPI 1778/2023 "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana en Distritos del Departamento Central y Asunción, con Provisión Total de Materiales", se encuentra en etapa de Convocatoria Abierta en la DNCP, con fecha de entrega de ofertas establecida al 25-06-2024.

Proyecto	Reposición de Compensador Estátivos de Reactivos Subestación San Lorenzo			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	706			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	18.000.000	GS.	147.493.037.151
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
118.726.107.908		28.766.929.243		80,50 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
12/12/2018		13/02/2021		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			99,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.028.335.652		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

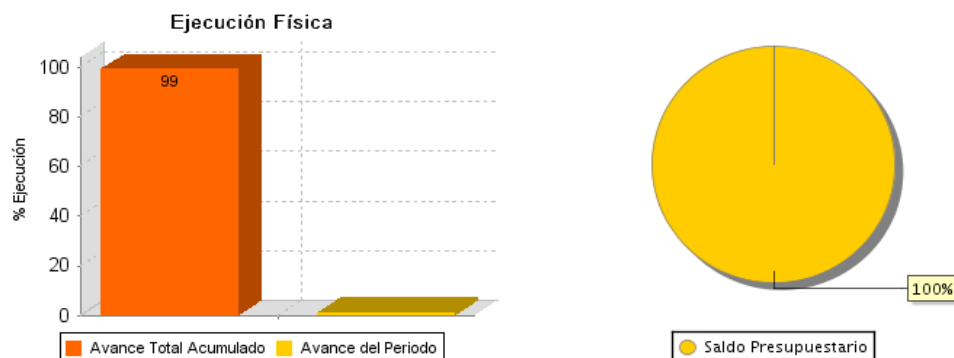


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto se encuentra en la etapa de finalización. La última actividad en ejecución consiste en la construcción e instalación de sistema de compensación reactiva basado en STATCOM de 220 kV en la Subestación San Lorenzo (LPI 1487/2019), está en etapa de pruebas finales y ajustes y correcciones de los equipos instalados. La Unidad Administradora de Contrato se encuentra gestionando el Convenio Modificatorio N° 2.

Proyecto		Construcción de la Subestación Valenzuela 500 KV en Valenzuela			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		712			
Financiamiento		FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	89.567.653	GS.	661.943.968.863
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
525.475.491.877		136.468.476.986			79,38 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
02/01/2020		02/01/2023			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,76 %			52,45 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
257.197.528.542		28.737.089.792			11,17 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

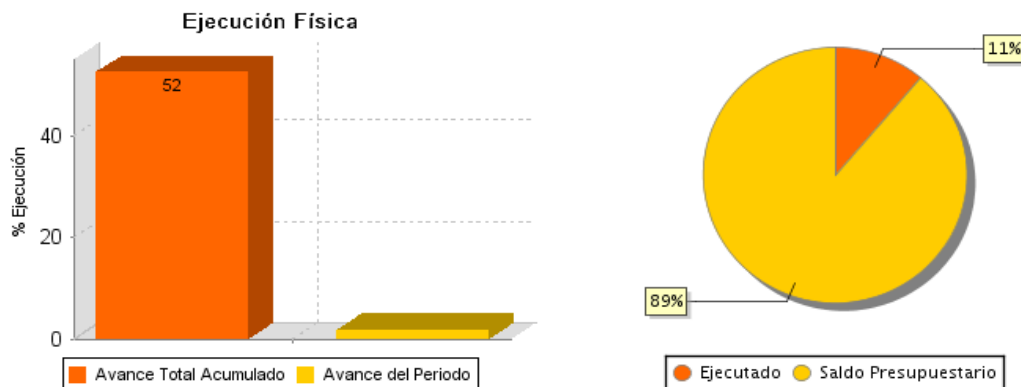


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto	Construcción de la Subestación Iguazú en 500 KV			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	717			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	134.061.629	GS.	1.082.355.319.250
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
886.809.568.630		195.545.750.620		81,93 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
19/07/2019		24/07/2023		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Guairá, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,88 %			96,38 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
37.818.347.870		6.390.350.968		16,90 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

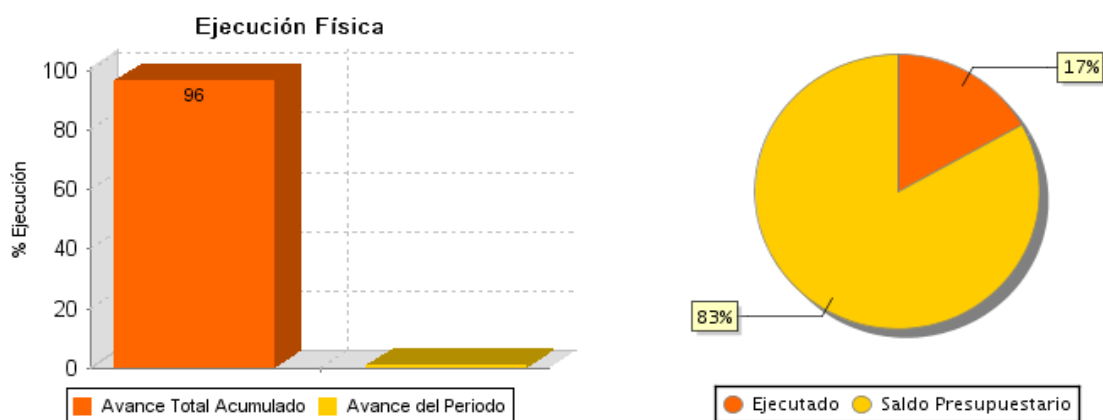


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	769			
Financiamiento	BONOS SOBERANOS			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	886.203.853.894
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
684.880.742.090		201.323.111.804		77,28 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/01/2018		02/01/2022		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			95,45 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
14.996.949.004		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

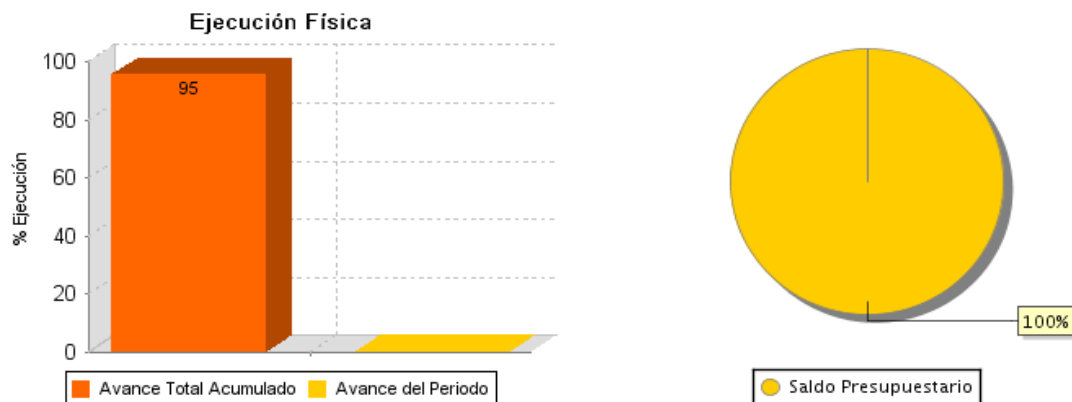


SITUACIÓN ACTUAL

Cabe señalar que, al inicio del presente año, las obras físicas se encuentran concluidas en su totalidad. En el periodo de referencia, se ha solicitado al MEF la ampliación presupuestaria a través de la Nota P. 1410/24 - Expediente SIME 31.942, para dar cobertura al pago de los compromisos pendientes. Una vez que se cuente con los créditos presupuestarios, será procederá a la cancelación de los Estados de Cuentas Finales y el cierre efectivo del proyecto.

Proyecto		Construcción de la Subestación Maria Auxiliadora y Línea de Transmisión de 220 kV Santa Rita - Maria Auxiliadora			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		776			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	41.754.450	GS.	242.175.803.142
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
165.787.574.978		76.388.228.164		68,46 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
19/07/2019		24/07/2023		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Itapúa				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,80 %			64,92 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
42.289.495.412		2.388.859.236		5,65 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

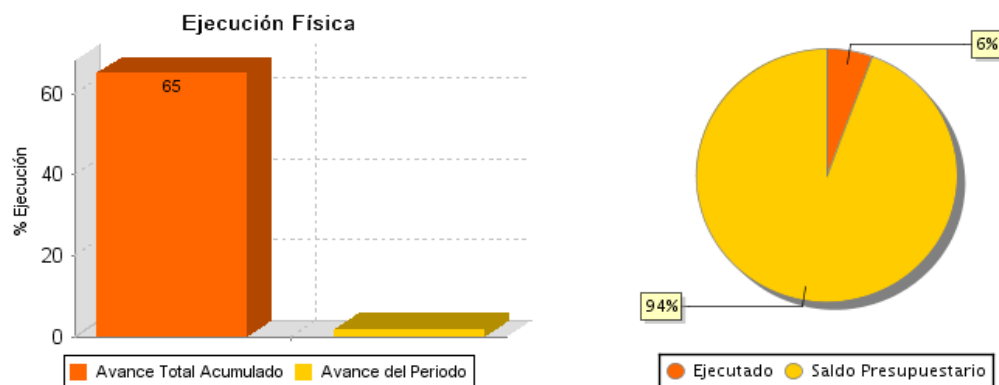


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, los trabajos principales de obras civiles y obras electromecánicas en las Subestaciones de María Auxiliadora y Santa Rita, se encuentran concluidas. Se han concluido los trabajos de campo para el relevamiento planialtimétrico de la traza de la Línea de Transmisión de 220 kV. Las torres B y C se encuentran aprobadas por Ingeniería y se han realizado las pruebas en fábricas. Se cuentan con los permisos municipales y se ha obtenido la licencia ambiental requeridos para el inicio de los trabajos. Se encuentra en gestión la orden de inicio para las obras de construcción de la Línea de Transmisión.

Proyecto	Mejoramiento de 5.000 Km. de Líneas de Baja Tensión y Media Tensión de Autoayuda			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	777			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	37.769.686	GS.	219.064.177.460
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
83.456.494.838		135.607.682.622		38,10 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
19/07/2019		24/07/2023		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4,60 %			52,40 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
83.314.750.005		7.357.397.835		8,83 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

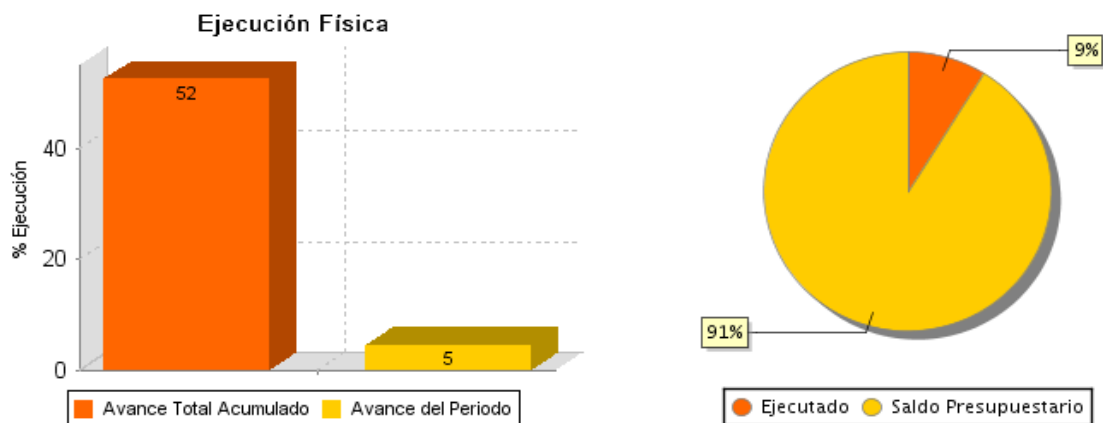


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo, se reportan avances en la ejecución de las Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en media y baja tensión (LPI 1526/2020), se encuentra con un avance en kilómetros de 1.843, los cuales representan el 36,69% del total de kilómetros a ser intervenidos. La fiscalización de obras de mejoramiento de las Líneas de Autoayuda, se encuentra en plena ejecución.

Proyecto	Mejoramiento Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray en Alto Paraná			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	794			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	145.200.000	GS.	1.008.319.620.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
42.213.896.253		966.105.723.747		4,19 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/01/2020		07/01/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,23 %			5,60 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
252.809.738.224		549.507.600		0,22 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

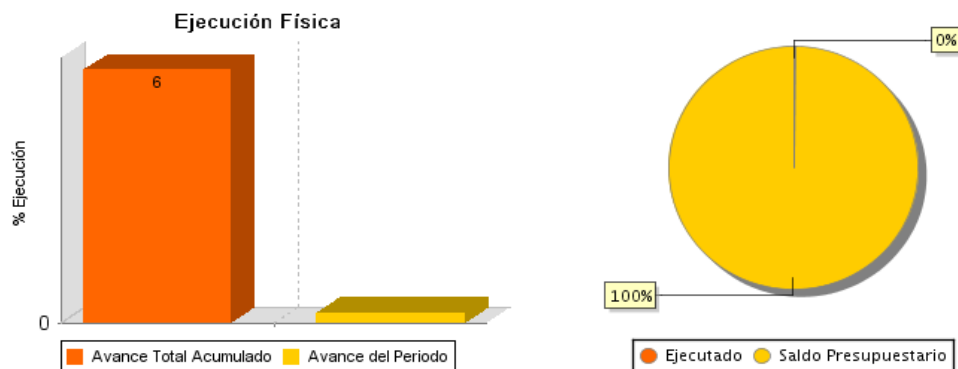


SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el cuatrimestre: - La Consultoría SP ANDE - BID N° 3-2022 "Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Coordinación General, Supervisión e Inspección de las Intervenciones del Programa de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray - Yguazú" adjudicado al Consorcio AFRY y Asociados, conformado por las siguientes entidades: AFRY SWITZERLAND LTD. (SUIZA) - LATINOCONSULT S.A. (ARGENTINA), ha entregado su Primer Informe, que presenta las Alternativas de Solución.

- En cuanto a la "Adquisición de Equipos y Herramientas Especiales LPI 1594/2021", se encuentra en procesos de despacho de los suministros del exterior.
- En cuanto a la Recapitación y Modernización de la Subestación Acaray, el pliego de bases y condiciones se encuentra en análisis por ente financiador (BID) para la No Objeción para dar inicio del llamado.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución - Fase III RO y PH (Región Oriental yPresidente Hayes)				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	844				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	126.052.910		GS.	875.355.525.559
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
192.122.999.831		683.232.525.728		21,95 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022		01/05/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
8,98 %			28,31 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
118.848.107.383		96.000.000		0,08 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

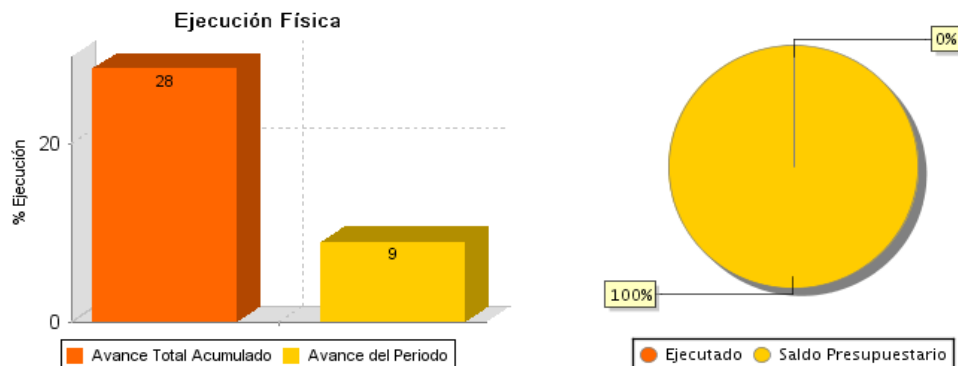


SITUACIÓN ACTUAL

La Licitación Pública Internacional ANDE – CAF N° 1749/2023, para ejecución de "Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - FASE III", adjudicada a: Lote 1- CONSORCIO LÍNEAS PROTEGIDAS (CDD CONSTRUCCIONES S.A. –DELPAR INGENIERÍA DE PABLO RAMÓN DELGADO SALINAS –DECO S.R.L. – TECMAG INGENIERÍA DE DARÍO RAMÓN BRUN VERA – ROTEL INGENIERÍA S.R.L.); Lote 2- CONSORCIO ISS (INGELCO S.R.L. – SANTA ISABEL DE NORMA ISABEL GIRETTOVELAR – SERVICIOS ELÉCTRICOS Y METALÚRGICOS S.A. (SEMESA); Lote 3- CONSORCIO ELÉCTRICO DEL ESTE (L.T. S.A. – ABUNDIO LÓPEZ IBARRA); Lote 4- CONSORCIO ELÉCTRICO CCS (CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS S.A. –SINGEL S.A. – CONCRET - MIX S.A.); Lote 5- CONSORCIO DEL ESTE (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS S.A. (ESTESA S.A.) – SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGÜELLO), cuentan con el 100% de apertura de Cartas de Créditos, se encuentran pendiente de la adjudicación de la Fiscalización para dar inicio a las obras.

Proyecto	Equipamiento Adquisición de Subestaciones Móviles de 220/23 KV y 66/23 KV			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	848			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	20.086.365	GS.	146.495.684.991
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
101.579.542.113		44.916.142.878		69,34 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/05/2022		01/05/2024		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			14,21 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
151.746.313.462		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

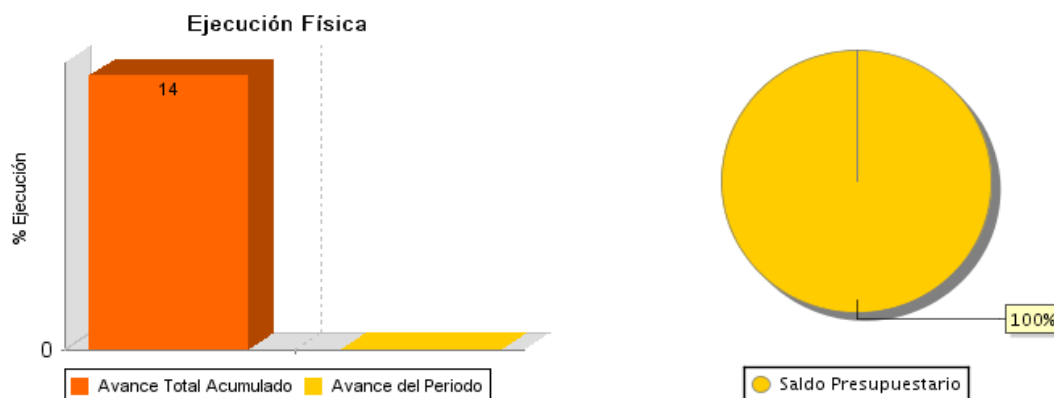


SITUACIÓN ACTUAL

La Entidad ha reportado que en el periodo de referencia, no se han obtenido avances físicos en el marco de ejecución del Proyecto. Cabe señalar igualmente que en el ejercicio 2023 se ha finiquitado un proceso licitatorio para la adquisición de Subestaciones Móviles (LPI N° 1687/2022), el cual, posteriormente, fue declarado desierto considerando la Resolución DNCP N° 819/23, habiéndose realizado el reintegro de los recursos aplicados para la Apertura de las Cartas de Crédito Internacionales a la Cuenta Operativa del Proyecto.

Proyecto	Mejoramiento Gestión del Sistema Eléctrico de Distribución-SGIDE			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	886			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	100.227.735	GS.	702.960.821.547
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
244.313.451.089		458.647.370.458		34,75 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/05/2022		01/05/2027		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,48 %			22,11 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
339.416.351.662		11.224.527.445		3,31 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

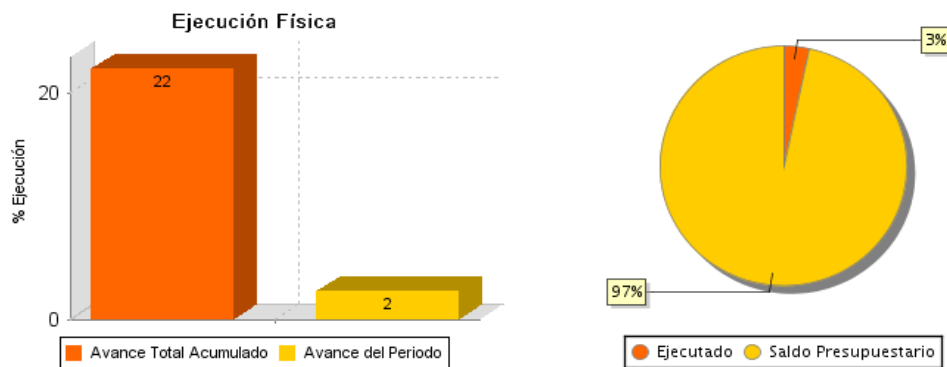


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reportan los siguientes avances:

- Ajuste el Pliego de Bases y Condiciones para la Construcción de un edificio para Centro de Operación Nacional de Distribución y Data Center y la adecuación edilicia de los centros de operación regional de distribución.
- Se encuentra en ejecución los Servicios de comunicación y de conectividad 3G/LTE para equipos telecomandados de distribución, bajo la modalidad de Contrato Abierto - LPN 1786/2023
- Se encuentra en ejecución la Adquisición, Instalación e Integración de Llaves Telecomandadas para Distribución - LPI 1706/2022
- Se encuentra en ejecución los Servicios técnicos y profesionales de la asistencia técnica a la unidad SGIDE. (ECATEF) - LPN 1701/2022
- Se encuentra en ejecución los Servicios de Consultoría para Asistencia Técnica Especializada (ATE) de apoyo en la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica – SGIDE - LPI 1690/2022
- Se encuentra en proceso el Desarrollo y puesta en servicio del sistema de información geográfica (GIS Smallworld Electric Office) - LPI 1723/22

Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión de 500 KV Yguazú - Valenzuela			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	897			
Financiamiento	BID , JICA			
Costo del Proyecto	USD	157.780.124	GS.	978.236.768.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
160.624.397.073		817.612.371.727		16,42 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
15/09/2023		15/09/2029		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			8,71 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
364.503.591.068		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

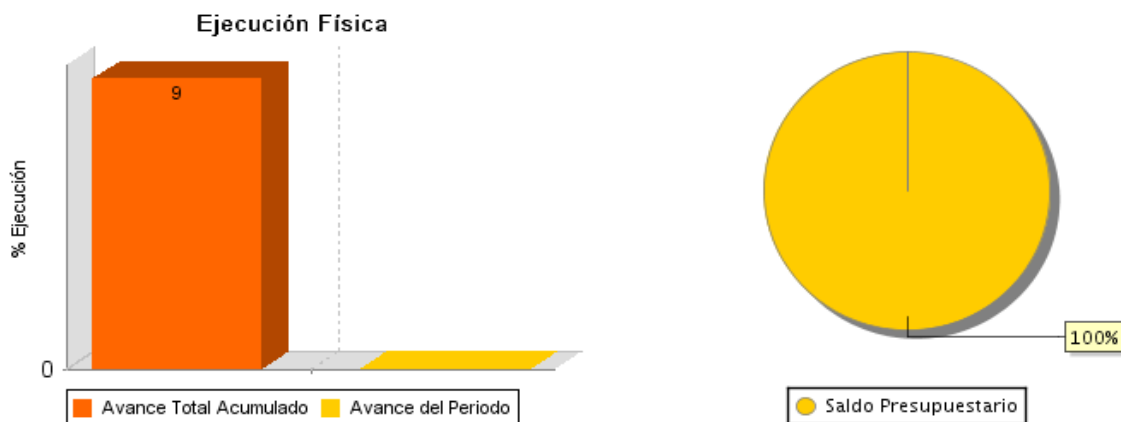


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto fue aprobado por la Ley de la Nación N° 7147 de fecha 15 de Setiembre de 2023. En diciembre de 2023 arrancó la ejecución física y financiera del proyecto con la Apertura de Cartas de Crédito correspondientes a la LPI ANDE-BID-JICA N° 1684/2022. En el primer cuatrimestre del presente año se solicitó la ampliación presupuestaria al MEF a través de la Nota P. 1163/2024, en fecha 04/04/2024, mediante el Expediente SIME N° 29204-2024, el cual se encuentra en proceso de aprobación a fin de avanzar en la ejecución del proyecto.

Proyecto		Mejoramiento de la Eficiencia Energética de la Red de Alumbrado			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		900			
Financiamiento		BID , JICA			
Costo del Proyecto		USD	15.232.700	GS.	97.215.091.464
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		97.215.091.464			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
15/09/2023		15/09/2027			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			0,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024			Porcentaje Ejecutado
50.570.382.947		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

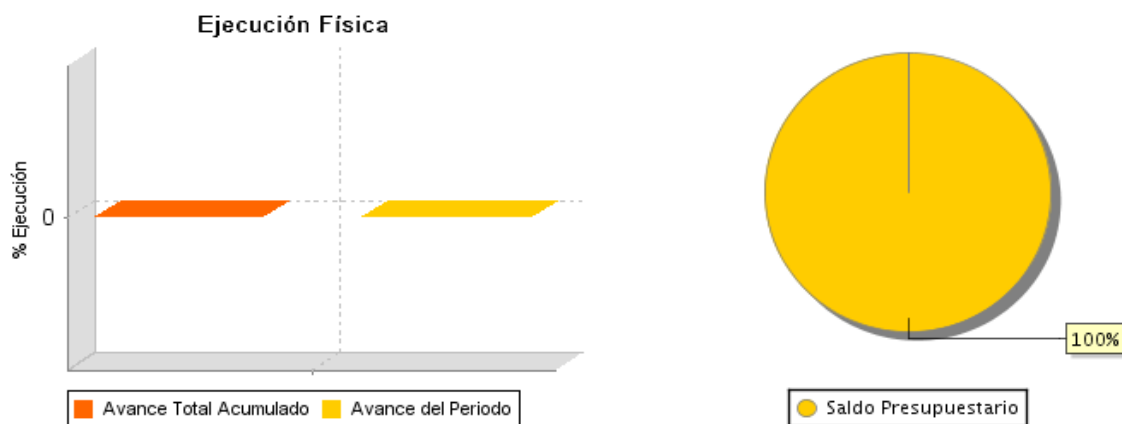


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto fue aprobado por la Ley de la Nación N° 7147 de fecha 15 de Setiembre de 2023. En el primer cuatrimestre del presente año se solicitó la ampliación presupuestaria al MEF a través de la Nota P. 1163/2024, en fecha 04/04/2024, mediante el Expediente SIME N° 29204-2024, el cual se encuentra en proceso de aprobación a fin de iniciar la ejecución del proyecto.

Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión De 220 Kv Villa Hayes/ Villa Real/ Pozo Colorado/ Loma Plata y Subestación Pozo Colorado			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	961			
Financiamiento	FONPLATA, KFW			
Costo del Proyecto	USD	126.126.140	GS.	882.882.780.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		882.882.780.000		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
1/4/2024		31/12/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Boquerón, Concepción, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
6,81 %			6,81 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2024		Porcentaje Ejecutado
601.400.043.409		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

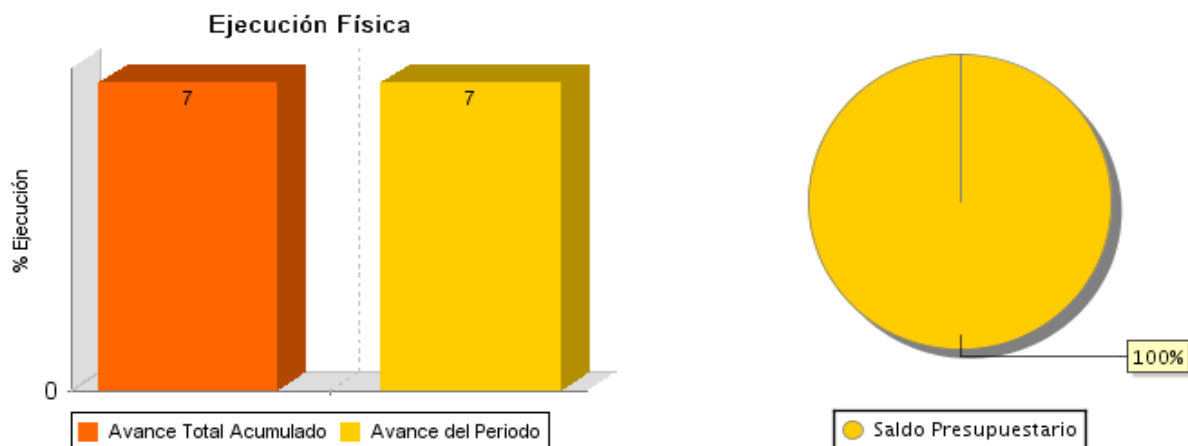

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.
