



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

Mayo - Agosto 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto		Mejoramiento de Investogación, innovación y Transferencia de Tecnología Agraria			
OEE		INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA			
Código SNIP N°		786			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	20.000.000	GS.	134.303.639.056
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
24.365.945.459		109.937.693.597		18,14 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2022		24/04/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,82 %			21,03 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
14.610.868.800		3.685.886.686		25,23 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

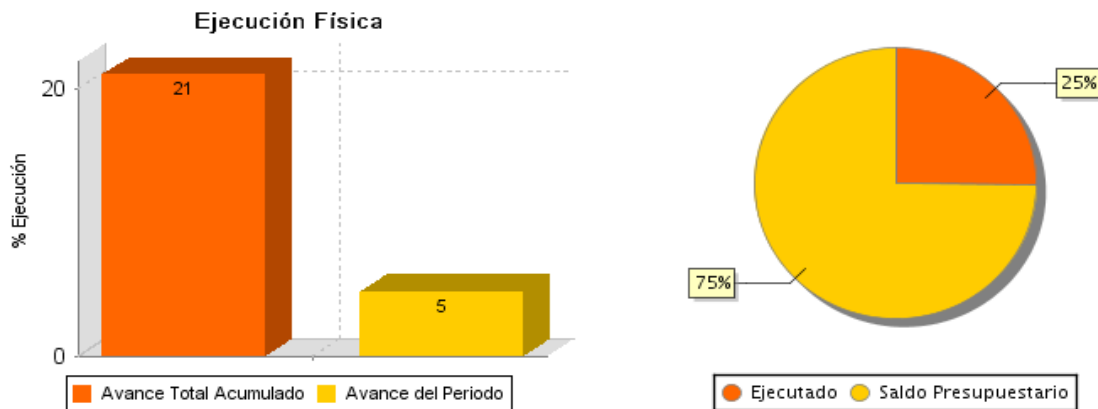

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el presente cuatrimestre se financió el pago de honorarios a consultores especializados en mejoramiento genético en soja y en trigo. Así también al personal de apoyo de campo en la línea prioritaria de los sistemas de producción de cría vacuna, cultivos de soja, trigo, arroz, en cultivos hortícolas, cultivos de la agricultura familiar.

Además, se realizó el pago de honorarios al consultor especializado en producción animal. Se gestionó el pago del plan de trabajo a la consultoría para el Plan Maestro de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), en virtud al servicio de relevamiento, diagnóstico y elaboración de los Diseños de Obras para los Centros de Investigación.

Se realizó el pago por el servicio de auditoría externa anual correspondiente al ejercicio 2023.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

Mayo - Agosto 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.				
OEE	SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL				
Código SNIP N°	710				
Financiamiento	BID , LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	16.306.294		GS.	91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
48.775.342.841		42.539.903.559		53,41 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020		27/03/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
10,20 %			67,30 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
21.563.877.401		9.767.512.211		45,30 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

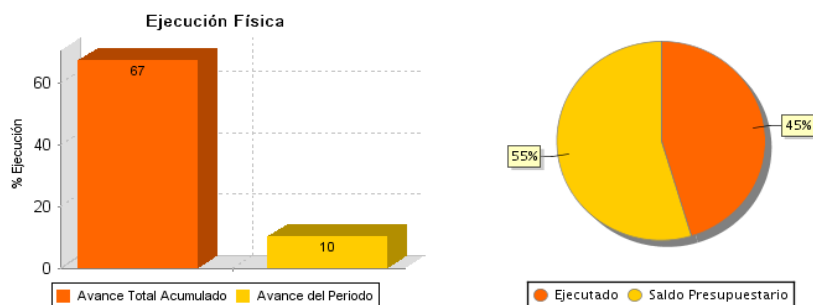

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reportó que en el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal se elaboraron las especificaciones técnicas para la compra de tablets rutgerizadas en todo el territorio nacional para las unidades zonales del SENACSA. El objetivo del mismo es equipar en tecnología para el uso del Sistema de Sanidad Animal (SISA).

En lo referente al fortalecimiento del laboratorio del SENACSA la empresa consorcio Grupo mas-VTG entregó el segundo informe de soporte técnico, así como el consultor contratado para la formación de la Red de Laboratorios entregó el segundo informe de avance.

Por otra parte, se avanzaron con las obras de construcción de las coordinaciones de las siguientes Regiones: en Pozo Colorado (terminación de pisos, mantenimiento de techos, paredes, terminación de aljibe, tanque elevado, muralla perimetral, entre otros), en San Estanislao (mampostería planta baja y planta alta, techos, muralla perimetral, revoque de paredes interiores, terminaciones, pinturas, instalaciones eléctricas, pluviales), en Agua Dulce, (culminación del techo, mampostería, muralla perimetral, aljibe, tanque elevado, revoque de paredes internas, mampostería externa, pintura, terminaciones, instalaciones eléctricas), e Ypíehu (techo culminado, mampostería, muralla perimetral, revoque interior, pinturas, exteriores, instalaciones eléctricas).

Así mismo, la empresa New technology Solutions que desarrolla el Sistema de Identificación Animal del Paraguay entregó el informe de Avance, el cual se encuentra aprobado por el área técnica. Además, la consultoría de corte canal o Dressing realizó la entrega del segundo informe y la misma se encuentra aprobado por el área técnica.

Así también, la consultoría del Plan sanitario sector apícola realizó la entrega del informe final para aumentar la competitividad a nivel nacional e internacional y se elaboraron los términos de referencia para la consultoría de reformulación del plan sanitario para rabia en animales susceptibles. De igual manera se encuentra en evaluación para la consultoría de reformulación de la Dirección de cuarentena conforme a estándares internacionales y se presentaron los avances de la consultoría para el levantamiento de la vacunación contra la fiebre aftosa y sus efectos.

Además, se iniciaron los trámites para la compra de bastones identificadores electrónicos para el Sistema de Trazabilidad y la compra de licencias Oracle.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Mayo - Agosto 2024



Proyecto	Sp Programa Nacional Caminos Rurales 2° Etapa Fase II BID 2163/Oc-2164/BI-OFID			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	36			
Financiamiento	BID, JICA , LOCAL, OFID			
Costo del Proyecto	USD	170.000.000	GS.	925.666.587.755
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
838.026.670.770		87.639.916.985		90,53 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2011		04/01/2016		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,91 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.856.245.387		364.816.640		12,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

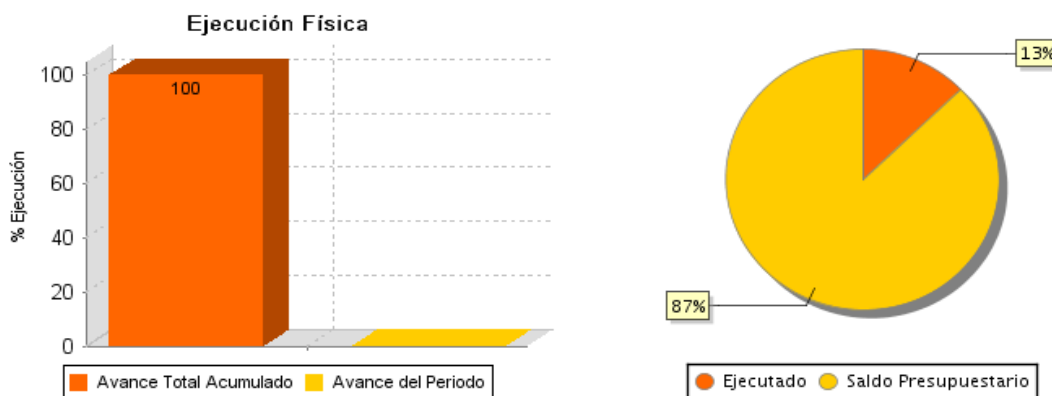


SITUACIÓN ACTUAL

Para este segundo periodo se informa que las obras en su totalidad ya fueron terminadas de los cuales los porcentajes pendientes en ejecución, corresponden a los pagos pendientes de Devoluciones de Retenciones, reajustes e interés moratorios de los llamados 09/2014 "Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción", llamado 62/2014 "Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento en Concepción", llamado 81/2012 "Construcción de Puentes de HºAº en los Departamentos de Guairá, Misiones y Paraguairí", llamado 199/2015 "Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los de Departamentos de Guairá y Misiones".

Para el llamado 93/2012 "Consultoría para la implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales" y "Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguairí, Guairá y Misiones" se encuentra pendiente el pago de intereses moratorios. Al respecto se informa también que se encuentran en proceso la obtención de los Códigos de Contratación ante las instancias del MOPC. Por tanto, una vez terminado el proceso de la obtención del mismo se procederá a honrar todos los certificados de acuerdo a la disponibilidad Presupuestaria de este Proyecto.

Proyecto	SP Proyecto Acueducto			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	80			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	506.204.353.201
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
435.491.513.810		70.712.839.391		86,03 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/10/2012		26/01/2015		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,78 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.582.306.393		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

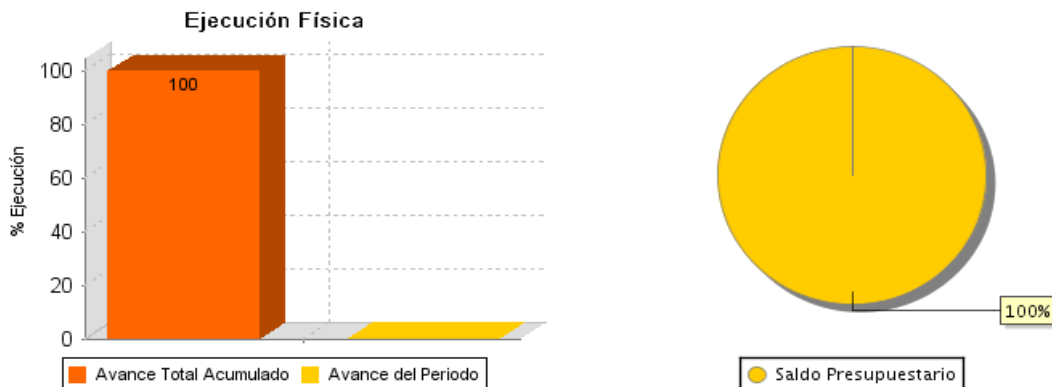


SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre prosiguen las tareas administrativas pendientes a los diferentes procesos de traspaso y convenios con el ente prestador ESSAP S.A., Por otra parte, siguen en trámite las rescisiones con los consorcios PS y ABH S.A. – Taivo S.A. – Constructa S.A., que uno de ellos se encuentra en etapa de liquidación final, las gestiones son impulsadas por la PGR.

Para los trabajos de Obras Complementarias, Montajes del Sistema de Automatización y Operación del Acueducto Principal tramo Puerto Casado – Loma Plata, en los componentes C y D (Parte C: Sistema de comunicación y monitoreo de la aductora del Acueducto principal y Parte D: Operación y mantenimiento de la planta potabilizadora del Acueducto), ya ha finalizado el periodo de responsabilidad por defecto, las gestiones inherentes al proceso de recepción definitiva se encuentran en revisión en la Dirección de Asuntos Jurídicos, una vez que se le otorgue la recepción definitiva, se dará inicio al proceso de pago del fondo de Reparación conforme a disponibilidad presupuestaria en el siguiente ejercicio fiscal. La ESSAP S.A. continúa a cargo de la operación, distribución y mantenimiento de la toma de agua cruda y de la planta de tratamiento de la Ciudad de Puerto Casado, donde distribuyen agua a dicha ciudad.

Proyecto	SP Mejoramiento travesías urbanas ciudades de Paraguari - Carapegua - Quiindy - Caapucu			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	91			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	153.606.820.275
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
155.960.458.418		-2.353.638.143		101,53%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A		N/A		31/12/2022
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Caapucú, Carapeguá, Paraguari, Quiindy			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
530.823.440		486.995.197		91,74 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

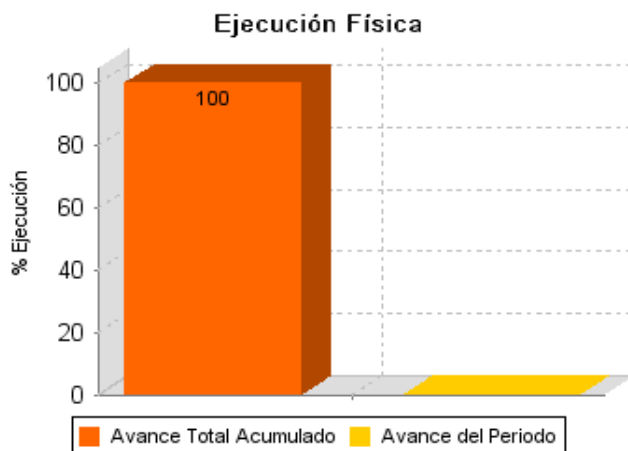


SITUACIÓN ACTUAL

Es un proyecto previo a la vigencia del SNIP. La obras que abarca el proyecto han culminado. Actualmente pendiente el pago a frentistas por indemnizaciones

Proyecto	Sp Programa Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	149			
Financiamiento	AECID, BID , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	88.000.000	GS.	635.532.769.647
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
567.063.841.205		68.468.928.442		89,23 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
23/11/2012		23/11/2017		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,67 %			93,22 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
88.180.369.839		31.701.945.382		35,95 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

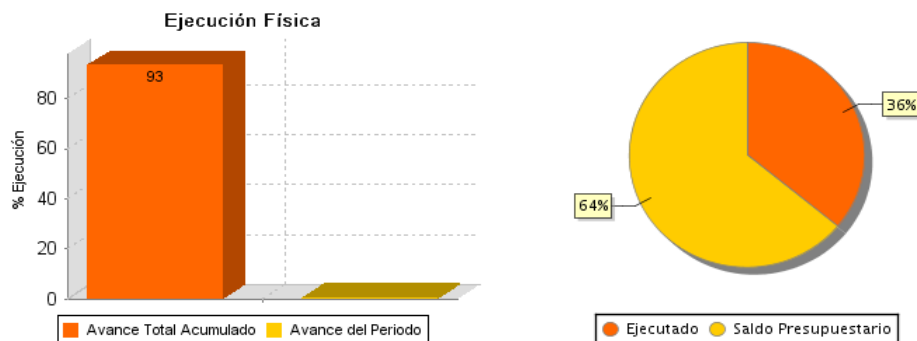


SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre las obras de "Construcción Aduktoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central" cuentan con recepción definitiva. Las obras de "Construcción de Redes de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Indígenas y Localidades Menores Beneficiarias del Proyecto del Acueducto del Chaco Central" cuentan con recepción definitiva. En el mes mayo 2024 se procedió al pago del fondo de reparto (previo procedimiento administrativo de levantamiento de cabecera del código de contratación, equivalente a USD 386.766. Dando así por concluidas las gestiones inherentes a este contrato.

La Infraestructura para Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias, Grupo 1 - Caacupe: Construcción redes nuevas: 100% Revisión de Red preexistente: 100%, Línea de Impulsión de EB1 a PTAR: 91 %, Movimiento de suelo en PTAR: 100%, Avance Global PTAR 93 % al último convenio. Las obras de conexiones se encuentran en pleno avance, registrando al cierre de 2do cuatrimestre 2024, un total 2000 conexiones domiciliarias, de 2.800 habilitadas. Tobatí: Redes Básicas 91%, Redes Condominiales 90%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión 20%, PTAR 30,15% y un avance Global del 84% al último convenio. En este segundo cuatrimestre aparte de continuar con las obras en redes, se ingresó oficialmente el legajo para el Convenio Modificatorio que habilita las cantidades y plazo suficientes para la culminación de la PTAR cuyo financiamiento está previsto con contrapartida local, teniendo en cuenta que las cantidades hoy existentes no son suficientes para la culminación de la obra. Infraestructura para Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para la Ciudad de Horqueta, el avance en la ejecución acumulada fueron los siguientes.: Redes Básicas 106%, Redes Condominiales 109%, Mejoramiento del Agua 100%, PTAR 100%, Estaciones de Bombeo N° 1= 100% y N°5= 100%. Se concluyó la obra, a la espera de la inauguración, así también se iniciaron las notificaciones para las conexiones domiciliarias efectivas en el mes de julio/2024.

Proyecto	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	154			
Financiamiento	BID , JICA , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	332.984.000	GS.	2.026.829.087.180
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.566.523.394.533		460.305.692.647		77,29 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/10/2014		28/10/2021		28/10/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,04 %			92,34 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
291.495.187.424		125.604.063.659		43,09 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

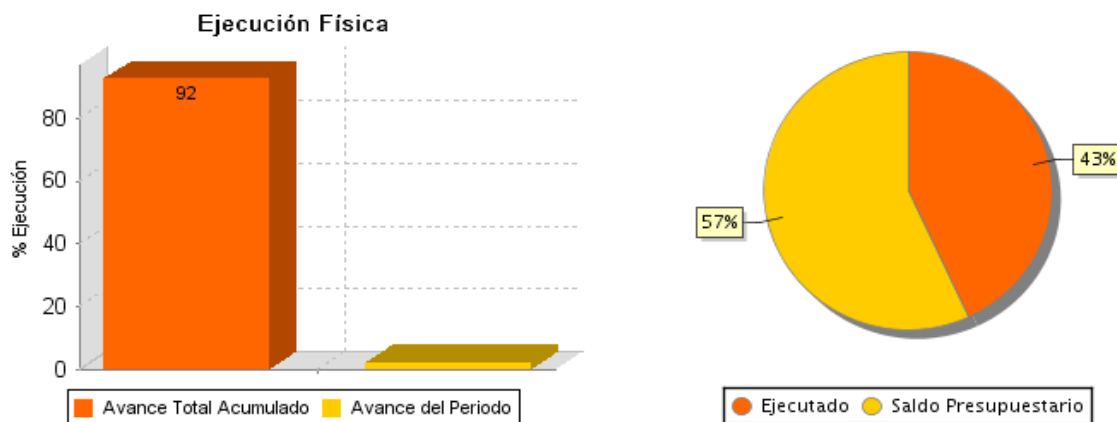


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	162			
Financiamiento	CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	285.000.000	GS.	1.643.841.538.888
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.441.706.207.240		202.135.331.648		87,70 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
29/10/2014		31/12/2018		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,19 %			92,07 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
151.961.330.429		23.954.839.635		15,76 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

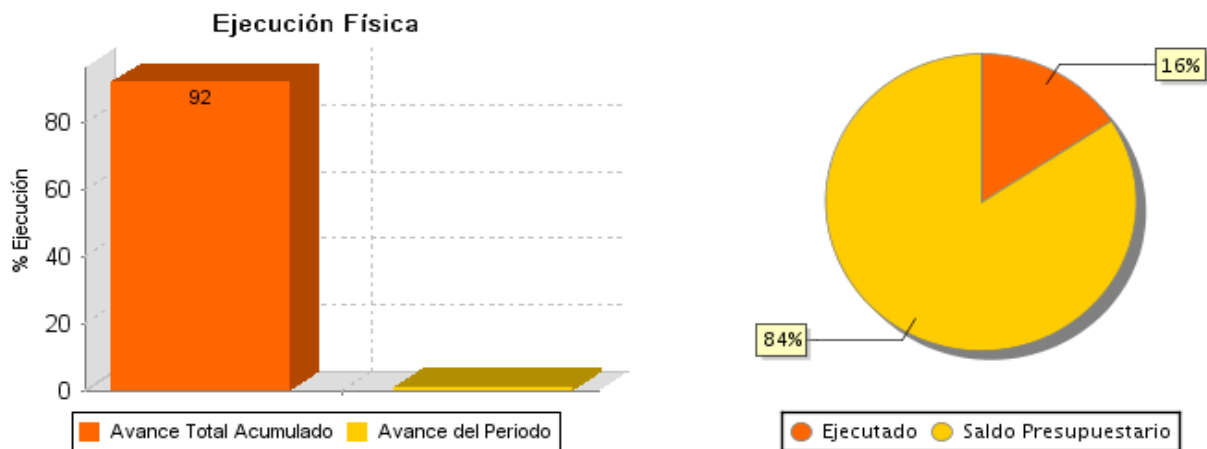


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Mejoramiento Pavimentación de Corredores de Integración, Rehabilitación y Mantenimiento de la Red Vial (Fase II)			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	195			
Financiamiento	BID , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	200.800.000	GS.	1.399.274.027.789
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.458.976.038.155		-59.702.010.366		104,27 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/11/2013		16/09/2021		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,27 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
143.855.107.233		124.630.854.338		86,64 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

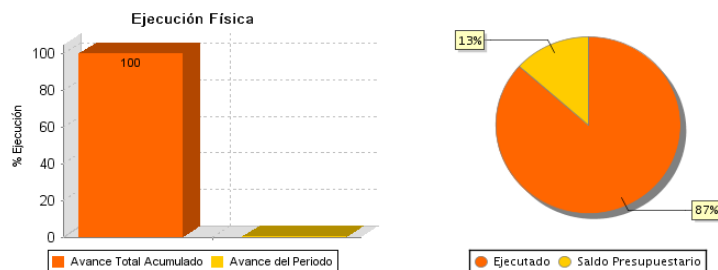


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección. Cabe mencionar que se encuentra en evaluación el ajuste de su Costo Total.

Está en EIP el pedido de ajuste del costo Nota MOPC N° 732 del 10/07/24 Costo Total solicitado 1.527.309.460.265

Proyecto	Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	219			
Financiamiento	CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	71.706.681	GS.	311.671.052.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
294.579.197.311		17.091.854.689		94,52 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
20/10/2014		20/10/2014		22/07/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
2.732.246.870		645.432.555		23,62 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

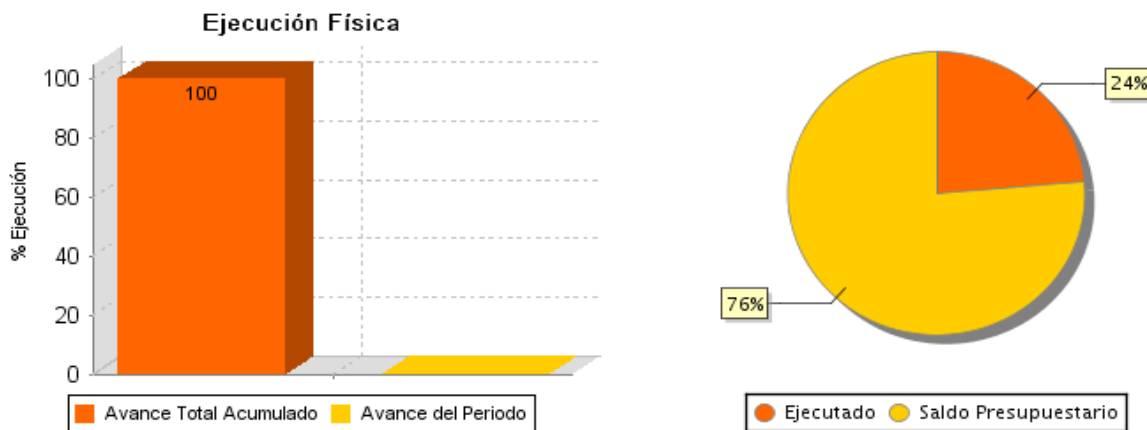


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para Caminos Vecinales y Puentes están concluidos. Existen deudas pendientes en concepto de Reajuste, Devoluciones de Retenciones y Devolución de pagos de IVA.

Por otra parte, se informa que los procesos de las actividades fueron ejecutados en su totalidad conforme al cronograma previsto en el PEP.

Proyecto		Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		260			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	68.385.986	GS.	758.974.498.622
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
677.464.708.287		81.509.790.335			89,26 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
09/06/2015		26/11/2020			26/11/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caazapá, Itapúa				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,64 %			96,81 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024			Porcentaje Ejecutado
26.368.656.953		909.726.069			3,45 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

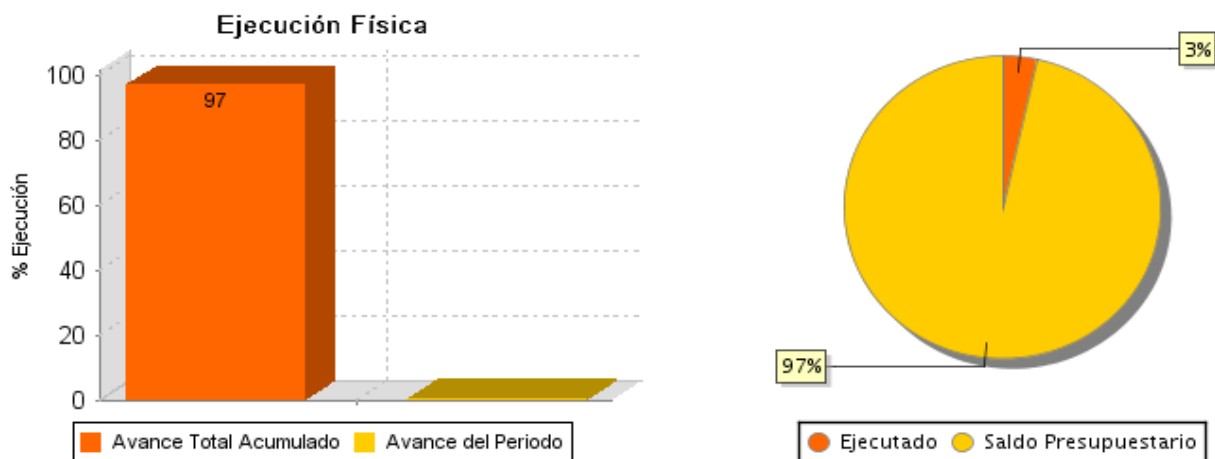


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		329		
Financiamiento		BID , ICO		
Costo del Proyecto	USD	125.000.000	GS.	805.881.066.227
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
790.312.334.697		15.568.731.530		98,07 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2015		25/11/2020		30/11/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,53 %			89,28 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
14.217.453.701		7.601.216.742		53,46 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

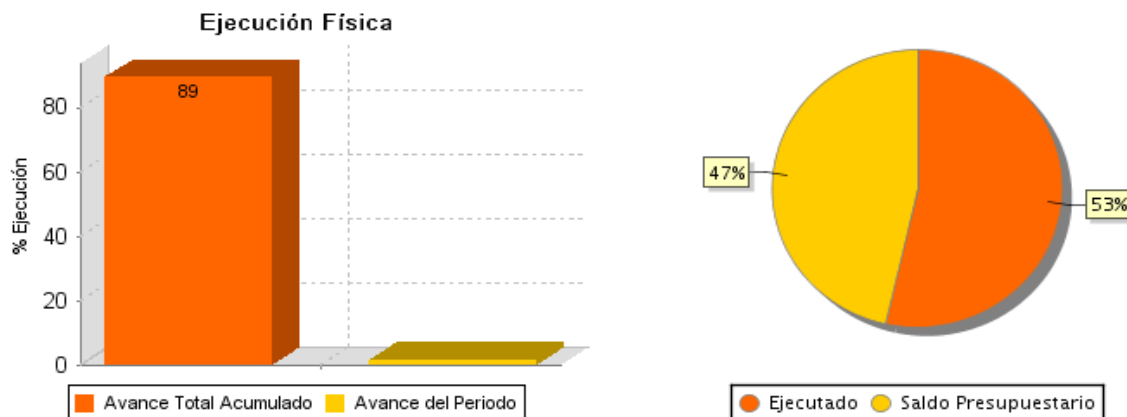


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para Caminos Rehabilitados, Puentes Construidos ambas con sus Fiscalizaciones y Consultorías finalizadas, en proceso de pagos finales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones fueron ejecutados en su totalidad conforme al cronograma previsto en el PEP.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	384			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	142.911.000	GS.	1.001.545.257.053
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
825.885.228.539		175.660.028.514		82,46 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/12/2018		31/12/2022		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,41 %			85,36 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
206.731.851.192		84.526.860.449		40,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

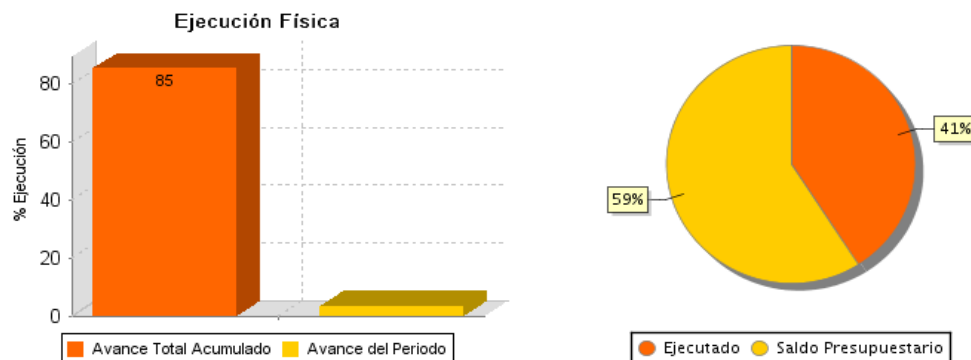


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto comprende la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales y Rurales, así también la construcción de Puentes de Hormigón Armado (HºAº) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente en plena etapa de ejecución. En cuanto a la Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales, las obras poseen Recepción Provisoria, un contrato con Recepción Definitiva, más 2 contratos con Recepción Provisoria y mantenimiento rutinario, el segundo contrato actividad finalizada, el tercer contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance de 11,19 Km de Caminos Rehabilitados. El cuarto contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de tramos de Caminos Vecinales tuvo un avance de 6,34 km. de Caminos Rehabilitados. En cuanto a la construcción de Puentes de Hormigón Armado se encuentra en ejecución un contrato que abarca los Departamentos de Canindeyú, Caazapá y Paraguari, esta actividad tiene 5 lotes de los cuales tres lotes cuenta con Recepción Provisoria más 2 lotes en ejecución. El segundo contrato de Construcción de Puentes se encuentra con un avance de 61,54 ml de Puentes construidos, esta actividad tiene 7 lotes, el llamado se encuentra en ejecución. En cuanto a la actividad 7, actividad con servicio finalizado, En la actividad 8 servicio finalizado. La actividad 9 cuenta con ampliación y regularización de plazos. La fiscalización de las Obras de Puentes 1ra tanda CAF servicio finalizado al igual que la fiscalización de las Obras de Puentes 2da tanda. El servicio de Consultoría de Apoyo Técnico y Fiduciario cuenta con un Avance de 15%; el Contrato de Auditoría Externa se encuentra en etapa de Evaluación Técnicas.

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguarí, Caaguazú Guairá, Caazapá.			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	451			
Financiamiento	CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	201.878.982.976	GS.	593.091.656.828
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
523.170.988.288		69.920.668.540		88,21 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguarí			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
3,33 %			85,65 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
58.622.148.974		30.644.578.212		52,27 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

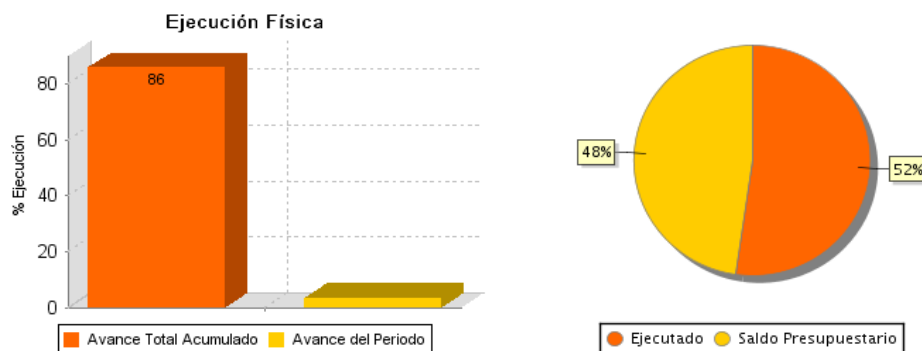

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se registraron los siguientes avances:


Tramo 1: Paraguari – Villarrica;Tebicuary – La Colmena; Paraguari – Piribebuy – Ruta Nacional N° 2, las obras se encuentran en etapa de Mantenimiento de 156,97 km. de Rutas Pavimentadas entre las intervenciones realizadas fueron: limpieza de franja de dominio.

Tramo 2: Cnel. Oviedo - Carayao; Cnel. Oviedo - Caazapa; Acceso a Yataty; Circunvalación de Ñumi; Circunvalación de Mbocayaty; Mbocayaty Troche - Ruta Nacional N° 7, las obras se encuentran también en etapa de Mantenimiento de 156,97 km. de Rutas Pavimentadas, los principales trabajos realizados son limpieza de franja de dominio y bacheo superficial.

En cuanto a las Fiscalizaciones de los tramos intervenidos, avanza al ritmo de la ejecución de las obras de las contratistas, el cual aprueban los certificados de obras de manera mensual por el mantenimiento de la ruta .

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada en el Departamento de San Pedro		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		454		
Financiamiento		CAF, FONPLATA		
Costo del Proyecto		USD	34.157.721	GS. 251.942.708.325
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
183.477.552.511		68.465.155.814		72,83 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,89 %			90,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
29.716.227.030		19.282.212.172		64,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

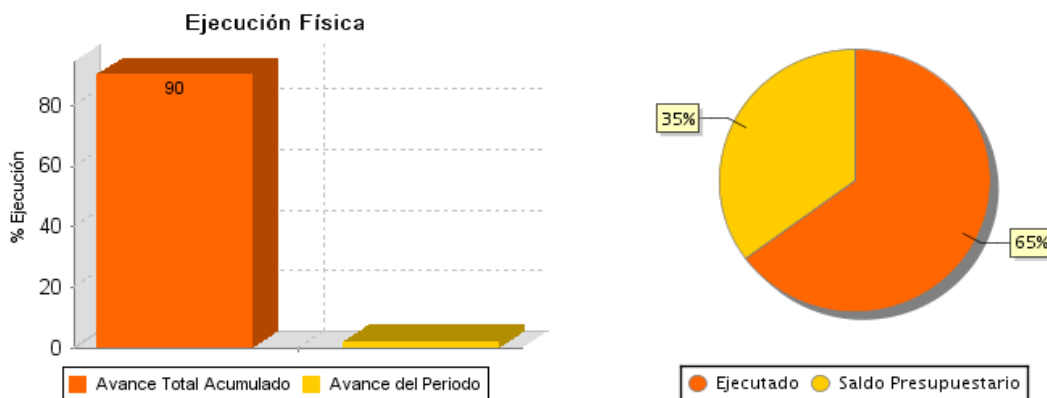


SITUACIÓN ACTUAL

La etapa de rehabilitación de las obras de pavimentación de la Ruta PY 11 "Juan Maria de Lara" ha culminado. Actualmente se está ejecutando trabajos de mantenimiento como: limpieza de la franja de dominio a lo largo de los 89 km del tramo de la Ruta PY 11, retiro de material suelto en la calzada y banquina, sellado de fisuras, reposición de cartelera de señalización vertical, Repintado de señalización horizontal de 30 km, limpieza de cunetas y alcantarillas, bacheo superficial y profundo y reposición de tachas reflectivas-.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		455			
Financiamiento		CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	31.889.950	GS.	189.562.926.102
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
149.256.927.073		40.305.999.029		78,74 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018		04/01/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,00 %			88,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
10.608.576.888		5.871.788.906		55,35 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

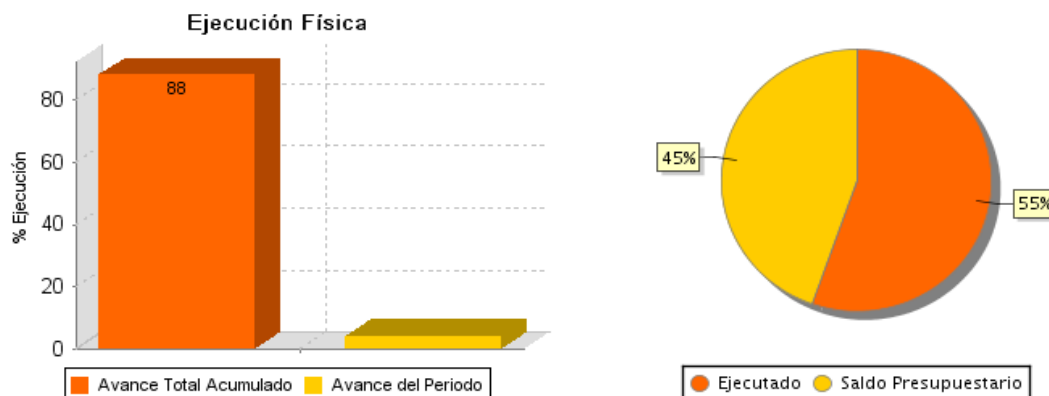


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se avanzó en la Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicios (CREMA) en el mantenimiento de 40 km, a lo largo de las Rutas Pavimentadas, resaltando los trabajos de limpieza de franja de dominio, sellado de fisuras y bacheo superficial.

En cuanto a la Fiscalización de 40 km de la Ruta Villeta - Alberdi, avanza al ritmo de ejecución de la contratista, con la aprobación mensual de mantenimiento de la ruta.

Proyecto	Mejoramiento de 160 km de caminos vecinales en la Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	564			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	62.000.000	GS.	450.306.379.043
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
346.156.158.310		73.017.092.721		82,58 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		05/01/2023		17/01/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
10,33 %			76,47 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
80.658.640.436		45.649.395.119		56,60 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

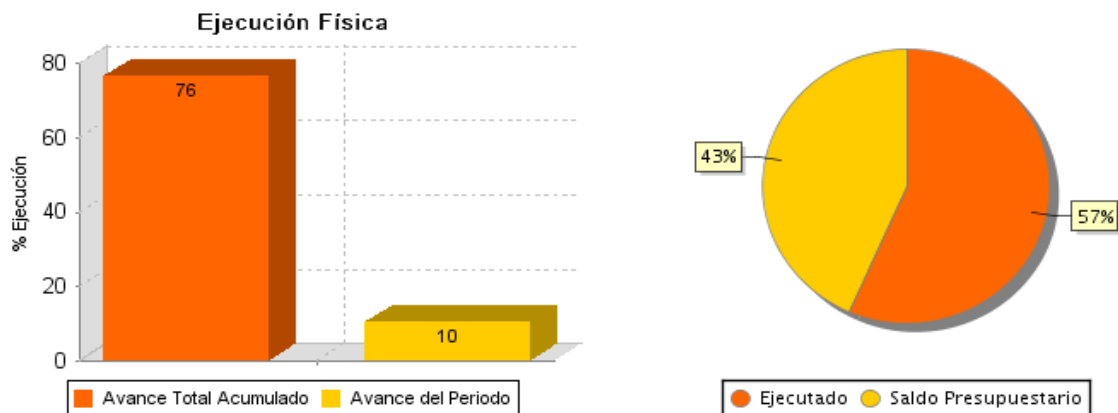


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de este segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto han avanzado conforme al PEP, tanto para Caminos Rehabilitados, Puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y Consultorías, se detallan cuanto sigue: Para los Caminos Rehabilitados dentro del Proyecto, se registran un total de 5,62 km de obras realizadas dentro de la Región Oriental de 21,08 km, el Mantenimiento de Caminos Vecinales de cuenta con un avance de 724,29,76 km., así también se registra un total de 24,13 ml de Puentes construidos de 72,22 ml a construir en la Región Oriental, todos conforme a la meta física prevista dentro del periodo fiscal 2024. Cabe mencionar también que los certificados correspondientes a las consultorías se procesan con normalidad honrando el pago de acuerdo al Vº Bº de la Dirección de Caminos Vecinales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones dentro del proyecto siguen su curso conforme al cronograma previsto en el PEP.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú y Canindeyú.			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	594			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	53.057.700	GS.	411.614.354.995
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
178.059.601.072		233.554.753.923		43,26 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		05/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caazapá, Canindeyú, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
8,09 %			46,57 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
94.522.452.792		61.221.622.238		64,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

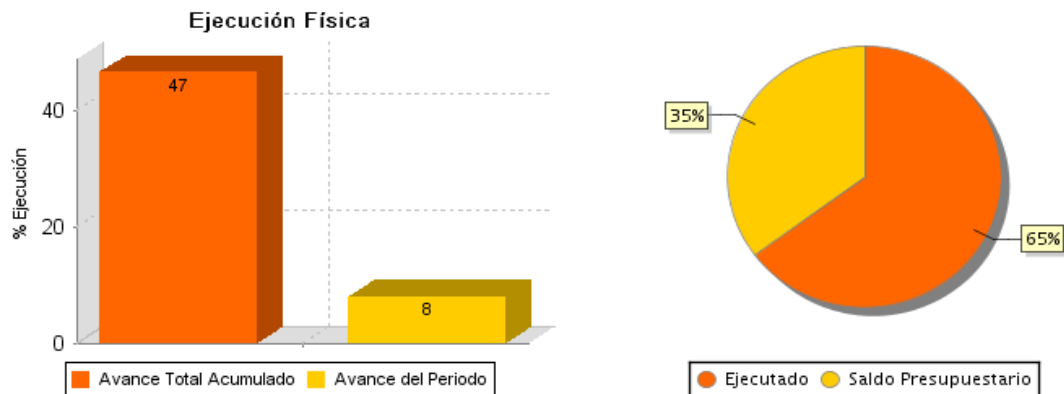


SITUACIÓN ACTUAL

La etapa de rehabilitación del contrato CREMA (contrato de rehabilitación y mantenimiento) por Índice de Servicio no ha culminado, se encuentra muy retrasada en relación a su cronograma de obra. Entre los avances se menciona los siguientes: limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para control de peso en Capiibary, bacheo superficial, limpieza de franja, obstrucción del escurrimiento y materiales sueltos del asfalto. Se procesaron sin inconvenientes los Informes presentados en la institución por parte del consorcio encargado de la fiscalización de rutas rehabilitadas y mantenidas.

En ese mismo sentido las Obras de Ejecución de Planes Urbanos Malla Norte se está ejecutando obras de accesos peatonales a las escuelas. Asimismo se encuentra en etapa de evaluación de las ofertas el llamado a Licitación Pública Nacional para la adquisición de equipos educativos para campañas de seguridad vial.

Proyecto	Habilitación de la Red Pavimentada en los Departamentos de Misiones e Itapúa			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	595			
Financiamiento	BIRF			
Costo del Proyecto	USD	46.540.241	GS.	383.046.126.088
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
197.351.467.230		185.694.658.858		51,52%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		05/01/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Itapúa, Misiones			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
4,31 %			62,32 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
71.505.414.522		23.296.341.917		32,58 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

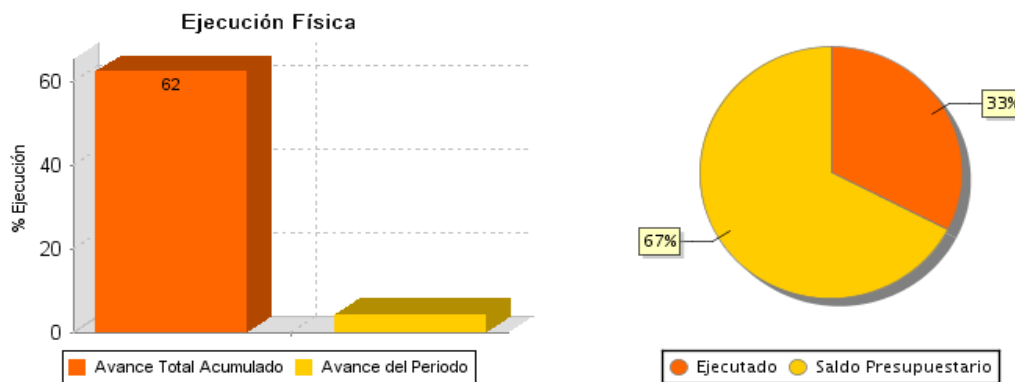

SITUACIÓN ACTUAL


Las obras de rehabilitación de la Ruta PY 1 ha culminado, actualmente en etapa de mantenimiento que se ejecuta a lo largo de la ruta. No presenta mayores retrasos. A continuación se detalla las siguientes intervenciones: se han reparado y solucionado, desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, reducción de espesor de pavimento, materiales sueltos, obstrucciones al escurrimiento de la vía, exceso de vegetación, pozos, entre otros.

El llamado a Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría de Implementación y operación del sistema de planificación y gestión vial a fin de completar el inventario vial, continua en etapa de evaluación, no ha avanzado en éste cuatrimestre.

Se encuentra en ejecución la auditoria del periodo 2023 con la presentación de su Informe N° 3. Así mismo comenzó el proceso para el llamado de Selección de Consultores para Auditoría Financiera y Contable Externa para los siguientes ejercicios.

Proyecto	Construcción Caminos Rurales no Pavimentados Región Oriental			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	720			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	1.093.778.338.894
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.063.331.559.285		30.446.779.609		97,21 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
20.473.908.082		16.298.803.838		79,61 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

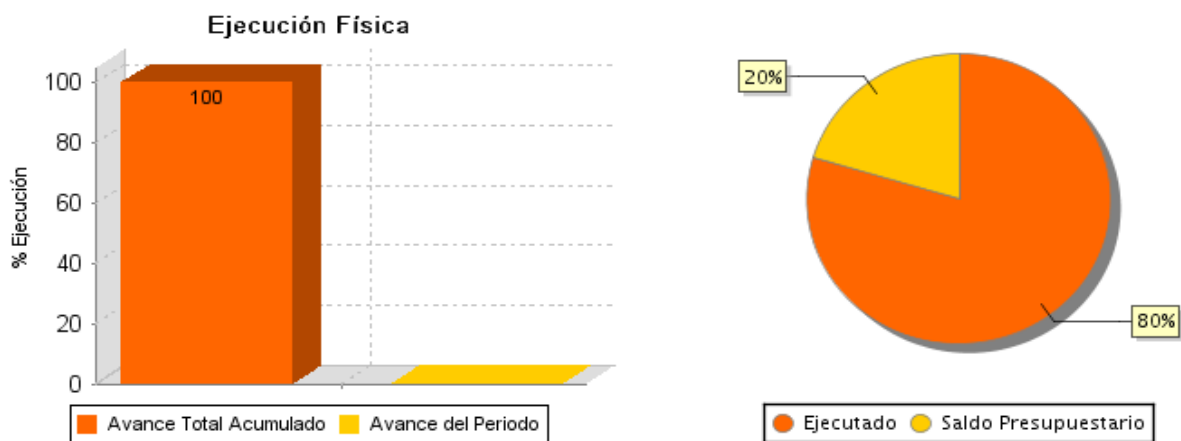


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción de Asfalto sobre Empedrados - Región Sur			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	724			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	21.884.404.330
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
21.364.292.276		520.112.054		97,62 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Itapúa, Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,50 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
105.755.141		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

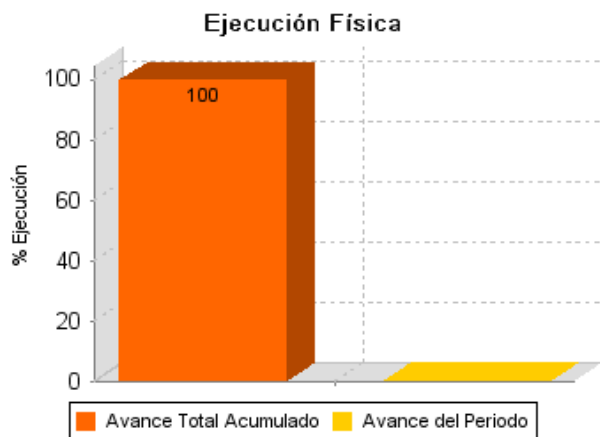


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

Proyecto	Construcción de Pavimentación sobre Empedrados en la Región Este			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	725			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	37.686.822.499
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
36.631.678.571		1.055.143.928		97,20 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			98,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
3.883.228.228		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

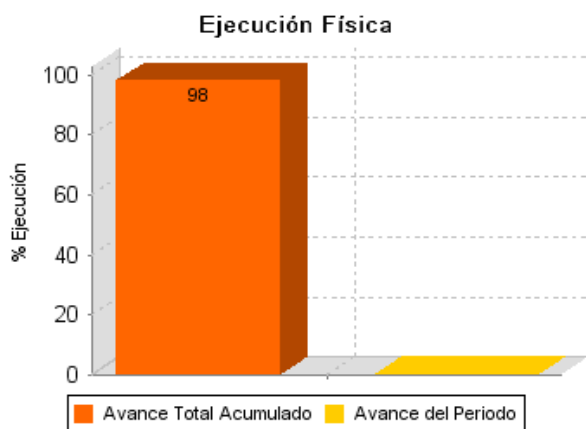


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Ttramos Camineros en Región Centro			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	729			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	407.298.756.129
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
407.495.549.655		-196.793.526		100,05 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Guairá, Paraguari			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,4 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
17.422.362.163		8.087.840.320		46,42 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

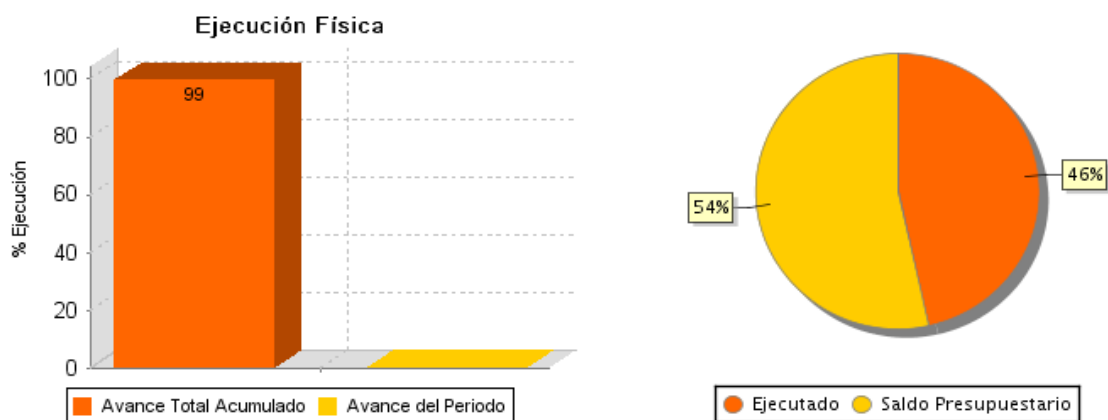


SITUACIÓN ACTUAL

Obras culminadas no se registran avances presupuestarios en esta etapa. Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución. Actualmente en proceso de análisis la actualización de su costo total.

Proyecto		Construcción y Pavimentación Asfáltica de Camineros en Región Este		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		730		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 161.967.754.975
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
160.887.188.373		1.080.566.602		99,33 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			98,80 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
704.596.698		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

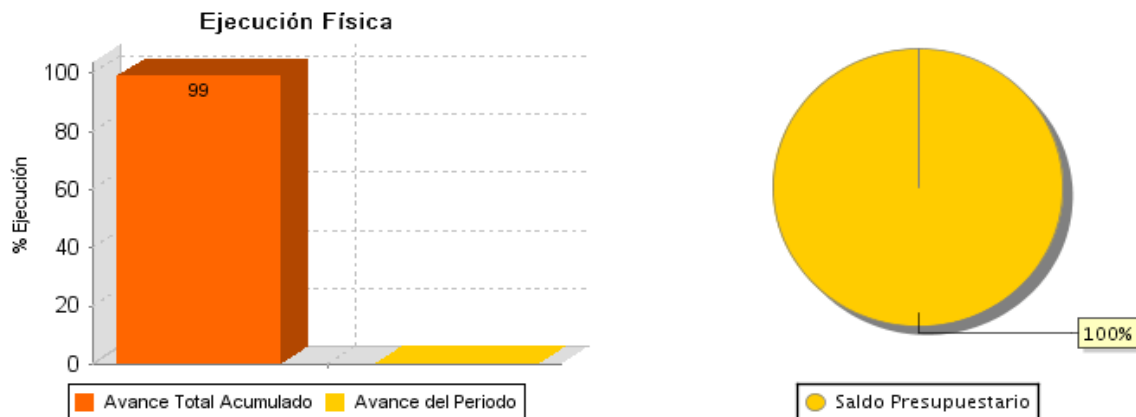

SITUACIÓN ACTUAL


Las obras de éste proyecto han culminado, queda pendiente pagos de certificados, adendas, reajustes y moras de contrato de obras.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.



Proyecto	Construcción y Pavimentada Asfáltica de Tramos Camineros en Región Noreste			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	732			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	272.415.685.907
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
271.069.440.062		1.346.245.845		99,51%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			90,96 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
4.677.334.918		2.453.754.155		52,46 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

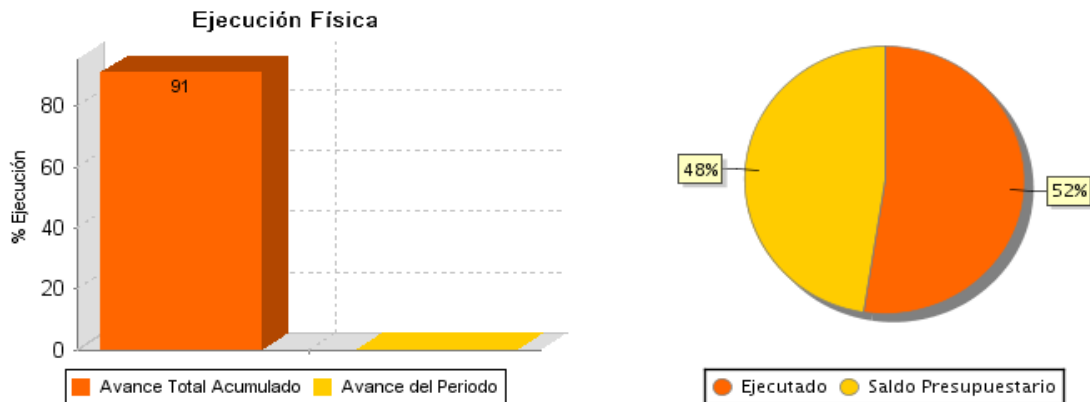


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, se ha pagado en concepto de reajuste de precios la pavimentación asfáltica de Bella Vista Norte hasta el Empalme con la Ruta N° 5 de 76,58 km y de circunvalación de 5,91 km.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Construcción de Pavimento Tipo Empedrado y Puente. Región Centro		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		736		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 28.060.365.090
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
26.214.560.425		1.845.804.665		93,42 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Cordillera, Guairá, Paraguari			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,36 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
3.180.254.770		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

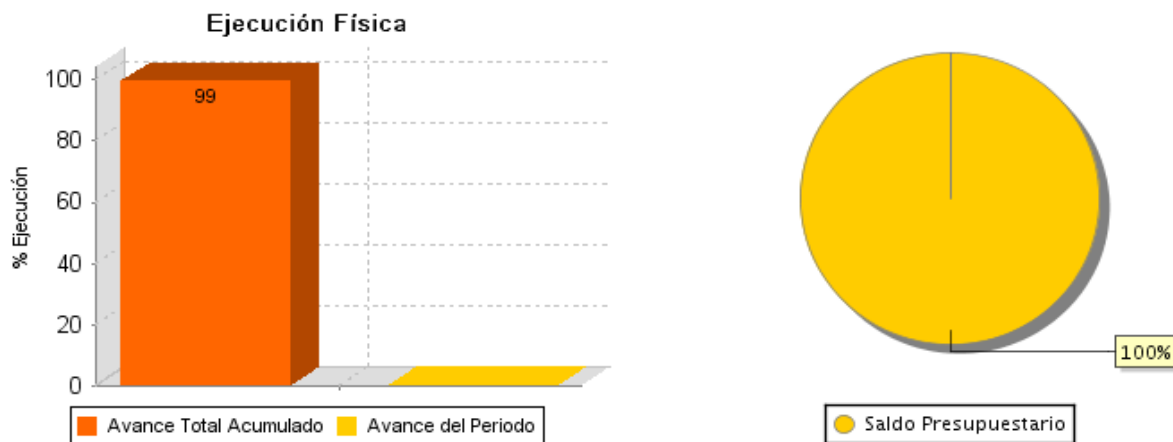


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

Proyecto		Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Occidental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		758			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	20.069.727.667
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.042.982.236		26.745.431		99,87 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
196.628.411		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

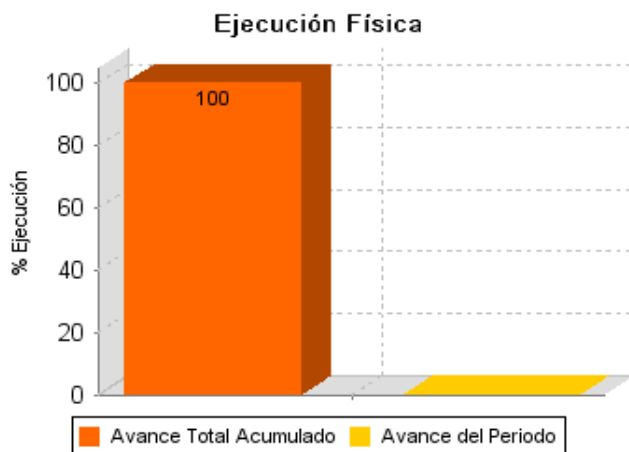


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no reportó su avance físico del segundo cuatrimestre

Proyecto		Construcción y mantenimiento de la Ruta N° 3 tramo km 21.8-170.3		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		761		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	118.376.807.553
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
107.073.306.908		271.471.974.902		28,29 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central, Cordillera, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
33.005.350.720		3.846.261.572		11,65 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

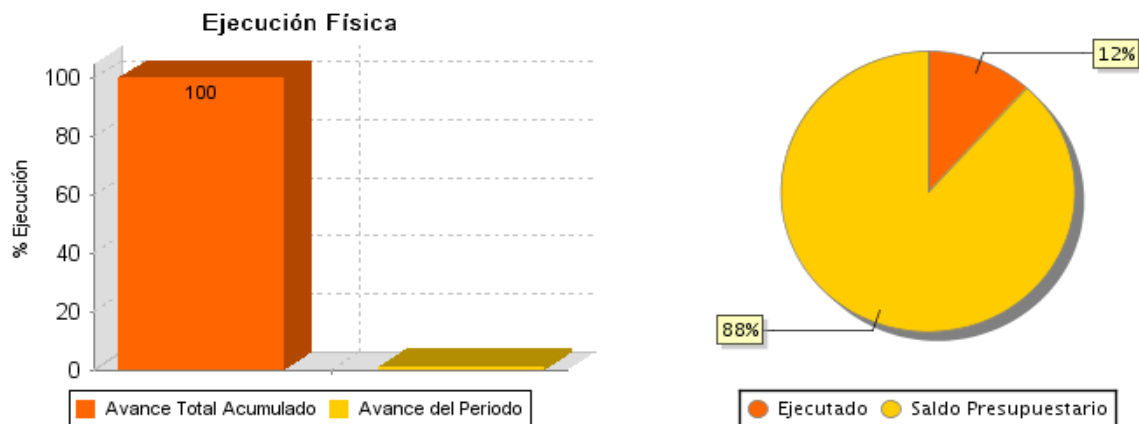


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, también el periodo de garantía, se presentaron todos los certificados de obra y fiscalización, a la espera de recursos financieros para honrar las deudas pendientes.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	762			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	146.007.640.363
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
116.747.120.531		29.260.519.832		79,96%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Misiones, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
35.114.637.349		8.788.678.560		25,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

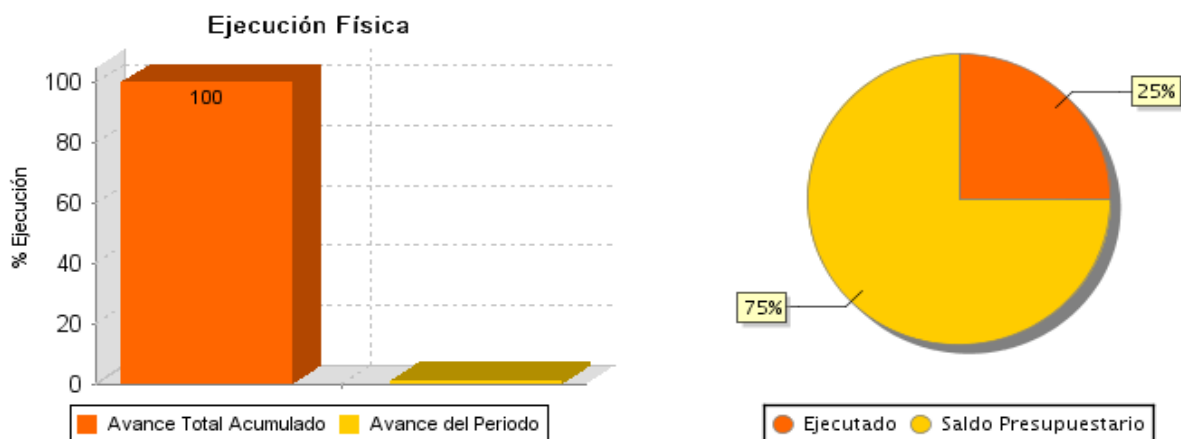


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han finalizado. Actualmente a falta de recursos financieros se ha generado retrasos en el pago de los certificados mensuales, generando pagos de intereses moratorios.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		764			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	194.800.960.023
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
191.652.918.562		3.148.041.461		98,38%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
2.686.293.317		1.077.573.199		40,11%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

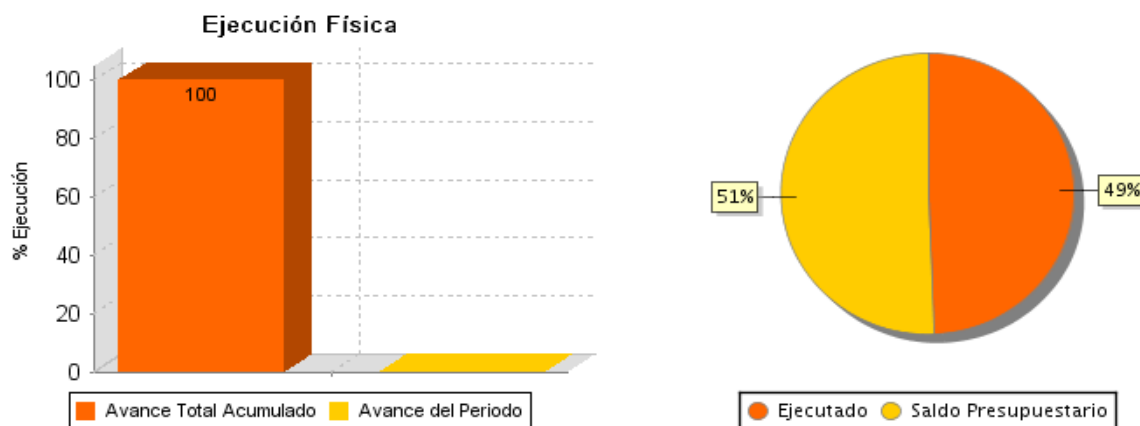


SITUACIÓN ACTUAL

Todas las obras del proyecto han concluido. Se realizaron pago de deudas en concepto de reajuste de precio, como así también pagos en concepto de viáticos a funcionarios del Departamento de Puentes y Obras de Arte por trabajos de Administración.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Conservación de Caminos Rurales no Pavimentados en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		766			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	273.331.128.503
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
265.582.815.967		7.748.312.536		97,17%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
2.193.042.076		544.874.336		24,85%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

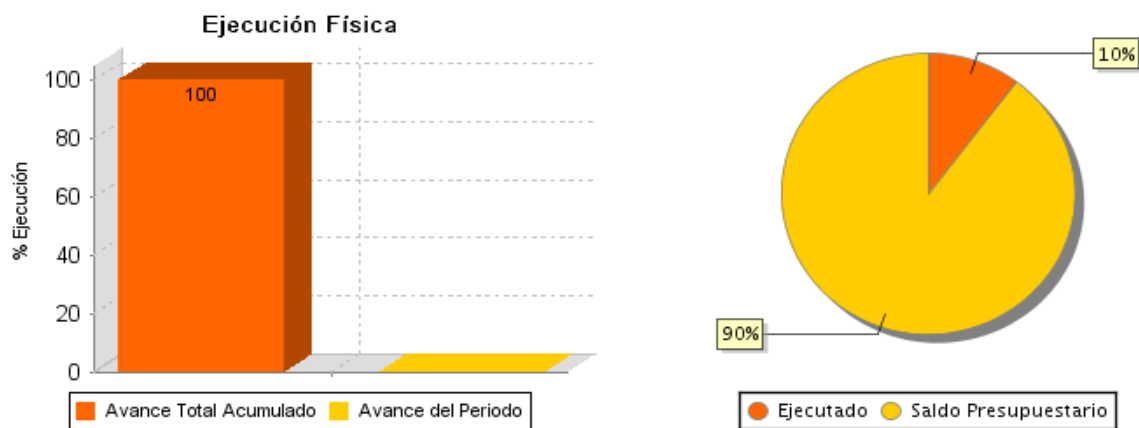


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, en este cuatrimestre no se registraron pagos, quedan deudas pendientes, en concepto de intereses moratorios.

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero - Cap. Bado - Ypejhu			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	796			
Financiamiento	FONPLATA			
Costo del Proyecto	USD	220.000.000	GS.	1.638.315.800.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		1.638.315.800.000		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A		N/A		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Amambay, Canindeyú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,92 %			2,88 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
108.057.993.548		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

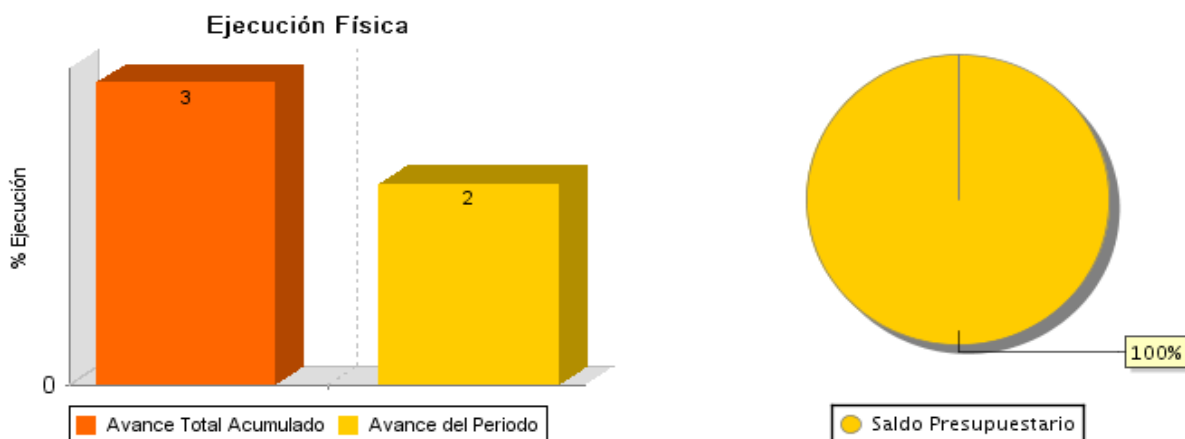



SITUACIÓN ACTUAL

Se han adjudicado los cuatro lotes de la obra de pavimentación asfáltica sobre la Ruta PY N° 17 "Ruta de la Soberanía". se han firmado los contratos con las empresas contratistas adjudicadas.

En cuanto a la fiscalización de los lotes continúa en etapa de evaluación del llamado a contratación.

Proyecto	Capacitación, Mejoramiento, Formulación Ejecucion de Proyectos de la DIPE			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	798			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	138.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
34.366.191.391		103.633.808.609		24,90%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
22/11/2018		22/11/2023		22/11/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,55 %			99,65 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
5.601.979.826		3.012.293.409		53,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

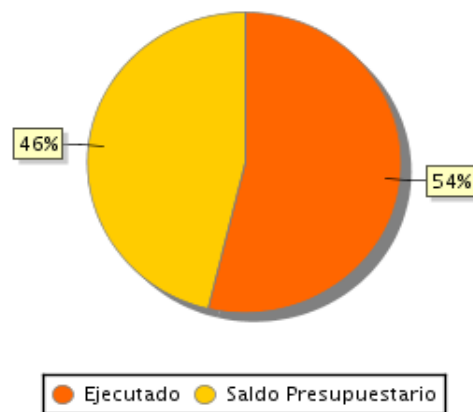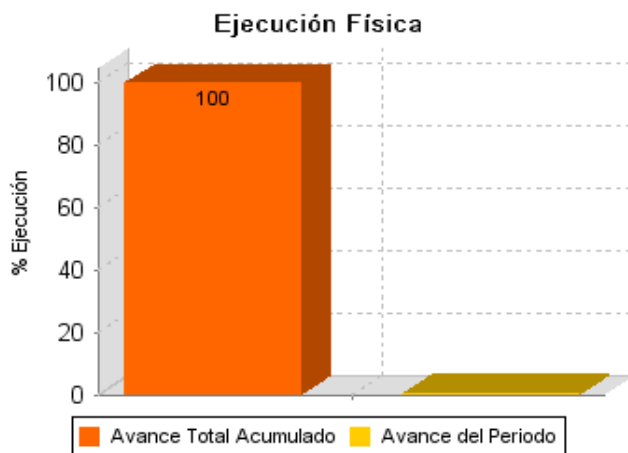


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración del informe cuatrimestral, La Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones emitidas por ésta dirección.

Proyecto		Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		806		
Financiamiento		LOCAL		
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS. 827.729.290.861
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
640.031.083.744		187.698.207.117		77,32 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/05/2019		24/05/2023		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,40 %			75,23 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
151.518.370.429		68.259.299.350		45,05 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO


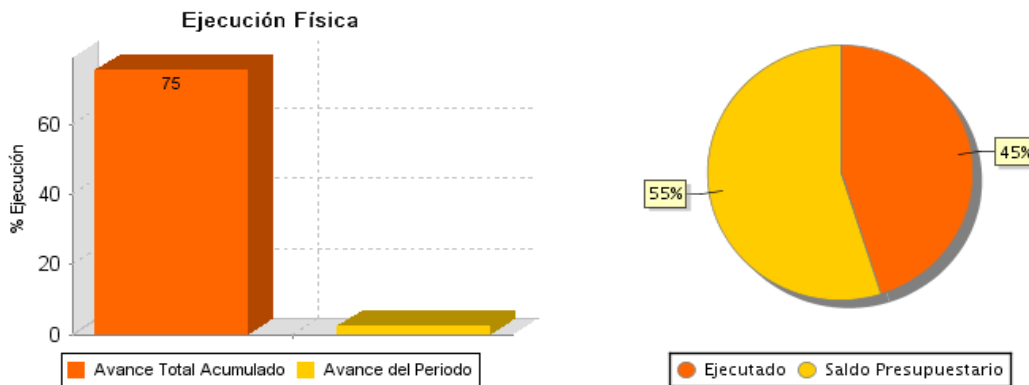


SITUACIÓN ACTUAL

Para el segundo cuatrimestre se realizaron pagos de viáticos por trabajos de supervisión de las obras administradas por la Dirección de Caminos Vecinales. - Se efectuaron los pagos por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Viales, así como por los Servicios de Reparaciones menores de vehículos, asociados a los siguientes procesos: LPN N° 54/2021 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camiones, Equipos y Maquinarias Viales, también se realizaron compras de baterías para vehículos y maquinarias del MOPC.- Contratación de Alquiler de las oficinas Administrativas y Sede Distrital. - Se registró avances en pagos de Certificados de Adquisición de pre-fabricados de hormigón armado. - Registramos un avance de 9,72 ml de Puentes de H°A° y metálicos en varios Departamentos del país, así como 49,44 km de Caminos mejorados de zonas críticas con obras de drenaje en el Dpto. de Pte. Hayes.

Proyecto	Mejoramiento Intersección Tres Bocas			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	807			
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA			
Costo del Proyecto	USD	24.096.276	GS.	181.858.228.583
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
170.729.032.747		11.129.195.836		93,88 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
26/12/2018		26/12/2021		31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
1,19 %			99,43 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
11.319.791.762		8.945.579.749		79,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

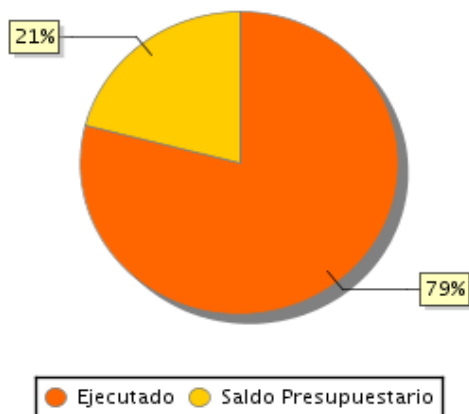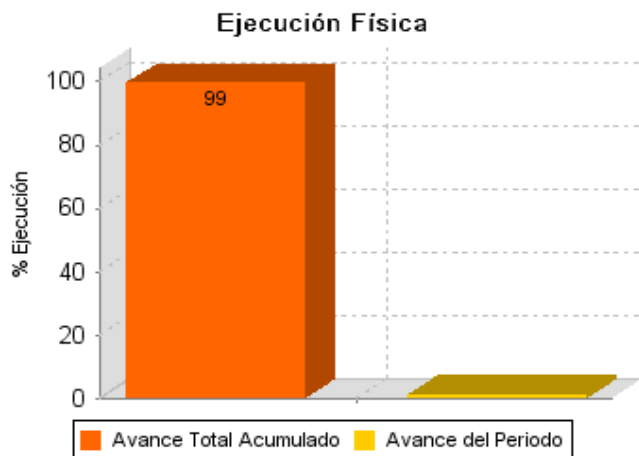


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco i - Gral. Briguez			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	882			
Financiamiento	BID			
Costo del Proyecto	USD	215.000.000	GS.	1.660.864.646.912
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
17.220.594.656		1.643.644.052.256		1,04%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
09/09/2022		09/09/2025		31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
11,42 %			20,79 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
88.614.000.000		69.531.671.959		78,47 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

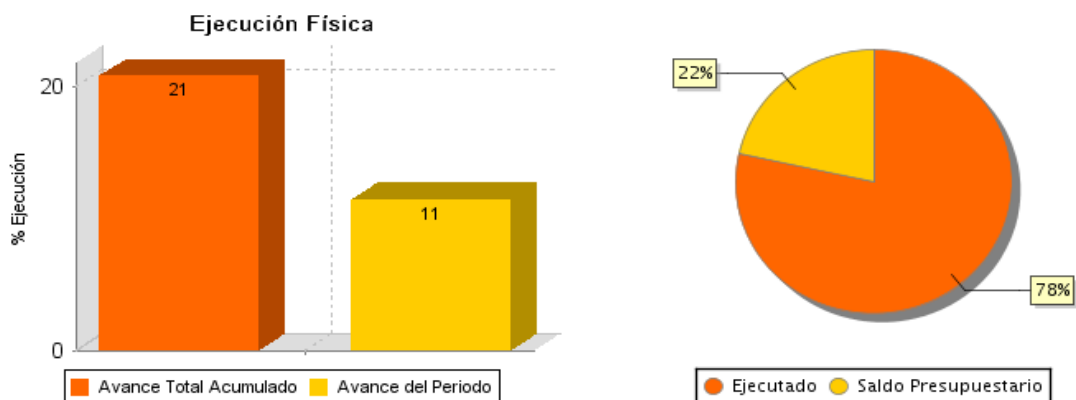

SITUACIÓN ACTUAL

Para el segundo cuatrimestre la totalidad de los lotes de la obra de Pavimentación Asfáltica sobre la Ruta PY N° 12 fueron adjudicados, asimismo se encuentra en ejecución en proceso de liberación de franja de dominio y terraplenado. A continuación se detalla el avance físico % por tramo:

Tramo 1 (2+500 a 37+400) y Acceso a Nanawa: avanzó 3,21%.

Tramo 2 (34+400 a 80+200): tuvo un avance físico de 12,24%.


Tramo 3 (80+200 s 122+000) y Acceso a Ninfa: avanzó 11,33%.

Tramo 4 (80+200 a 122+000) y Acceso a Gral Briguez avanzó 2,44%.

En el 2do cuatrimestre los llamados de Fiscalizaciones se firmaron contratos y en junio le dieron orden de Proceder.

Proyecto		Mejoramiento Sistemas de Agua y Alcantarillado Sanitario de Ciudad del Este y Presidente Franco		
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°		883		
Financiamiento		BID , JICA		
Costo del Proyecto	USD	200.000.000	GS.	1.276.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		1.276.400.000.000		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
11/05/2023		11/05/2029		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,82 %			0,82 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
48.589.351.420		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

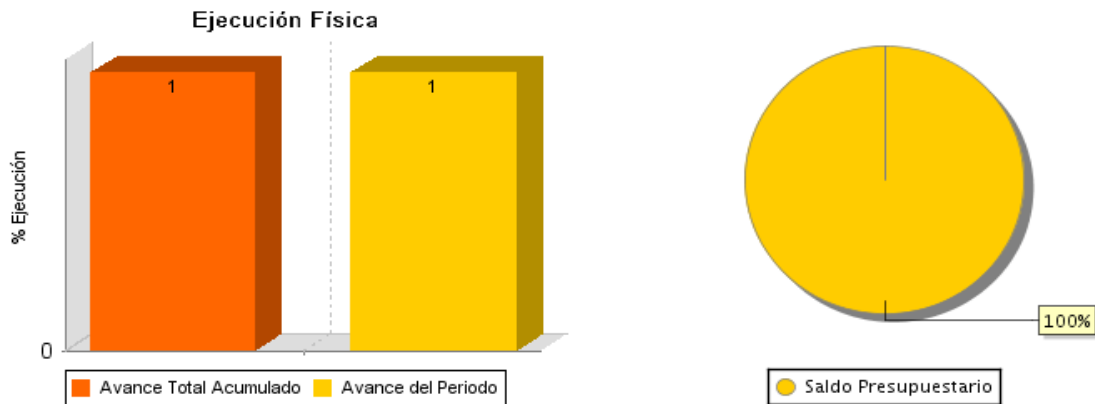


SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del segundo cuatrimestre fue publicado el Llamado MOPC N°55/2024 Licitación Pública Internacional para El Diseño y Construcción del Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales en Ciudad del Este. El Llamado MOPC N° 58/2023 Manifestación de Interés para la contratación de Servicios de Consultoría para la Fiscalización de obras, con ID N° 784, se está evaluando para la conformación de la lista corta. La Contratación de Servicios de Gerenciamiento para la Ejecución de los Proyectos: (i) Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción - Cuenca Lambare y (II) Área Metropolitana de Ciudad del Este, con ID 789 se encuentra en proceso de evaluación de la lista corta. La contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Obras, cuenta con No objeción a evaluación y fue publicado en fecha 13/08/24.

Proyecto		Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		892			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	51.611.968.238
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
45.926.169.520		5.685.798.718		88,98%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/11/2019		25/11/2022		25/11/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
11.871.359.178		3.787.246.603		31,90 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

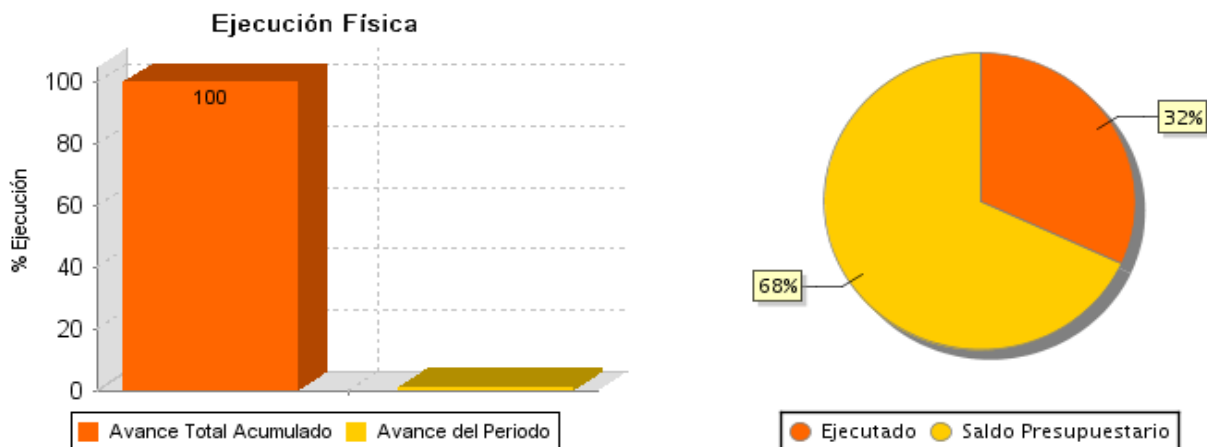


SITUACIÓN ACTUAL

La obra de restauración del ala oeste del Palacio de Gobierno ha concluido, ya cuenta con recepción provisoria y la recepción definitiva se encuentra en trámite.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema Integrado de abastecimiento de agua Potable y alcantarillado Sanitario del Área Metropolitana de Asunción - Cuenca Lambaré			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	906			
Financiamiento	BID , ICO			
Costo del Proyecto	USD	165.000.000	GS.	1.193.250.300.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		1.193.250.300.000		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
24/04/2024		24/04/2029		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,87 %			0,87 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
61.333.073.831		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

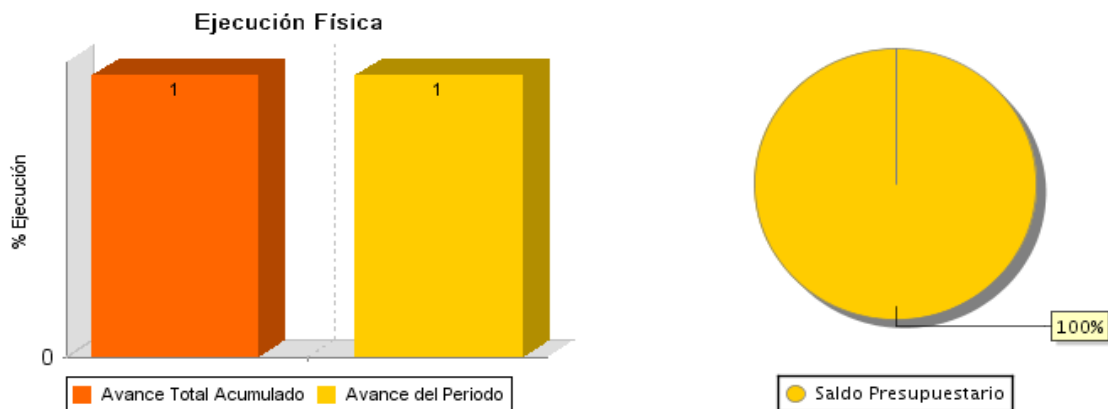

SITUACIÓN ACTUAL


Dentro del segundo cuatrimestre se ha recibido la Manifestación de Interés según Llamado MOPC N° 60/2023 para la Contratación de la Consultora para Fiscalizar el Diseño y Construcción de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial Cuenca Lambare con ID 785, la cual se está evaluando para la conformación de la lista corta.

Se ha publicado el Llamado MOPC N°69/2024 LPI Diseño y Construcción Cuencas Menores y Principal de Lambare, así como el Llamado MOPC N° 71/2024 Manifestación de Interes para la Contratación de Ingeniero FIDIC, que estara a cargo del Diseño y Construcción de Colectores de Cuencas Menores y Principal, con ID 801.

La contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Sub fluvial cuenta con Manifestación de Interés publicada.

Proyecto		Mejoramiento de gestión de infraestructura vial pavimentada			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		956			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	52.666.659	GS.	401.829.120.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
102.109.650.977		299.719.469.023		25,41 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2022		01/10/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,28 %			39,84 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
96.462.564.220		16.675.114.234		17,29 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

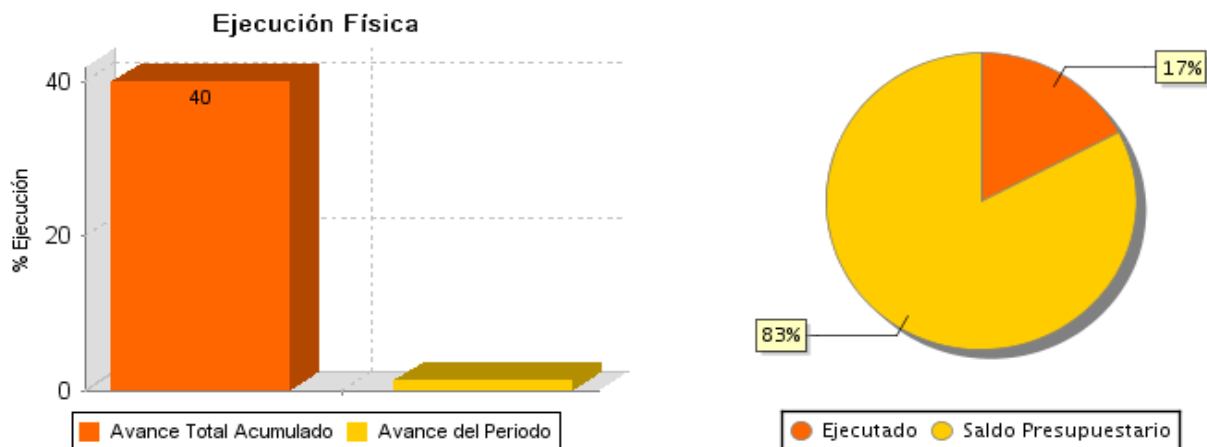


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora de Proyectos no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 y Ramal 1a Linea, 33Km			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	962			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	13.972.812.086	GS.	135.972.812.086
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
37.708.287.197		98.264.524.889		27,73 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/10/2022		01/04/2024		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Municipal	Capiibary, Yhú			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
15,78 %			26,77 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
39.698.653.191		22.959.081.626		57,83 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

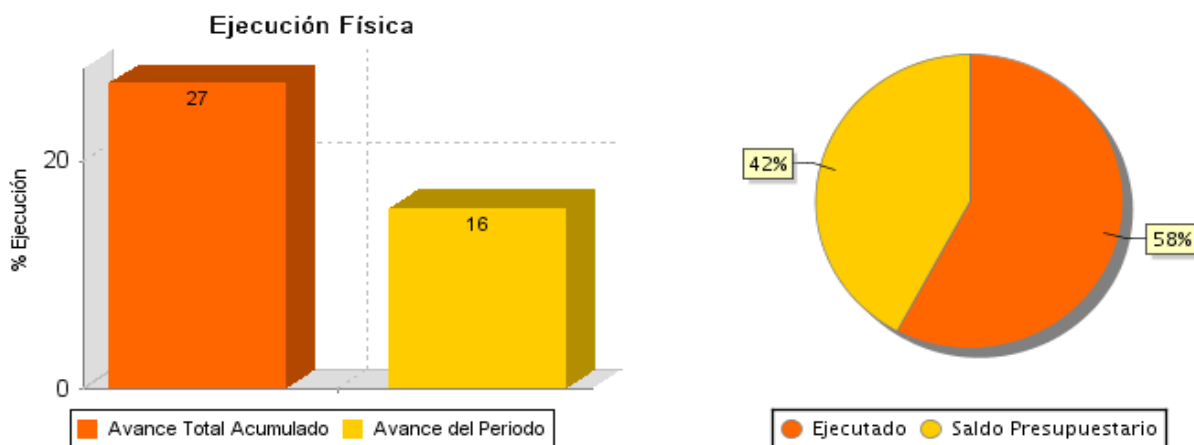

SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo cuatrimestre se presentaron y aprobaron cuatro informes de fiscalización de obras de construcción del tramo Ruta 10 y 13. Así como un avance acumulado del 27,26% de caminos construidos correspondiente al certificado número 14. El certificado número 15 cuenta con un avance acumulado de obra del 43,30% correspondiente a caminos construidos.



INFORME DE MONITOREO FÍSICO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Mayo - Agosto 2024




Sistema Nacional
de Inversión
Pública



Proyecto	Mejoramiento de condición de aprendizaje con incorporación de TIC			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	394			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	639.856.204.101
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
607.230.589.700		32.625.614.401		94,90 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/11/2015		25/12/2019		30/06/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,65 %			79,16 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
43.051.032.610		27.425.110.888		63,70 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

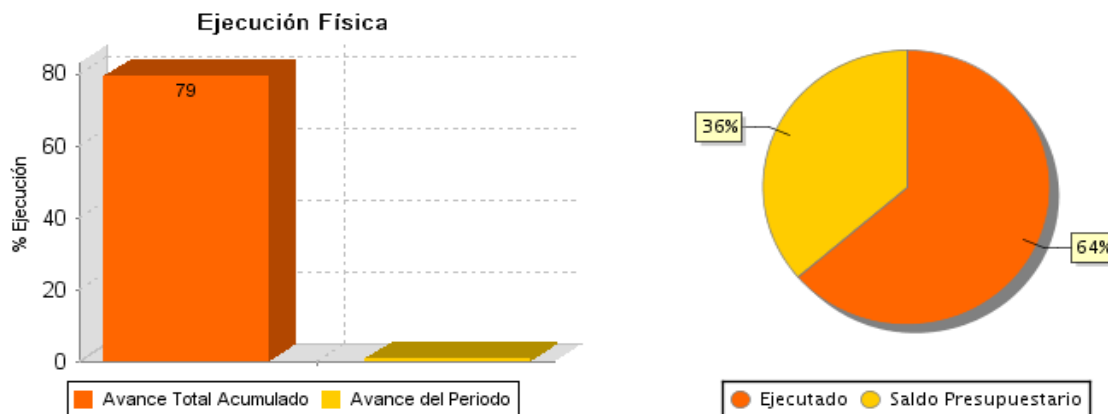

SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos informó que el presente proyecto se encuentra en etapa de cierre y se encuentran realizando el seguimiento para la extensión del plazo del proyecto.

Se realizaron los siguientes pagos: por consumo de internet satelite y fibra optica, mantenimiento de software,pago parcial de segundo informe del contrato por auditoria interna periodo fiscal 2023,pago parcial curso de capacitacion "Gestores TIC".

Además,se relizó el pago por combustibles,conforme al Convenio con Petroprar.

Proyecto		Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		570			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	19.720.000	GS.	141.761.952.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
103.270.252.801		38.491.699.999			72,85 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
31/10/2017		10/05/2025			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
14,64 %			72,08 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024			Porcentaje Ejecutado
26.356.513.992		11.413.333.889			43,30 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

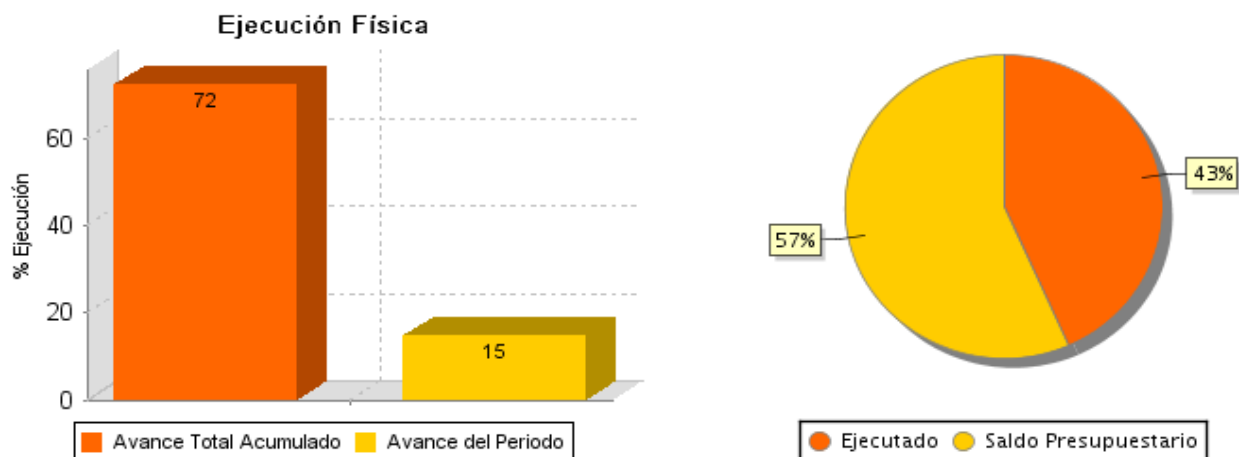


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024, la Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto		Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes		
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS		
Código SNIP N°		571		
Financiamiento		BID		
Costo del Proyecto		USD	280.000	GS. 2.012.847.200
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.261.939.141		750.908.059		62,69 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2017		10/05/2025		10/06/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
46,08 %			50,79 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
530.317.208		517.200.000		97,53 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

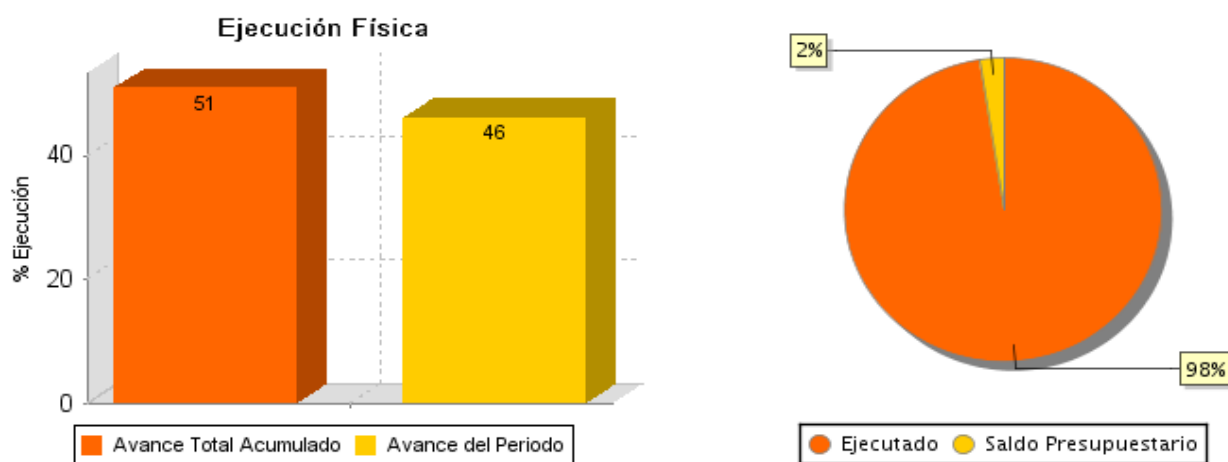


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Colegios Técnicos			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	972			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	202.172.259.397
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
3.324.815.147		198.847.444.250		1,64 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/01/2022		31/07/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,21 %			3,36 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
58.455.292.815		2.450.446.409		4,19 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

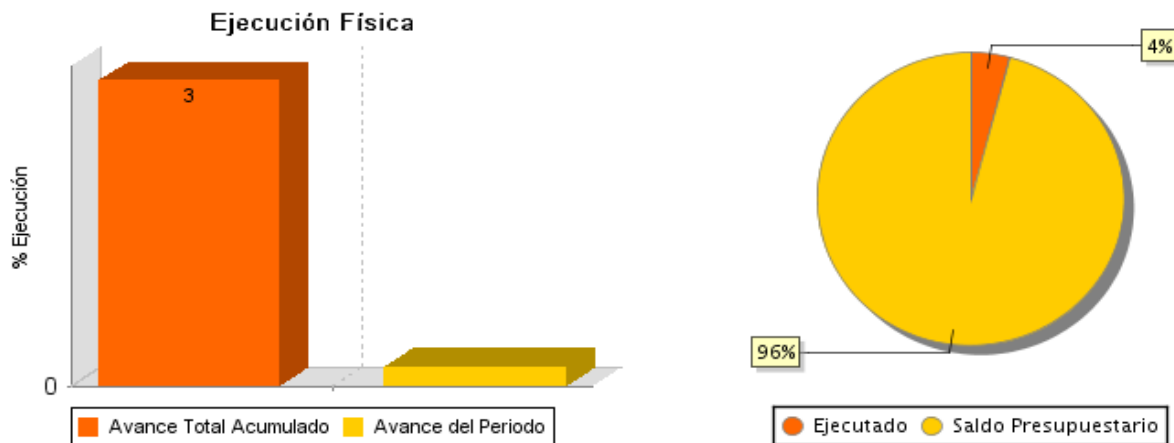


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el presente cuatrimestre, se realizó la verificación de planos, relevamientos de datos en Instituciones Escolares, como así también la elaboración de precios referenciales para el proceso licitatorio para la construcción de obras en los Departamentos de: Canindeyú, 10 Instituciones y Alto Paraná, 10 Instituciones.

Proyecto	Capacitación de las competencias profesionales de educadores			
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°	1071			
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS.	175.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
8.720.534.447		166.279.465.553		4,98 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
21/04/2023		21/04/2026		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
17,39 %			21,53 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
37.490.000.000		8.720.534.447		23,26 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

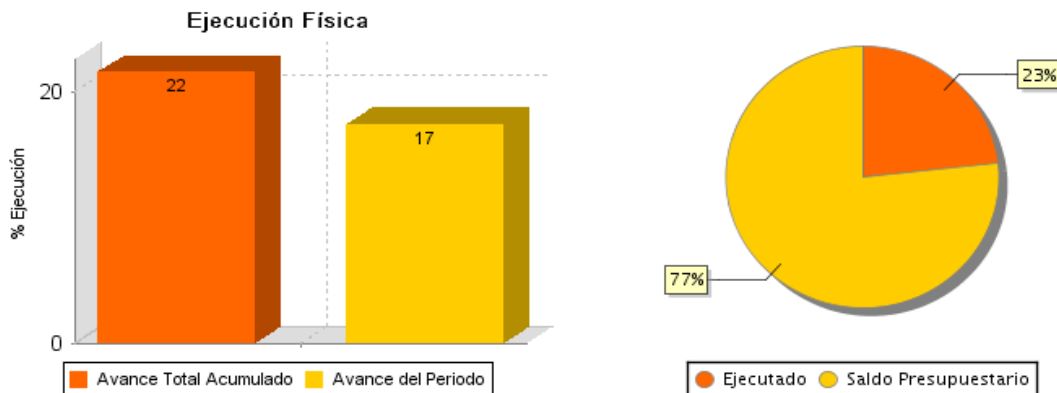

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal, se desarrollaron 7 módulos del curso de "Capacitación para la formación de docentes en servicio del primer y segundo ciclo de la Enseñanza Escolar Básica en estrategias de enseñanza de lectura y escritura", para 2.000 coordinadores pedagógicos y 12.000 docentes de instituciones educativas oficiales de todos los departamentos del país y Asunción

Así también, se inició el curso de "Capacitación para la Didáctica de las Matemáticas" dirigido a 2.250 docentes de educación inicial y 3.000 docentes del primer y segundo ciclo de la educación escolar básica de escuelas de todo el país.

Además, se desarrollaron 6 encuentros presenciales y 6 módulos a distancia como parte del curso de capacitación con enfoque en el desarrollo de competencias para vida sana, dirigido a 1.000 docentes de 121 escuelas públicas focalizadas de todo el país.

Proyecto		Mejoramiento de establecimientos escolares e IFD			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		1073			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BIRF			
Costo del Proyecto		USD	75.810.000		GS. 553.413.003.153
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.571.835.325		532.841.167.828		3,71 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2023		01/07/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,93 %			4,97 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
151.252.818.645		19.722.705.325		13,04 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

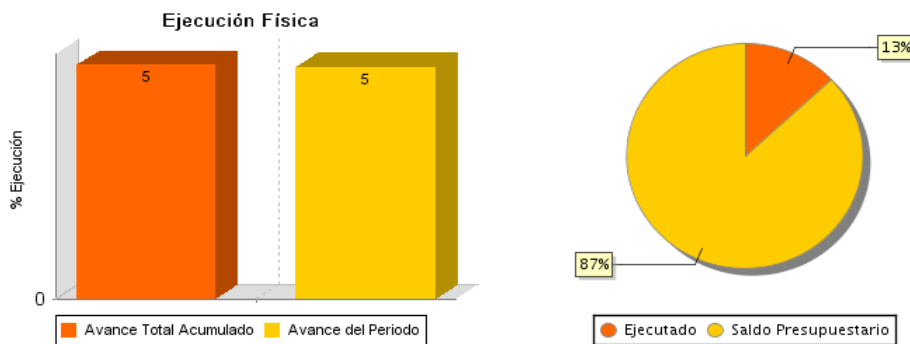

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que en el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se abonó por la ejecución de los Lotes N° 2, 4 y 5 ,correspondientes al ID N° 435.418,LPN N° 01/2023 "CONSULTORÍA PARA SERVICIOS DE RELEVAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOCALES ESCOLARES - PLURIANUAL" y los lotes 1 y 3, recibieron su primer pago en concepto de anticipo.La empresa adjudicada es la Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A.

La empresa contratada realizó el servicio de relevamiento de infraestructura de locales escolares de los 316 instituciones educativas a citar: Lote 1), 67 Instituciones en los Departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes, Capital, Central, Lote 2) ,64 instituciones en los Departamentos de Amambay, Concepción, San Pedro, Cordillera, Lote 3), 60 instituciones en los Departamentos de Caaguazú, Canindeyú, Lote 4),61 instituciones en los Dptos de Alto Paraná,Lote 5), 64 instituciones en los Dptos de Alto Paraná, Caazapá, Guaira, Itapúa, Misiones, Neembucú, Paraguari.

También se realizaron los pagos por honorarios profesionales a los supervisores de planta y campo encargados de realizar el relevamiento y acompañamiento de los locales escolares.

Por otra parte,se realizaron 123 transferencias para obras menores a los Locales Escolares a Potenciar (LEAPs) en tres etapas: 1). transferencia: 58 LEAPs: Departamentos de Canindeyú y Central 2) transferencia: 44 LEAPs: Departamentos de Caazapá, Alto Paraná y Central 3) transferencia: 21 LEAPs: Departamentos de Misiones y Central.

Asi también, se realizó el pago a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA),establecido en el contrato en el marco de los 316 locales escolares a potenciar (LEAPs).



INFORME DE MONITOREO FÍSICO


MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Mayo - Agosto 2024



Proyecto		Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental		
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°		567		
Financiamiento		FIDA		
Costo del Proyecto		USD	22.468.000	GS. 121.400.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
57.142.419.094		64.257.580.906		47,07 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2018		08/11/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
29,36 %			78,93 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
50.294.300.000		17.458.029.210		34,71 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

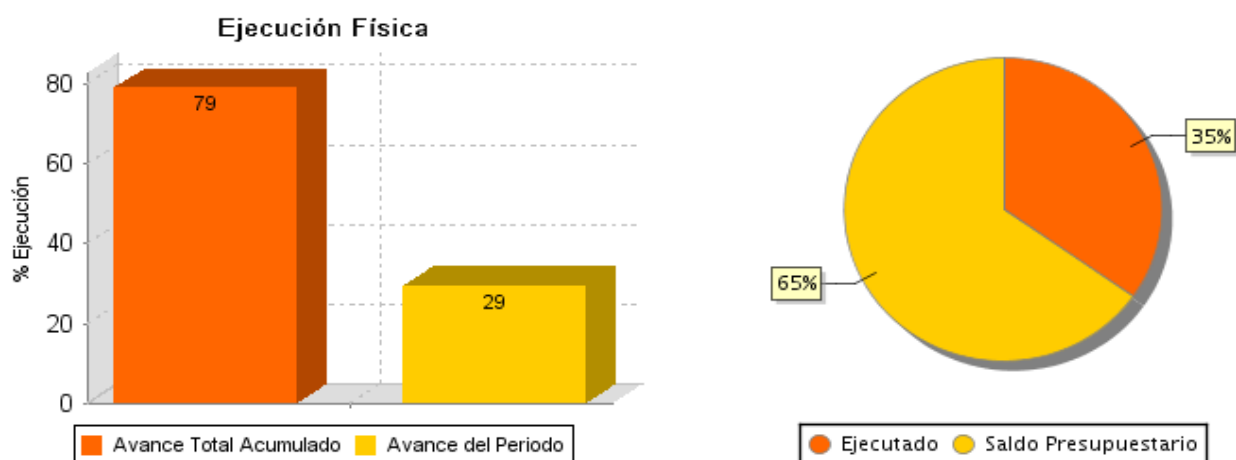


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto		Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		664			
Financiamiento		KFW			
Costo del Proyecto		USD	8.463.250	GS.	52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
9.994.481.493		42.088.358.499			19,19 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
13/09/2017		13/02/2022			31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
17,30 %				41,52 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024			Porcentaje Ejecutado
11.705.947.396		4.891.229.596			41,78 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

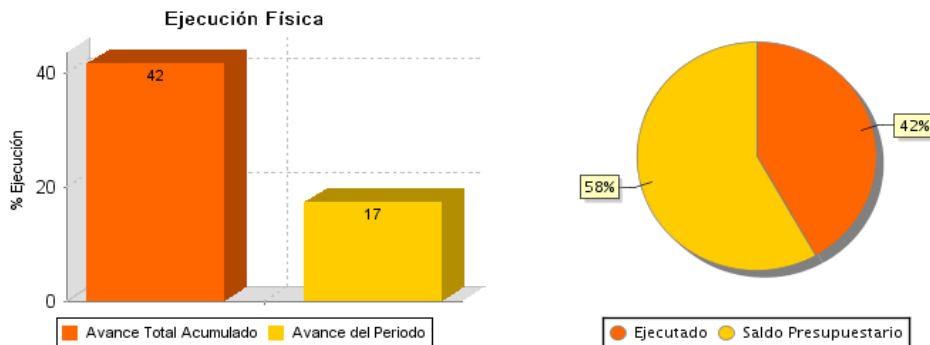

SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del presente periodo fiscal la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizó la entrega de incentivos financieros para la adquisición de insumos (fertilizantes, cal agrícola, herbicida, semillas de abonos verdes y semillas de maíz) para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada (ACM) a las siguientes organizaciones de productores:

Departamento de Caazapá - Distrito General Morinigo - Comité de Productores Almidonero Santa María
 Departamento de Caaguazú - Distrito Simón Bolívar - Comité de Productores Santa Elena
 Departamento de Concepción - Distrito Arroyito - Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco

Por otro lado, se realizó la entrega de incentivos financieros para la adquisición de maquinarias (tractor), implementos (sembradora para siembra directa, pulverizador, rolo cuchillo) e insumos (fertilizantes, cal agrícola, herbicida, semillas de abonos verdes y semillas de maíz y análisis de suelo) para la implementación de la ACM, a las siguientes organizaciones de productores:


Dpto Caaguazú - Asociación San Pedro II
 Dpto Caaguazú - Comité San Marcos
 Dpto Caaguazú - Consejo Distrital de Comités de Productores San José de los Arroyos
 Dpto San Pedro - Comité de Productores Ñande Rekoha Moporavevo
 Dpto San Pedro - Comité de Productores Cuatro Bocas
 Dpto San Pedro - Comité Virgen de Fátima
 Dpto. Caazapá - Comité Joayhu
 Dpto. Paraguari - Comité de Agricultores Potrerito

Asimismo, se realizó la fiscalización de las adquisiciones y posterior rendición de cuentas.

:

Proyecto		Mejoramiento de inserción a mercados Regiones Oriental y Occidental			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		904			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	100.000.000	GS.	635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
335.926.050.582		299.073.949.418		52,90 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020		30/06/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
12,07 %			73,74 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
87.487.339.638		25.125.213.613		28,72 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

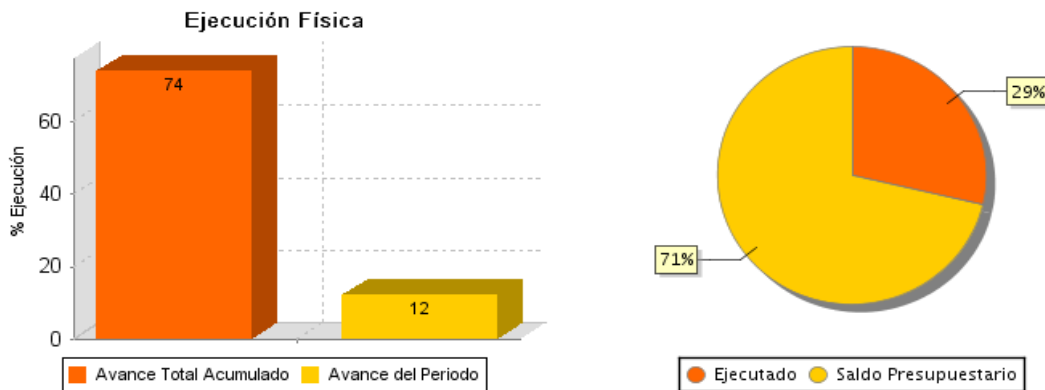

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que en el segundo cuatrimestre del presente año fiscal se financiaron 14 subproyectos de inversión para 570 (298 mujeres y 272 varones) productores agrarios organizados en los Departamentos de: Concepción, Caaguazú, Paraguari, Itapúa, Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú destinados a la producción de granos, yerba mate, producción frutihortícola, producción apícola, caprina.

Asi también, se realizaron capacitaciones a 1.259 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas (644 varones y 615 mujeres) de los Departamentos de: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Amambay y Canindeyú.

Además, se financió 1 Plan de Asistencia de Emergencia (PAE) que beneficiará a 52 miembros de Comunidades Indígenas (12 mujeres y 40 varones) del departamento Boquerón. El mismo está destinado a la producción de aves y ovejas.

Proyecto		Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar		
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°		984		
Financiamiento		COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	13.500.000	GS.	94.500.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
31.895.311.467		62.604.688.533		33,75 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
25/10/2022		25/10/2025		N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto				
Nacional	N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
16,30 %			43,69 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2024		Porcentaje Ejecutado
10.400.000.000		807.867.399		7,77 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

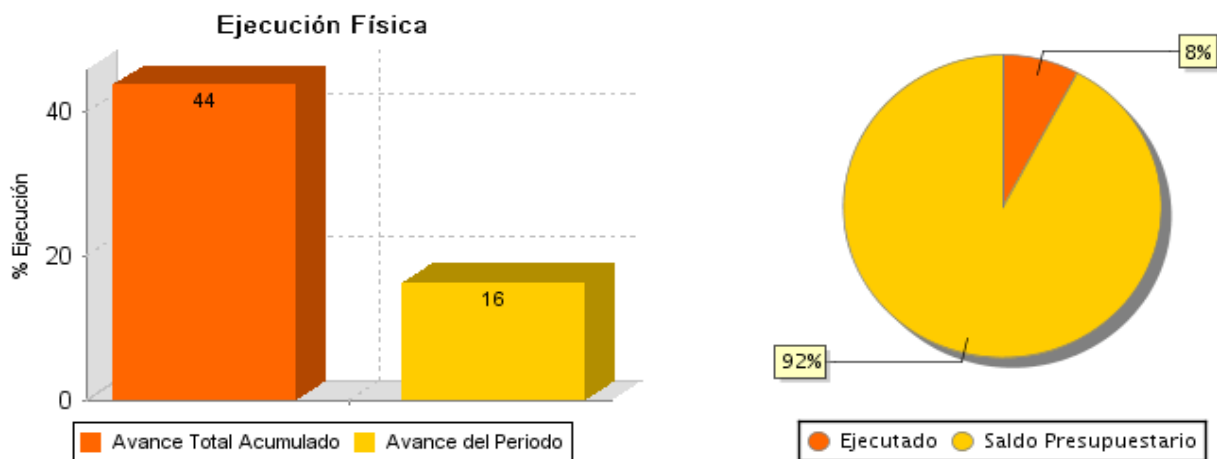

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.
