


Proyecto		Mejoramiento Energético en el Sector Industrial					
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO					
Código SNIP N°		784					
Financiamiento		BID , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	40.000.000		GS.	240.000.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
121.138.355			239.878.861.645			0,05 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
23/06/2022			23/06/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional	N/A						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,00 %				1,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
14.800.000.000			121.138.355			0,82 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

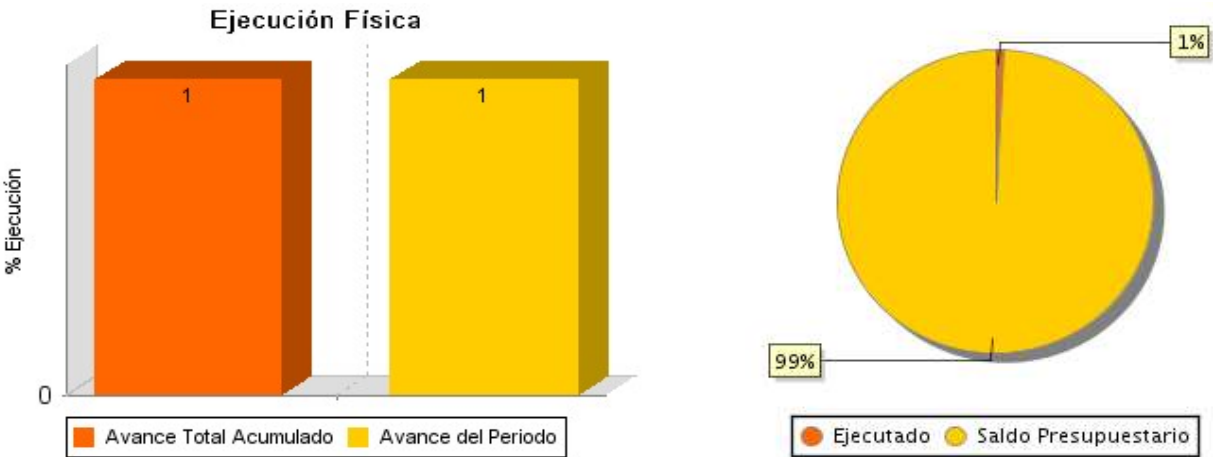


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el tercer cuatrimestre del 2024 se registró una operación crediticia.

Proyecto		Mejoramiento y Amp. de Financ. de Inver. para el Sec Agrop.							
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO							
Código SNIP N°		862							
Financiamiento		0							
Costo del Proyecto		USD		N/A		GS.		189.000.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
38.399.793.857			150.600.206.143			20,32 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
1/9/2020			1/9/2025			N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Nacional		N/A							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
31,00		%			31,00		%		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado			
43.800.000.000			38.399.793.857			87,67 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

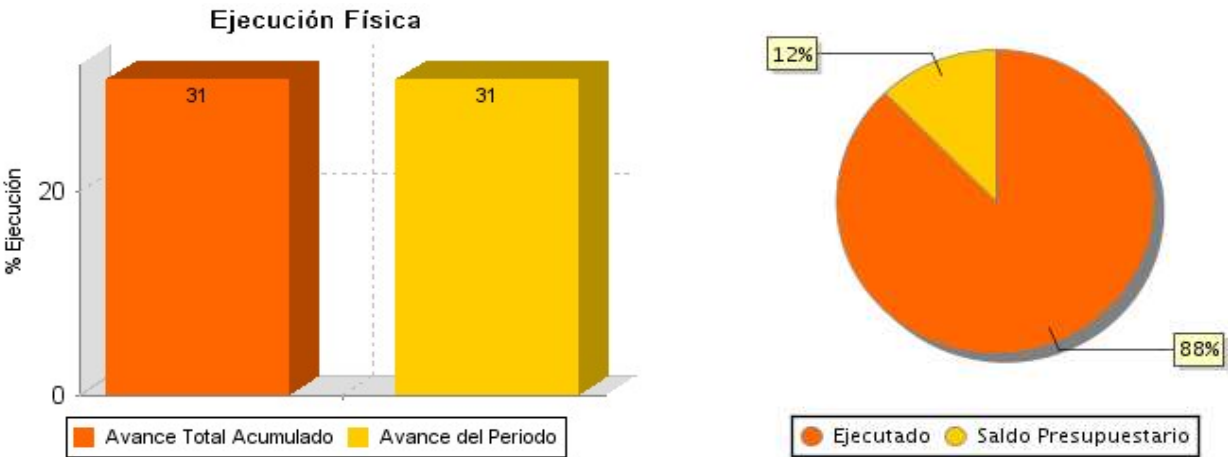


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que de un total de 210 créditos programados como meta total del proyecto, el avance físico acumulado hasta el tercer cuatrimestre del 2024 asciende a 66 créditos desembolsados.

Proyecto		Capacitación y Evaluación de Educación Superior				
OEE		AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR				
Código SNIP N°		644				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	23.167.811.280
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
22.372.448.197			795.363.083		96,57 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/05/2016			27/05/2019		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,03 %				84,01 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
1.383.695.299			39.000.000		2,82 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

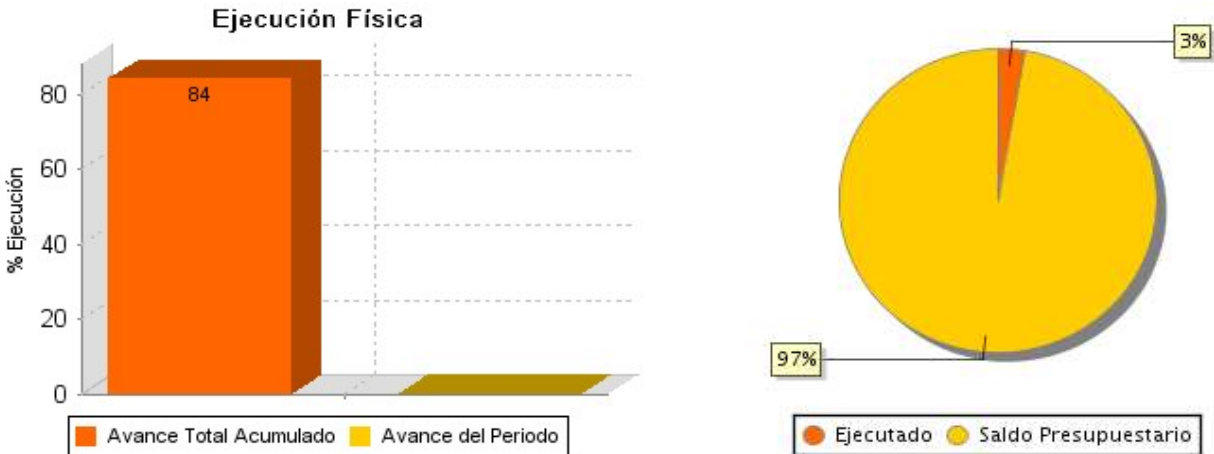


SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre del periodo fiscal 2024 la UEP informó que no se realizó el pago por el desarrollo completo del Sistema Informático, el cual fue adjudicado a la empresa CIBYRA CONSULTING, bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional (LPN) N° 01/2022.

El tiempo estipulado para la entrega del mismo fenece en el mes de Enero del 2025, a raíz de la Prórroga concedida según Nota PCD 263/23, para la entrega del mencionado producto.

Proyecto	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia				
OEE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
Código SNIP N°	155				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	122.000.000		GS.	1.038.323.935.698
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
829.941.553.287		208.382.382.411		79,93	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/03/1996		11/03/2016		30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
7,80 %			56,80 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
126.206.539.759		117.668.104.127		93,23	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

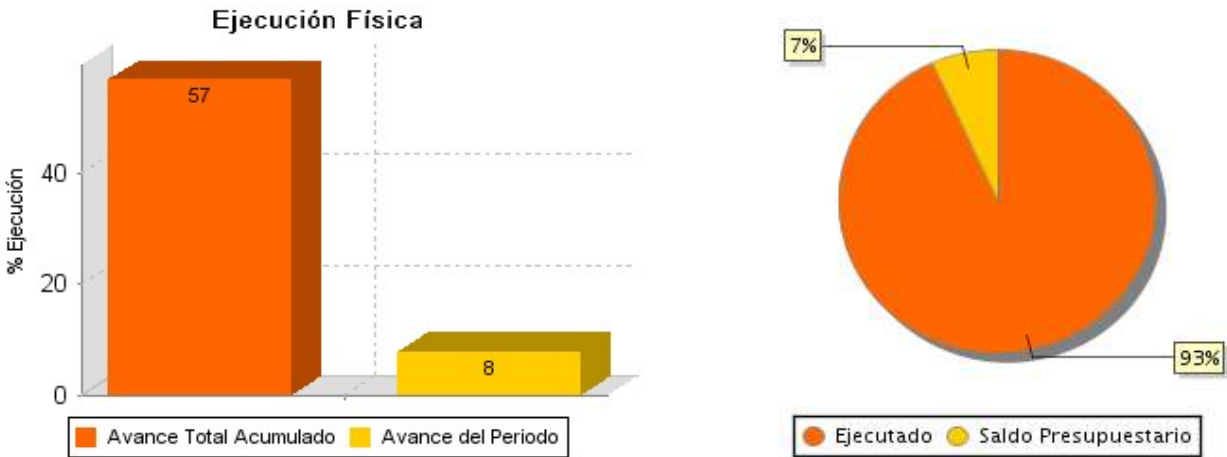

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo en cuanto a obras y guardería,cuya presentación de informes mensuales de dicho mantenimiento fue realizada por el contratista.

Asi también, en Salto del Guairá realizaron pagos finales de la retención caucional de las obras civiles e inicio de la segunda etapa del contrato.Igualmente, en el juzgado de primera instancia de Capiatá,se pagó el certificado N° 23 correspondiente al mes de noviembre 2024,quedando pendiente la cancelación de pago del certificado N° 24,correspondiente al mes de diciembre 2024, con el cual se llegará a la culminación de los trabajos de la firma del acta de recepción definitiva y pago final de la retención caucional.

Por otro lado,en el juzgado de primera instancia de Fernando de la Mora, se realizó el pago parcial del certificado N° 6,correspondiente al mes de noviembre 2024.

Proyecto		Censo Poblacional de Paraguay				
OEE		INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				
Código SNIP N°		869				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	633.712.360.978
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
248.733.682.067			384.978.678.911		39,25 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
8/11/2021			8/11/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional		N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,66 %				97,72 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
32.200.708.462			25.485.168.975		79,14 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

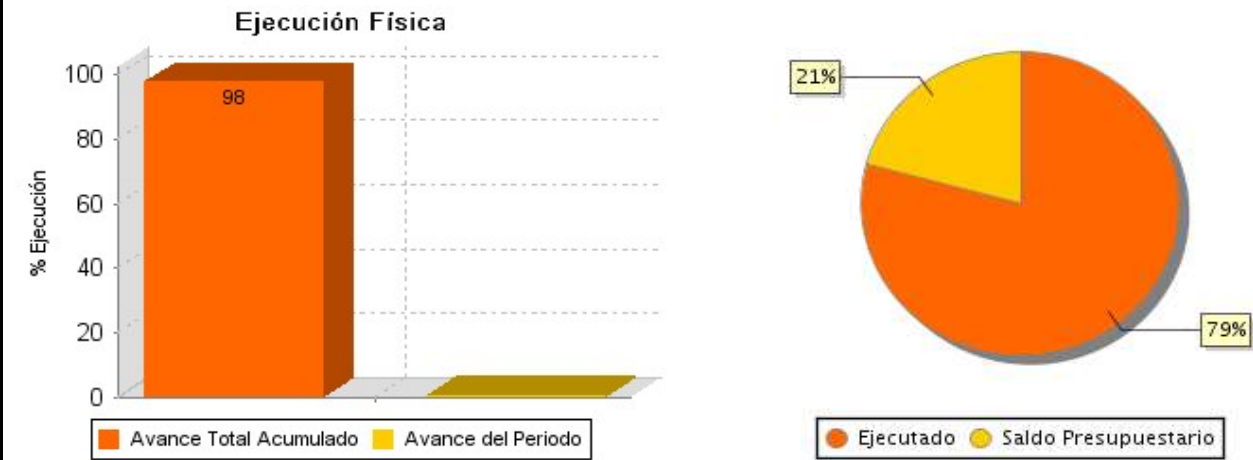


SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre la Unidad Ejecutora de Proyectos informó que se realizaron las siguientes actividades:

1. Codificación de las variables abiertas correspondientes al Censo Indígena
2. Codificación de las variables abiertas Censo Nacional 2022
3. Apoyo al Sistema Estadístico en Nomenclatura y Clasificaciones
4. Consistencia y validación de la base de datos del Censo Indígena.
5. Consistencia y validación de la base de datos del Censo Nacional
6. Estimación de indicadores demográficos
7. Elaboración de informes correspondientes a las tareas mensuales.

Proyecto	Mejoramiento de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agraria.				
OEE	INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA				
Código SNIP N°	786				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	20.000.000		GS.	134.303.639.056
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
27.827.254.049		106.476.385.007		20,72 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2022		24/04/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
7,18 %			23,40 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
13.610.868.800		7.147.195.276		52,51 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

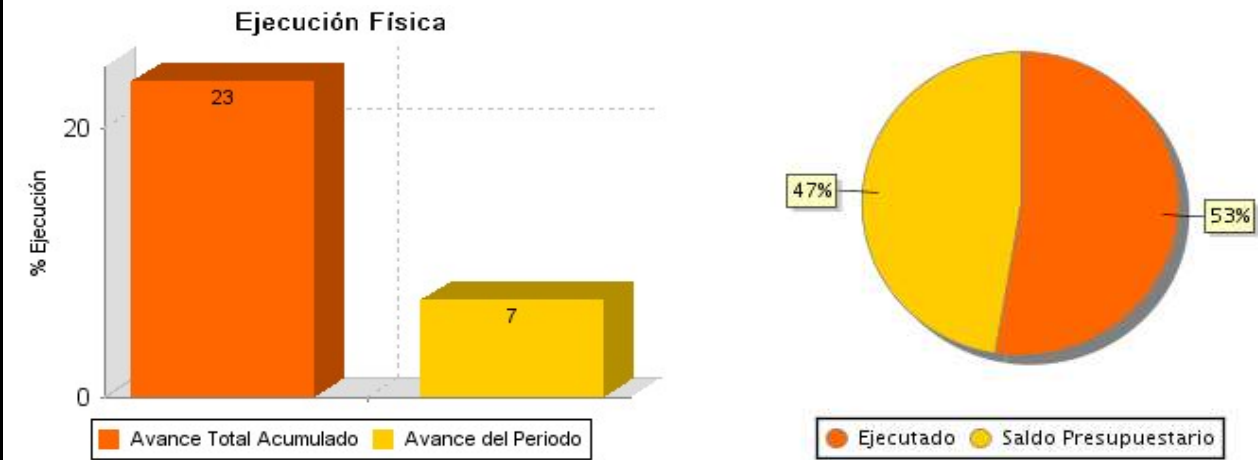

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de proyectos reportó que se Implementó el Sistema de Recursos Genéticos Operativos. Se realizó el pago por el servicio de alquiler de fotocopidora por medio del llamado ID: 420.945, por viáticos nacionales e internacionales, servicio de adquisición de pasajes aéreos (ID: 431.767).


Así también, se contrataron los siguientes profesionales, en Estadística y Diseño Experimental, en Mejoramiento Genético (SOJA), y (TRIGO), y en Biotecnología, en Ecofisiología de cultivo de soja y trigo, en Manejo de Pasturas, en Producción Animal. Igualmente, se realizó el pago de honorarios a consultores especializados en mejoramiento genético en soja y trigo. Además, al personal de apoyo de campo en la línea prioritaria para los cultivos de soja, trigo, arroz, en cultivos hortícolas, cultivos de la agricultura familiar y en sistemas pecuarios. Se gestionó la adquisición de equipos de protección individual a través del llamado ID: 452.261.

Se realizó el servicio de mantenimiento y reparación de alambrada de cerramiento, potreros y aguadas para el Centro de Investigación Ganadero Barrerito, por medio del llamado ID: 452.262. Se gestionó el servicio de consultoría para el relevamiento, diagnóstico, y elaboración de diseños arquitectónicos y proyectos ejecutivos de obras para los Centros de Investigación, (ID: 438.650), como también, contratación de póliza de seguros para maquinarias agrícolas, (ID: 454.573), y póliza de seguros para vehículos, (ID: 436.710).

Por otra parte, se efectuó el pago por el servicio de auditoria externa anual correspondiente al ejercicio 2023, como también de los servicios básicos y alquileres para el funcionamiento de la UEP.

Proyecto	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental				
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°	567				
Financiamiento	FIDA				
Costo del Proyecto	USD	22.468.000	GS.	121.400.000.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
83.769.211.498		37.630.788.502		69,00	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018		08/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
30,56 %			80,14 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
57.692.639.211		44.084.821.614		76,41	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

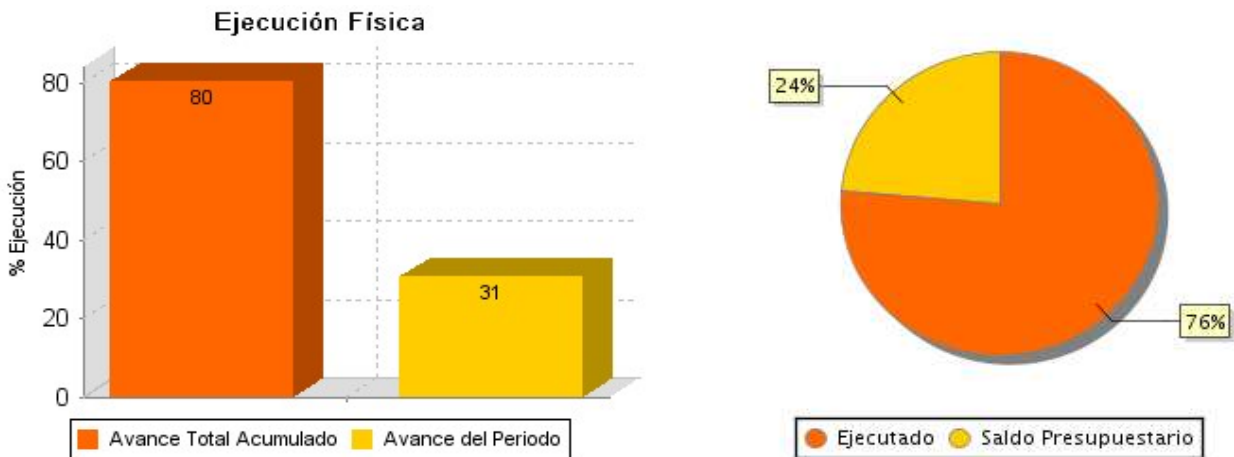


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre fueron aprobados 52 Planes y transferidos en los Dptos. de Caaguazú, San Pedro, Canindeyú y Concepción, beneficiando a 1904 productores de la Agricultura Familiar Campesina, de los cuales 1370 son mujeres y 534 son hombres.

Asi también, se entregaron maquinarias y equipos agricolas, como por ejemplo, tractor agrícola, sembradora, motocultores, forrajeras, motocarros, camiones recolector de leche, para animales menores como aves, producción de queso entre otros, como granos y huertas familiares.

Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales				
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°	664				
Financiamiento	KFW				
Costo del Proyecto	USD	8.463.250	GS.	52.082.839.992	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
14.403.174.798		37.679.665.194		27,65 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
13/09/2017		13/02/2022		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
30,06 %			54,28 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
11.705.947.396		9.299.922.901		79,45 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

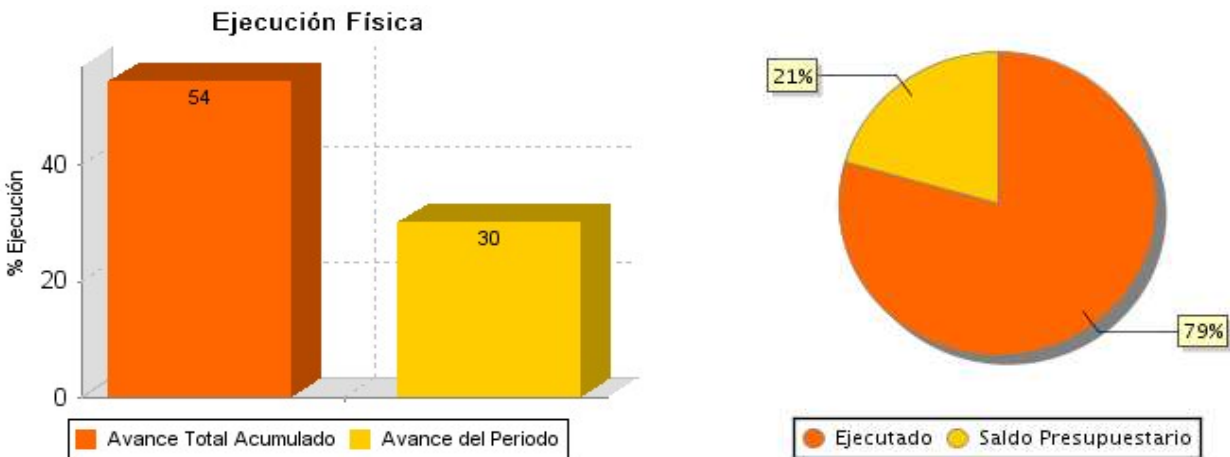

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se realizó la provisión de incentivos financieros para la adquisición de insumos técnicos, equipos e implementos a las organizaciones de la Agricultura Familiar para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada para las siguientes organizaciones:

Comité de Productores La Esperanza, Dpto. de San Pedro - Distrito Nueva Germania.

Comité Paz del Chaco, Dpto. de Caaguazu - Distrito San Joaquín.

Comité Pindo’i, Dpto. de Caazapá - Distrito San Juan Nepomuceno.

Comité de Agricultores Amistad, Dpto. de San Pedro - Distrito Tacuati.

Asociación de Productores Agrícolas de Carayao

Asociación de Productores Agropecuaria Kuarahu Rese, Dpto. de Caazapá - Distrito San Juan Nepomuceno.

Comité de Productores El Porvenir, Dpto. de Caazapá - Distrito San Juan Nepomuceno.

Comité de Productores Ñande Rekoha Moporavevo - Dpto San Pedro - Distrito Gral Aquino. Insumos técnicos

Comité de Productores Cuatro Bocas - Dpto. San Pedro - Itacurubi del Rosario.

Comité Virgen de Fátima - Dpto. San Pedro - Distrito San Estanislao.

Asi también, se realizaron capacitaciones dirigidas a técnicos extensionistas y productores beneficiarios sobre los siguientes temas:

Siembra directa y uso de sembradora y pulverizadora.


Capacitación, elaboración y aprobación de reglamento de uso de maquinarias e implementos y la propuesta de producción en el marco del proyecto.

Capacitación sobre uso correcto de fertilizantes, cal agrícola implementación de análisis de suelo.

Capacitación sobre rendición de cuentas documentaciones a las siguientes organizaciones:

Proyecto		Censo y Encuestas Agropecuarias				
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°		714				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	12.315.661		GS.	109.893.595.654.
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
76.719.232.361			33.174.363.293		69,81	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/05/2019			25/05/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
3,40 %				82,41 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
11.970.688.451			7.270.471.379		60,74	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

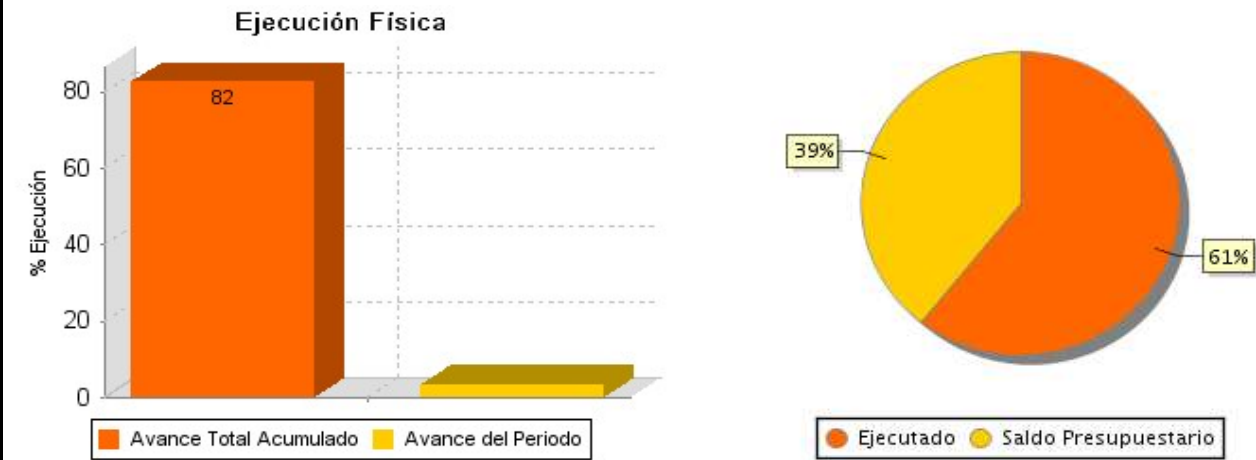

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se publicó el geoportal estadístico y de los microdatos basados en los resultados del CAN 2022. Así también, se adquirió el terreno en el cual se asienta la Dirección de Censo y Estadística Agropecuaria.

Además, prosiguen los trabajos relacionados al nuevo contrato para la consultoría sobre desarrollo del modelo de uso de Imágenes satelitales; se realizó la firma de contrato con la firma responsable de la gestión de recursos humanos para el operativo de campo de la Encuesta Nacional Agropecuaria.

Por otro lado, se realizó la evaluación y selección de oferentes para la consultoría relacionada a los tres estudios temáticos basados en los resultados del CAN 2022; igualmente, se cumplieron con los compromisos contractuales correspondientes al ejercicio 2024, relacionado a la Auditoría financiera del proyecto.

Proyecto		Mejoramiento de inserción a mercados Región Oriental y Occidental			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		904			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	100.000.000	GS.	635.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
362.839.609.879		272.160.390.121		57,14 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020		30/06/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
15,04 %			76,71 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
80.879.159.805		52.038.772.910		64,34 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

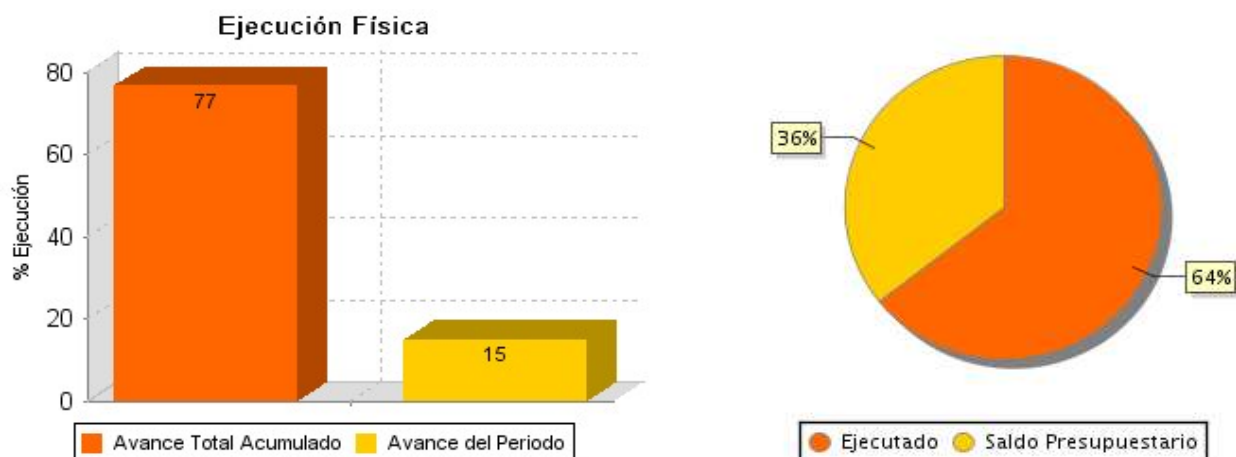


SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre se financiaron con transferencias de fondos a 27 subproyectos de inversión y beneficiaron a 1.271 productores agrarios (536 mujeres y 735 varones) en los Departamentos de: Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Central, Cordillera, Guairá, Ñeembucú, Paraguarí y San Pedro, destinados a la producción de granos, producción frutihortícola, caña de azúcar, ferias agropecuarias, leche, frutilla.

[illegible]

Proyecto		Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar					
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA					
Código SNIP N°		984					
Financiamiento		COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	13.500.000		GS.	94.500.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
67.437.593.733			27.062.406.267			71,36 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
25/10/2022			25/12/2025			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
20,57 %				47,96 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
36.532.708.539			36.350.149.665			99,50 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

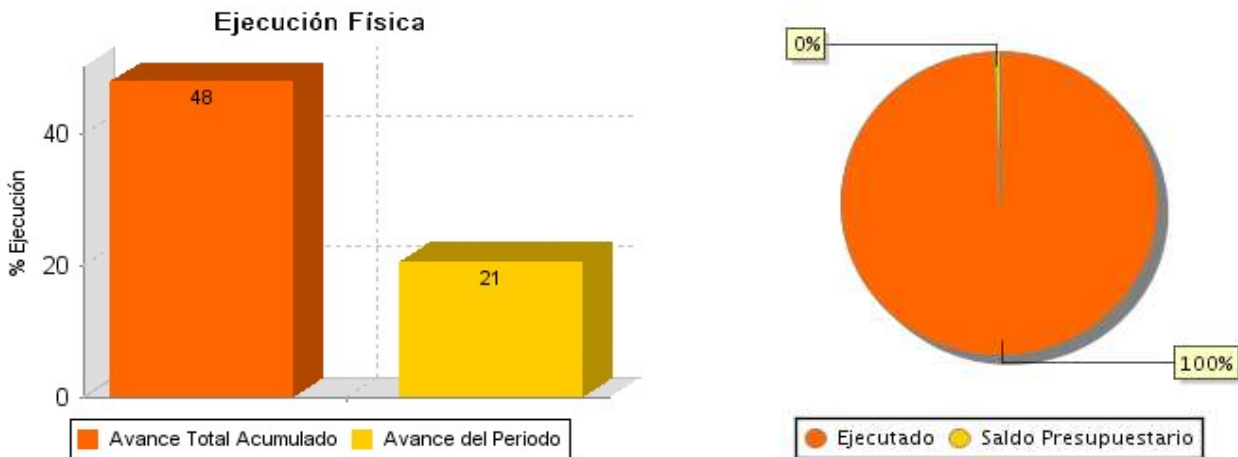


SITUACIÓN ACTUAL

La UEP reportó que en el tercer cuatrimestre fueron aprobados 54 proyectos productivos, en los Departamentos de Ñeembucú, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Misiones, Paraguari y San Pedro, dando cobertura a 3.472 productores de la Agricultura Familiar Campesina. Al respecto, los bienes e insumos entregados a las organizaciones beneficiarias contemplan los rubros de semillas (maiz, soja, tomate, locote, pimiento, lecguga, zanahoria, repollo, remolacha, perejil y cebolla), fertilizantes (granulados, foliar, bio estimulantes), insumos agricolas (malla media sombre, cinta de riego por goteo, mulching, bandeja de germinacion, tejido de alambre), maquinarias e implementos (forrejera, incubadora, generador, motocultivador, tablonera, carrito para motocultivador, desmalezadora), kit de produccion avicola, tractor agricola, rastra aradora, sembradora, trilladora de granos, fumigadora a motor, perforacion y equipamiento de pozo artesiano y tanque tipo copa de 15.000 litros. Por otro lado, 2 organizaciones de los Departamentos de San Pedro y Canindeyu recibieron transferencias de recursos, mientras que 52 se encuentran en proceso de transferencia.

Proyecto	Ampliación, Reparacion de 22 Establecimientos Educativos Asunción 17 Departamentos.				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	325				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	578.568.001.943
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
538.114.977.416		40.453.024.527		93,01	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/09/2014		11/09/2017		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
8,50 %			98,02 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
63.733.322.069		24.002.749.947		37,66	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

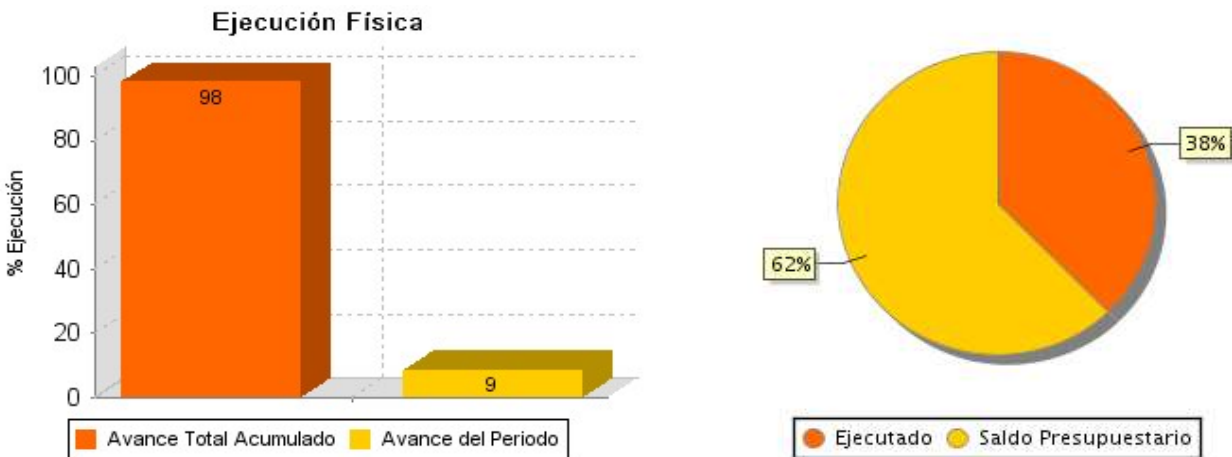


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme a la Resolución CAFEEI N° 13/24 del 10 de diciembre de 2024,se aprobó la prórroga de plazo del proyecto hasta el 31/12/2025. En el presente cuatrimestre se realizó la fiscalización y supervisión de obras en 24 establecimientos educativos terminados con sus respectivas actas de recepción definitiva, en los siguientes Departamentos de: Concepción con 12 (doce) Instituciones Escolares, Canindeyú con 12 (doce) Instituciones Escolares. Asi mismo,las obras se detallan a continuación: Aula Simple, Aula Simple con sanitarios, Aula Doble, Aula Doble con sanitarios, Aula Doble y Aula Simple, Aula general doble, sanitarios diferenciado e inclusivo, Aula doble 1° ciclo Enseñanza Escolar Basica (EEB) con sanitario integrado, Aula general simple, Bloque de Aula Simple. Por otro lado,se entregaron muebles de equipamiento en 24 Instituciones Escolares correspondientes al Lote N° 2 (Empresa Maq. Py) ; los mismos son los siguientes; Armario con puerta y sin puerta, Estante multiuso, Mueble de apoyo para docente, Escritorio para docente, Mesa de reunión, Silla estándar para docente, Mesa comedor, Silla 1° y 2° ciclo de la EEB para alumno, Silla EB 2° y 3° ciclo de la EEB para alumno, Mesa EB 1° ciclo EEB Mesa individual para alumno, Mesa EB 2° y 3° ciclo EEB Mesa individual para alumno.

Proyecto		Ampliación en la atención Educativa desde la Gestación hasta 5 años			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		388			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 591.638.288.812
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
426.554.578.318		165.083.710.494			72,10 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/05/2015		31/12/2018			30/06/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
8,41 %				81,27 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
72.639.815.853		55.110.086.084			75,87 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

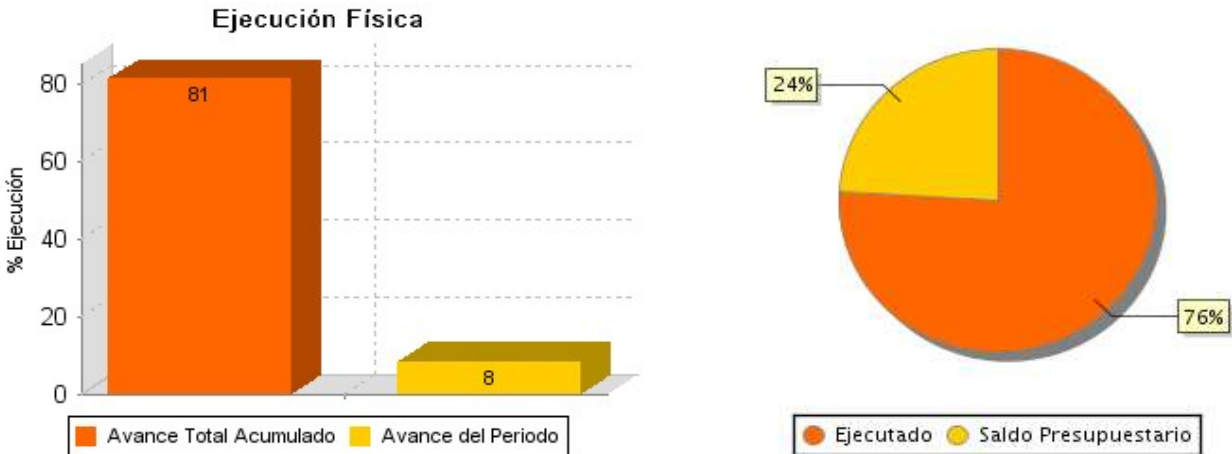


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que adjudicaron 60 obras mediante la licitación ID N° 444.094 para la construcción de nuevos espacios educativos en instituciones indígenas y no indígenas, para primera infancia, en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Central, Canindeyú, Boquerón, Presidente Hayes, Alto Paraguay. Así también se adjudicó el llamado con ID N° 444.090 para dar continuidad a la construcción de 32 obras en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Ñeembucú y Canindeyú, las mismas formaban parte del llamado ID 406.738, cuyos contratos fueron rescindidos. Por otra parte, se dió continuidad a los talleres y asesoramiento pedagógico realizado por la instancia misional. Se aprobó el informe de auditoría y se desembolsaron los pagos correspondientes. Además, se realizó el pago final a la firma encargada de la entrega y distribución de materiales didácticos.

Asi también, se entregaron kits para tres espacios instalados en contextos de encierro y 58 espacios ubicadas en 50 instituciones educativas localizadas en Asunción y los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Canindeyú y Presidente Hayes.

Proyecto		Investigación Evaluación estandarizadas de desempeño a estudiantes			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		389			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 76.913.289.274
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
63.134.594.212		13.778.695.062		82,09 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
30/12/2014		30/12/2021		31/12/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			97,85 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
1.250.000.000		965.395.958		77,23 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

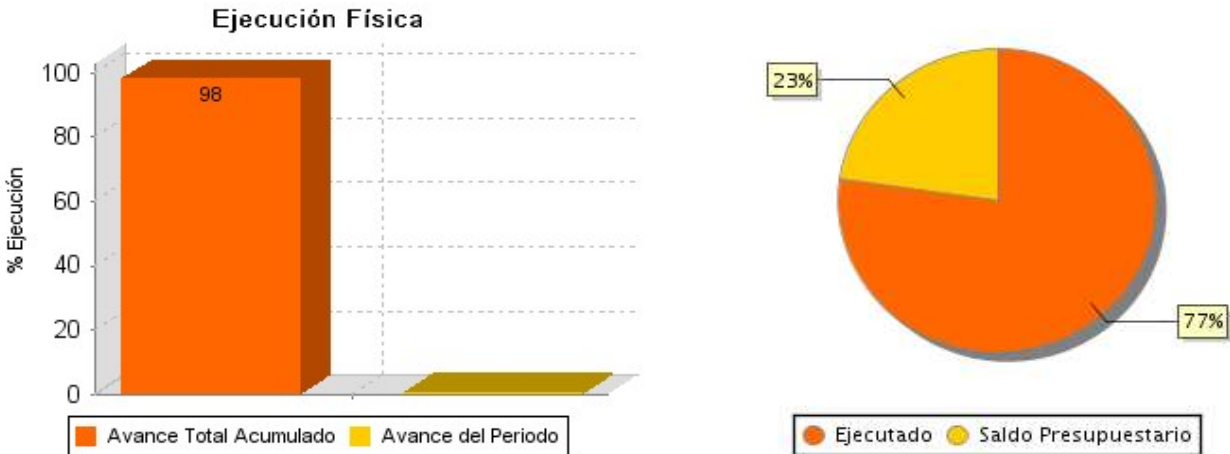


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme a la Resolución CAFEEI N° 07/24 del 20 de agosto de 2024, se aprobó la prórroga de plazo del proyecto hasta el 31/07/2027 y extensión de monto en GS. 76.913.289.274.

La Unidad Ejecutora de proyectos reportó que se realizó la corrección de los instrumentos de conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias. Además, se realizaron las correcciones de los ítems abiertos y el procesamiento de los datos recolectados.

Proyecto	Mejoramiento de condiciones de aprendizaje con incorporación de TIC				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	394				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	639.856.204.101
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
617.035.220.690		22.820.983.411		96,43 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/11/2015		25/12/2019		30/6/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,84 %			79,36 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
43.051.032.610		37.229.741.878		86,48 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

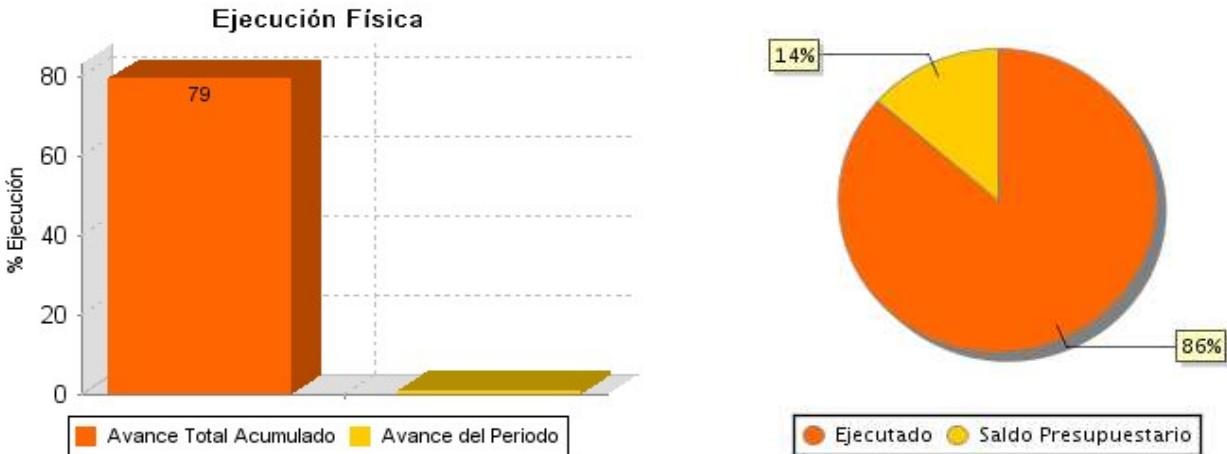


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme a la Resolución CAFEEI N° 08/24 del 20 de agosto de 2024 se aprobó la extensión de plazo del proyecto hasta el 30/06/2026. La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que finalizó el curso de capacitación "Gestores TIC institucionales capacitados para la gestión de la incorporación de TIC,y la asistencia técnica y el mantenimiento básico de equipamientos en instituciones educativas,con 1834 docentes capacitados. Asi también, se realizaron los pagos por servicio trimestral de internet satelital a través del llamado ID N°419352, en 157 instituciones educativas,servicio de internet por fibra óptica, por medio del llamado ID N° 419295 a 90 instituciones,por servicio de mantenimiento preventivo de equipamientonto de infraestructura tecnológica en 512 instituciones educativas.

Proyecto		Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		570			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	19.720.000	GS.	141.761.952.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
109.415.187.740		32.346.765.060		77,18 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/6/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
23,97 %			81,40 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
26.356.513.992		17.558.268.828		66,62 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

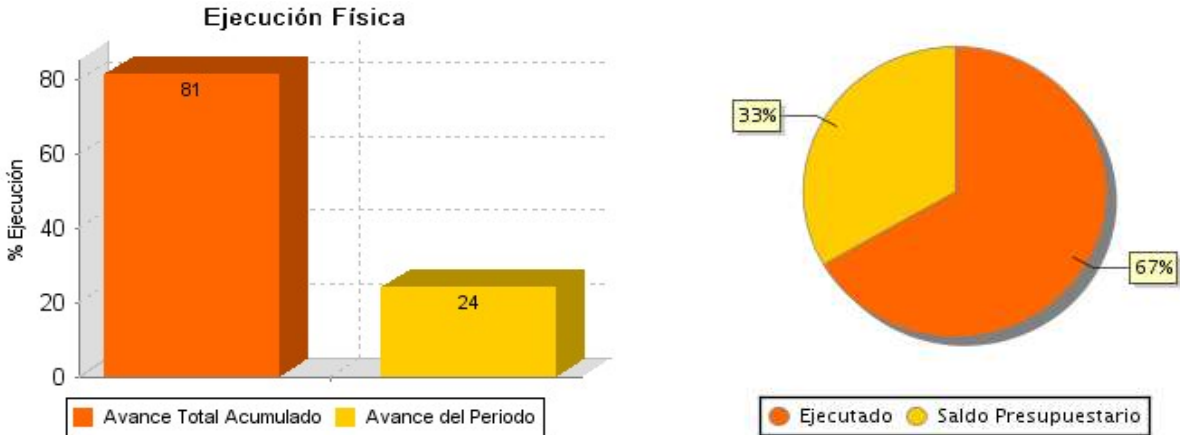

SITUACIÓN ACTUAL

En el tercer cuatrimestre de 2024 se encuentran en ejecución los contratos para la edición de contenidos de cuadernos de aprendizaje y guías didácticas del 1º al 6º grado de la Enseñanza Escolar Básica (EEB), así como la elaboración de materiales educativos para el 1º y 2º grado de la EEB. También está vigente el contrato con CCPA para la implementación del programa "Inglés sin límites". Se procesó el pago a la empresa Mercurio (ID 424449) por el servicio de impresión de materiales didácticos para el 1º y 2º ciclo de la (EEB), y continúa el convenio con DINACOPA para la distribución de materiales didácticos en la Capital y en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay.


Así también, se encuentra en ejecución el contrato con la Fundación Dequení para la implementación del servicio de tutorías remotas en matemáticas, en 200 instituciones educativas del país con la participación de estudiantes del 2º ciclo de la EEB. Asimismo, se cuenta con un contrato con la misma fundación para tutorías remotas en lengua castellana en 57 instituciones educativas del 1º y 2º Ciclo de la EEB, en ejecución el contrato N° 34/2023 con la firma Econometría S.A. para la consultoría de evaluación de impacto (ID 424452), con PETROPAR y el alquiler de oficinas.

El llamado para la adquisición de libros de biblioteca en aula en instituciones educativas focalizadas (ID 454088) ya fue adjudicado. Los proveedores adjudicados incluyen Librería Intercontinental, Servilibro, Atlas Representaciones, Editorial en Alianza, entre otros.

Por otro lado, se realizaron pagos por movilidad a funcionarios del MEC para el seguimiento a los equipos de gestión de instituciones educativas en diversas regiones del país, incluyendo Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Caazapá, Itapúa, Misiones, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Además, se encuentra en ejecución el llamado para la contratación de profesionales para la fiscalización de las adecuaciones menores de espacios en el marco del programa "Cocinando en la Escuela", así como el llamado ID 444795 para la adquisición de equipamientos de cocina y adecuaciones menores en 90 instituciones educativas de todo el país.

Proyecto	Fomento y apoyo operativo para la ejecución de proyectos del MEC					
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS					
Código SNIP N°	709					
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.					
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	58.994.841.017	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
50.558.362.353		8.436.478.664			85,70 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
31/01/2017		30/06/2019			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
9,85 %				86,96 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
10.016.360.000		6.578.264.246			65,68 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

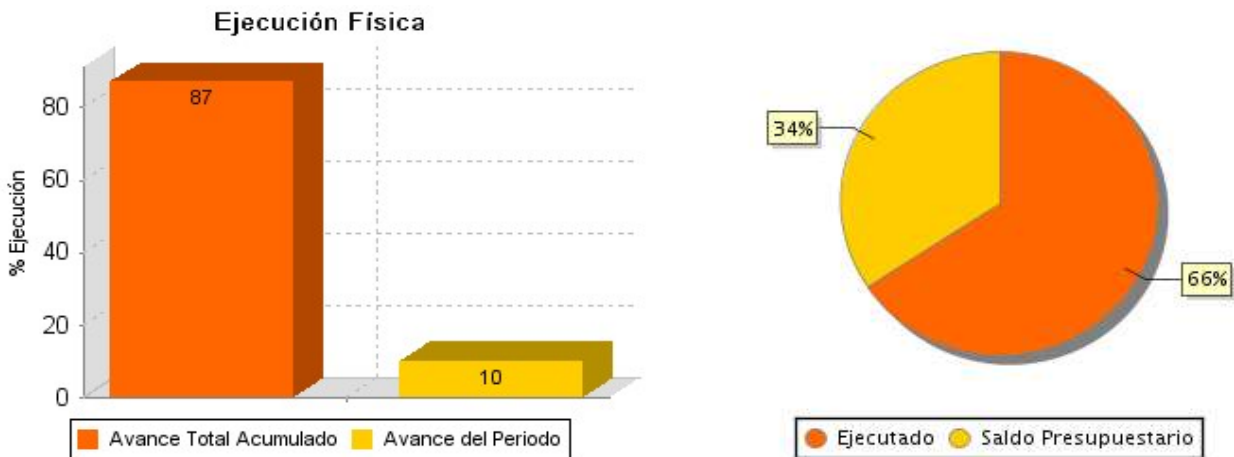

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se abonaron siete convenios marcos para “Útiles de oficina y productos de papel ” con las empresas Álamo S.A., Carlos Gabriel Sánchez Sartorio, In Design S.R.L., Bringco S.A., Nazareno Comercial e Industrial S.R.L., y Dalmi S.R.L. También se efectuó el pago del consumo de combustible correspondiente a los meses reportados a la empresa Petropar.


Se llevó a cabo el monitoreo a las instituciones de Presidente Hayes, focalizadas por los programas y proyectos de la UEPP. Además,se modificaron y extendieron los plazos de varios programas y proyectos aprobados por el FEEI, tales como las Evaluaciones Estandarizadas de Desempeño de los Estudiantes en Áreas Curriculares a Nivel Nacional, el diseño del Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP), el Mejoramiento de las Condiciones de Aprendizaje mediante TIC, y el proyecto de Ampliación y Reposición de Espacios Escolares en 822 Establecimientos Educativos del MEC. También se presentó el informe trimestral.

De igual manera,se realizaron los pagos correspondientes al personal contratado y comisionado que forma parte de la UEPP, incluyendo la Coordinación de Apoyo a la Gestión, la Coordinación de Administración y Finanzas, la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones, la Coordinación de Infraestructura, la Coordinación de Proyectos de Formación Docente,especialistas en Infraestructura, el coordinador para el proyecto TAPE, y el personal de apoyo en asesoría, adquisiciones,contrataciones y apoyo general.

Así también, se efectuaron los pagos correspondientes a los contratos de servicios de mantenimiento de aires acondicionados, vehículos y limpieza,servicios básicos (luz y agua) ,alquiler de las oficinas administrativas de la UEPP, ubicadas en el Edificio Presto, correspondiente a los últimos tres meses de 2024.

Proyecto	Mejoramiento de infraestura y equipamiento de Colegios Técnicos				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	972				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	202.172.259.397
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
11.938.921.451		190.233.337.946			5,91 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
21/01/2022		31/07/2025			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,42 %			3,57 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
58.455.292.815		11.064.552.713			18,93 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

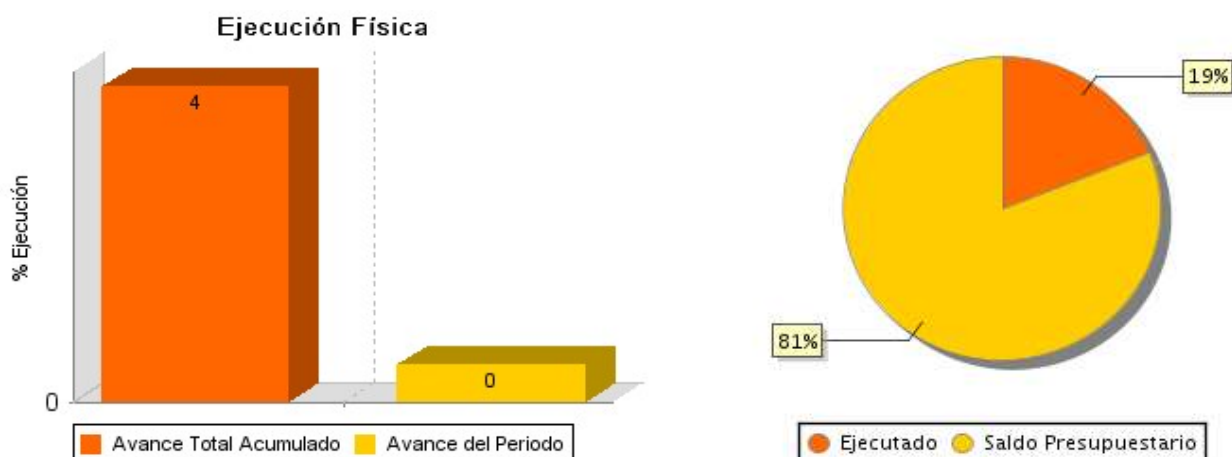


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron trabajos de verificación de planos, para el relevamiento de 151 espacios educativos en los Dptos. de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guaira, Paraguairí, Central, Amambay, Canindeyú.

[illegible]

Proyecto		Capacitación de las competencias profesionales de educadores				
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°		1071				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	175.000.000.000
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
15.058.039.230			159.941.960.770			8,60 %
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
21/04/2023			21/04/2026			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
25,67 %				29,81 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
37.490.000.000			15.058.039.230			40,17 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

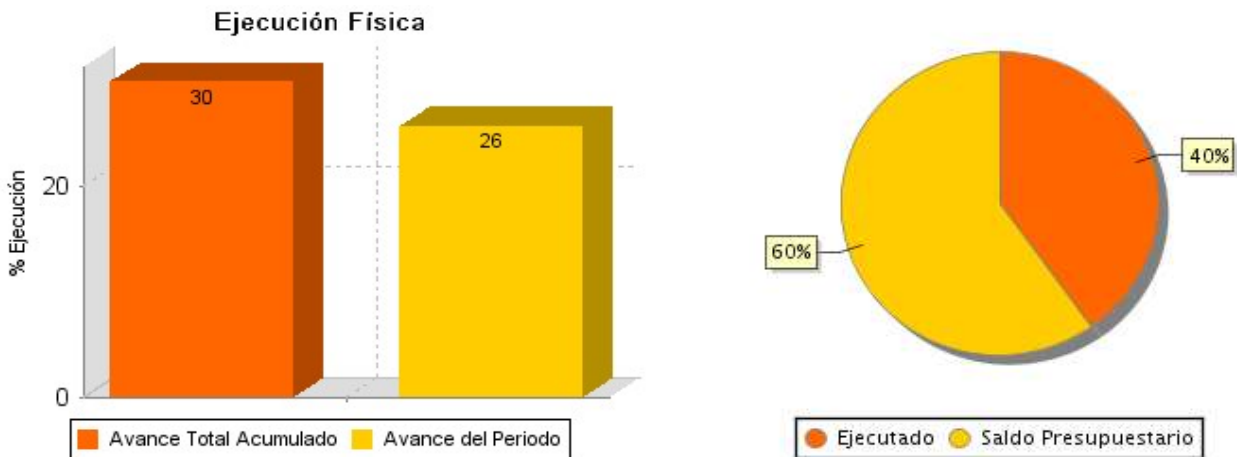

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora reportó que concluyó el segundo módulo del curso de "Capacitación para la didáctica de las matemáticas", dirigido a 2.250 docentes de educación inicial y 3.000 docentes del 1er. y 2do. ciclo de la Educación Escolar Básica, de instituciones educativas del sector oficial a nivel país. Este curso se desarrolló de manera íntegramente a distancia a través de la plataforma digital de la institución formadora.

Asi también, inició el curso de: "Formación Docente sobre intervención temprana para el desarrollo de lenguaje oral en el nivel inicial", con la formación presencial, que incluyó la primera "formación de formadores" dirigida a 200 técnicos docentes del sector oficial a nivel país.

Por otro lado,inició el proceso de llamado: "Contratación de una entidad de formación o actualización para la implementación de un Programa de Formación a Educadores para la aplicación del proceso de orientación profesional en bachillerato técnico de la Educación Media",dirigido a 8000 educadores (directivos, técnicos y docentes) de 100 instituciones educativas a nivel nacional.

Proyecto	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py				
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
Código SNIP N°	707				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	10.000.000		GS.	68.919.969.211
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
49.093.348.688		19.826.620.523		71,23 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
03/07/2018		03/07/2023		3/7/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			74,79 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
17.007.122.600		15.392.003.302		90,50 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

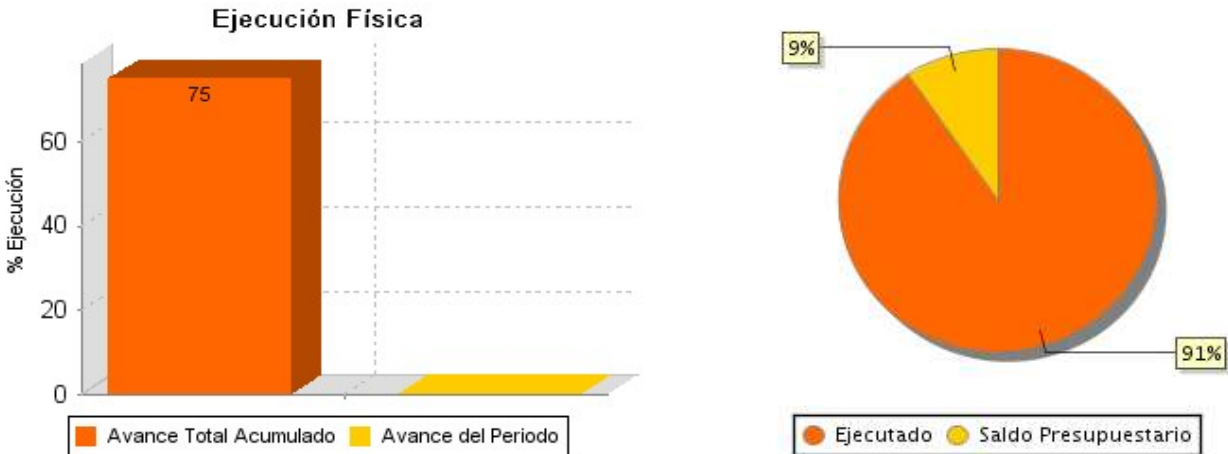


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se realizó el cierre del taller sobre atención al inversionista, con certificación de 28 funcionarios públicos.

Proyecto		Construcción de una red para instituciones educativas							
OEE		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN							
Código SNIP N°		856							
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.							
Costo del Proyecto		USD		62.145.436		GS.		386.171.739.304	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
226.453.022.196			159.718.717.108			58,64 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
16/04/2020			16/04/2025			N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Nacional		N/A							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
1,32 %					68,45 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado			
130.764.660.435			28.476.682.888			21,78 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

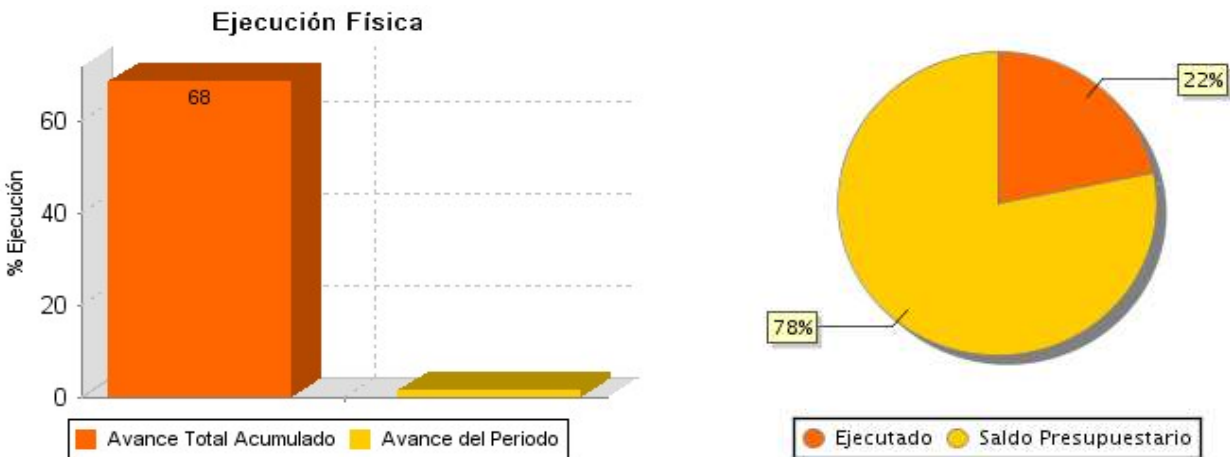

SITUACIÓN ACTUAL


En el tercer cuatrimestre se continuó con la implementación de los servicios de conectividad en establecimientos educativos, a traves de los convenios con COPACO y CONATEL.

Así también se realizó tareas de fiscalizaciones in situ, de soporte y mantenimiento de equipos instalados. Se presentó el Informe final de la Evaluación Intermedia del Proyecto.

Por otro lado,el proyecto ha sido reformulado según Resolución CAFEEI N° 15/2024 de fecha 10 de diciembre de 2024, principalmente se realizó una redistribución de saldos entre componentes y actividades, y la inclusión del Componente 7. Incorporación de habilidades TIC.

Proyecto		SP Construcción Avda Costanera, Centro Histórico y Parque Bicentenario.					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		67					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	533.875.437.551	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
434.975.445.393			98.899.992.158			81,48 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2012			31/12/2023			31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional	N/A						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,66		%		99,65		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
4.679.781.487			3.881.383.738			82,94 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

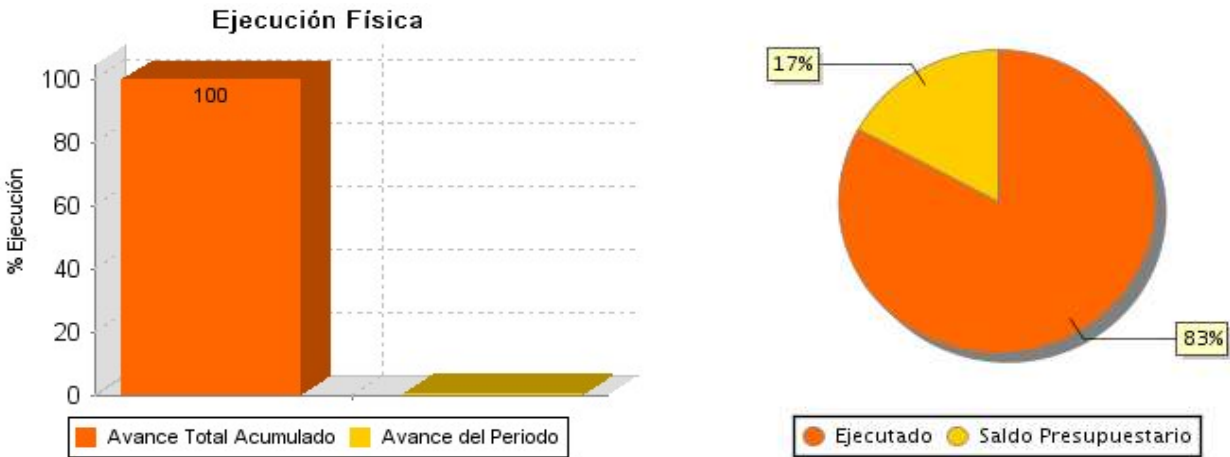


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de construcción y equipamiento del Parque Lineal, Segunda Etapa se encuentran culminadas por lo que se ha iniciado los trámites correspondientes para dar la Recepción Definitiva con fecha estimada el 3 de junio del 2025, en atención a lo establecido en la Cláusula 47 "Recepción Definiva de Obras" de las Condiciones Generales del Contrato.

Proyecto		SP Reconversión Centro Oficina Zona Puerto de Asunción, Centro Oficinas Cont CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR.				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		83				
Financiamiento		BID , LOCAL, OFID				
Costo del Proyecto		USD	199.000.000		GS.	1.102.749.246.391
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.105.183.337.703			-2.434.091.312		100,22	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/12/2013			27/12/2018		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
2,03 %				59,81 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
50.509.774.032			47.434.091.312		93,91	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

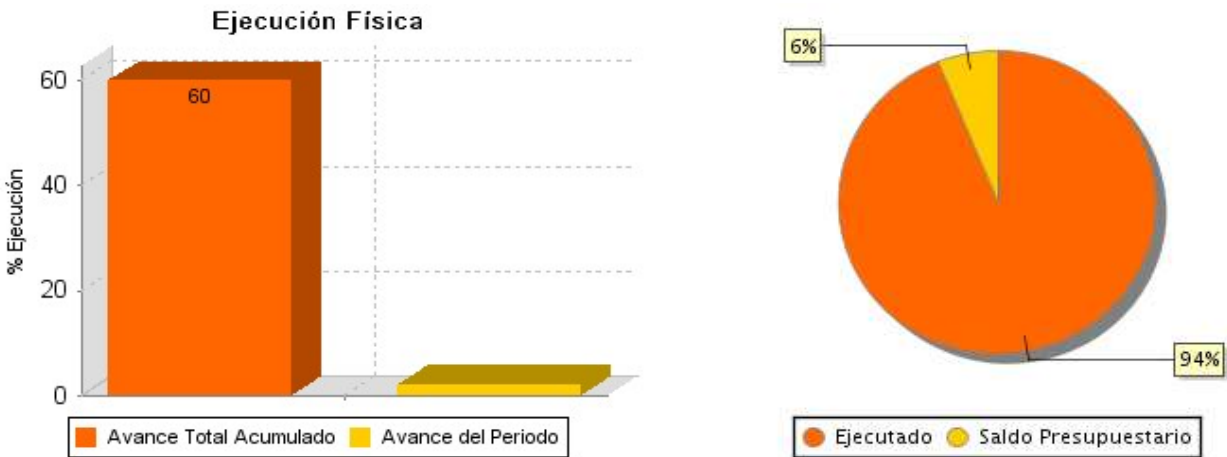


SITUACIÓN ACTUAL

La obras de Restauración del Edificio Histórico del Puerto de Asunción cuentan con recepción definitiva. El edificio fue entregado en fecha 31 de enero del 2024, por Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), a la Secretaria Nacional de Cultura (SNC).

Las obras de las Oficinas de Gobierno, auditorio, comedor, subsuelo y el eje cívico, han sido culminadas, sigue pendiente la aprobación final de toda la obra por parte de la Municipalidad de Asunción hasta tanto se realicen la implementación de las medidas de mitigación de acceso vial y tránsito ordenadas por la misma. Quedan pendientes pagos en concepto de IVA y de Intereses Moratorios, para el próximo año. La obra de línea de 23.000 Voltios cuenta con recepción provisoria. Por su parte, el proceso de Arbitraje Internacional con respecto al Programa BTR, ya está concluido, la Procuraduría General de la República (PGR), comunicó que apelaría la decisión del Juzgado Internacional.


Proyecto	SP Mejoramiento de Travesías Urbanas de las ciudaddes de Paraguari-Carapegua- Quiindy-Caapucu.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	91				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	153.606.820.275
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
156.447.453.615		2.840.633.340		102%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
N/A		N/A		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Caapucú, Carapeguá, Paraguarí, Quiindy				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
530.823.440		486.995.197		91,74 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

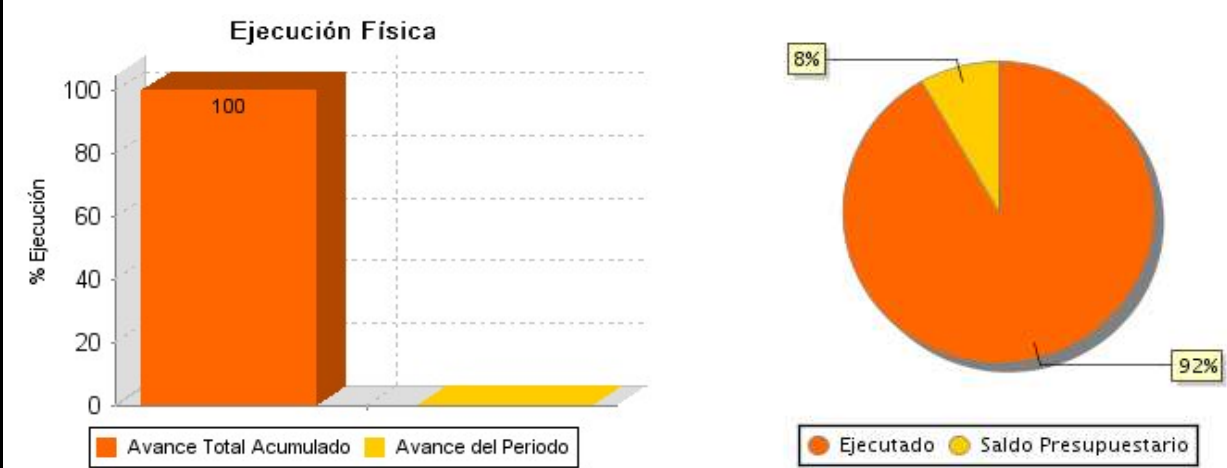

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han culminado, se ha procedido al pago de indemnizaciones por las obras realizadas. Cabe mencionar que el proyecto inició su ejecución antes de la entrada en vigencia del SNIP.


 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública			
Proyecto		SP Programa de Saneamiento y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias.			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		149			
Financiamiento		AECID, BID , LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	88.000.000	GS.	635.532.769.647
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
579.293.637.140		56.239.132.507		91,15 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/11/2012		23/11/2017		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,69 %			93,24 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
88.215.104.231		43.931.741.317		49,80 %	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO					
Ejecución Física  Avance Total Acumulado Avance del Periodo  50% 50% Ejecutado Saldo Presupuestario					
SITUACIÓN ACTUAL					
Las obras de “Construcción Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central” cuentan con recepción definitiva, según acta de fecha 21/04/2023.					
Las obras de “Construcción de Redes de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Indígenas y Localidades Menores Beneficiarias del Proyecto del Acueducto del Chaco Central; se ha realizado un ajuste aporte local por USD 10.859, esta obra se encuentra concluida.					
En cuanto a la Infraestructura para Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias:					
1. En cuanto a la obra de la Obra Ciudad de Caacupé: Avances acumulados registrados al cierre del 3er cuatrimestre 2024: la construcción de la PTAR registra los siguientes avances: Tratamiento preliminar 100%, Lagunas artificiales 100%, Obras civiles 100%, Servicio de agua potable 100%, Desagüe pluvial 80%, Humedales artificiales 95%, Empastado 95%, Cercado perimetral 60% Construcción redes nuevas: 100%. Construcción de Línea de Impulsión: 95% (cruce con tunelera: 100%, tendido de tuberías 98%, registros construidos 80%), Estaciones de Bombeo: EB1: 20%, EB2: 95%, EB Intermedia: 5%, Conexiones Domiciliarias: 2400 de 2800 previstas. //					
2. Frente de Obra Ciudad de Tobati: Avances acumulados registrados al cierre del 3er cuatrimestre 2024: Redes Básica: 87.5%, Redes Condominiales: 86,9%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión 20,2%, PTAR: 30,15% (se financiará con contrapartida local).					
3. Obras en la ciudad de Horqueta: el avance en la ejecución acumulada fueron los siguientes.: Redes Básicas 106%, Redes Condominiales 109%, Mejoramiento del Agua 100%, PTAR 100%, Estaciones de Bombeo N° 1= 100% y N°5= 100%. se realizaron los trabajos de arborización en zona de la PTAR y el acto de inauguración oficial se realizó el 22/11/2024. Al cierre del 3er cuatrimestre se cuenta con 620 conexiones efectivas al sistema de alcantarillado sanitario. Se han iniciado los trámites inherentes al traspaso del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Redes y PTAR) a la Junta de Saneamiento de San Antonio que será la responsable de la Operación y mantenimiento del Sistema, dicho trámite se encuentra en revisión en la DAPSAN.					

Proyecto	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	154			
Financiamiento	BID , JICA , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	332.984.000	GS.	2.026.829.087.180
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.612.207.432.873		414.621.654.307		79,54 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/10/2014		28/10/2021		28/10/2024

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Alto Paraná, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
2,84 %			93,14 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado
202.431.062.324		171.288.101.999		84,62 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

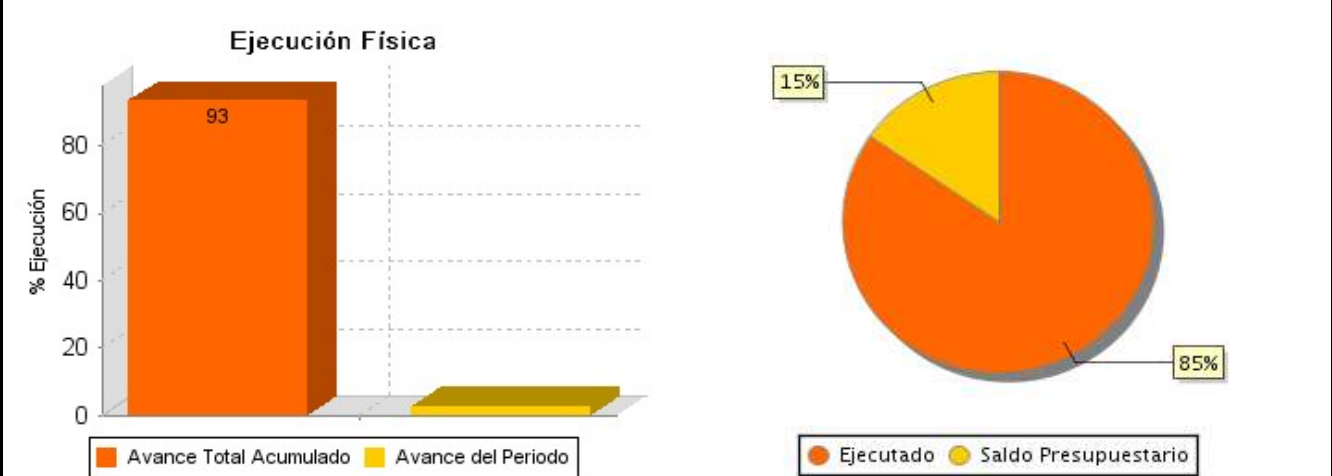

SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre se encuentra en ejecución las dos últimas actividades del proyecto.


1. El Mejoramiento del tramo Kimex (Ruta PY 06) - Frutika - Carlos Antonio López: se encuentra ejecución, se avanzó 10,05 km en la carpeta asfáltica, también se avanzó en obras de drenaje, señalizaciones y también en la construcción de dos puentes que forma parte del tramo principal de 10 y 25 ml.

2. La Pavimentación Asfáltica del Acceso al Puerto de Paredón en Honeau, que se encuentra en proceso licitatorio.

Cabe mencionar, que la mayor intervención del proyecto es la rehabilitación a lo largo de la Ruta PY 06 (Encarnación - Cedrales), actualmente se encuentran culminadas y forma parte del gran corredor de exportación.

Proyecto		Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		162			
Financiamiento		CAF, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	285.000.000	GS.	1.643.841.538.888
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
1.470.069.736.970		173.771.801.918			89,43 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
29/10/2014		31/12/2018			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Ñeembucú, Chaco				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,06 %			92,95 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
121.907.854.059		52.318.369.365			42,92 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

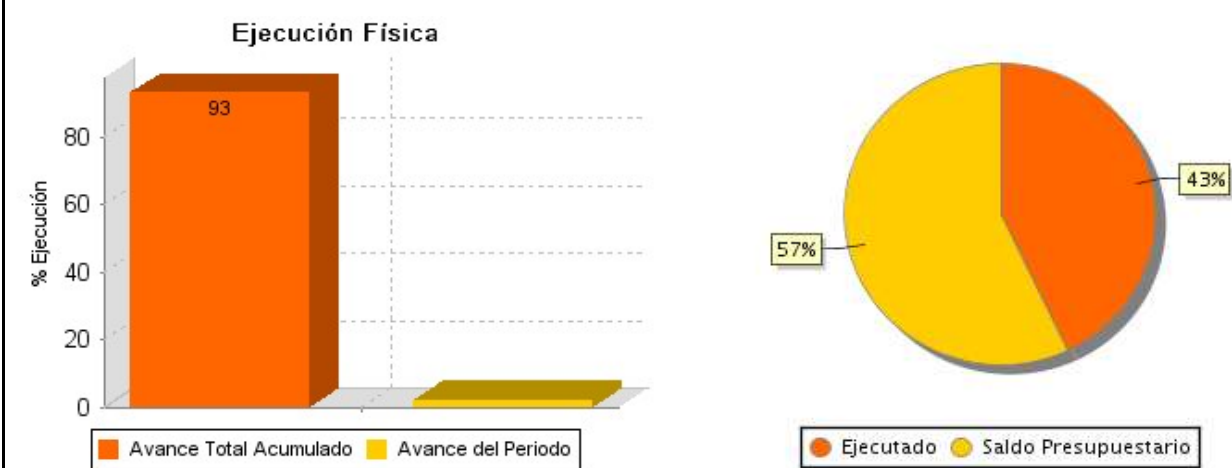

SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre, quedan 5 actividades pendientes de culminación y presentan los siguientes avances:

1. Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) de la Ruta PY 09 del tramo Mcal. Estigarribia - La Patria de 57,9 km, la misma se encuentra en etapa de mantenimiento; con limpieza de la franja de dominio y de exceso de vegetal; también sellado de fisuras y bacheo superficial.

2. Construcción de la Circunvalación a la ciudad de Curuguaty de 6,8 km; se encuentra en ejecución con movimiento de suelo y sub base granular, pero presenta retraso debido a que no se ha liberado completamente la franja de dominio.

3. Construcción de puestos de Peaje, Báscula y Caseta de Control Policial en los siguientes tramos: a) Desvío Villeta - Alberdi: en etapa de liberación de franja de dominio. b) Curuguaty - Villa Ygatimí - Ypejhu: en proceso de licitación.

4. Construcción de obras complementarias para el mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Km 40 - Alberdi ; la misma ha culminado y ya cuenta recepción provisoria.

5. Rehabilitación y Mantenimiento por precios unitarios de los siguientes tramos: a) Ruta PY 19 Villeta - Km 40 - Alberdi de 68,70 km, no ha presentado avance, debido a que continua en etapa de elaboración del PBC. b) Ruta PY 13 Curuguaty - Villa Ygatimí - Ypejhu de 182 km, también se encuentra en etapa de elaboración del PBC. c) Ruta PY 09 Mcal. Estigarribia - La Patria - Infante Rivarola, no presentaron avance, continúa en etapa de elaboración del PBC.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		259					
Financiamiento		FONPLATA, LOCAL, OFID					
Costo del Proyecto		USD	125.250.000		GS.	1.129.367.243.085	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
1.067.650.902.063			61.716.341.022			94,54 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/05/2016			22/06/2021			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Alberdi, Guazú Cuá, Pilar, San Juan B. de Ñeembucú, Villa Franca						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,25 %				95,03 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
88.863.987.642			42.807.646.209			48,17 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo, se reporta que la Obra 1: que abarca desde el desvío de Alberdi hasta el Río Tebicuary y la travesía urbana de Villa Franca, se encuentra en etapa de recepción provisoria con obras culminadas. Se espera contar con la recepción final en el año 2025. Con respecto a la Obra 2: Que se extiende desde el Río Tebicuary hasta Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar, la misma cuenta con Recepción Final.

Proyecto		Construcción del CIRS de Emboscada			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		273			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	49.800.000	GS.	278.880.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
172.884.330.756		105.995.669.244		61,99 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/02/2016		16/02/2018		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción, Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			89,75 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
8.838.872.131		3.820.461.629		43,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

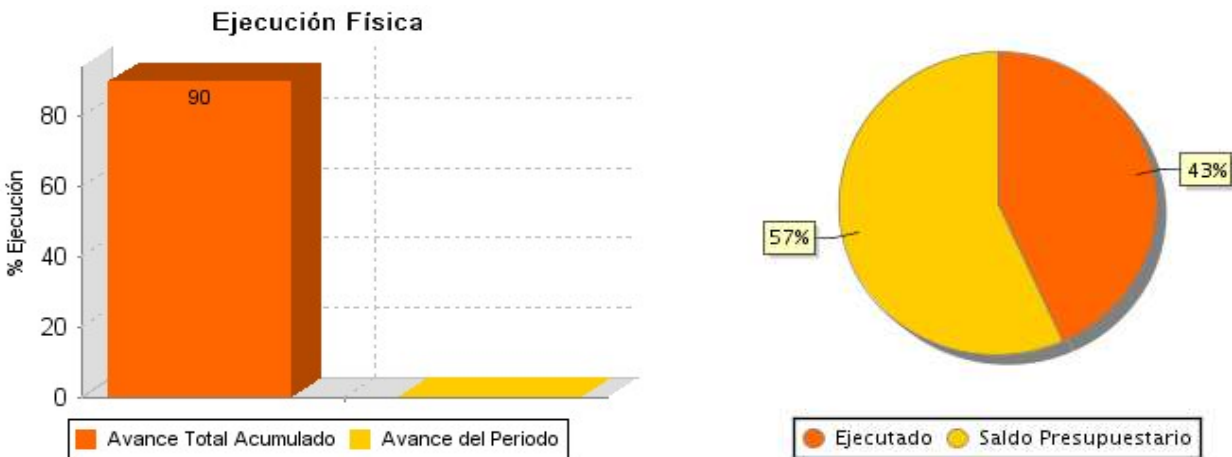


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de proyectos informó que el Bloque de la obra ya fue entregada y recepcionada por el Ministerio de Justicia, la Recepción Definitiva fue firmada el 21 de noviembre del 2024.

Asi también, el Bloque B de la obra cuenta con Recepción Definitiva de fecha 23/04/2024.

Proyecto		Mejoramiento del Servicio de Alcantarilla de la Bahía de Asunción			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		310			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	62.317.000	GS.	491.585.661.429
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
445.211.593.061		46.374.068.368		90,57 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/06/2016		23/06/2021		24/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			96,29 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
22.188.500.116		6.201.540.111		27,95 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

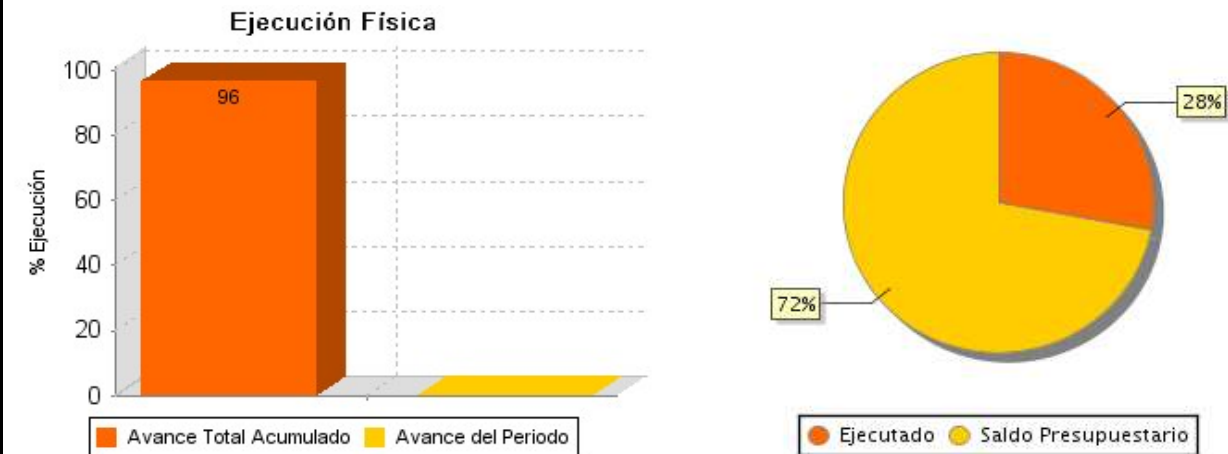

SITUACIÓN ACTUAL

El Proyecto Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado de la Bahía de la Ciudad de Asunción, se encuentra justificado el Ultimo Desembolso. El inconveniente que se sigue teniendo para el cierre de los contratos que concierne al proyecto, es la falta de disponibilidad presupuestaria con fondo local. Para lo cual se encuentra en trámite un requerimiento de presupuesto de manera a honrar con las deudas de los contratos vigentes. Se ha solicitado una reprogramación presupuestaria para dicho fin. Así mismo se informa que las obras y el periodo de operación de la PTAR de Bella Vista de Asunción fueron concluidas y está en etapa de traspaso a la ESSAP. a) PTAR Varadero: La PTAR Varadero se encuentran en funcionamiento y se ha emitido la recepción definitiva de las Obras. b) PTAR Bella Vista se encuentran en funcionamiento y ha finalizado el periodo de operación de la contratista y se ha emitido la recepción definitiva de la obra, actualmente ambas plantas se encuentran a cargo de la Operación y mantenimiento el prestador (ESSAP).

Proyecto	Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	311				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	48.120.000	GS.	312.293.363.651	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
286.943.384.647		25.349.979.004		91,88	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/06/2016		23/06/2021		24/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	San Lorenzo				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,24 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
42.592.402.130		22.222.054.952		52,17	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

El Proyecto Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado de la Bahía de la Ciudad de San Lorenzo, se encuentra justificado el Ultimo Desembolso. El inconveniente principal para el cierre de los contratos que concierne al proyecto, es la falta de disponibilidad presupuestaria con fondo local. La actividad principal acaba de terminar que es la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), está con recepción provisoria al cabo del tercer cuatrimestre y ya se encuentra en operación y mantenimiento.

Cabe mencionar, que varias consultorias fueron canceladas por falta de disponibilidad del crédito externo, y el pequeño saldo fue direccionado a las obras de construcción de la PTAR; entre las consultorias canceladas se encuentran: la actualización del catastro, el Plan Piloto de reducción de conflictos, el Plan de Fortalecimiento comercial de la ESSAP y la adquisición de software,modelos infomáticos para la Unidad de Alcantarillado del MOPC.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		329					
Financiamiento		BID , ICO					
Costo del Proyecto		USD	125.000.000		GS.	805.881.066.227	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
792.432.285.221			13.448.781.006			98,33 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
25/11/2015			25/11/2020			30/11/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
3,59 %				91,35 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
17.717.453.701			9.721.167.266			54,87 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para caminos rehabilitados, puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y consultorías, se encuentran finalizadas y en proceso de pagos finales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones fueron ejecutados en su totalidad conforme al cronograma previsto en el PEP.

Proyecto		Habilitación y Mantenimiento Ruta Nacional N° 9 y Acceso Colonia Menonita										
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES										
Código SNIP N°		383										
Financiamiento		BID , CAF, LOCAL										
Costo del Proyecto		USD	670.386.143				GS.	4.688.049.304.307				
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.					Porcentaje de Ejecución				
4.214.610.265.254			473.439.039.053					89,90 %				
Fecha de Inicio			Fecha de Fin					Fecha de Prórroga				
18/09/2018			20/9/2025					N/A				
Ubicación Geográfica del Proyecto												
Departamental		Boquerón, Presidente Hayes										
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total						
5,77		%						92,87		%		
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024					Porcentaje Ejecutado			
430.516.351.394				328.289.506.438					76,25 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

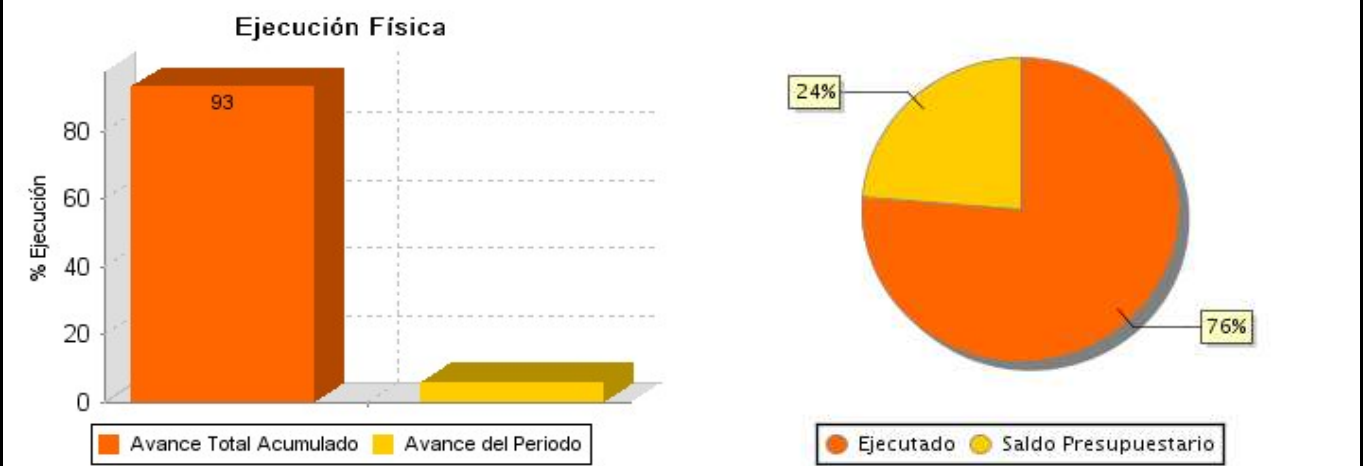

SITUACIÓN ACTUAL

El estado de las obras es el siguiente: Supervisión y Aprobación de los Certificados de Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y accesos:

Tramo 1, Lote 1 (PROG. 50+000 a PROG. 112+000). tiene un avance físico de 100%, con una pavimentación asfáltica de 60 kilómetros se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 2 (PROG. 112+000 a PROG. 173+000), tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 61 kilómetros, el Lote 2 se encuentra en la Etapa de Mantenimiento.

Tramo 2, Lote 3 (PROG. 173+000 a PROG. 250+000). tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 74 kilómetros se encuentra en etapa de mantenimiento, Lote 4 (PROG. 250+000 a PROG. 326+000). tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 73 kilómetros se encuentra en etapa de mantenimiento.


Tramo 3, Lote 5 (PROG. 326+000 a PROG. 390+000). tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 6 (PROG. 390+000 a PROG 450+000), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento.

Tramo 4, Lote 7 (PROG. 450+000 a PROG. 525+000)., tiene un avance físico de 100% se encuentra en Etapa de Mantenimiento, Lote 8 (Accesos), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en la Etapa de Mantenimiento.

El mantenimiento de todos los Tramos contemplan el trabajo de : Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas habilitadas y la Operaciones de Bascula Móvil.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		384					
Financiamiento		CAF, FONPLATA					
Costo del Proyecto		USD	142.911.000		GS.	1.001.545.257.053	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
878.860.213.499			122.685.043.554			87,75 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
31/12/2018			31/12/2022			31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
4,82 %				86,77 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
184.676.497.932			137.501.845.409			74,46 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

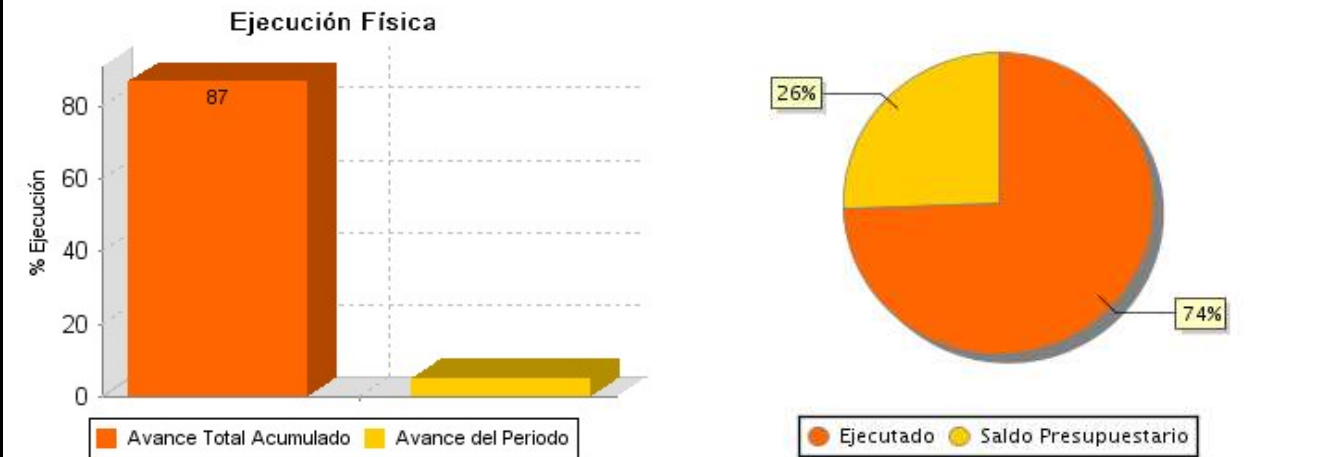

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto comprende la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y rurales, así también la construcción de puentes de Hormigón Armado (HºAº) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente en plena etapa de ejecución.

1. En cuanto a la Rehabilitación y Mantenimiento de caminos vecinales las obras poseen Contratos con Recepción Definitiva, más 2 contratos con Recepción Provisoria y mantenimiento rutinario, el segundo contrato actividad finalizada, el tercer contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance de 11.70 Km de caminos rehabilitados. El cuarto contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de tramos de caminos vecinales tuvo un avance de 1,76 km. de caminos rehabilitados.


2. En cuanto a la construcción de puentes de hormigón armado se encuentra en ejecución un contrato que abarca los Departamentos de Canindeyú, Caazapá y Paraguari, esta actividad tiene 5 lotes de los cuales tres lotes cuenta con Recepción Provisoria más 2 lotes en ejecución. El segundo contrato de construcción de puentes se encuentra con un avance de 149,18 ml de puentes construidos, esta actividad tiene 7 lotes, el llamado se encuentra en ejecución.

3. La fiscalización de las Obras de Puentes 1ra tanda CAF servicio finalizado al igual que la fiscalización de las Obras de Puentes 2da tanda.

4. El servicio de Consultoría de Apoyo Técnico y Fiduciario al Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental; tiene un avance del 20% de ejecución.

Proyecto		Mejoramiento de 160 km de caminos vecinales en la Región Oriental					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		564					
Financiamiento		BID					
Costo del Proyecto		USD	62.000.000		GS.	537.761.224.043	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
373.592.593.449			164.168.630.594			69,47 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
05/01/2018			05/01/2023			17/01/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
19,95 %				86,09 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
99.849.021.409			73.085.830.258			73,20 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

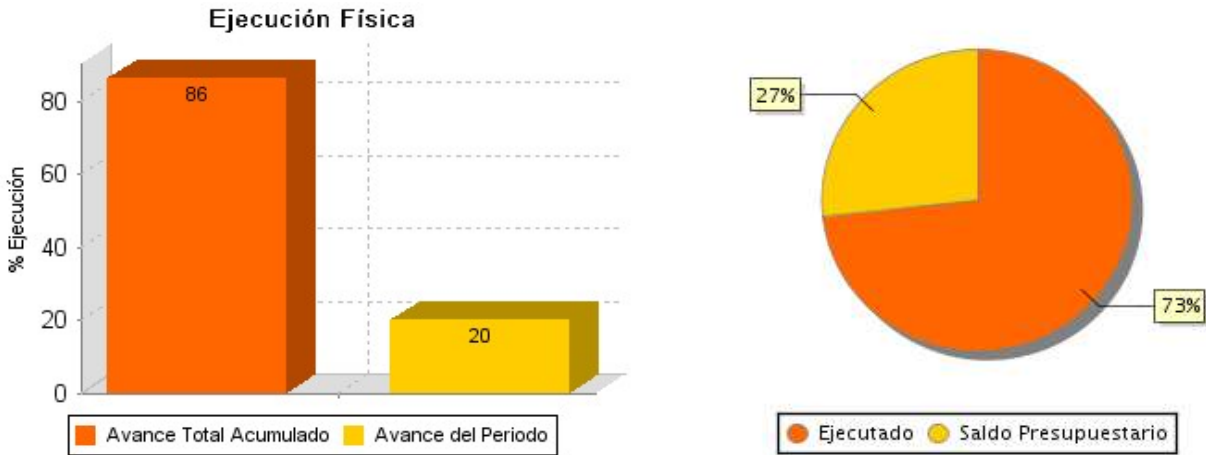

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de este tercer periodo se informa que las actividades previstas dentro del proyecto han avanzado conforme al PEP, tanto para caminos rehabilitados, puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y Consultorías, que se detallan cuanto sigue:


1. Para los caminos Rehabilitados dentro del Proyecto, se registran un total de 9,67 km de caminos rehabilitados dentro de la Región Oriental de 21,08 km y
2. Mantenimiento de Caminos Vecinales, 87,53 km en varios tramos de la Región Oriental.
3. Puentes construidos 34.46 ml de 72,22 ml a construir en la Región Oriental,

Todos conforme a la meta física prevista dentro del periodo fiscal 2024.

Así también las empresas fiscalizadoras acompañan a cabalidad todo lo concerniente a las aprobaciones de las obras construidas.

Proyecto		Habilitación de la Red Pavimentadas de los Departamentos de San Pedro, Caaguazu y Canindeyu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		594			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	53.057.700	GS.	411.614.354.995
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
210.352.074.593		201.262.280.402			51,10 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/01/2018		05/01/2025			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caazapá, Canindeyú, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
12,26 %			50,74 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
119.522.452.792		93.514.095.759			78,24 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

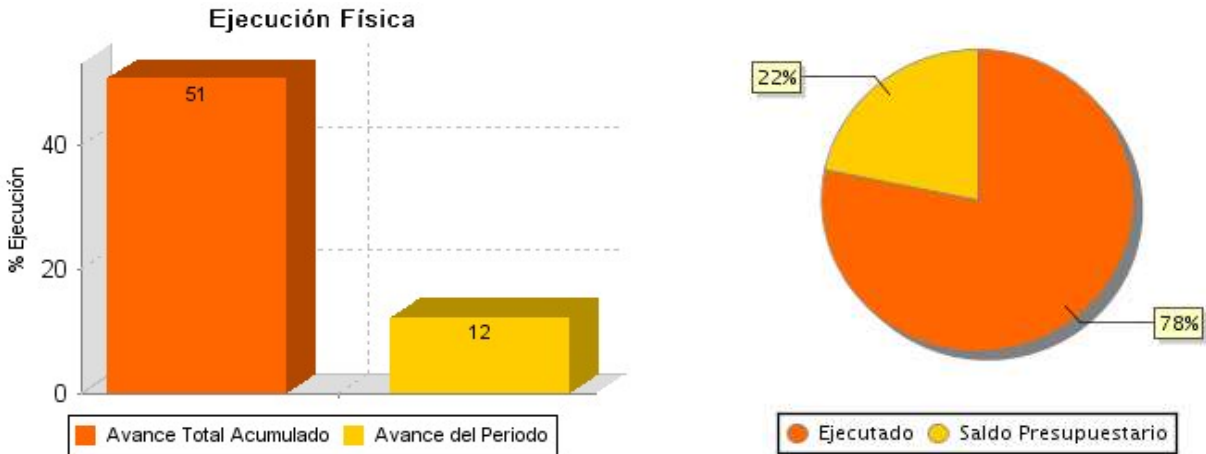

SITUACIÓN ACTUAL


Al cabo del Tercer Cuatrimestre: se encuentran en ejecución del proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) por Índice de Servicio. Los cuales se presentaron certificados del periodo de Obras de Puesta a Punto y así mismo la etapa de mantenimiento, por lo que los avances en km se consideran en la longitud total del tramo, ya que se verifica mensualmente el estado general del mismo. Dichas intervenciones fueron las siguientes: Limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para control de peso, bacheo superficial, limpieza de franja y obstrucción del escurrimiento, materiales sueltos. Se procesaron sin inconvenientes los Informes presentados en la institución por parte del consorcio encargado de la fiscalización de rutas rehabilitadas y mantenidas.

En ese mismo sentido las Obras de Ejecución de Planes Urbanos Malla Norte se encuentra en ejecución según el cronograma previsto,

En cuanto a la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CAMPAÑAS DE SEGURIDAD VIAL; se adquirieron equipos y dispositivos educativos: "lote 1: parque infantil completo, por resolución 2260 de fecha 03 de diciembre/2024 se adjudicó el lote 1, esperamos completar todos los procesos en el siguiente cuatrimestre para lograr su ejecución efectiva.

Proyecto		Habilitación de la Red Pavimentada en los Departamentos de Misiones e Itapúa			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		595			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	46.540.241	GS.	383.046.126.088
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
204.831.733.264		178.214.392.824		53,47 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018		05/01/2025		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Itapúa, Misiones				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6,52 %			64,53 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
71.505.414.522		30.834.907.951		43,12 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

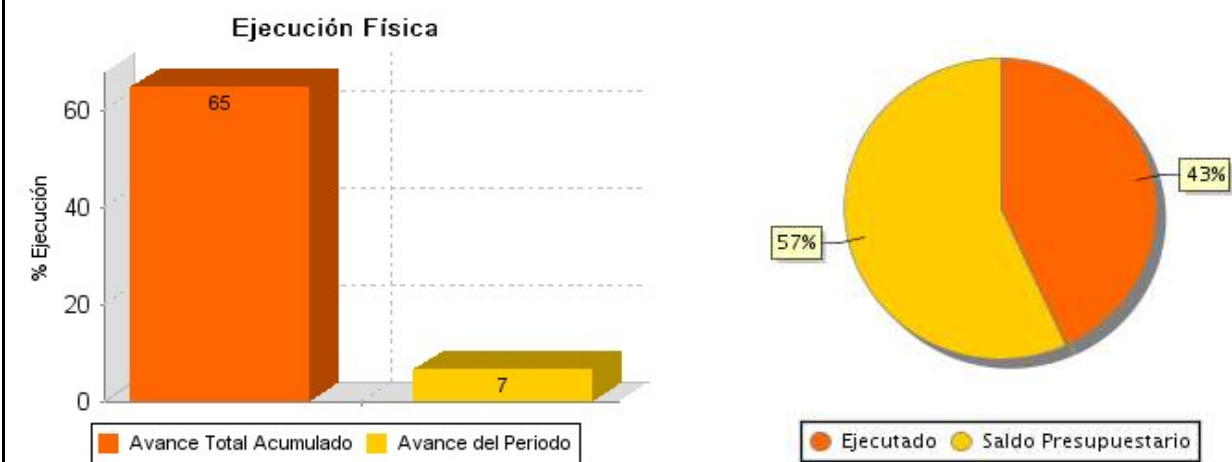

SITUACIÓN ACTUAL


Los avances de obras en la etapa de mantenimiento se consideran en la longitud total del tramo, ya que se verifica mensualmente el estado general del mismo; las intervenciones en obras según datos de los especialistas técnicos de la UEP son las siguientes: se han reparado y solucionado a lo largo del tramo de la Ruta PY 01, el desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, reducción de espesor de pavimento, materiales sueltos, obstrucciones al escurrimiento de la vía, exceso de vegetación, pozos, entre otros.

Llamado a Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Servicios de Consultoría para consolidar la Implementación y operación del sistema de planificación y gestión vial que incluye completar el inventario vial; mencionamos que al cierre del Tercer Al término del cuatrimestre se determinó cancelar todas las etapas del llamado de referencia y se iniciaron los trámites de rigor a fin de concluir con dicho proceso

El Llamado de Selección de Consultores para Auditoría Financiera y Contable Externa del Proyecto de Préstamo UEP 8638 para los siguientes ejercicios 2024 al 2025. referimos que en el Tercer Cuatrimestre culminó la etapa de la manifestación de interés, esperamos completar todos los procesos en el siguiente cuatrimestre para lograr su ejecución efectiva.

Proyecto		Mejoramiento y Conservación tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme RN 6											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		646											
Financiamiento		BID											
Costo del Proyecto		USD		48.747.500				GS.		342.424.871.123			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
314.932.319.480				27.492.551.643				91,97		%			
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
23/11/2018				23/11/2025				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Caazapá, Guairá											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
10,49		%		90,41						%			
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024				Porcentaje Ejecutado					
41.721.551.502				25.948.087.710				62,19		%			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

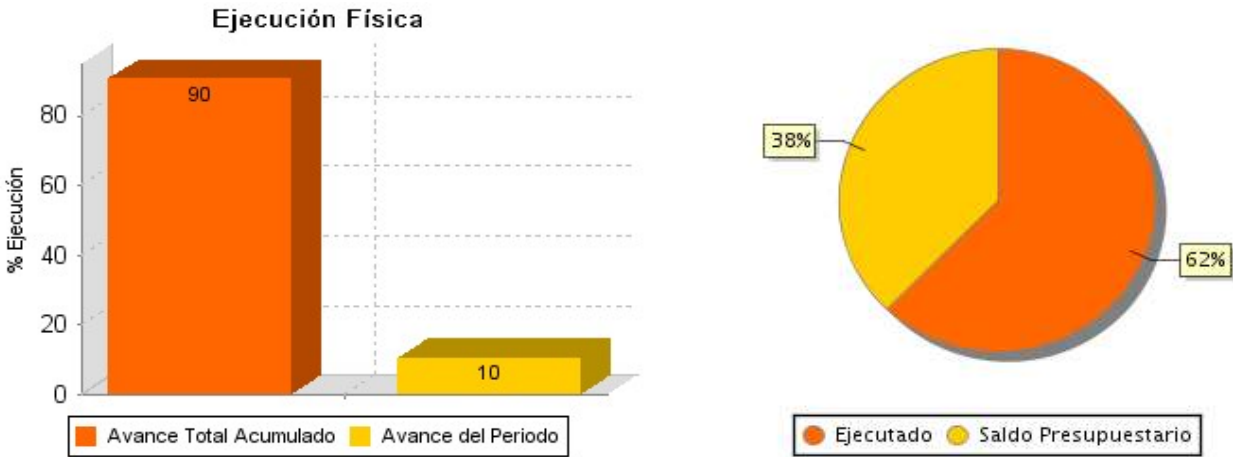


SITUACIÓN ACTUAL

Las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6. se encuentra en etapa de mantenimiento, con un avance físico real de la Capa de Rodadura de 60 km. Con respecto a las actividades realizadas en el periodo continúan los trabajos de limpieza de la franja de dominio y de los drenajes, bacheo en las calzadas rehabilitadas y la operaciones de bascula móvil. El objetivo de estos trabajos es mantener los niveles de servicion optimos en todo el tramo. Asimismo, se continúa trabajando en los TDRs de los Servicios de Consultoría para el Plan de Gestión Ambiental. El Contrato de Pago de Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno Programa, se encuentra en ejecución. Tambien sgue en ejecución la Consultoría de la ECATEF y la Auditoria Externa en donde se presentó el Informe Correspondiente al año 2023 y fue aprobado.

Proyecto		Mejoramiento y Conserv. tramo Caaguazu - Yhu. - Emp. RN 10							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		647							
Financiamiento		BID							
Costo del Proyecto		USD		6.994.000		GS.		52.153.436.228	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
36.799.074.843			15.354.361.385			70,56 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
23/11/2018			23/11/2024			31/12/2025			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Caaguazú, Canindeyú							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
5,06		%				95,06		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado			
6.570.702.616			705.831.288			10,74 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

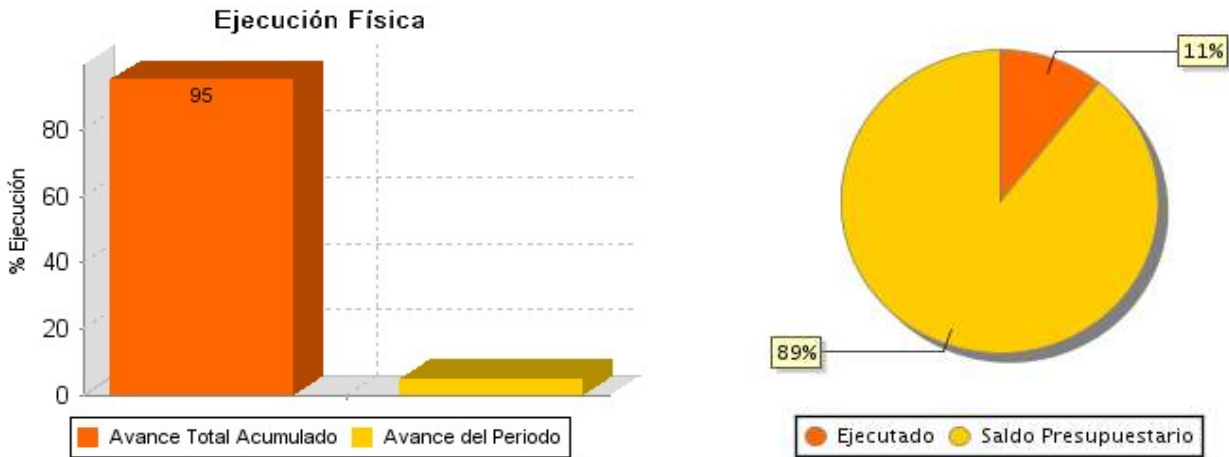


SITUACIÓN ACTUAL

La obra de mejoramiento y conservación por niveles de servicio de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N° 10, continua en etapa de mantenimiento y los trabajos realizados en el periodo fueron. Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas rehabilitada, calzada existente y las Operaciones de Bascula Móvil. Las obras de mantenimiento son los mismos en todo el tramo en donde el objetivo principal es mantener los niveles de servicios óptimos.

Proyecto		Construcción Caminos Rurales no Pavimentados R. Oriental					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		720					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	1.093.778.338.894	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
1.065.282.269.659			28.496.069.235			100,55 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
19.954.867.717			18.249.514.212			91,45 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

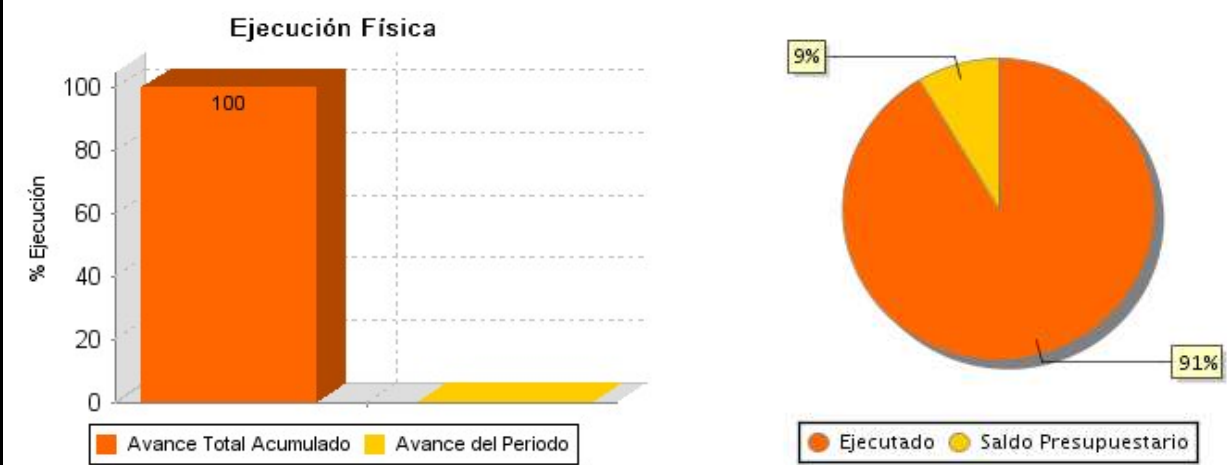


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyectos se encuentran concluidas. Se realizaron pagos de deudas en concepto de saldos de certificaciones, reajustes de precios e intereses moratorios.
Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Construcción de Pavimento sobre Empedrados en REGION CENTRO											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		722											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		N/A				GS.		296.215.158.010			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
254.671.517.592				41.543.640.418				85,98 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/01/2018				31/12/2020				31/12/2024					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Asunción, Central, Cordillera, Paraguari											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00		%						99,10		%			
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024				Porcentaje Ejecutado					
1.543.640.418				0				0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

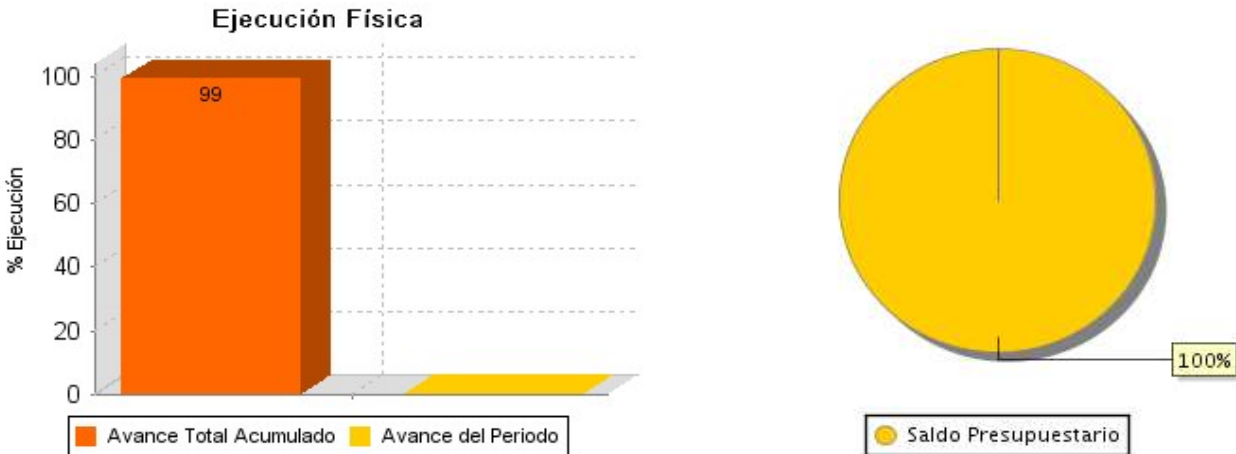


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras se encuentran culminadas. Debido a la falta de disponibilidad presupuestaria no se ha podido honrar los compromisos pendientes (reajustes, intereses moratorios)

Proyecto	Construcción Asfalto sobre Empedrados - REGION SUR				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	724				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	21.884.404.330
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
21.364.292.276		520.112.054		97,62 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Itapúa, Misiones, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,50 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
0		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

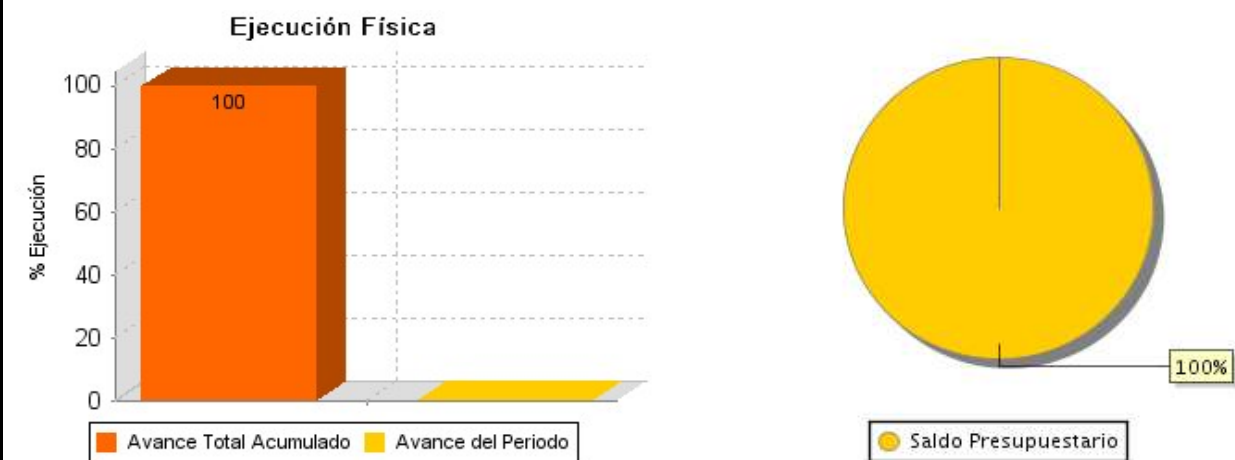


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto se encuentran concluidas. No se ha obligado las deudas pendientes de los certificados de obras.
Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Construcción de Pavimentacion sobre Empedrados en la Región Este			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		725			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 37.686.822.499
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
36.631.678.571		1.055.143.928		97%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			98,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
0		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

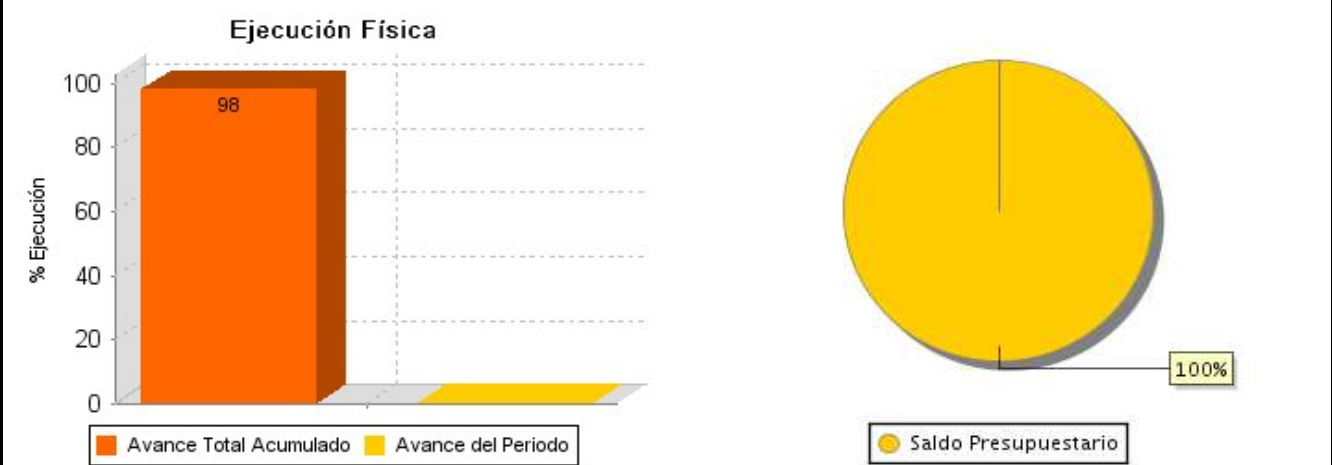


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado. No se ha obligado las deudas pendientes en este ejercicio fiscal. Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Construcción y Pavimentacion Asfaltica de Tramos Camineros en REGION ESTE					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		730					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	161.967.754.975	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
160.887.188.373			1.080.566.602			99,33 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				98,80 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
0			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

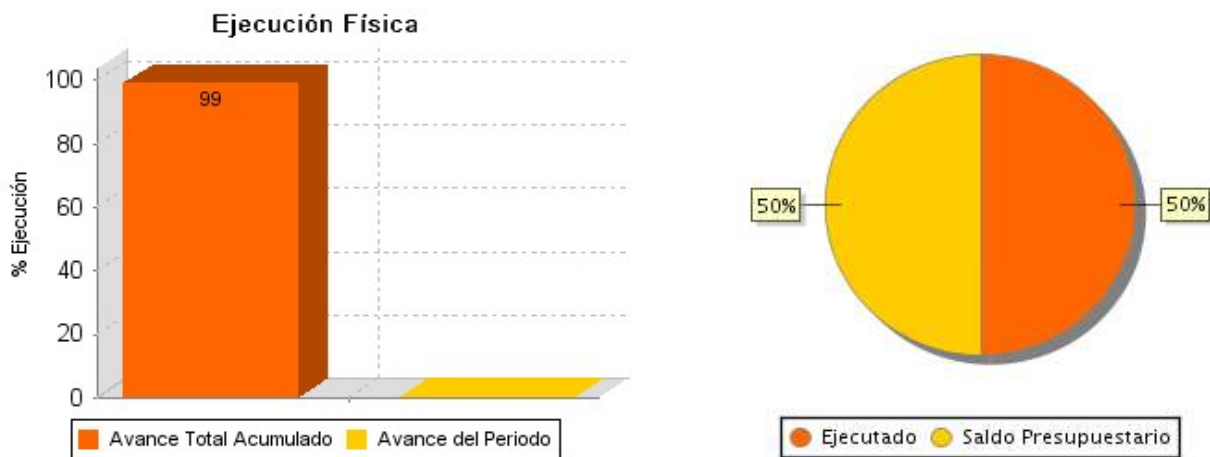


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han concluido. No se han obligado las deudas pendientes de los contratos de obras. Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Construcción Pavimentación Asfaltado de Tramos camineros. Región Centro Sur.					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		731					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	194.288.417.303	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
186.696.183.486			7.592.233.817			96,09 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Caazapá, Guairá, Itapúa						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				94,20 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
4.231.095.535			1.153.408.096			27,26 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

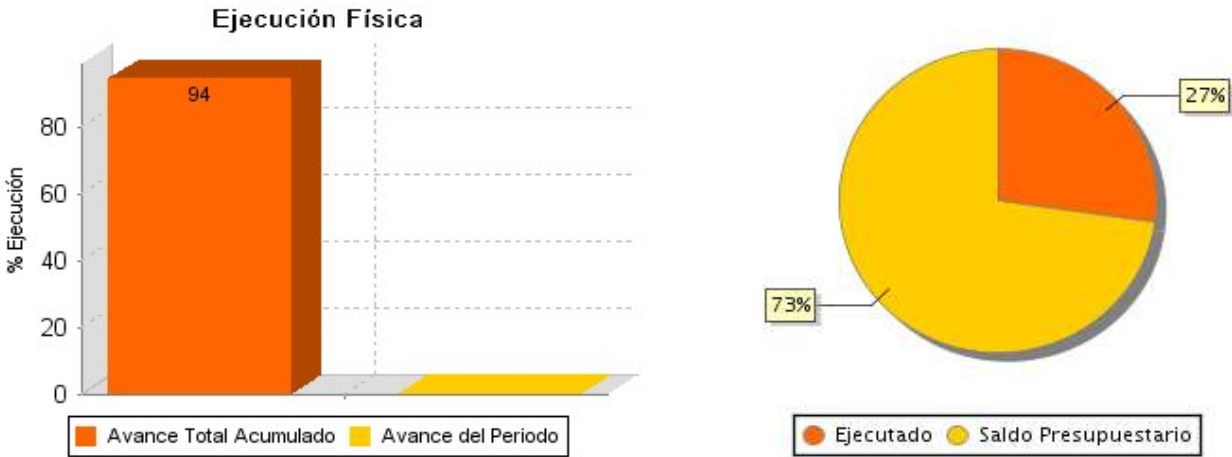


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras se encuentran concluidas, se realizaron pagos en concepto de reajuste de precios correspondiente al Lote N°4: San Pedro del Paraná - San Solano Fleitas Cué. - 33.50 km.

Proyecto		Construcción y Pavimentacion Asfaltica de Tramos Camineros en región Noreste.				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		732				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	272.415.685.907
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
271.112.097.479			1.303.588.428		99,5%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				90,96 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
3.110.819.881			2.496.411.572		80,25 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

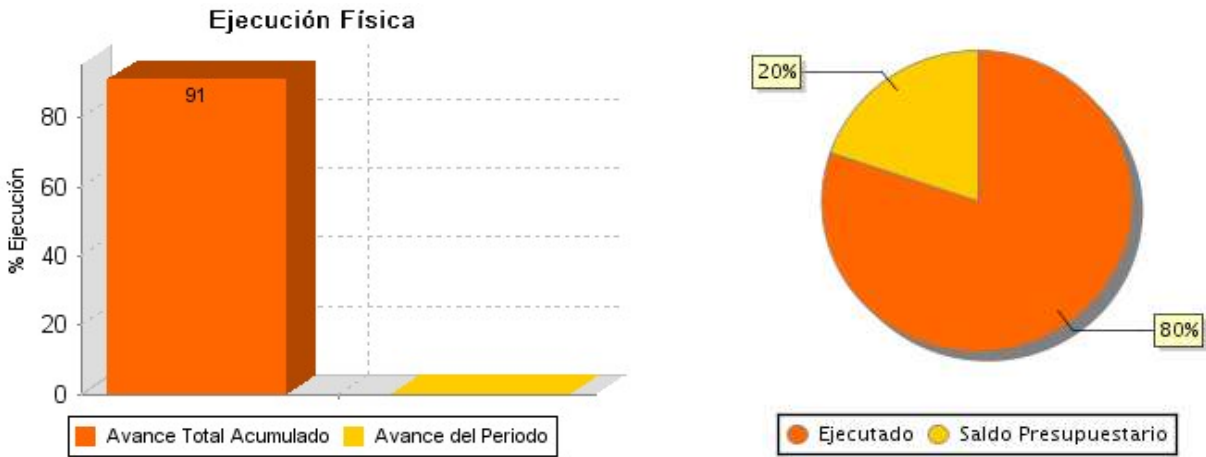


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han concluido en su totalidad. En éste cuatrimestre se ha pagado indemnizaciones de las obras Pavimentación Asfáltica Bella Vista Norte hasta el empalme R5 76,58 km y circunvalación de 5,91 km. Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto	Construcción Pavimentada Tipo Empedrados y Puentes - Región Centro				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	736				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	28.060.365.090
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
26.214.560.425		1.845.804.665		93,42 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Cordillera, Guairá, Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,36 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
989.387.695		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

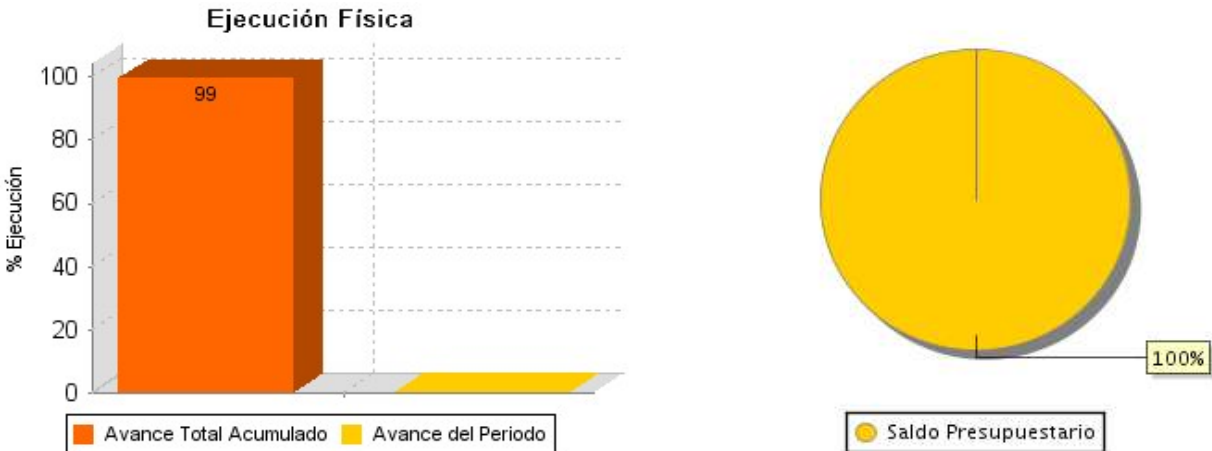


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han concluido, quedan pendientes el pago de deudas de los certificados de obras.
Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Conservación de rutas pavimentadas por administracion											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		746											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		N/A				GS.		185.928.766.059			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
180.800.490.663				5.128.275.396				97,24 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/01/2018				31/12/2020				31/12/2025					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Nacional		N/A											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00 %						76,59 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024				Porcentaje Ejecutado					
8.694.511.792				6.156.260.626				70,81 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

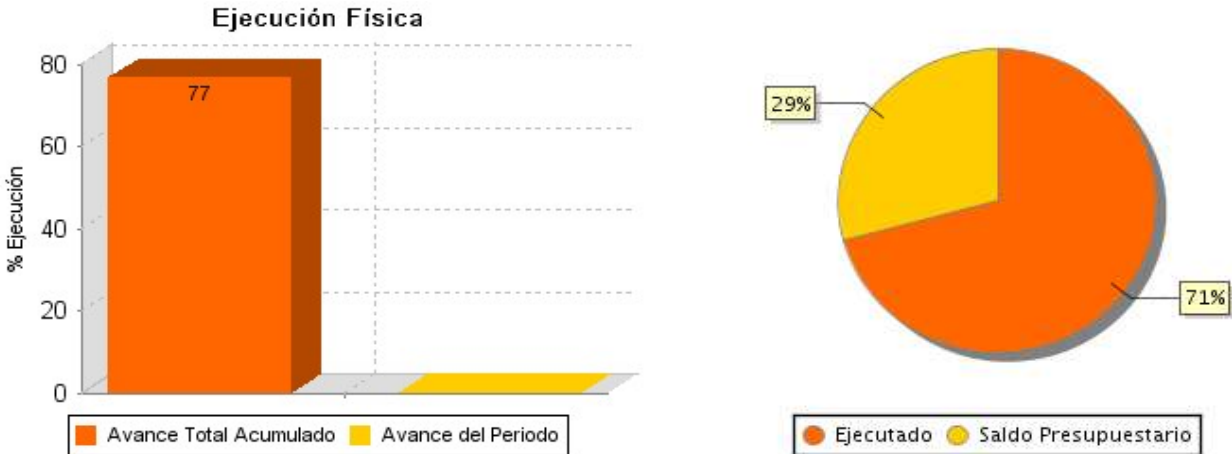


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo se realizaron pagos parciales de deudas debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, se espera contar con mas recursos en el próximo ejercicio fiscal para cubrir la totalidad de deudas. Con respecto a las actividades canceladas por el Decreto N° 4614/2020, los procesos administrativos para la emisión de un Decreto de Excepción, quedaron pendientes para el próximo ejercicio debido a ajustes en el último periodo del año.

Proyecto		Habilitación y Mantenimiento de la Ruta 1 tramo Carapegua - San Juan Bautista						
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
Código SNIP N°		760						
Financiamiento		CAF, FONPLATA, LOCAL						
Costo del Proyecto		USD	53.501.521			GS.	280.884.636.738	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución		
202.145.711.414			78.738.925.324			71,97 %		
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga		
04/01/2018			04/01/2025			15/12/2025		
Ubicación Geográfica del Proyecto								
Departamental		Misiones, Paraguarí						
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total			
4,96 %					85,85 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado		
58.007.845.135			24.965.246.164			43,04 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

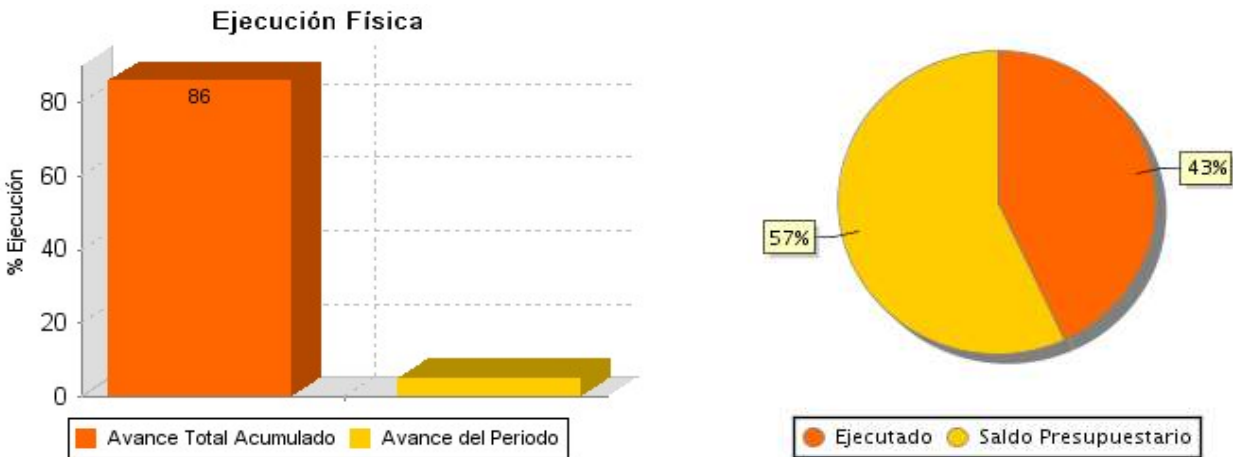


SITUACIÓN ACTUAL

La obra continua en periodo de mantenimiento, y los trabajos realizados consistieron en conservación de carretera, limpieza de franja de dominio, con corte de vegetación con maquina y manual y colocación de señales y elementos de seguridad.

Proyecto	Construcción y mantenimiento Ruta N° 3 tramo km 21.8-170.3				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	761				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	378.545.281.810
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
108.585.415.540		269.959.866.270		28,68 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Cordillera, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
20.554.831.899		5.358.370.204		26,07 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

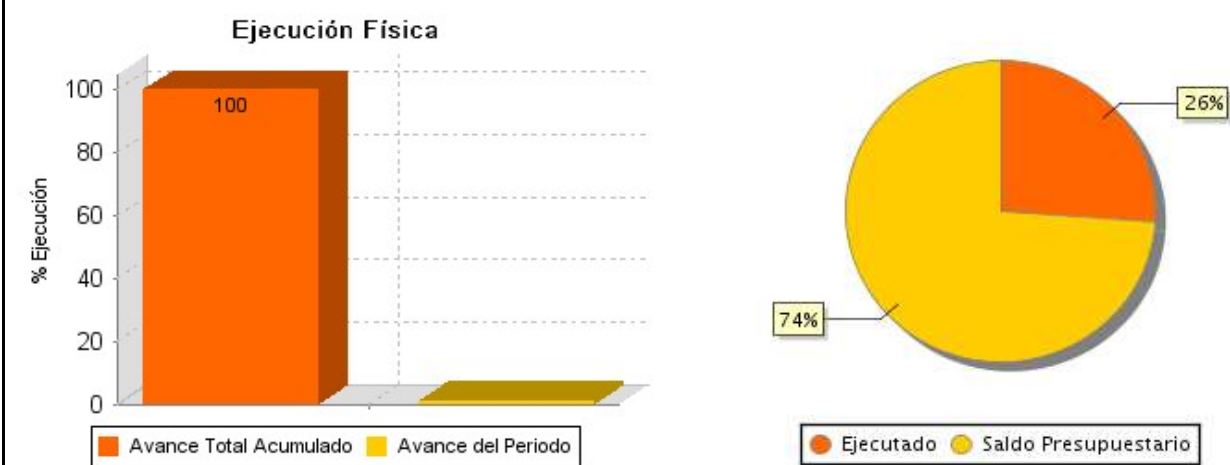

SITUACIÓN ACTUAL


Al cabo del tercer cuatrimestre no se procesaron certificados de parte de la Contratista (Ya cuenta con Recepción Definitiva), pero si de parte de la Fiscalizadora, hubo avance financiero de los saldos que quedaron pendientes en este cuatrimestre, quedaron pendientes varios certificados de obras a la espera de recursos financieros.

Ya no se realizó ningún trabajo de mantenimiento debido a la finalización del contrato y periodo de garantía, se presentaron todos los certificados de obras a la espera de recursos financieros para honrar las deudas pendientes. Queda pendiente los certificados del Convenio 3 de la Empresa Fiscalizadora.

Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Construcción y mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		762					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	403.343.600.758	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
142.399.555.419			260.944.045.339			35,30 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Misiones, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,00		%		100,00		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
28.483.480.200			25.652.434.888			90,06 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

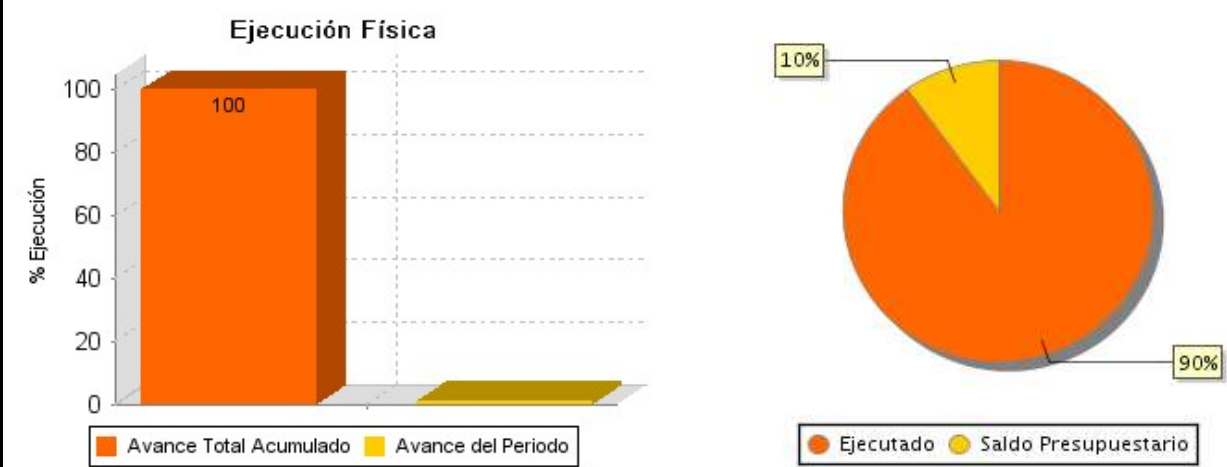


SITUACIÓN ACTUAL

Ya no se presentan certificados de obras debido a la finalización del contrato. Debido a la falta de recursos financieros se ha generado el retraso en el pago de los certificados mensuales, generando esto el compromiso de pagos de intereses moratorios.

Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		764			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	194.800.960.023
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
193.960.841.576		840.118.447		99,57 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
2.685.481.020		2.307.923.014		85,94 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

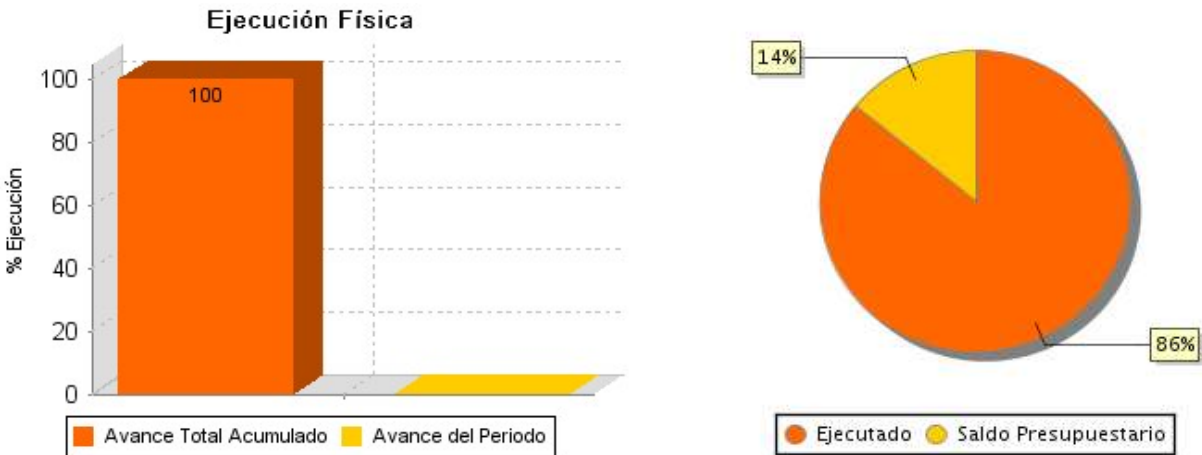


SITUACIÓN ACTUAL

Todas las obras del proyecto han concluido. Se realizaron pagos en concepto de viáticos a funcionarios del Departamento de Puentes y Obras de Arte por trabajos de Administración.
Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Conservación Caminos Rurales no Pavimentada de la Region Oriental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		766			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	273.331.128.503
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
266.127.690.303		7.203.438.200			97,36 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
01/01/2018		31/12/2020			31/12/2024
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
2.188.756.154		544.874.336			24,89 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

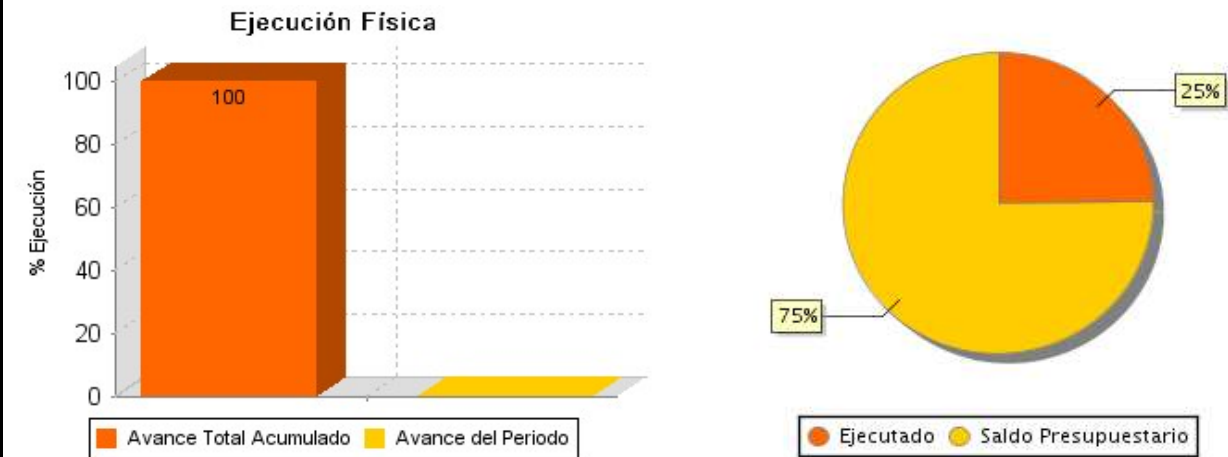


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto han culminado, en este cuatrimestre no se registraron pagos, quedan deudas pendientes de pago en concepto de intereses moratorios.
Cabe mencionar, que las obras del proyecto se encuentran enmarcado en el Anexo I del Decreto N° 4614/20, lo cual limita su costo total.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero - Capitan Bado - Ypejhu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		796			
Financiamiento		FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	220.000.000	GS.	1.638.315.800.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
62.663.966.461		1.575.651.833.539		3,82 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
6/7/2023		27/4/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5,55 %			6,51 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
108.057.993.548		62.663.966.461		57,99 %	


AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

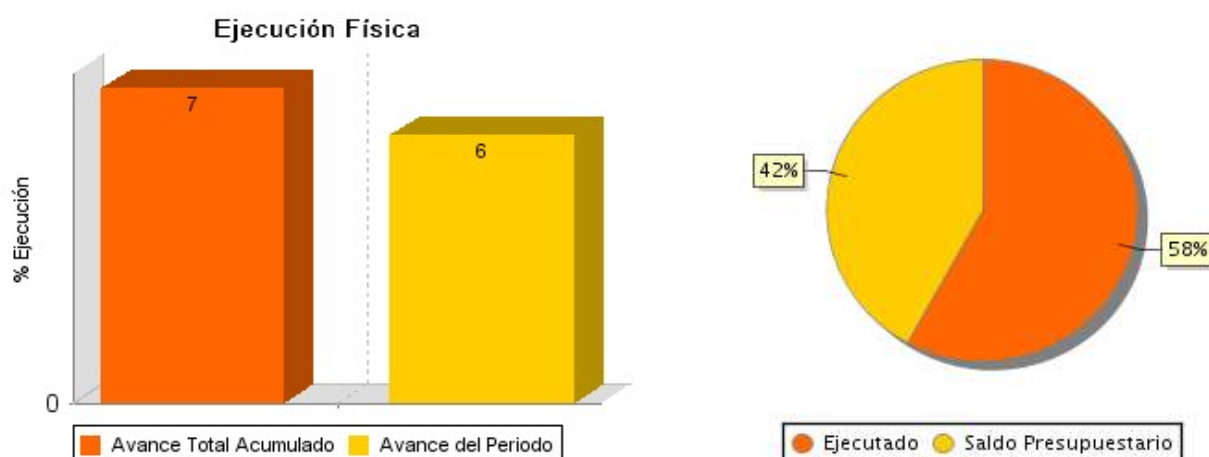

SITUACIÓN ACTUAL


En éste tercer cuatrimestre se han firmado los contratos de obras con las cuatro empresas constructoras, también se obligado el pago del anticipo financiero.

[illegible]

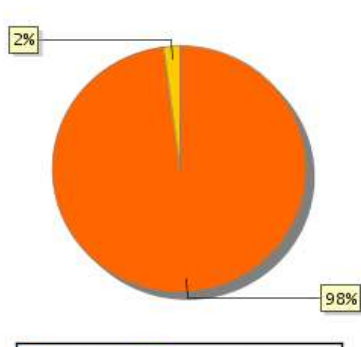 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto	Capacitación y Mejoramiento en Formulacion y Ejecucion de Proyectos de la DIPE		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	798		
Financiamiento	LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	N/A	GS. 138.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
43.476.383.704		94.523.616.296	31,50 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
22/11/2018		22/11/2023	22/11/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,90 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024	Porcentaje Ejecutado
9.301.977.145		9.110.192.313	97,94 %
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			
Ejecución Física  100 0,90  2% 98% Avance Total Acumulado Avance del Periodo Ejecutado Saldo Presupuestario			
SITUACIÓN ACTUAL			
Al cierre del Ejercicio Fiscal 2024, se ha logrado: Capacidades técnicas y operativas de la DIPE/ MOPC fortalecidas, a traves de profesionales nacionales especializados en las distintas áreas, conforme a requerimientos de los procesos de Estructuración de Proyectos estratégicos a cargo de la DIPE, para los Proyectos: diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la Ruta PY 01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy (108 km) y Proyecto de rehabilitación y Pavimentación de la Ruta PY10 Tramo San Cristobal - Paso Yobai. Proyecto de Equipamiento y Puesta en marcha de las Oficinas de Gobierno y mejoramiento del Puerto de Asunción, Mejoramiento de la Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, Plan de Transformación de Transporte, Modernización del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirosi, Proyecto de Construcción e implementación del Tren de Cercanía entre Asunción e Ypacaraí y Proyecto de enmienda de la Ruta PY02. Asimismo, cuenta con la asistencia de expertos internacionales para cubrir los requerimientos de alta complejidad. Proyecto Ampliación y Mejoramiento Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy 108 Km. PBC publicado en la página de la DNCP. Analisis de aclaraciones y respuestas en tiempo y forma de diversas consultas realizadas por los oferentes. Proyecto Modernización y Ampliación del Aeropuerto Silvio Pettirosi. Due Diligence de información relevante sobre la situación actual del aeropuerto con base en la documentación vigente. Asistencia técnica internacional realizada para el Proyecto de Modernización y Ampliación del Aeropuerto a través de una Consultoría Internacional. Proyecto Tren de Cercanía Asunción - Ypacaraí: Acompañamiento técnico de la DIPE a FEPASA, realizado durante el proceso de desarrollo de la consultoría internacional. Proyecto de Ley “DE LA REFORMA DEL TREN DE CERCANÍAS” aprobado y sancionado por el Congreso Nacional. Acompañamiento en la etapa de estructuración del proyecto con el apoyo de expertos internacionales. Proyecto Oficinas de Gobierno. PBC para el equipamiento de las Oficinas revisado y ajustado. Culminación del proceso de evaluación y en proceso de adjudicación. Mejoramiento de la Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción Unidad Ejecutora para la gestión del Proyecto conformada. Llamado de soterramiento de la Línea de Alta Tensión adjudicado. Proyecto vial para el Mejoramiento de la Avenida Artigas. Diseño conceptual desarrollado para la revitalización de la Avenida bajo la premisa de la conexión fluida a través de un corredor verde que conecte al Parque Bernardino Caballero, Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Estudio catastral de los predios aledaños a la Avenida iniciados. Proyecto Rehabilitación y Pavimentación de la Ruta Nacional PY10, tramo: San Cristóbal – Paso Yobái. Publicación del Llamado MOPC N.º 139/2024 con ID N.º 456.747 con un monto estimado de G. 765.737.125.276.			

Proyecto		Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		806					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	827.729.290.861	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
659.858.741.613			167.870.549.248			79,72 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
24/05/2019			24/05/2023			31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
4,72 %				77,55 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
128.126.374.515			88.086.957.219			68,75 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

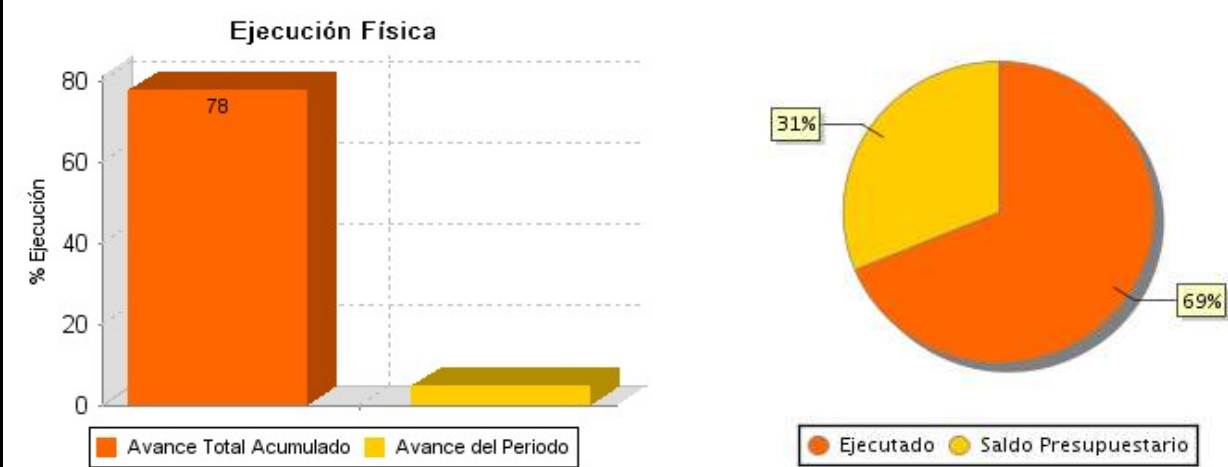


SITUACIÓN ACTUAL

Se registró avances en pagos de certificados de adquisición de pre-fabricados de hormigón armado, mantenimiento y reparación de equipos viales y, combustibles y lubricantes para los Distritos Departamentales. 123,4 ml de puentes metálicos construidos en varios departamentos del país

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		815				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	169.799.522.159
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
166.735.952.797			3.063.569.362		98,20	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/07/2019			31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	San Pedro					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				89,88 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
712.118.258			684.123.406		96,07	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

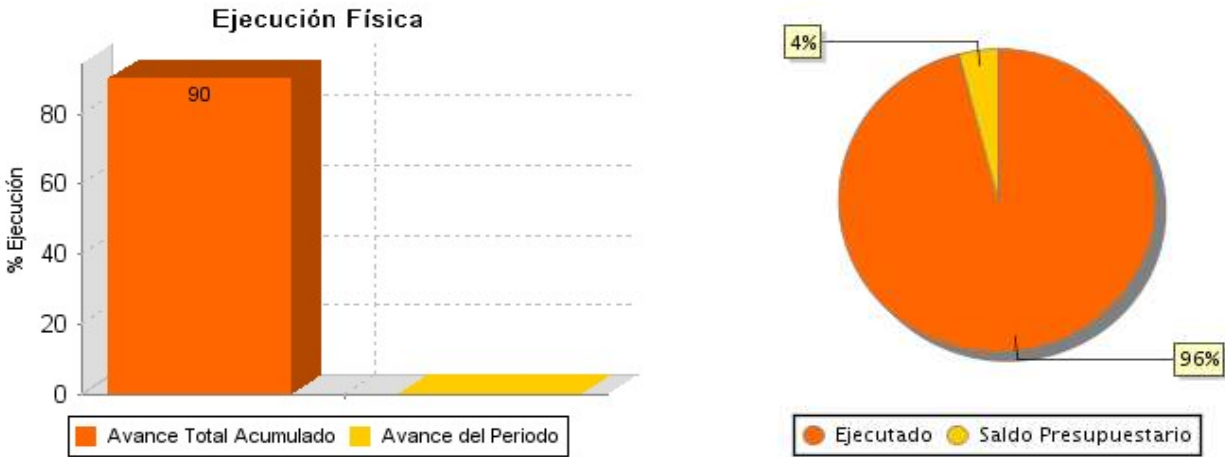


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Decreto 4614/20 se encuentran finalizadas. En el periodo de referencia se realizaron pagos de deudas correspondiente a la “Obra de Pavimentación Asfáltica de 5,4 Km del tramo Circunvalación Puerto Antequera. Cabe mencionar que quedan compromisos con procesos administrativos pendientes.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Alto Parana					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		817					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	148.941.083.602	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
145.194.761.116			3.746.322.486			97,48 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				85,72 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
59.819.669			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

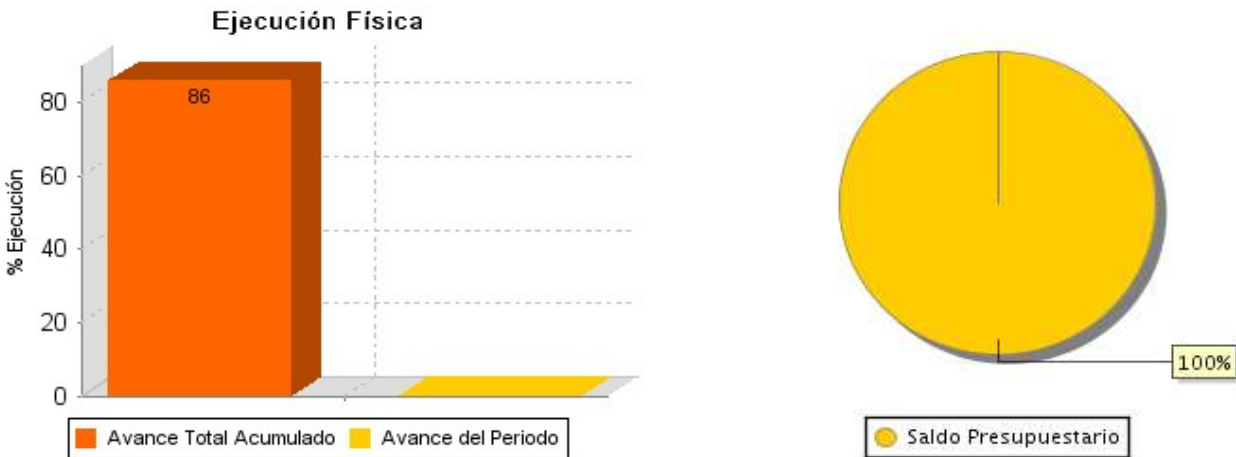


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Decreto 4614/20 se encuentran culminadas con procesos administrativos pendientes para pagos de reajustes e intereses moratorios.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Misiones				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		818				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	120.009.492.014
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
116.439.555.126			3.569.936.888		97,03 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Misiones				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0 %				79 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
156.773.872			53.330.580		34,02 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

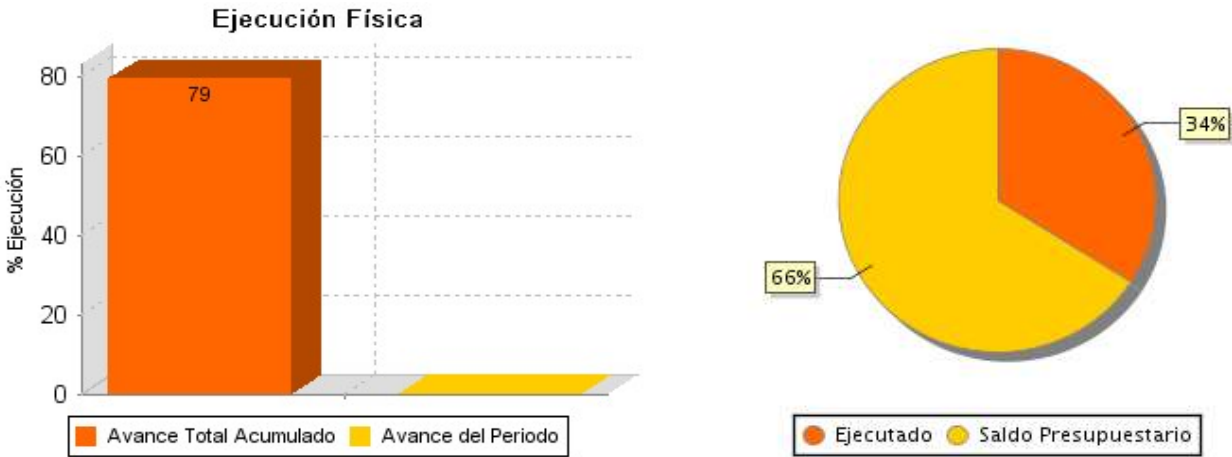


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Decreto 4614/20 se encuentran culminadas con procesos administrativos pendientes para pagos de reajustes e intereses moratorios. Cabe mencionar que en el periodo de referencia no se ha realizado pagos.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		820				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	161.055.635.470
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
149.755.324.196		11.300.311.274			92,98 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Cordillera				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0 %				77 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
30		0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

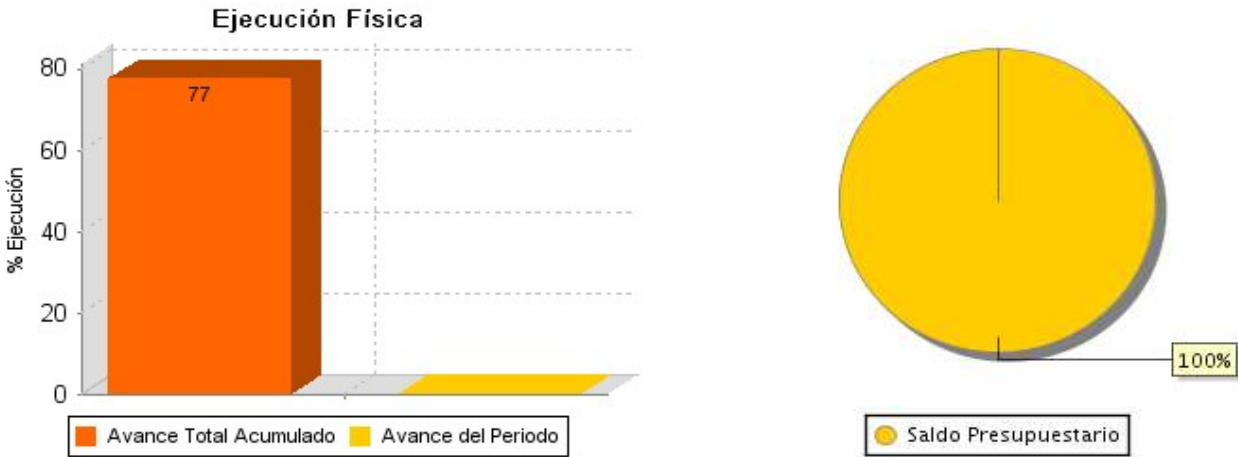


SITUACIÓN ACTUAL

No se registran avances en este periodo. El MOPC indica que no se cuenta con disponibilidad presupuestaria suficiente. Cabe mencionar, además, que el MOPC manifiesta que las obras enmarcadas en el Decreto 4614/2020 se encuentran concluidas, quedando pendiente el pago de reajustes, convenios e intereses moratorios.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		821					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	183.624.767.080	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
179.911.779.146			3.712.987.934			78,71 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Ñeembucú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				97,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
1.704.053.101			1.704.053.101			100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

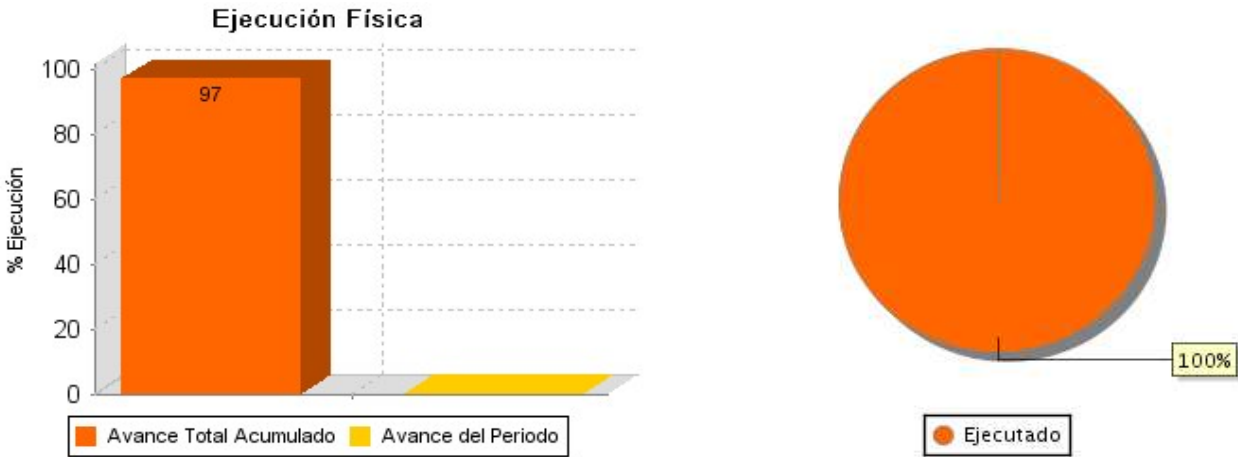


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, el MOPC reporta que se registraron pagos de certificados atrasados correspondiente a las obras culminadas del tramo Isla Umbu - Loma Guazu - General Díaz.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		822				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	101.526.789.923
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
69.533.135.063			#¿NOMBRE?		68,49	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/07/2019			31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,00 %				100,00 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
5.629.568.933			4.133.617.339		73,43	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

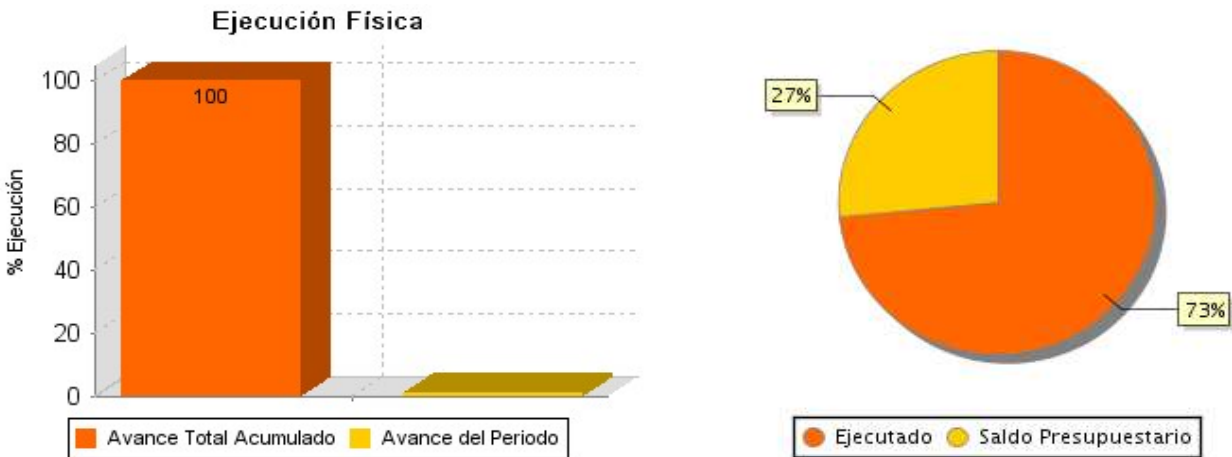


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que no se registran movimientos en este periodo. Cabe mencionar que, conforme a los datos brindados por el MOPC, las obras se encuentran finalizadas quedando deudas pendientes de pago a ser honradas una vez que culminen los procesos administrativos.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Guaira					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		824					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	159.627.862.420	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
152.674.797.455			6.953.064.965			95,64 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
05/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Guairá						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,34 %				81,16 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
913.045.606			913.045.576			100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

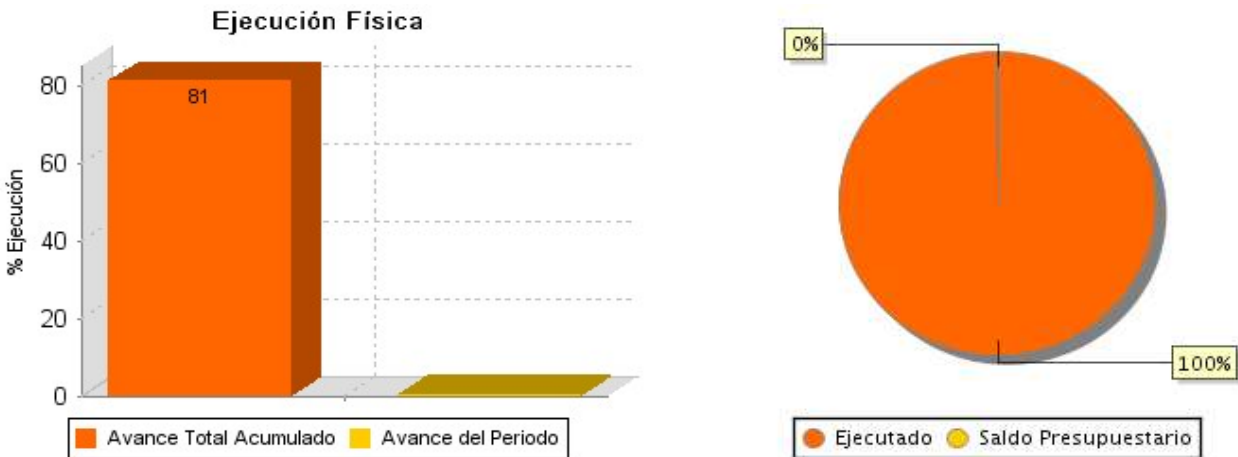


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia no se ha realizado ejecución presupuestaria. Cabe mencionar que según lo manifestado por el MOPC, las obras enmarcadas en el Decreto N° 4614/2020 están culminadas y hay procesos administrativos pendientes para pagos de reajuste e intereses moratorios.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		825			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	252.459.631.991
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
237.230.302.361		15.229.329.630			93,97 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			71,05 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
17.824.843.923		16.772.731.098			94,10 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

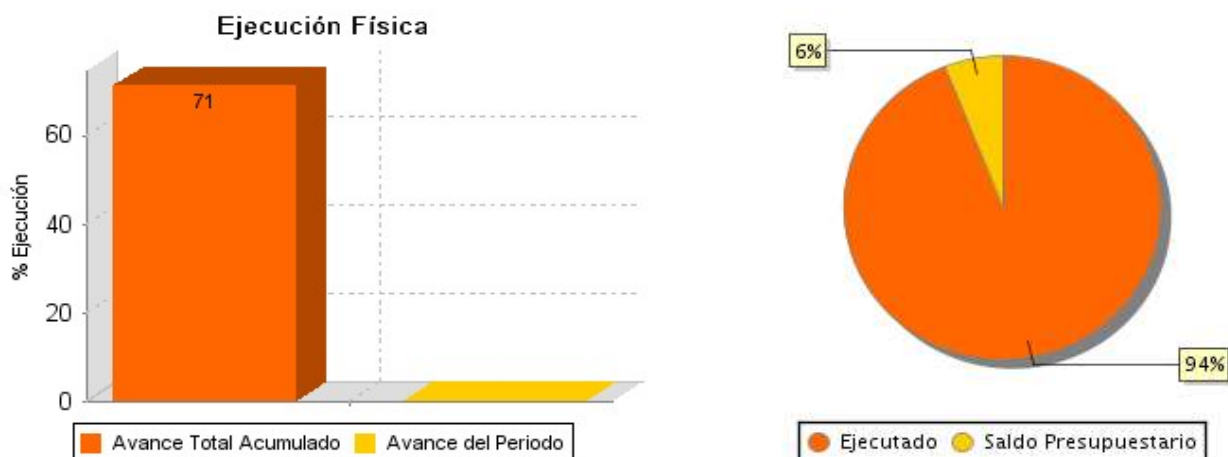


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que se han registrados pagos en concepto de certificados de obras por deudas correspondientes a los Tramos Cora Guazú - Compañía Walter Insfrán - Lote 3 y Lote N° 1: San José De Los Arroyos - Tebicuary. Cabe mencionar que las obras enmarcadas en el Decreto N° 4614/2020 se encuentran culminadas, de acuerdo a reportes anteriores del MOPC.

[illegible]

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Concepcion			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		826			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	56.605.555.891
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
54.070.681.439		2.534.874.452		95,52 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Concepción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			92,50 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
8.919.198.129		6.276.758.118		70,37 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

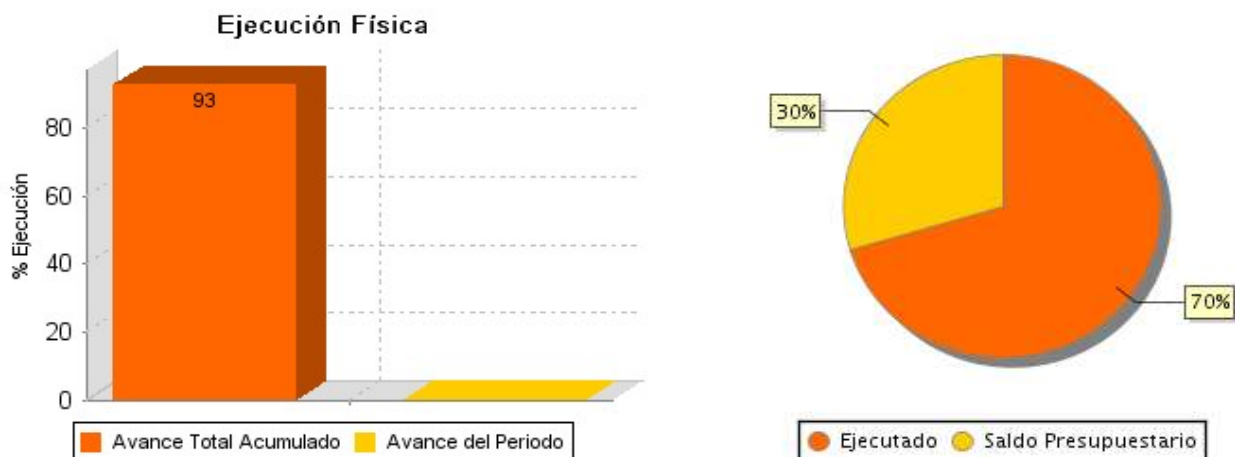


SITUACIÓN ACTUAL

Se ha registrado pago por deudas correspondiente a la obra Pavimentación Asfáltica de Varios Tramos de la Región Oriental, 5ª Tanda – Lote N° 3: Ruta Nacional N° 5 Jhuguá Ocampos - Ykua Jhovv - San Blas. Cabe mencionar que estas obras se encuentran culminadas, según reportes anteriores del MOPC.

[illegible]

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Itapua				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		827				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	283.005.776.870
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
277.061.759.806			5.944.017.064		97,90 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Itapúa				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				97,25 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
3.052.708.183			2.847.132.477		93,27 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

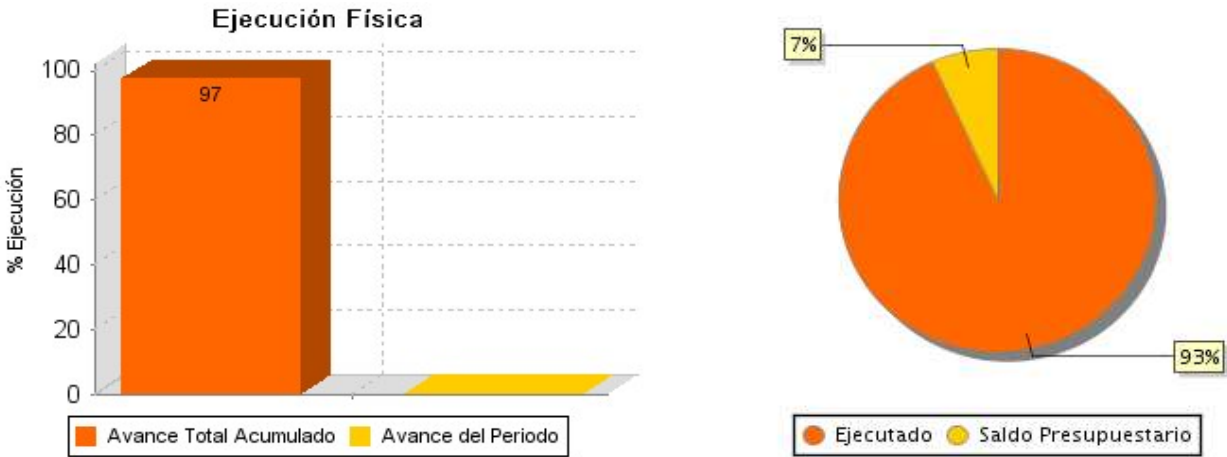


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en éste cuatrimestre no se ha podido cumplir con todos los pagos de las deudas pendientes, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria. Cabe mencionar que las obras enmarcadas dentro del Decreto N° 4614/2020, se encuentran culminadas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Central			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		828			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	139.594.862.782
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
124.104.925.046		15.489.937.736		88,90 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			94,90 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
4.991.047.501		4.367.388.588		87,50 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

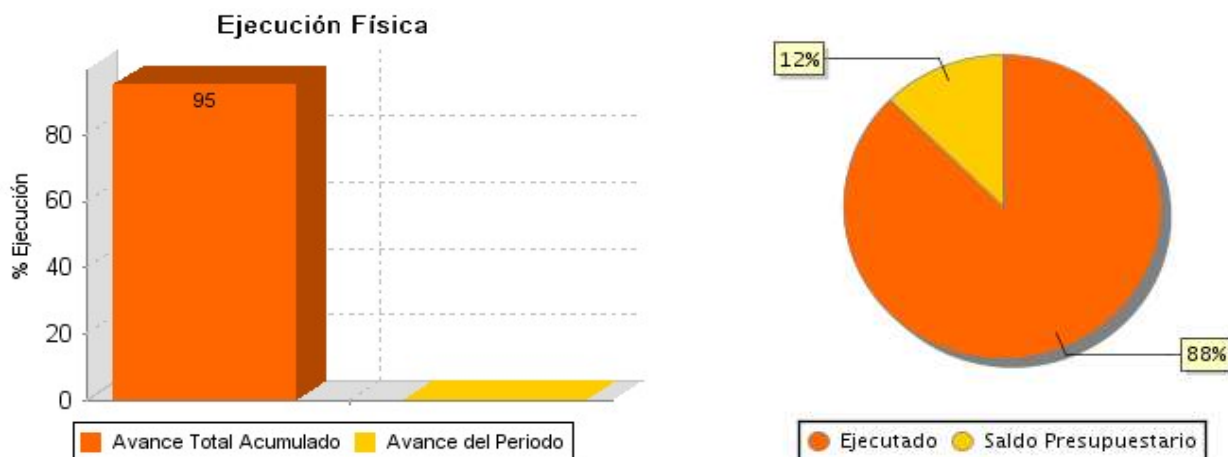


SITUACIÓN ACTUAL

Todas las obras se encuentran culminadas, no se registran avances financieros en este periodo, procesos administrativos pendientes para honrar deudas

[illegible]

Proyecto		Mejoramiento tramo San Juan Bautista - Ybyraty					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		830					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	51.543.483		GS.	241.524.055.598	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
67.444.683.113			174.079.372.485			27,92 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
04/01/2020			04/01/2024			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Misiones						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
51,00 %				54,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
49.286.707.192			48.986.707.192			99,39 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

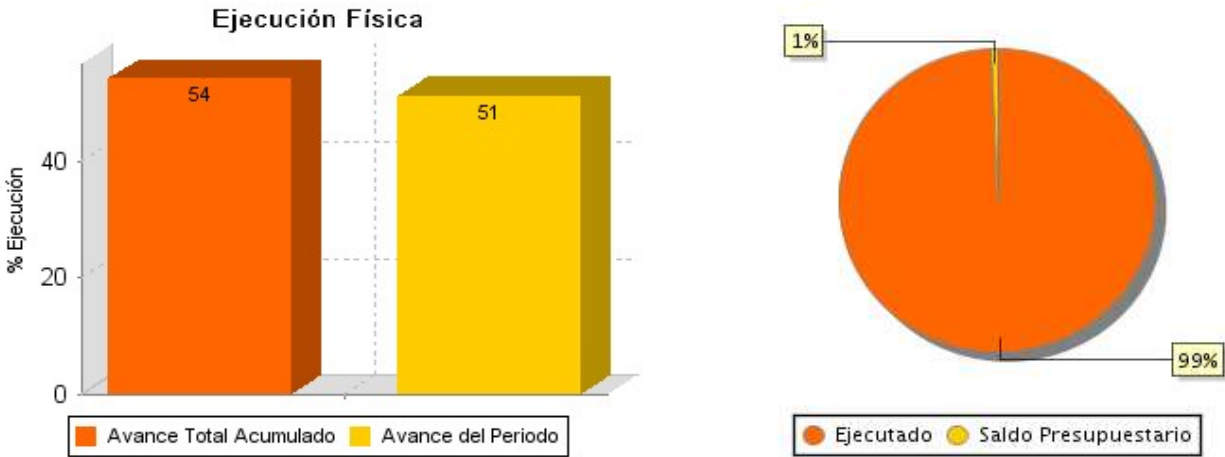


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras correspondientes a la obra Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo: Ybyraty - San Juan Bautista. Lote 1 (PK 0+000 - 18+620), Lote 2 (PK 18+620 - 38+690) y Lote 3 (PK 38+690 - 44+040), se encuentran en plena ejecución, con obras correspondientes a movilización, movimiento de suelo y alcantarillado. Con respecto a la obra Circunvalación de San Juan Bautista (Pk 0+000 - 6+200) la misma se encuentra en etapa de finalización.

Proyecto		Construcción Caminos Vec. Pav.y no Pav.Dpto San Pedro					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		833					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	198.586.785.389	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
189.157.404.533			9.429.380.856			95,25 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
04/10/2019			31/12/2020			31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	San Pedro						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				58,50 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
9.839.828.858			5.610.335.906			57,02 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

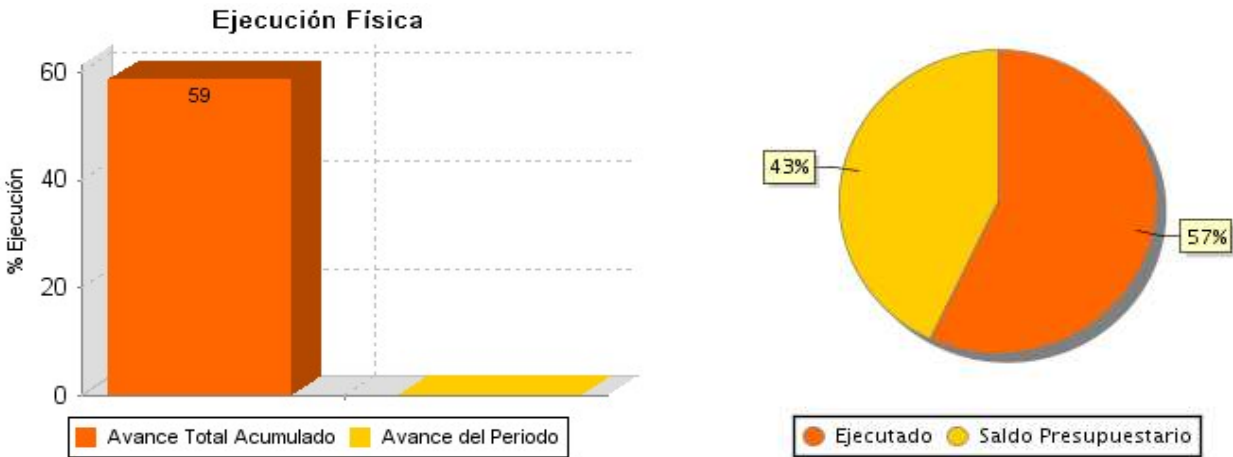


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Decreto N° 4614/2020 se encuentran concluidas, Asimismo, el MOPC informa que se cuenta con deudas en concepto de intereses moratorios.

Proyecto		Construcción Caminos Vec.Pav. y no Pav.Dpto.Canindeyu					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		834					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	126.790.411.092	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
112.246.535.893			14.543.875.199			88,53 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/11/2019			31/12/2020			31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Canindeyú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				42,08 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
570.409.308			495.892.706			86,94 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

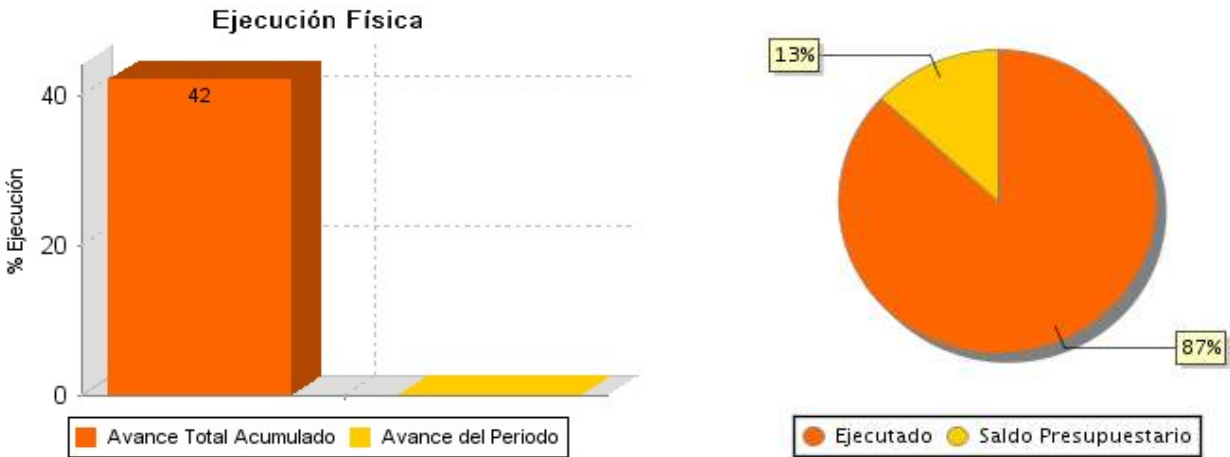


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC manifiesta que las obras se encuentran concluidas. Además, informa que el proyecto cuenta con deudas en concepto de intereses moratorios.

Proyecto		Construcción Caminos Vecinales Pavimentación y no Pavimentado Departamento Caazapa				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		838				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	18.649.845.171
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
17.760.415.191			889.429.980		95,23 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/10/2019			31/12/2020		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Caazapá				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				99,00 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
177.608			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

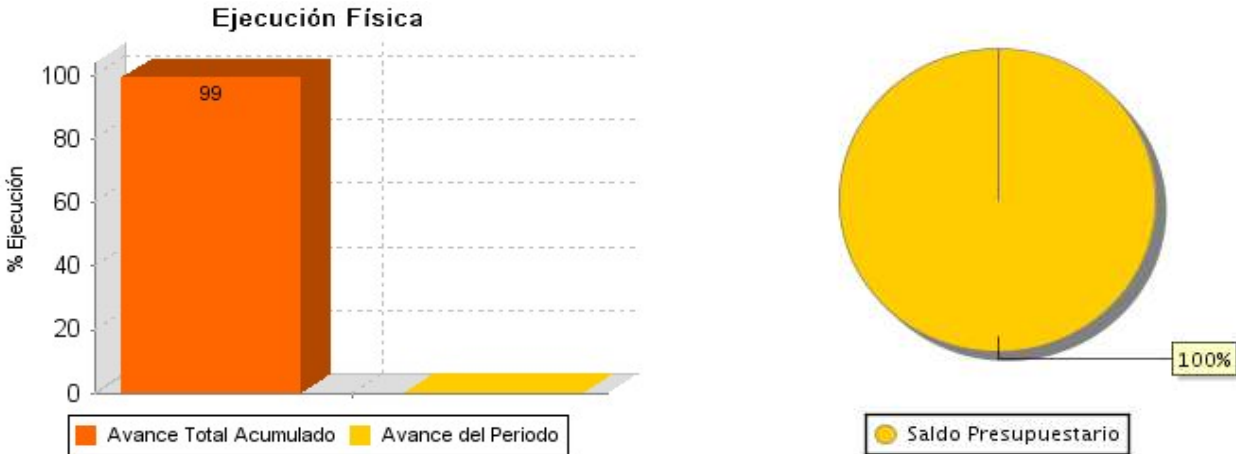


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que las obras se encuentran concluidas. Asimismo informa, que el Lote 4 - Caazapá -Boquerón cuenta con deudas pendientes en concepto de intereses moratorios.

Proyecto		Construcción Caminos Veinales Pavimentado Departamento Ñeembucu					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		841					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	108.459.128.663	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
91.217.783.094			17.241.345.569			84,10 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/11/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Ñeembucú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				40,30 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
48			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

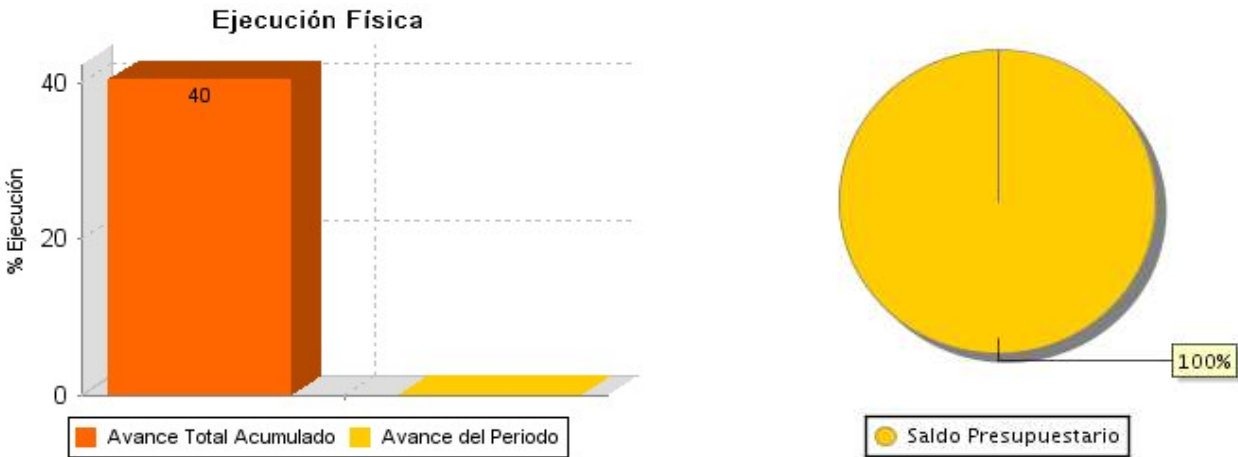


SITUACIÓN ACTUAL

El lote 7 Tramo Emp.Alberdi-Pilar - San Juan de Ñeembucu, tiene las obras concluidas con recepción definitiva, cuenta con deudas pendientes de pago en concepto de intereses moratorios.

Proyecto		Construcción Caminos Vecinales y Pavimentado Departamento de Paraguarí.					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		842					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	54.987.954.652	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
52.144.888.780			2.843.065.872			94,83 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
04/10/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Paraguarí						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0 %				34 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
586.320.566			349.320.565			59,58 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

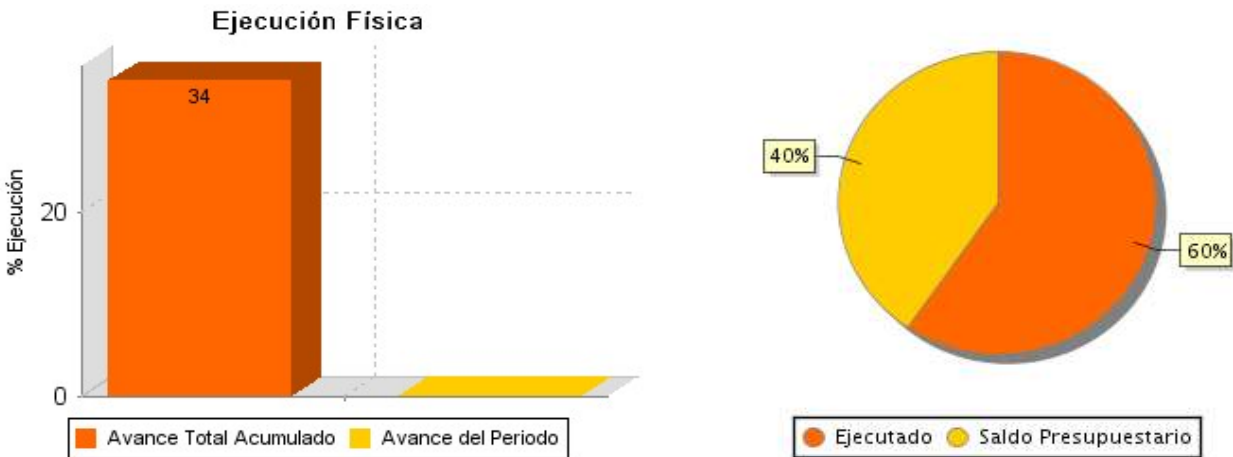


SITUACIÓN ACTUAL

Obras concluidas, cuenta con deudas pendientes en concepto de interes moratorio

Proyecto		Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 km											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		854											
Financiamiento		FONPLATA											
Costo del Proyecto		USD		418.266.335				GS.		2.918.033.081.600			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
361.176.662.035				2.556.856.419.565				12,38 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/04/2022				16/11/2028				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Boquerón											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
3,54 %						5,09 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024				Porcentaje Ejecutado					
418.594.865.061				267.954.849.681				64,01 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

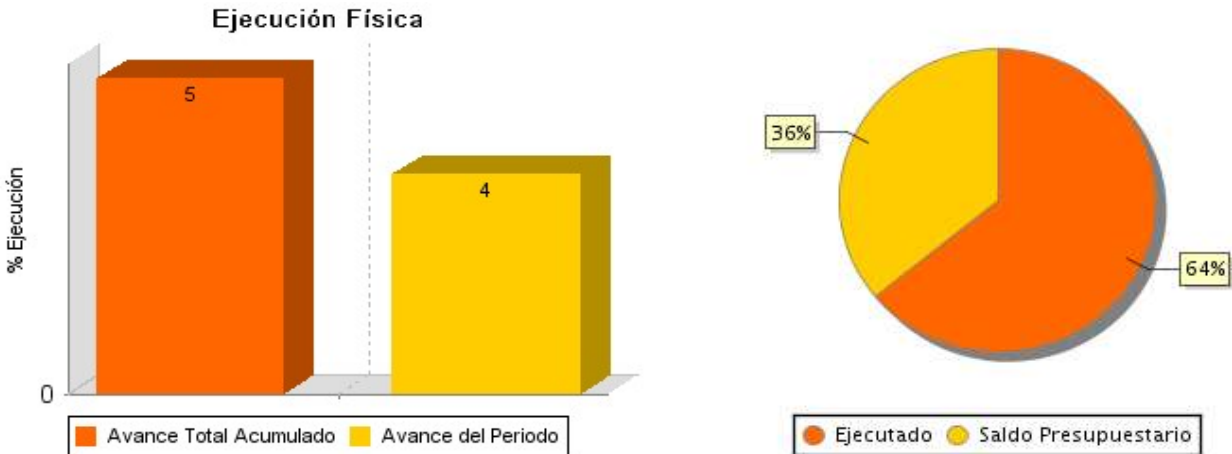


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en el periodo de referencia las actividades realizadas por las empresas contratistas consistieron en: Movilización, Instalación de Campamentos, mantenimiento de camino de servicio (camino existente), movimientos de suelo como despeje, desbroce y desbosque.

Proyecto		Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km)					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		857					
Financiamiento		CAF					
Costo del Proyecto		USD	99.100.000		GS.	633.712.360.978	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
132.338.323.957			501.374.037.021			20,88 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/04/2022			03/03/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Alto Paraná						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
17,57 %				27,54 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
84.047.221.501			66.743.921.106			79,41 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

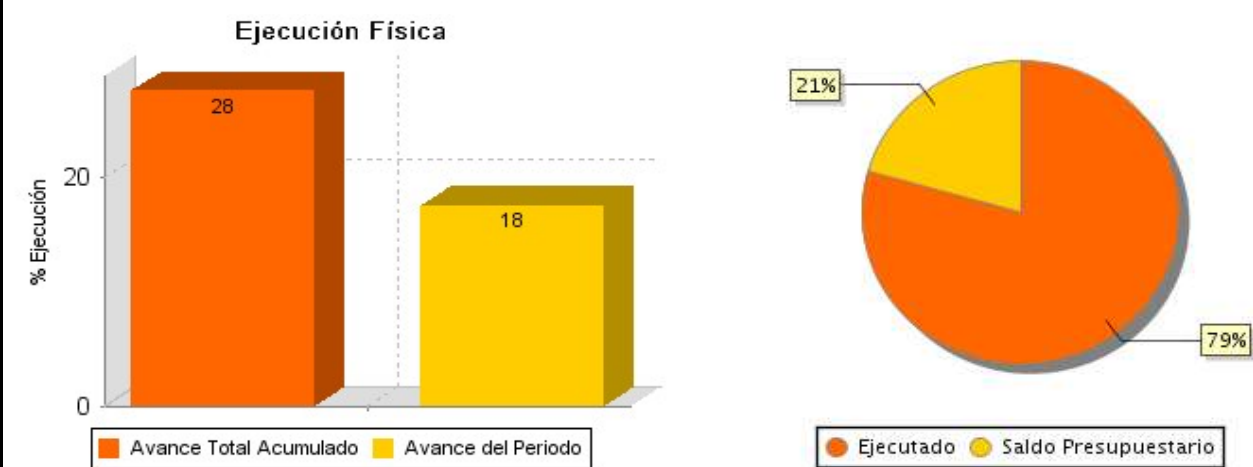


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se registraron los siguientes avances: Componente 1: Actividad 1: Construcción y Mantenimiento de la Ruta PY 21, Tramo: Ruta PY 07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, en los Lotes N° 1 y 2, presenta 8% de avance general, avance de 13 km en la capa asfáltica, se resaltan los trabajos de terraplén y excavaciones varias. Actividad 2: Obras Complementarias, en etapa de elaboración del PBC. Componente 2: Se realizaron varios pagos por expropiaciones de terrenos y mejoras. Componente 3: Actividad 2 - Fiscalización de las obras de Pavimentación y Mantenimiento de la Ruta PY 21, Tramo: Ruta PY 07 (Empalme Supercarretera) - Puerto Indio, las fiscalizadoras presentaron 3 informes mensuales en el presente cuatrimestre, las demás actividades no presentan avances.

Proyecto		Ampliación Defensa Costera Ciudad de Pilar				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		860				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	759.815.980.019
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
728.958.085.109			30.857.894.910		95,94 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
08/08/2019			08/08/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Municipal	Pilar					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,14 %				95,91 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
33.477.363.435			32.288.736.630		96,45 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

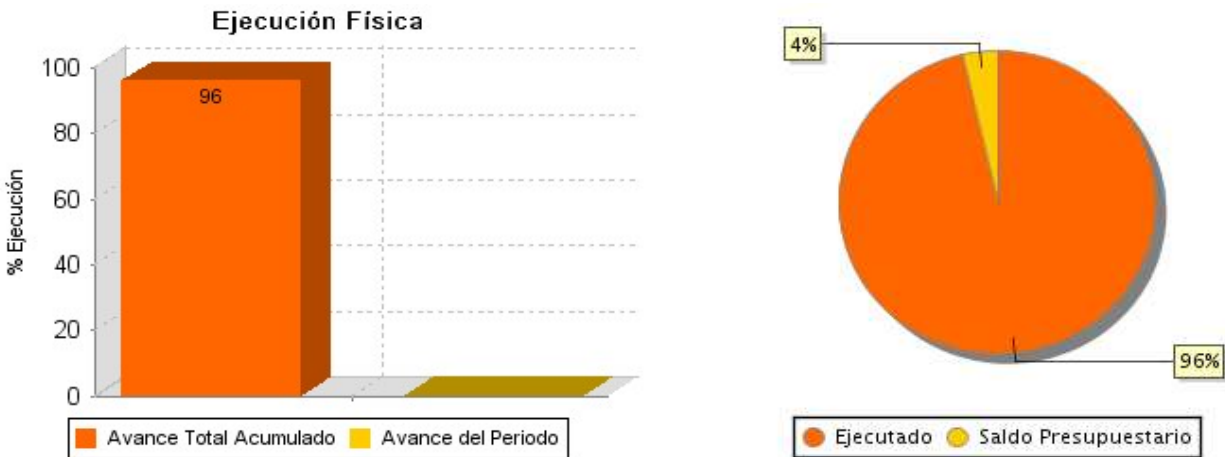


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo se continúan con los siguientes trabajos:
a)Mantenimiento de reservorios b)Canales de derivación y Cauce del Arroyo San Lorenzo - Limpieza de cauces y canales, corte de pasto y control de vegetación. - Reposición de empastado mediante hidrosiembra - Reacondicionamiento de suelos en taludes. - Perfilado de caminos auxiliares y coronamiento del muro. c)Mantenimiento y operación de sistemas de compuertas y electro bombas - Mantenimiento electromecánico de bombas, sistemas de alimentación, grupos electrógenos, mecanismos de compuertas y sistemas de iluminación (solar y eléctrica).

Proyecto		Mejoramiento Corredor Agroindustrial - Región Occidental			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		863			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	134.342.866	GS.	1.288.128.933.825
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.001.295.629.876		286.833.303.949		77,73 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020		23/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
20,63 %			74,01 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
266.883.925.138		229.482.779.587		85,99 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

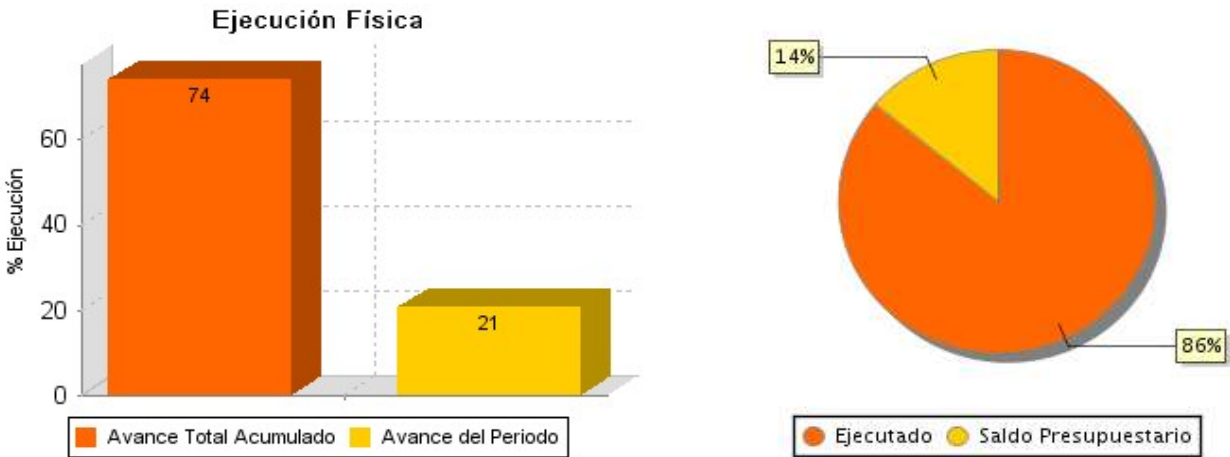

SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Occidental, a continuación, detallamos el avance:

Componente 1 - Obras de Mantenimiento y Pavimentacion Asfaltica:

1) Lote 1 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76Km), CULMINADO la Etapa de Puesta a Punto. En Proceso de Recepción Definitiva. En el año 2025 entra la etapa de mantenimiento.


2) Lote 2 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo – Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100, el acceso a Campo Aceval y el tramo Campo Aceval - Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 0+000 hasta progresiva 29+500 (71,47 Km), CULMINADO la Etapa de Puesta a Punto. En Proceso de Recepción Definitiva. En el año 2025 entra la etapa de mantenimiento.

Componente 2 - Construcciones y Mantenimiento de Obras Basicas; Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y Tramo Campo Aceval – Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500, Culminado la Etapa de Puesta a Punto. En Proceso de Recepción Definitiva. En el año 2025 entra la etapa de mantenimiento.

Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial Region Oriental				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		864				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	100.657.134		GS.	685.804.896.001
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
317.744.962.263			368.059.933.738		46,33 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020			23/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
29,96 %				90,76 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
140.542.554.850			117.332.655.948		83,49 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

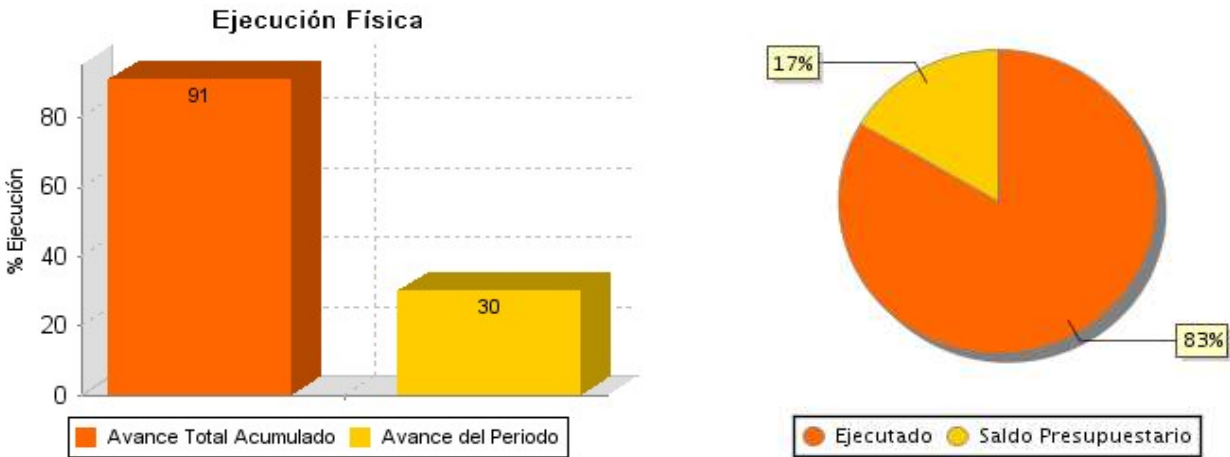


SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Oriental a continuación detallamos el avance:

1. Lote 1: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo (Incluye Accesos a Volendam (4 Km Zona Urbana) y Puerto Mbopicua (6 Km) y Volendam San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Río Jejui e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (77,9 Km). cuenta con un Avance Físico Rea del 78,62% -
2. Lote 2: San Pablo - Empalme PY 11 (Cruce Yacaré Ñe'e). tiene un Avance Físico Real 71,94% y.
3. Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Construcción Alcantarilla y Planta de Tratamiento. Sistema de Agua San Ignacio.					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		871					
Financiamiento		CAF					
Costo del Proyecto		USD	16.234.735		GS.	125.748.738.514	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			99.394.366.512			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/07/2023			7/7/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Misiones					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				0,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
13.087.460.046			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

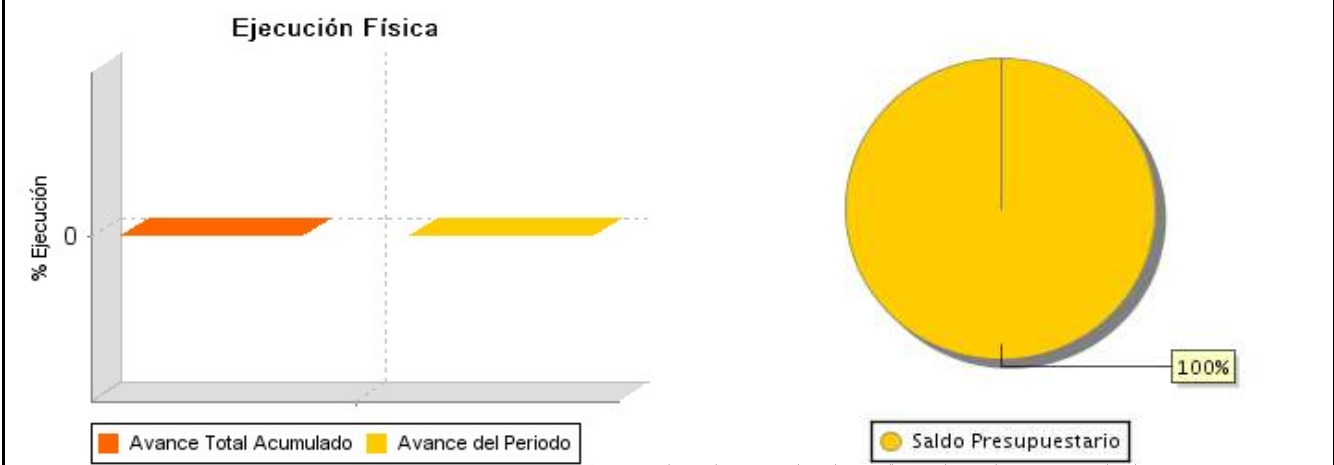

SITUACIÓN ACTUAL


Al cabo del tercer cuatrimestre 2024, el Proyecto ha avanzado en la adjudicación del llamado Licitación Pública Internacional para contratación de firmas consultoras para la construcción y fiscalización de obras. Así también se ha avanzado con el llamado para Licitación Pública Internacional para servicios de Gerenciamiento apoyo en la Ejecución de los programas.

Se han realizado las gestiones, para la obtención del primer desembolso, para el pago de gastos de evaluación CAF y comisión de financiamiento CAF.

Los inicios de obras están previstos para el primer cuatrimestre del año 2025

Proyecto		Construcción Alcantarilla y Planta de Tratamiento / Sistema de Agua Santa Rita			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		874			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	12.108.048	GS.	93.784.825.347
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		93.784.825.347		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
07/07/2023		7/7/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,04 %			0,04 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
12.475.467.720		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

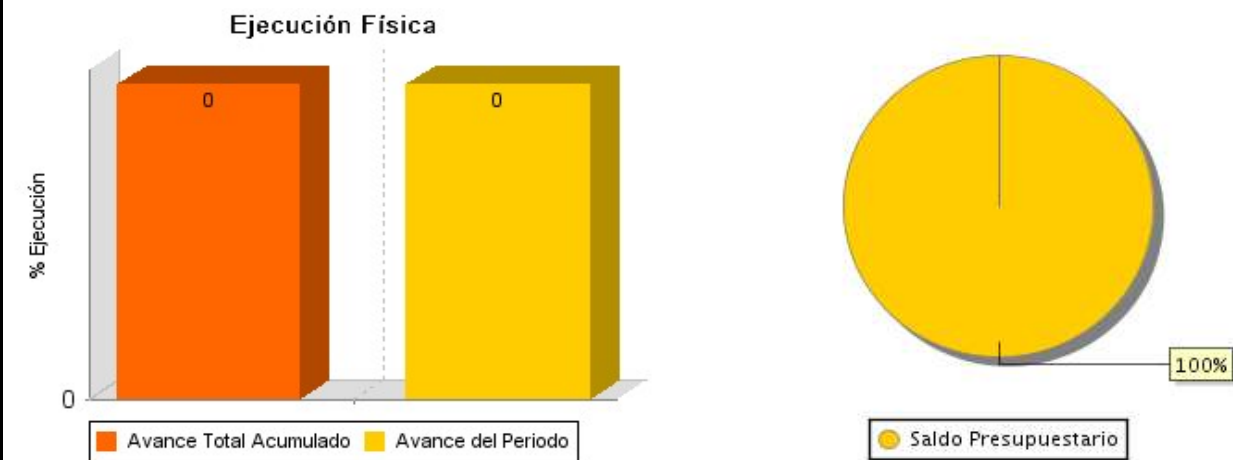

SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre, se tiene los siguientes avances:


- Llamado MOPC 25/2024 LPI para la contratación de firmas consultoras para la fiscalización de las obras de construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Actualmente adjudicado. Sin contrato firmado. Aguardando los plazos legales.
- Llamado MOPC N° 33/24 LPI construcción del sistema de alcantarillado sanitario, planta de tratamiento de aguas residuales y mejoramiento del sistema de agua potable actualmente adjudicado. Contrato firmado sin código de contratación. Falta actualizar CDP al 2025 .
- Llamado MOPC N° 118/24 LPI contratación de firmas para servicio de gerenciamiento apoyo en la ejecución de los programas de saneamiento de ciudades intermedias y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, actualmente en proceso de adjudicación (dictamen).

*Se han realizado las gestiones, para la obtención del primer desembolso, para el pago de gastos de evaluación CAF y comisión de financiamiento CAF

*Los inicios de obras están previstos para el primer cuatrimestre del año 2025

Proyecto	Construcción Alcantarilla y Planta de Tratamiento. Sistema de Agua Carapegua.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	875				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	12.694.902		GS.	98.330.393.066
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		98.330.393.066		0,00	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
07/07/2023		7/7/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Paraguarí				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
8,88 %			8,88 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
12.475.467.720		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

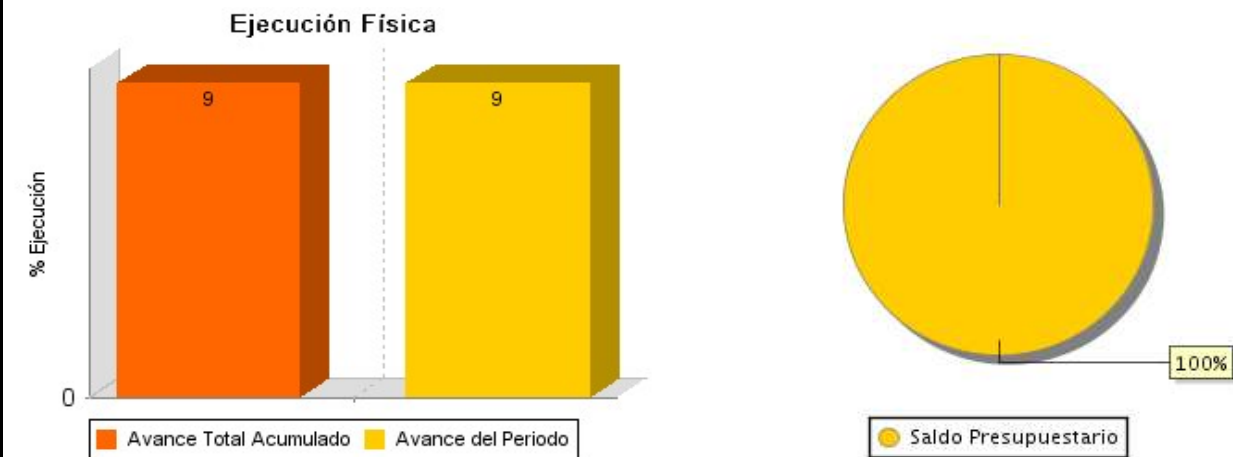

SITUACIÓN ACTUAL


Al cabo del tercer cuatrimestre 2024, el Proyecto ha avanzado en la adjudicación del llamado Licitación Pública Internacional para contratación de firmas consultoras para la construcción y fiscalización de obras. Así también se ha avanzado con el llamado para Licitación Pública Internacional para servicios de Gerenciamiento apoyo en la Ejecución de los programas.

Se han realizado las gestiones, para la obtención del primer desembolso, para el pago de gastos de evaluación CAF y comisión de financiamiento CAF.

Los inicios de obras están previstos para el primer cuatrimestre del año 2025

Proyecto		Construcción de la Ruta PY 12 Tramo Chaco´l-General Bruguez			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		882			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	215.000.000	GS.	1.485.662.900.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
387.146.558.910		1.098.516.341.090		26,06 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
09/09/2022		09/09/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
28,20 %			37,57 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
244.614.000.000		214.940.612.344		87,87 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

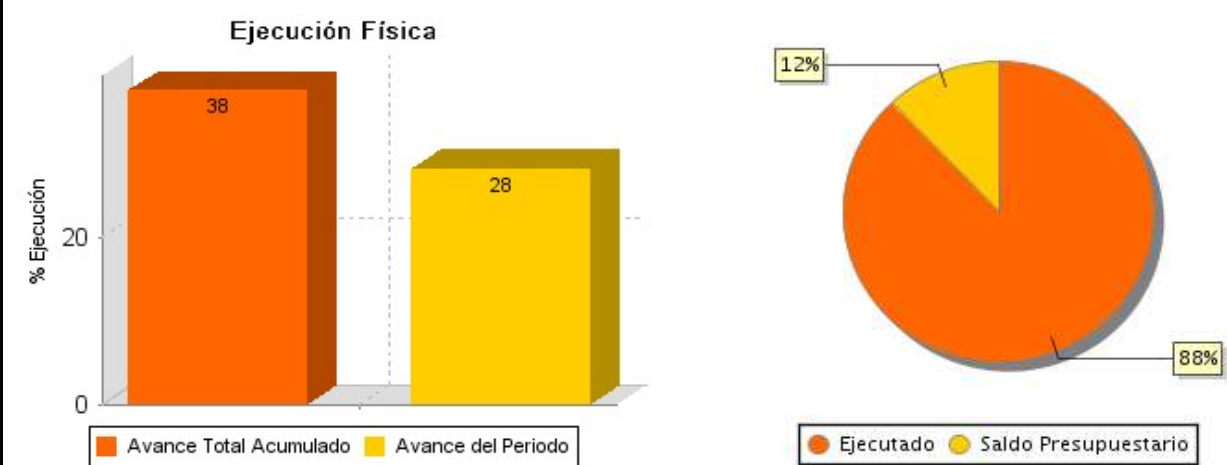


SITUACIÓN ACTUAL

A continuación, detallamos el avance: a. Se adjudicó el llamado MOPC N° 83/2022 LPI para la contratación de empresas constructoras para la obras de habilitación y mantenimiento de la Ruta PY 12. Tramo Cruce Nanawa - Gral Bruguez y accesos. Al cabo del tercer cuatrimestre ha obtenido un Avance físico real del Lote 1 – 12,36%, Lote 2 – 39,60%, Lote 3 – 31,72% y lote 4 – 18,10%. Cabe mencionar que el llamado de fiscalización se canceló, actualmente se está realizando vía administrativa.

Proyecto	Construcción Alcantarilla y Planta de Tratamiento. Sistema de Agua Sta Rosa Aguaray.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	889				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	11.254.316		GS.	87.172.104.572
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		87.172.104.572		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
7/7/2023		7/7/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,86 %			0,86 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
11.863.475.394		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

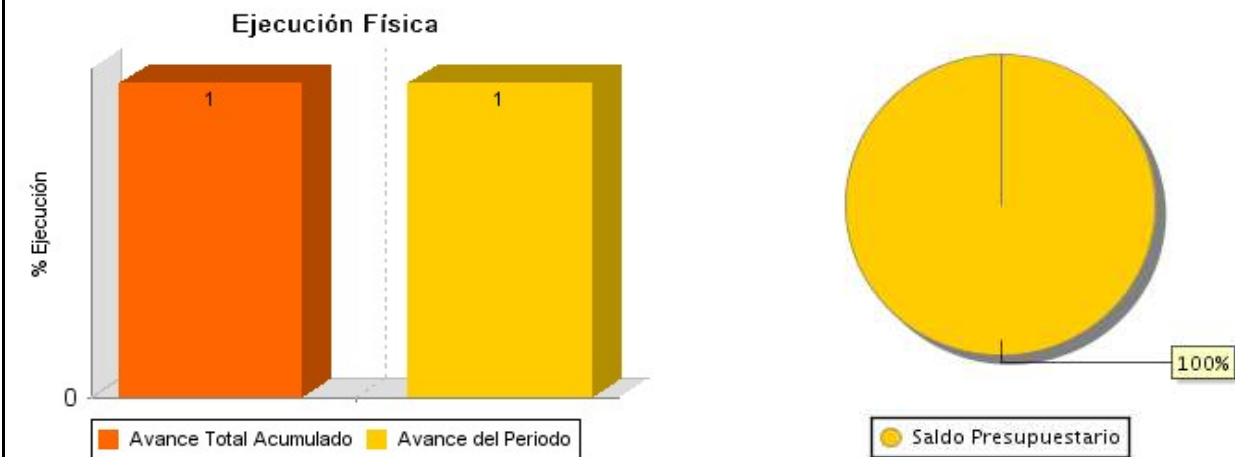

SITUACIÓN ACTUAL


Al cabo del tercer cuatrimestre 2024, el Proyecto ha avanzado en la adjudicación del llamado Licitación Pública Internacional para contratación de firmas consultoras para la construcción y fiscalización de obras. Así también se ha avanzado con el llamado para Licitación Pública Internacional para servicios de Gerenciamiento apoyo en la Ejecución de los programas.

Se han realizado las gestiones, para la obtención del primer desembolso, para el pago de gastos de evaluación CAF y comisión de financiamiento CAF

Los inicios de obras están previstos para el primer cuatrimestre del año 2025

Proyecto		Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		892					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	51.611.968.238	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
53.053.385.657			-1.441.417.419			102,79 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
25/11/2019			25/11/2022			25/11/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
7.127.216.137			7.127.216.137			100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

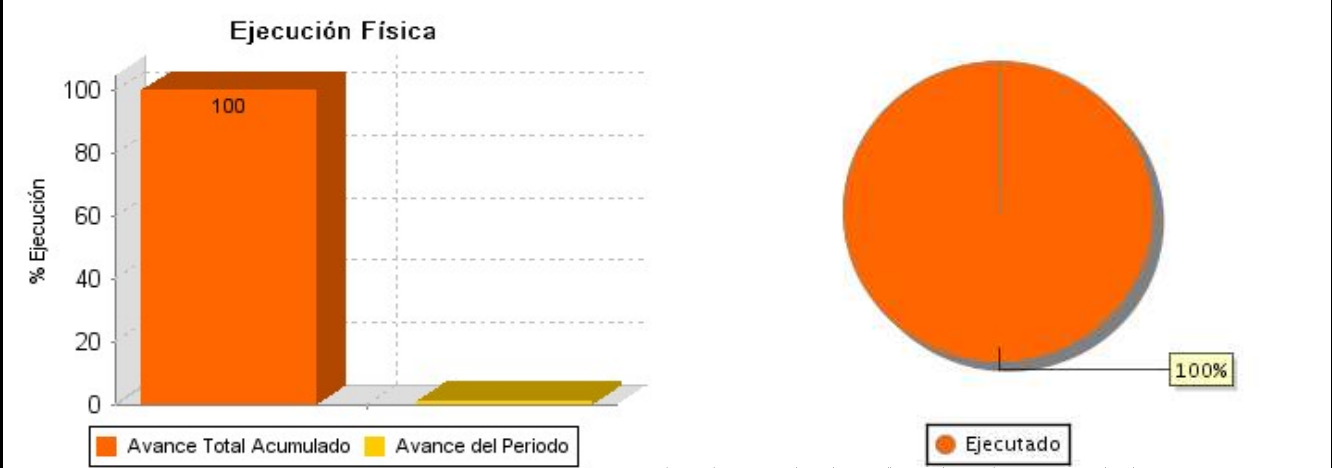


SITUACIÓN ACTUAL

La obra ya cuenta con Recepción Provisoria y la Recepción Definitiva se encuentra en trámite. El proyecto ha terminado éste cuatrimestre con saldo negativo en relación a su costo total. Lo cual deberá de gestionar el en el próximo cuatrimestre su aumento.

Proyecto		Mejoramiento Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario de Cuenca Lambaré					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		906					
Financiamiento		BID , ICO					
Costo del Proyecto		USD	165.000.000		GS.	1.193.250.300.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
907.450.000			1.192.342.850.000			0,08 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
24/04/2024			24/04/2029			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Central						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
5,65		%		5,65		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
29.280.416.741			907.450.000			3,10 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

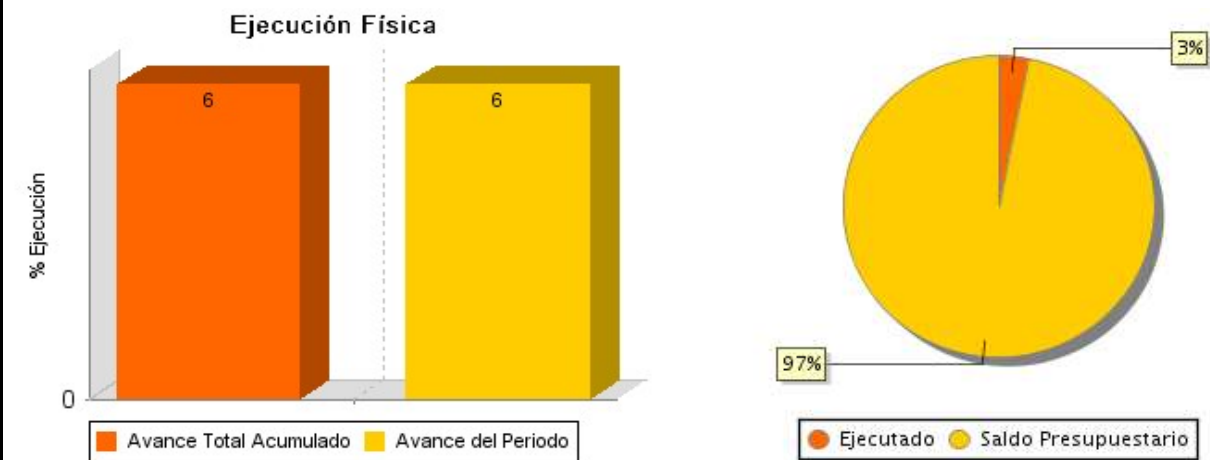


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre 2024, el Proyecto ha avanzado en los llamados para contratación de firma consultora para los servicios de Ingeniero Fidic, contratación de Diseño y construcción de Obra, contratación de asistencia técnica y operativa ATOE y Servicios de Gerenciamiento para la ejecución de los Proyectos, encontrándose todos los llamados en etapa de evaluación.

Proyecto	Construcción de Alcantarilla y Planta de Tratamiento para la Cuenca de Mariano Roque Alonso				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	933				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	160.000.000		GS.	1.211.528.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		1.211.528.000.000		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/1/2024		31/1/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,48 %			0,48 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
11.415.349.320		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

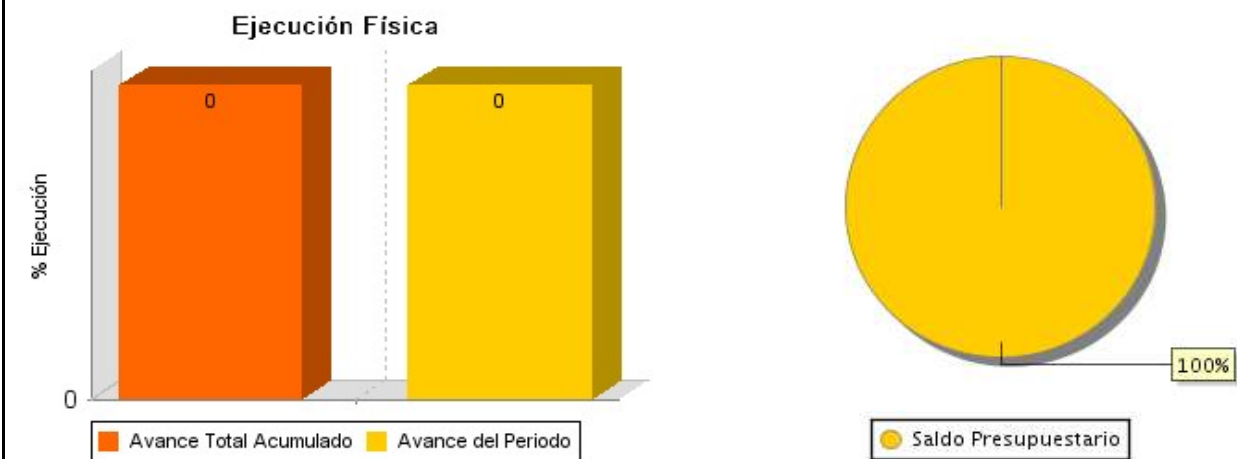


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre se han realizado las gestiones, para la obtención del primer desembolso, para el pago de gastos de evaluación CAF y comisión de financiamiento CAF.

Asimismo se ha publicado el llamado MOPC N° 118/24 LPI contratación de firmas para servicio de gerenciamiento apoyo en la ejecución de los programas de saneamiento de ciudades intermedias y la construcción del sistema de alcantarillado sanitario,PTAR cuenca de Mariano Roque Alonso. El mismo se encuentra en proceso de adjudicación (dictamen).

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		935			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	8.533.170	GS.	59.732.188.277
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		59.732.188.277		0,00	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
15/4/2024		15/4/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Capiatá				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,65 %			4,65 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
7.941.920.500		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

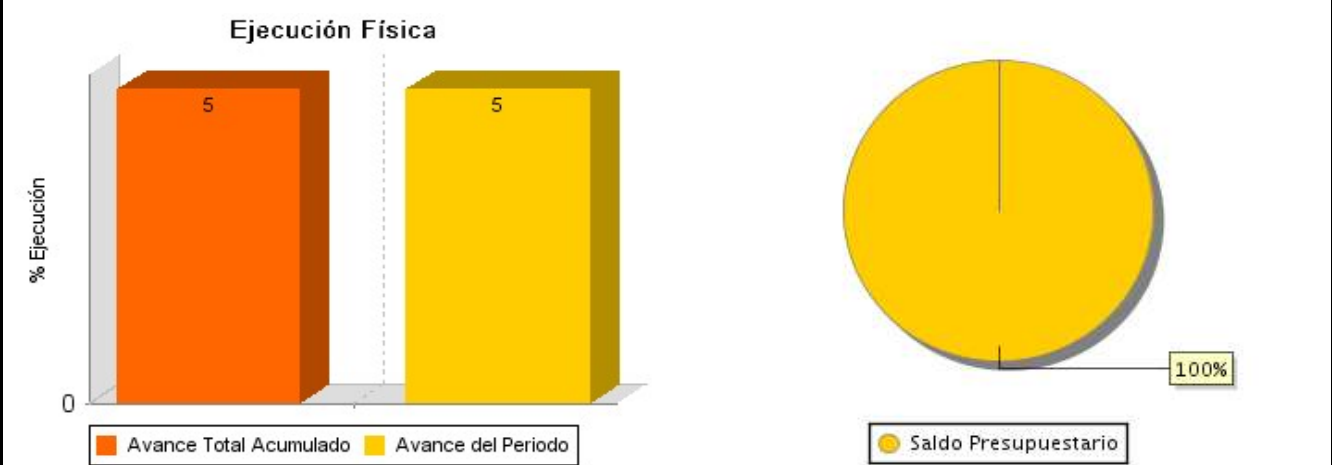


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre la obra se ha adjudicado, se ha procedido a la firma del contrato y presentación del pedido de Anticipo Financiero.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		936			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	9.744.865	GS.	68.214.056.612
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		68.214.056.612		0,00	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
N/A		-		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	San Lorenzo				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,65 %			4,65 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
6.938.039.500		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

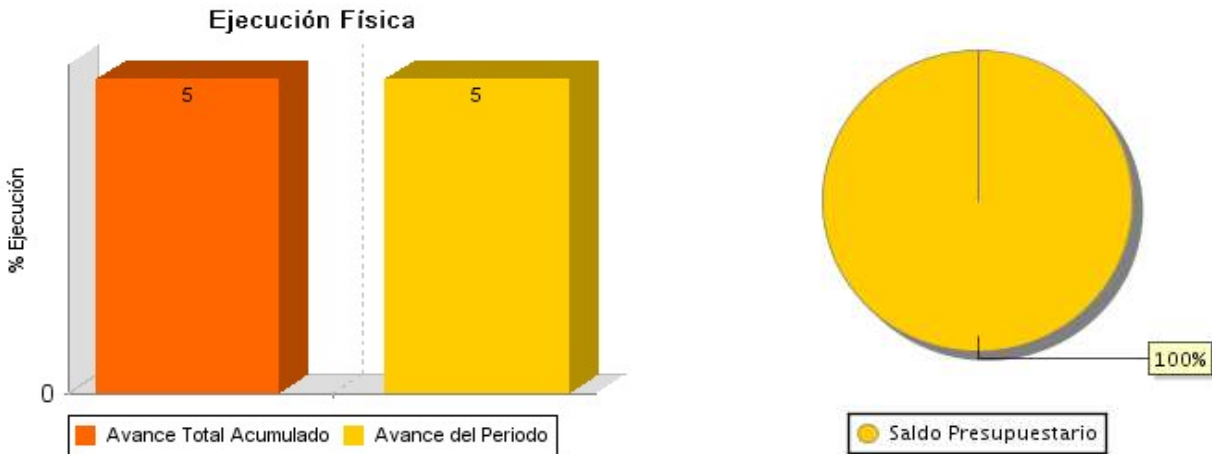


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre la obra se ha adjudicado, se ha procedido a la firma del contrato y presentación del pedido de Anticipo Financiero.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		938					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	4.737.130		GS.	33.159.913.456	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			33.159.913.456			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
14/4/2024			14/4/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal		Ñemby					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
4,65 %				4,65 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
3.367.360.000			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

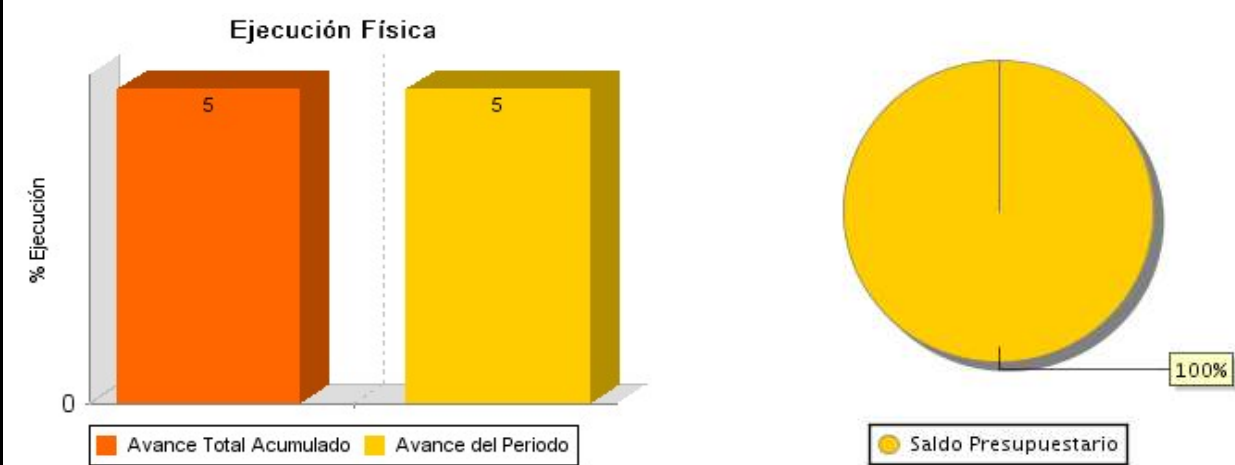


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre la obra se ha adjudicado, se ha procedido a la firma del contrato y presentación del pedido de Anticipo Financiero.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		939					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	6.190.230		GS.	43.331.611.088	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			43.331.611.088			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
15/4/2024			15/4/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal		Areguá					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
4,65 %				4,65 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
4.297.055.773			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

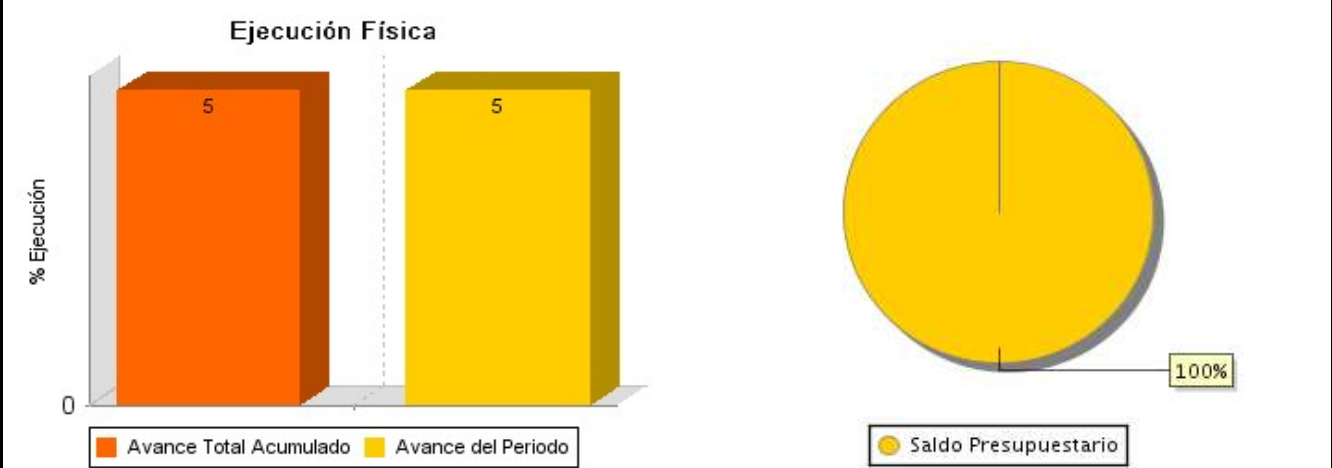


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre la obra se ha adjudicado, se ha procedido a la firma del contrato y presentación del pedido de Anticipo Financiero.

Proyecto	Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	946				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	1.205.470		GS.	8.438.289.069
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		8438289069		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/4/2024		14/4/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Guarambaré				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4,65 %			4,65 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
841.840.000		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

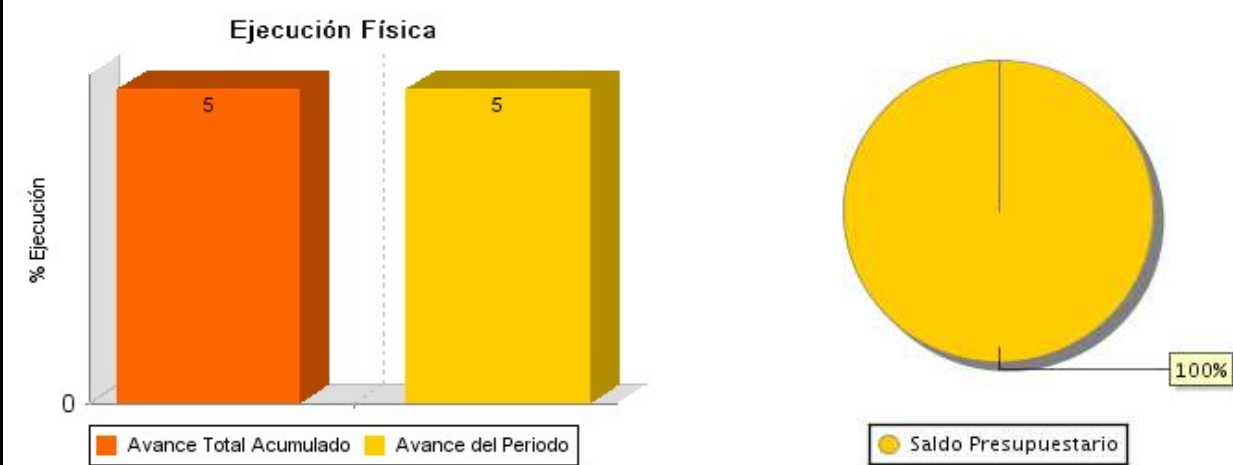


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre la obra se ha adjudicado, se ha procedido a la firma del contrato y presentación del pedido de Anticipo Financiero.

Proyecto	Mejoramiento de gestión de infraestructura vial pavimentada				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	956				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	52.666.659	GS.	401.829.120.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
166.513.408.096		235.315.711.904		41,44 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2022		1/10/2025		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
14,00 %			52,56 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
124.612.965.133		81.078.871.353		65,06 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

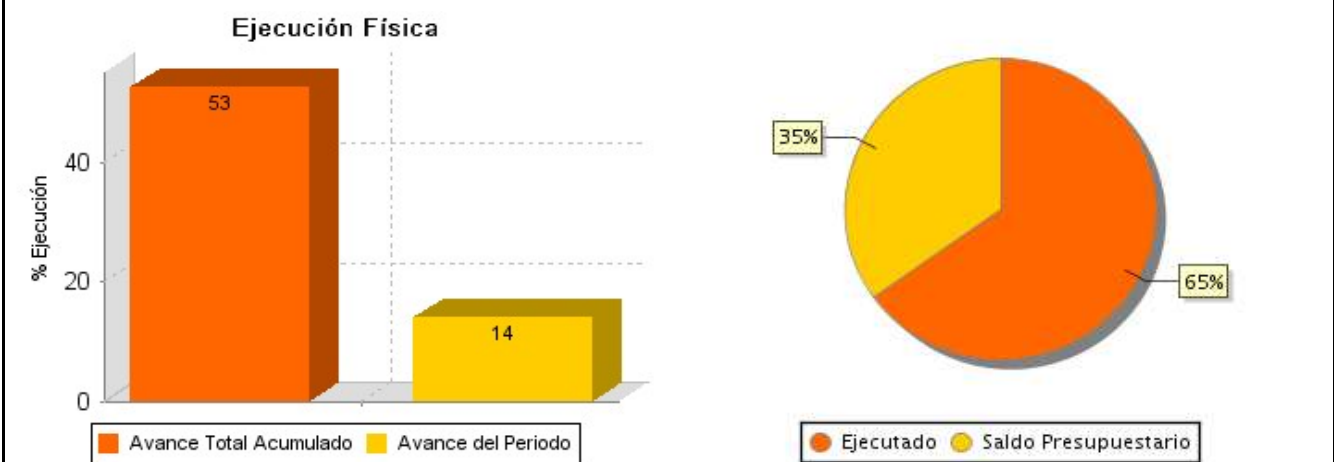

SITUACIÓN ACTUAL


Al cabo del tercer cuatrimestre, se han realizado pagos por provisión de materiales "Adquisición de materiales para planta asfáltica de puentes y obras de arte" de acuerdo acon el cronograma y plazo establecido.

No se ha podido pagar a la contratista por los trabajos de mejoramiento de franja de dominio de carreteras por niveles de servicios, debido a que no se ha emitido los códigos de contratación de parte de la DNCP.

Se ha adjudicado y firmado el último contrato de obra de Mantenimiento y Reparación de Pasos a Desniveles (Tuneles y Viaductos (Itapúa y Semidei).

Proyecto		Mejoramiento del edificio central del MINNA				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		957				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	10.905.509.073
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
8.841.605.059			2.063.904.014		81,07 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/06/2022			01/06/2023		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				52,00 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
815.913.228			815.913.228		100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

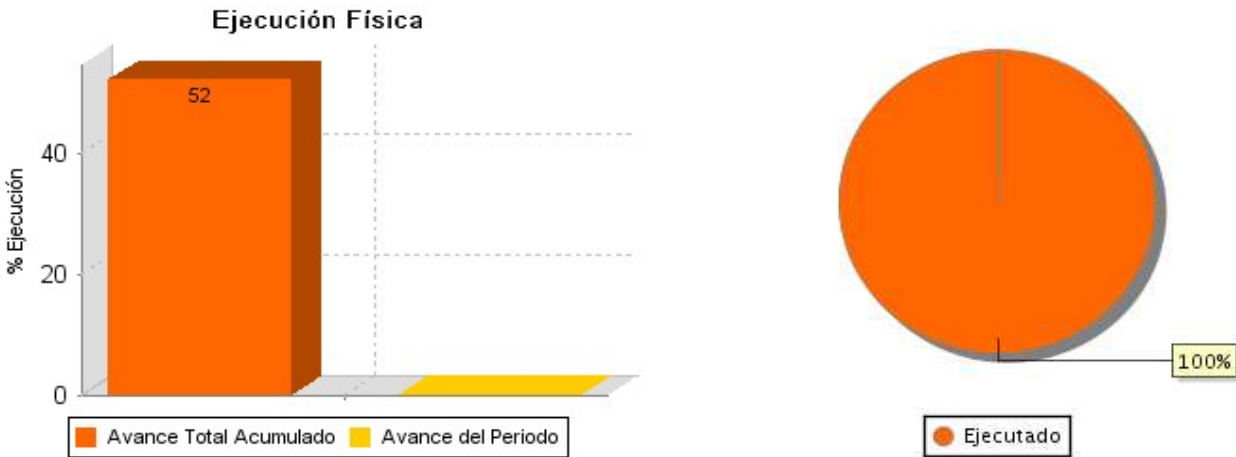


SITUACIÓN ACTUAL

La Obra para la adecuación de condiciones de funcionalidad institucional se encuentra en etapa de Recepción Definitiva.

Proyecto		Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Avenida Costanera Pilar			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		974			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	85.916.456	GS.	601.678.122.876
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		601.678.122.876			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
13/3/2024		13/3/2026			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Pilar				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			0,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado
38.890.814.515		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

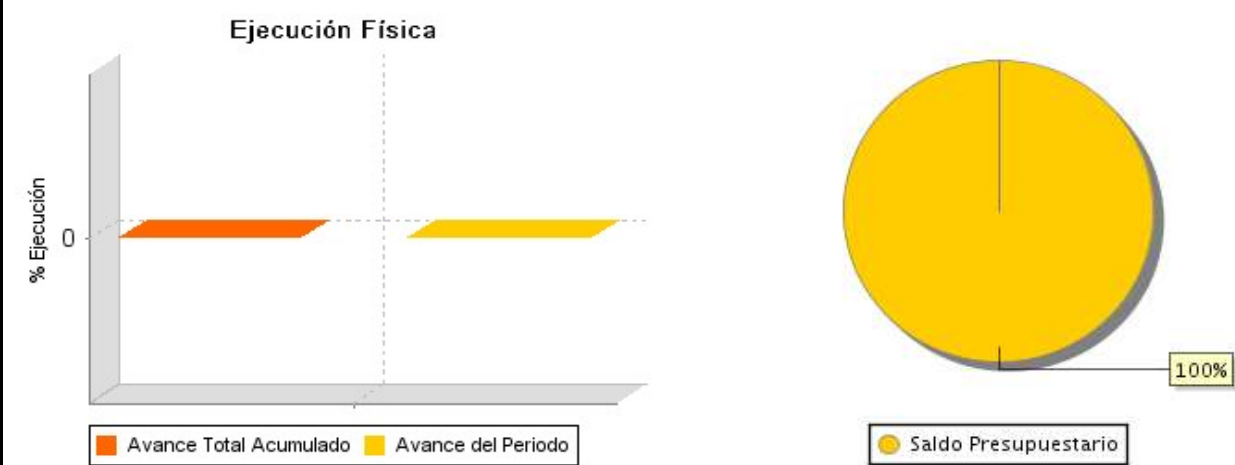


SITUACIÓN ACTUAL

El llamado Construcción del Sistema de Alcantarillado Pluvial, Cloacal y de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la Ciudad de Pilar - Fase B - AD, se encuentra adjudicado, a la espera del pago del anticipo financiero, para dar inicio a las obras.

Proyecto		Construcción y protección de márgenes del Arroyo San Lorenzo					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		1007					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	45.752.075.133	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			45.752.075.133			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
15/3/2024			15/3/2026			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal		San Lorenzo					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				0,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024			Porcentaje Ejecutado	
5.000.000.000			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

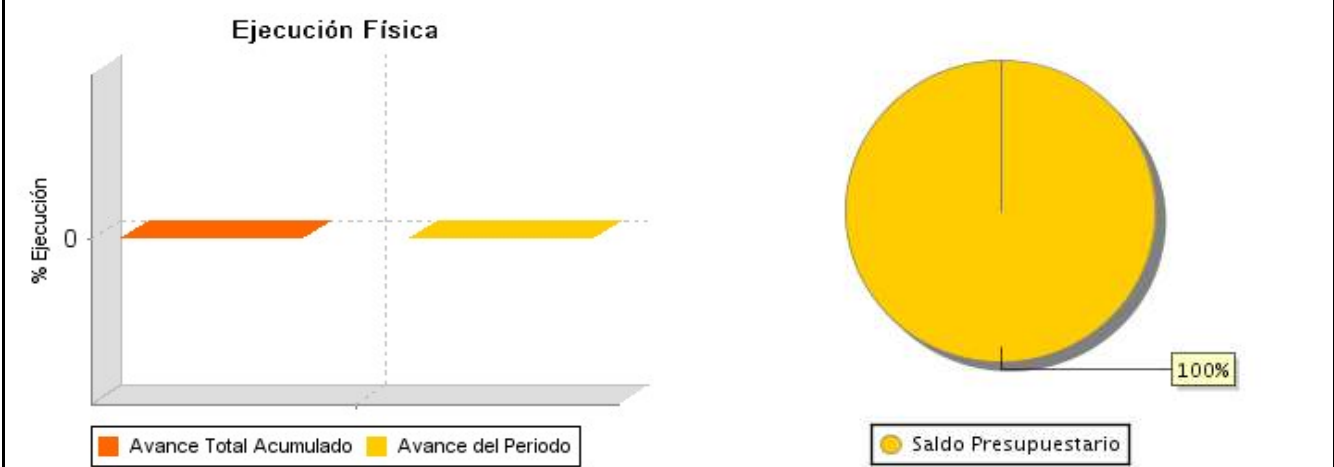

SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del tercer cuatrimestre se ha adjudicado el llamado MOPC N° 99/2024LPN para la construcción de Protección de Márgenes del Arroyo San Lorenzo desde la Avda Mcal Estigarribiahasta la Avda Dr. Gaspar Rodriguez de Francia de la Ciudad de San Lorenzo, la misma contempla la construcción de 850 mts de protección de márgenes.

Proyecto	Mejoramiento Travesía urbana de Coronel Oviedo												
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES												
Código SNIP N°	1131												
Financiamiento	N/A												
Costo del Proyecto	USD	N/A					GS.	101.771.956.863					
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.					Porcentaje de Ejecución						
7.879.098.588		93.892.858.275					0,08						
Fecha de Inicio		Fecha de Fin					Fecha de Prórroga						
1/1/2024		31/12/2026					N/A						
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Distrital	Coronel Oviedo												
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00 %						0,00 %							
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024					Porcentaje Ejecutado					
8.554.587.743			7.879.098.588					92,10 %					


AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


La obra se encuentra en ejecución, se ha pagado el anticipo al termino del tercer cuatrimestre.

[illegible]

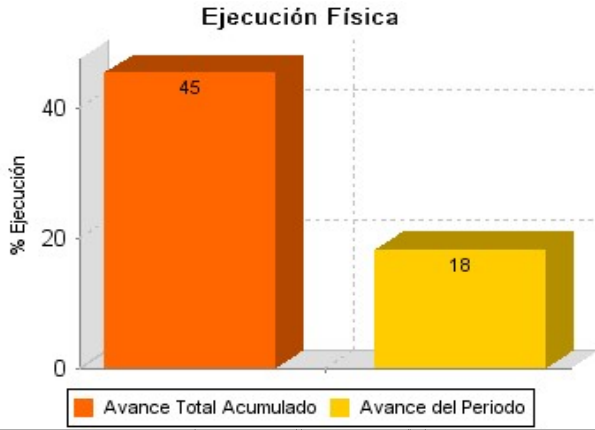 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto		Transferencia PROCENCIA II	
OOE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Código SNIP N°		958	
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.	
Costo del Proyecto		USD	N/A
		GS.	599.274.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	
189.993.824.668		409.280.175.332	
Porcentaje de Ejecución		31,70 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	
23/06/2021		22/06/2027	
Fecha de Prórroga		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional		N/A	
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
18,13 %		45,32 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024	
142.091.585.000		112.438.302.618	
Porcentaje Ejecutado		79,13 %	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			
Ejecución Física  45 18 21% 79%  Ejecutado Saldo Presupuestario			
SITUACIÓN ACTUAL			
En el presente cuatrimestre, se aprobaron 194 informes técnicos de las convocatorias Iniciación de Investigadores y Proyectos ,además de las Guías de Bases y Condiciones para la segunda convocatoria de Proyectos con más de 70 propuestas iniciadas. En los Fondos para Eventos Científicos, se adjudicaron 8 eventos, y se gestionaron las planificaciones y transferencias correspondientes. En los Proyectos Estratégicos y Asociativos, se aprobó la adenda a las Guías de Bases y Condiciones, concluyendo las postulaciones e iniciando la fase de admisión. Asi también, en la Creación y Fortalecimiento de Maestrías y Doctorados de Excelencia, se aprobó la Resolución N° 469/2024, ampliando el cupo de programas.En Incentivos para la Formación de Investigadores en Posgrados, se renovaron becas de beneficiarios activos y se abrieron dos convocatorias con 86 postulaciones (8 finalizadas). En Estancias de Investigación, se cerraron exitosamente los informes y se monitorea la ejecución de 33 contratos firmados, En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se cerró la postulación del Programa de Permanencia 2024 con 299 solicitudes finalizadas, En Inserción de Capital Humano Avanzado se registraron 33 postulaciones, de las cuales 1 fue finalizada. En Apoyo a Publicaciones Científicas, se registraron 31 postulaciones, de las cuales 33 fueron adjudicadas, completándose los desembolsos. Igualmente,en la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología, se aprobaron los Terminos de referencias preliminares y se realizaron conversatorios en colaboración con la UNESCO. En los Concursos de Divulgación y Periodismo Científico, se premiaron 27 ganadores en tres categorías, completando los desembolsos y resoluciones. En el Espacio Interactivo de Ciencia y Tecnología, se avanzó en las licitaciones y contratos del proyecto CONACYT American Space. Las Ferias y Olimpiadas Científicas premiaron proyectos destacados en Ciencia y Tecnología, alcanzando las metas propuestas. Por otro lado,se realizaron llamados para la contratación de profesionales destinados a la asistencia técnica, con la ejecución de evaluaciones de desempeño y la presentación de informes finales.			

Proyecto		Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.			
OEE		SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL			
Código SNIP N°		710			
Financiamiento		BID , LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	16.306.294	GS.	91.315.246.400
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
57.029.388.447		34.285.857.953		62,45 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020		27/03/2025		27/1/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
16,74 %			73,84 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/12/ 2024		Porcentaje Ejecutado	
20.346.987.441		18.021.557.817		88,57 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

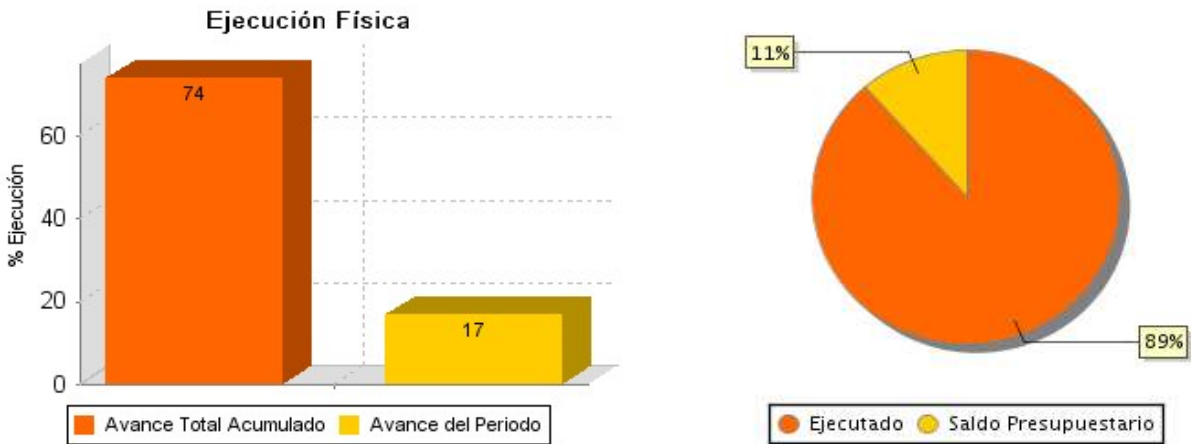

SITUACIÓN ACTUAL

La UEP reportó que se adquirieron 150 tablets rutgerizadas que serán utilizadas en todas las Unidades Zonales y Coordinaciones de Región del SENACSA en todo el territorio nacional. Además se contrataron los servicios de consultoria para la reestructuración de la Dirección de cuarentena de la Dirección General de Sanidad, Identidad y Trazabilidad conforme a los estandares internacionales.

En lo referente al fortalecimiento del laboratorio del SENACSA la empresa consorcio Grupo mas-VTG entrego el segundo informe de soporte tecnico realizado y aprobado por la Dirección General de Laboratorios (DIGELAB), y el tercer informe se encuentra en analisis por la DIGELAB, asi como el consultor contratado para la formación de la Red de Laboratorios entregó el informe final que se encuentra aprobado por la DIGELAB. Por otro lado,se culminaron las obras de Construcción de la Coordinación de Región en Pozo Colorado y San Estanislao, como asi con las Unidades Zonales del SENACSA en Agua Dulce e Ypjehu.

La empresa New technology Solutions que desarrolla el Sistema de Identificación Animal del Paraguay entregó el informe de Avance N ° 3 y el N° 4 la cual se encuentra aprobado por el área técnica, ademas,se adquirieron 50 bastones identificadores electronicos para el Sistema de identidad animal, como asi también licencias ORACLE para el Sistema de identidad animal del Paraguay (SIAP).

Se avanzo con la aprobación del informe final de la consultoria del Plan sanitario sector apicola para aumentar la competitividad a nivel nacional e internacional, asi también,se realizó la contratación de un consultor para la elaboración de un plan sanitario de rabia en animales susceptibles que cuenta con el plan de trabajo aprobado.

Además,se encuentra en etapa de soporte el nuevo DATACENTER del SENACSA con 5 informes entregados a la fecha. Se dió inicio al contrato del consultor encargado de asesorar a la Unidad de Tecnologia en la implementación del Plan maestro de TIC- Componente de seguridad.

Por último,se entregó el plan de trabajo e informe de avance de la consultoria para la evaluación intermedia del Proyecto.
