

Informes cuatrimestrales


1er. Cuatrimestre

2025



Proyecto		Mejoramiento Energético en el Sector Industrial					
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO					
Código SNIP N°		784					
Financiamiento		BID , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	40.000.000		GS.	240.000.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
163.726.252			239.836.273.748			0,07 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
23/06/2022			23/06/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				1,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
37.500.000.000			42.587.897			0,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

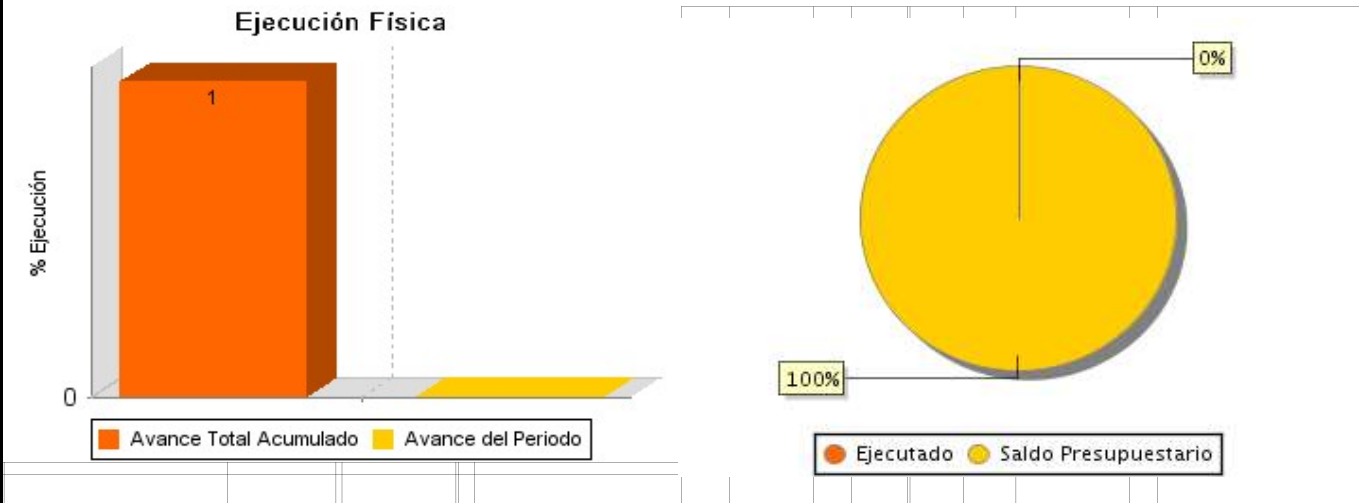


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2025 la Unidad Ejecutora de Proyectos,no respondió a las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Mejoramiento y Amp. de Financ. de Inver. para el Sector Agropecuario				
OEE	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO				
Código SNIP N°	862				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	189.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
56.510.832.048		132.489.167.952		29,89 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
1/6/2024		1/6/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
16,00 %			33,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
112.500.000.000		18.111.038.191		16,10 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

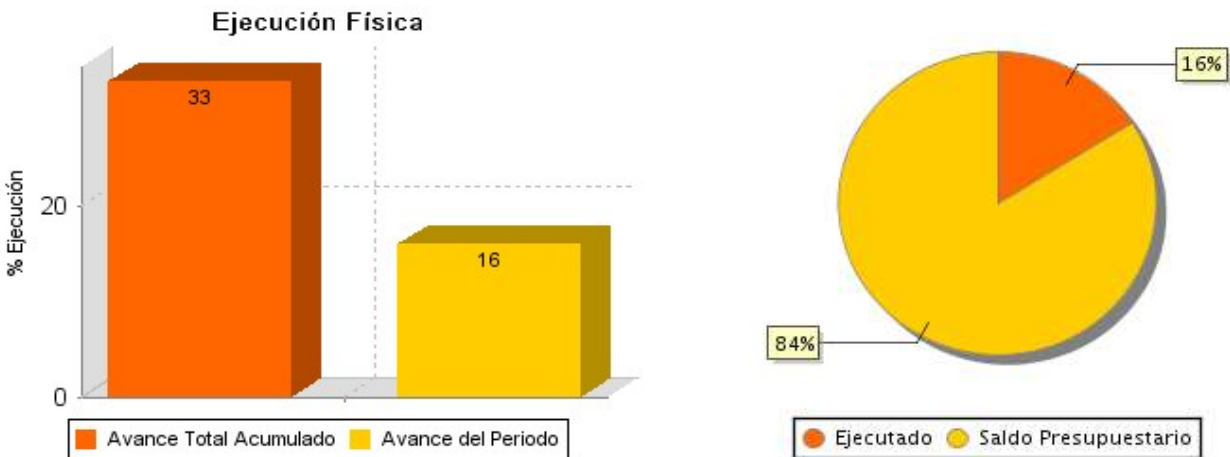

SITUACIÓN ACTUAL


En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2025 la Unidad Ejecutora de Proyectos, no respondió a las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Villa Hayes/ Villa Real/ Pozo Col./ Loma Plata y Subestación Pozo Col.			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	961			
Financiamiento	FONPLATA, KFW, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	126.126.140	GS.	999.023.713.496
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
60.000.000		998.963.713.496	0,01 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
1/3/2025		31/12/2028	N/A	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Boquerón, Concepción, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %		2,96 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025	Porcentaje Ejecutado	
541.723.953.988		60.000.000	0,01 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

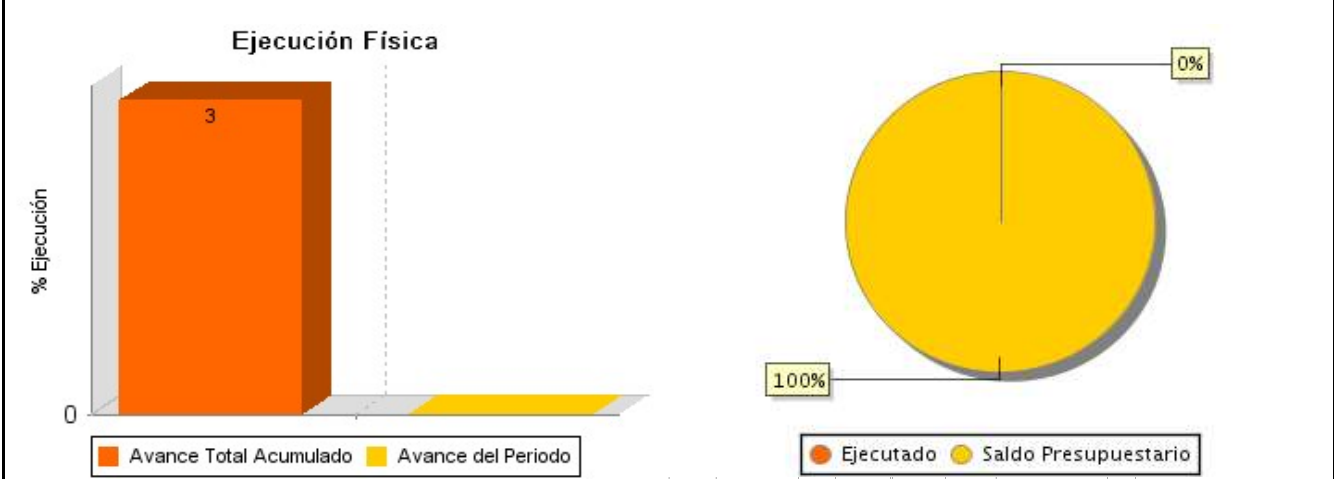


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Mejoramiento Eficiencia Energética de la Red de Alumbrado			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		900			
Financiamiento		BID, JICA			
Costo del Proyecto		USD	15.232.700	GS.	121.774.011.975
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		121.774.011.975		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
15/09/2023		31/12/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			0,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
35.944.597.923		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

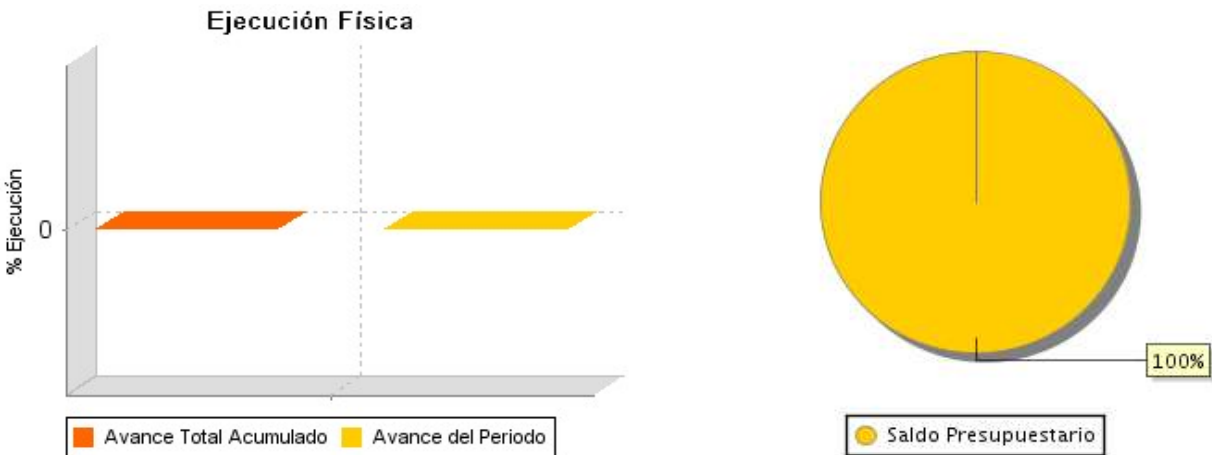


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Yguazú-Valenzuela				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	897				
Financiamiento	BID, JICA				
Costo del Proyecto	USD	157.780.124		GS.	978.236.768.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
475.730.871.145		502.505.897.655		48,63 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
15/09/2023		15/09/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			31,06 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
304.045.403.008		5.458.216.266		1,80 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

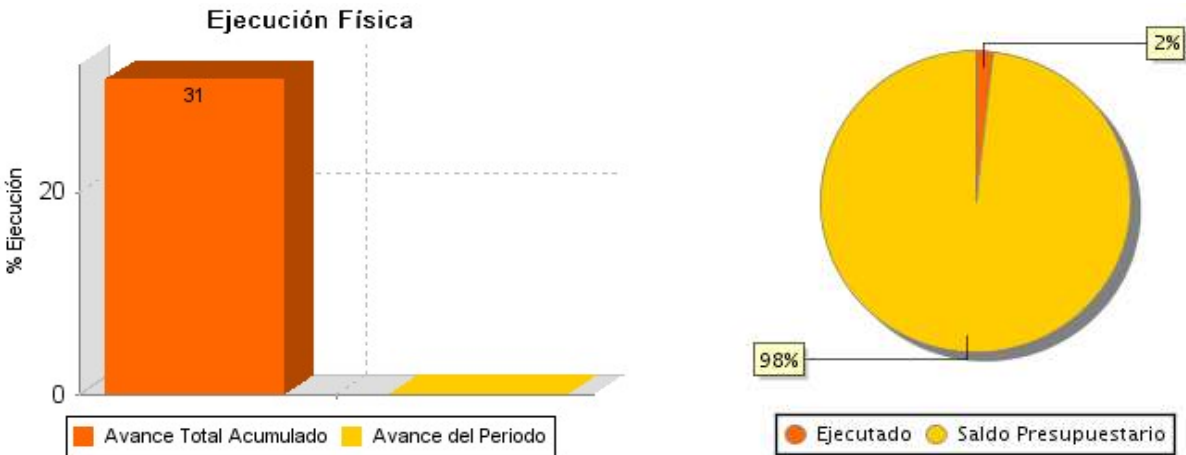


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Mejoramiento Gestión Sistema Eléctrico de Distribución-SGIDE				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	886				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	100.227.735		GS.	840.155.347.946
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
343.156.333.879		496.999.014.067		40,84 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022		31/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			51,26 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
203.530.178.624		11.953.347.283		5,87 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

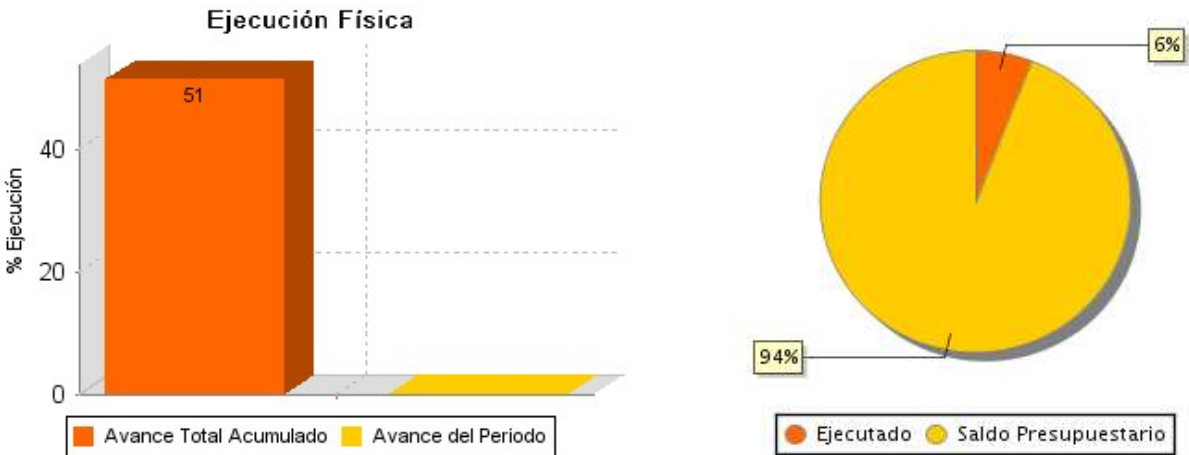


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Equipamiento Adquisición Subestaciones Móviles 220/23 y 66/23 kV				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	848				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	20.086.365		GS.	258.963.581.350
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
210.140.519.888		48.823.061.462		81,15 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022		01/05/2024		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			42,11 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
18.954.573.835		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

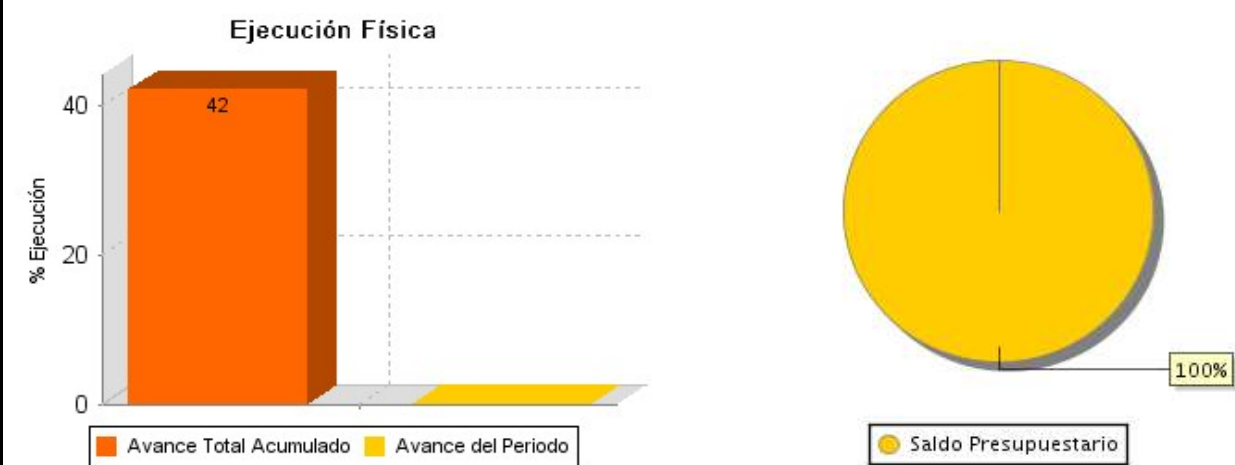


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución - FASE III Región Oriental y Presidente Hayes (RO y PH)				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	844				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	126.052.910	GS.	972.384.599.373	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
268.423.234.101		703.961.365.272		27,60	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/05/2022		01/05/2025		31/12/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			32,02 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
148.442.992.412		26.075.444.614		17,57	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

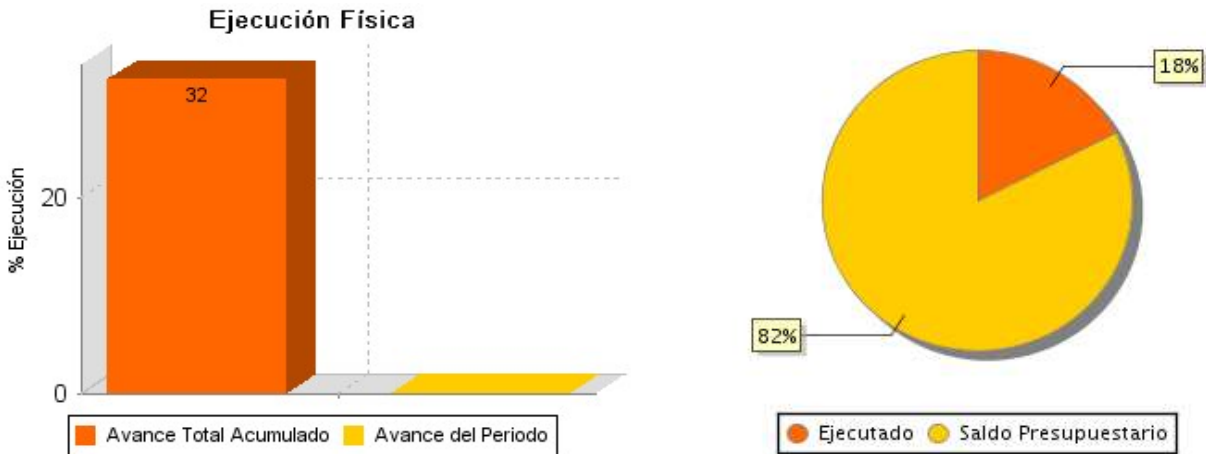


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Mejoramiento Rehabilitación y Modernización Central Hidroeléctrica Acaray en Alto Paraná				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	794				
Financiamiento	BID, RECURSOS INSTITUCIONALES				
Costo del Proyecto	USD	145.200.000		GS.	1.162.078.988.273
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
182.212.128.895		979.866.859.378		15,68 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/01/2020		07/01/2026		31/12/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			6,76 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
402.420.836.003		8.499.915.970		2,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

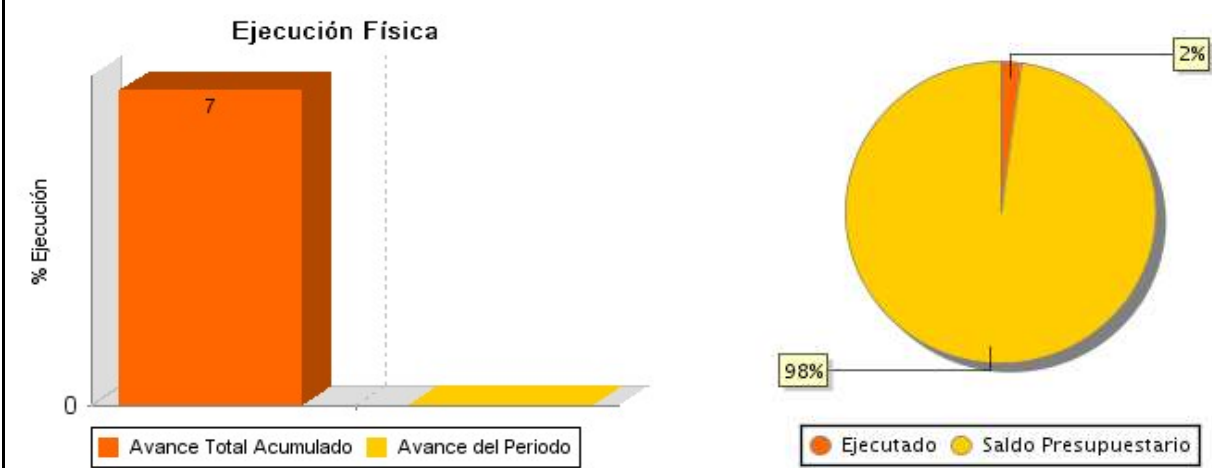


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Mejoramiento de 5000 km de líneas Baja Tensión y Media Tensión de Autoayuda							
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD							
Código SNIP N°		777							
Financiamiento		CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES							
Costo del Proyecto		USD		37.769.686		GS.		227.737.857.237	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
99.262.356.809			128.475.500.428			43,59 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
19/07/2019			24/07/2023			31/12/2026			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
0,00 %					61,58 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
56.938.004.046			4.504.671.754			7,91 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

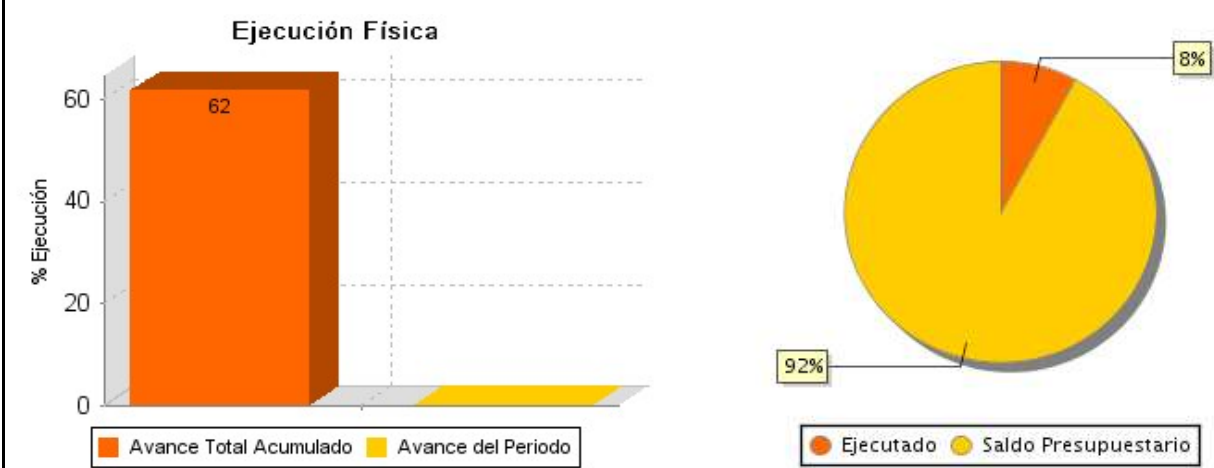

SITUACIÓN ACTUAL


Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Construcción de la Subestación María Auxiliadora y Línea de Transmisión 220 kV Santa Rita - María Auxiliadora			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	776			
Financiamiento	CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	41.754.450	GS.	296.922.382.856
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
191.339.528.517		105.582.854.339		64,44 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
19/07/2019		24/07/2023		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Alto Paraná, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			71,16 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado
31.981.829.223		3.910.305.089		12,23 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

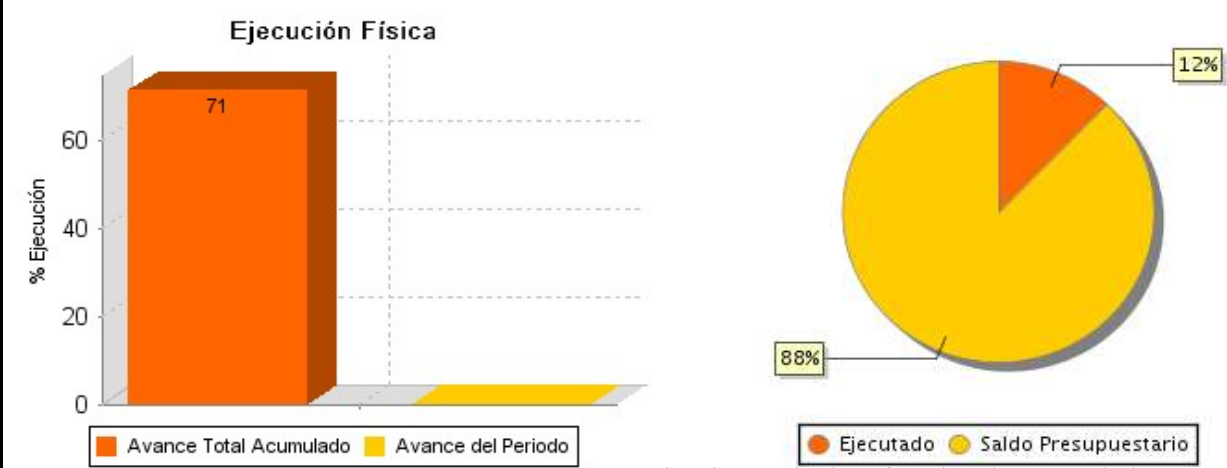


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Construcción de la Subestación Yguazú en 500 kV					
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD					
Código SNIP N°		717					
Financiamiento		CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES					
Costo del Proyecto		USD	134.061.629		GS.	1.236.769.308.822	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
910.852.281.231			325.917.027.591			73,65 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
19/07/2019			24/07/2023			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Guairá, San Pedro					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				99,14 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
24.978.062.893			3.308.659.461			13,25 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

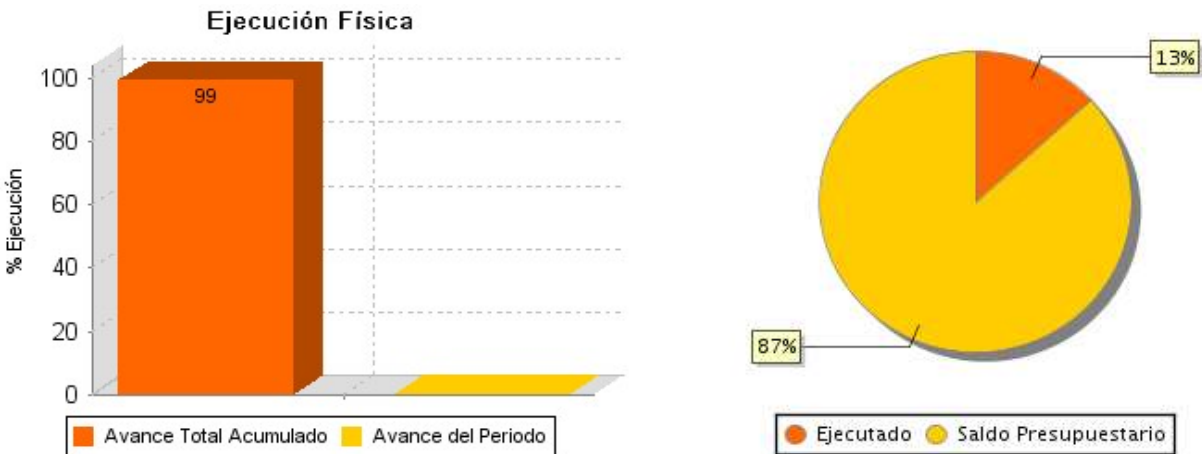


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Construcción de la Subestación Valenzuela 500 kV en Valenzuela				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	712				
Financiamiento	FONPLATA, RECURSOS INSTITUCIONALES				
Costo del Proyecto	USD	89.567.653		GS.	728.491.264.752
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
624.357.871.784		104.133.392.968		85,71	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/01/2020		02/01/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			61,79 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
87.882.000.204		8.978.182.070		10,22	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

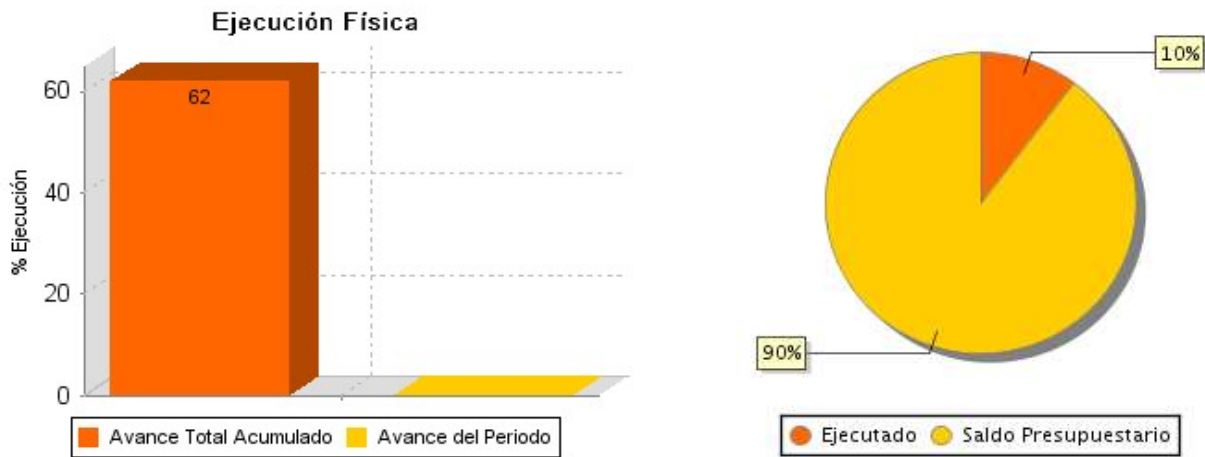

SITUACIÓN ACTUAL


Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Reposición de Compensador Estático de Reactivos Subestación San Lorenzo (SE SLO)			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	706			
Financiamiento	CAF, BEI, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	18.000.000	GS.	147.493.037.151
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
119.804.784.962		27.688.252.189		81,23 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
12/12/2018		13/02/2021		31/12/2028

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguari, Presidente Hayes			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			99,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado
20.089.435.105		672.916.884		3,35 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

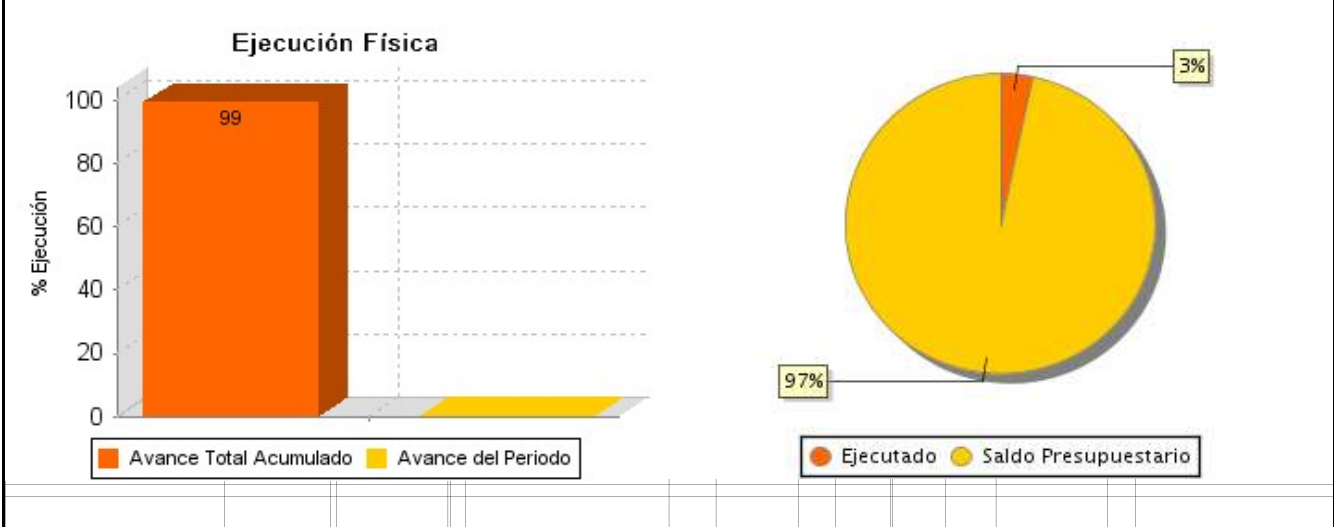


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema de Distribución Energía Electrica FASE II					
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD					
Código SNIP N°		621					
Financiamiento		BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES					
Costo del Proyecto		USD	152.075.474		GS.	1.006.027.561.101	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
589.586.042.460			416.441.518.641			58,61 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
12/12/2018			12/12/2021			31/12/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción, Central, Cordillera, Presidente Hayes					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				39,84 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
385.118.179.738			58.837.210.330			15,28 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

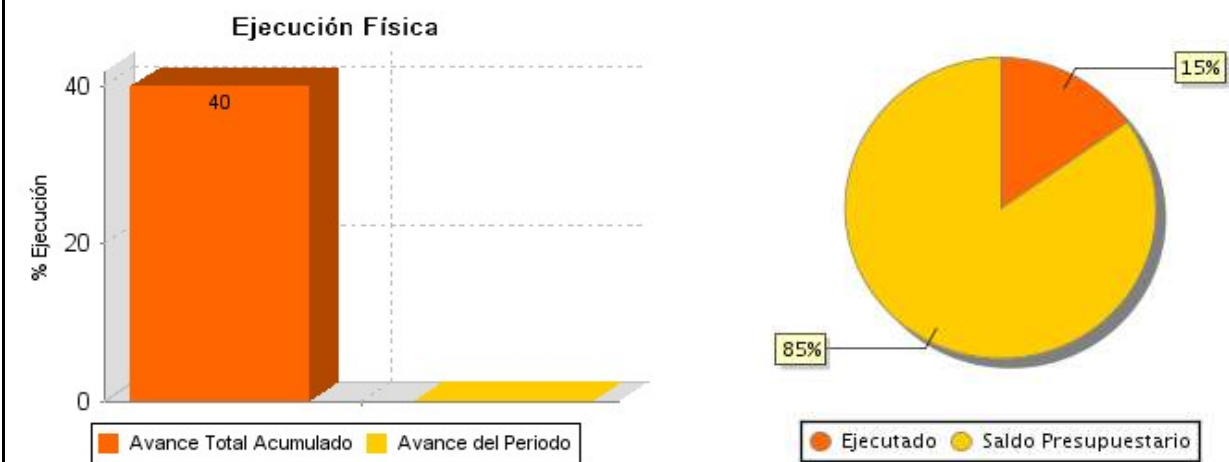


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema Eléctrico en los Departamentos Caaguazú y Alto Paraná							
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD							
Código SNIP N°		277							
Financiamiento		BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES							
Costo del Proyecto		USD		66.239.968		GS.		651.109.456.912	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
490.340.229.935			160.769.226.977			75,31 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
12/12/2018			12/11/2020			31/12/2028			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Alto Paraná, Caaguazú							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
0,00 %					96,95 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
37.188.829.079			5.255.569.130			14,13 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

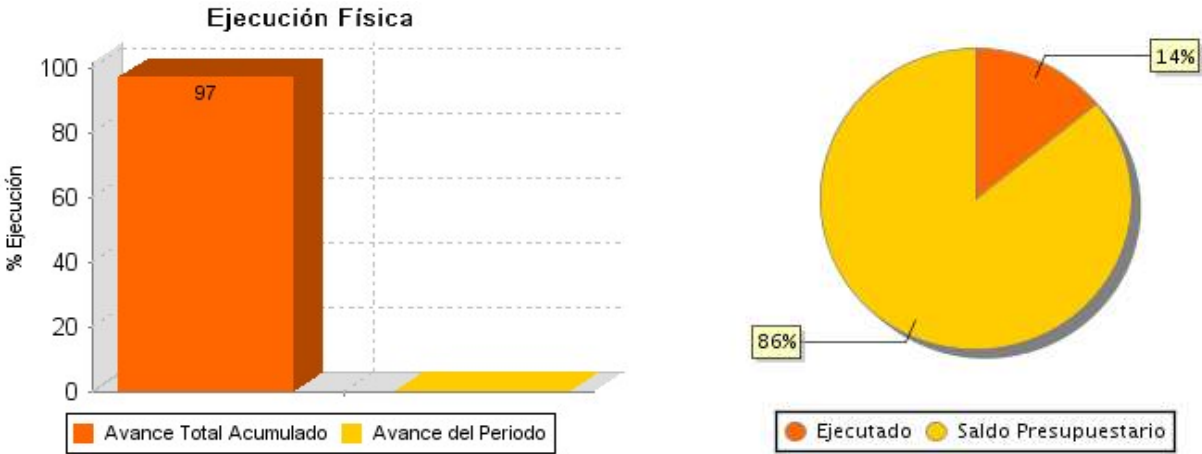


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la ciudad de Asunción					
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD					
Código SNIP N°		276					
Financiamiento		BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES					
Costo del Proyecto		USD	51.279.624		GS.	407.039.540.964	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
315.351.370.854			91.688.170.110			77,47 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
12/12/2018			12/11/2020			31/12/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				98,52 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
14.702.718.370			800.850.896			5,45 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

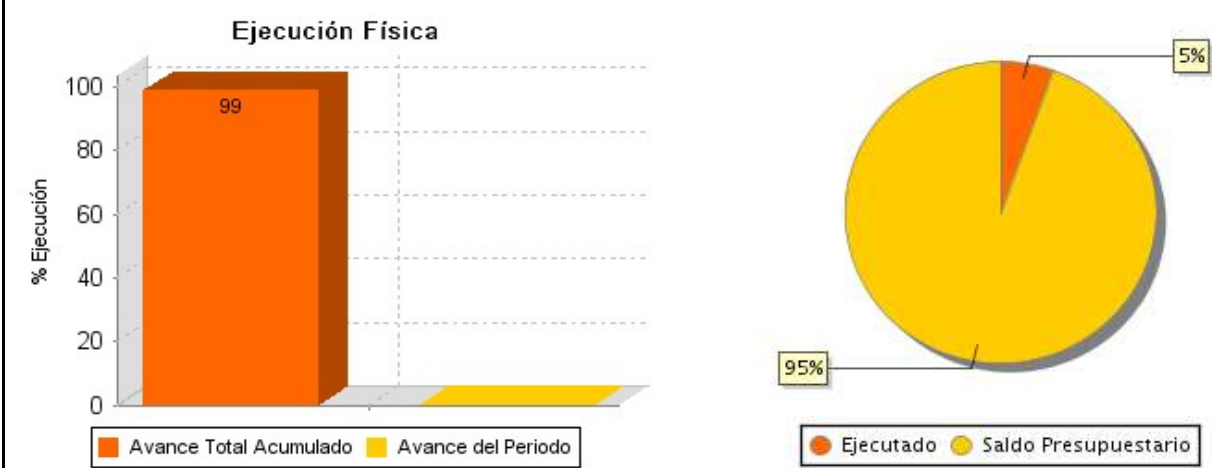


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Manejo de Pasivos Ambientales del Sistema Eléctrico de la ANDE				
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD				
Código SNIP N°	160				
Financiamiento	BID, RECURSOS INSTITUCIONALES				
Costo del Proyecto	USD	5.286.000		GS.	53.708.085.988
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
21.132.228.642		32.575.857.346		39,35 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2014		30/06/2022		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
3.000.000.000		1.030.001.065		34,33 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

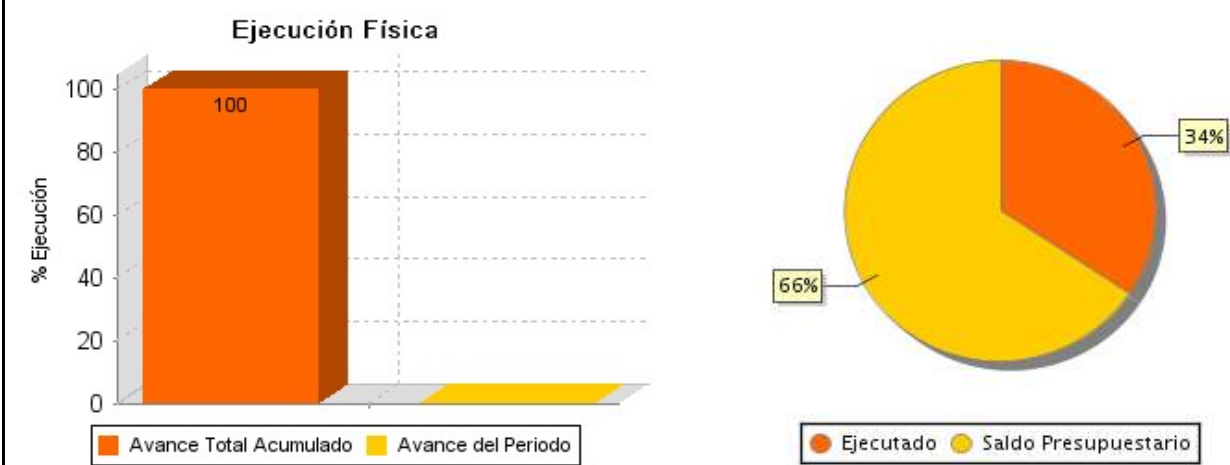


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del cuatrimestre, se reportan los siguientes avances: En el marco de la LPN 1573-20 - Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución, fue solicitada por la Unidad de Administración de Contratos la prórroga de los plazos de ejecución por atrasos generados por liberación de zona (210 días) e inclemencias del tiempo (70 días)".

Así mismo, se encuentra en proceso la aprobación del Convenio Modificadorio N°2 "Provisión y montaje de carro grúa, 3 tanques para aceite de 20.000 lts., mesadas de acero inoxidable para laboratorio". Cabe señalar que estas son las últimas actividades que se encuentran en ejecución en el marco del Proyecto.

Proyecto		Construcción de la Línea de Transmisión de 500 kV Yacyreta-Villa Hayes					
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD					
Código SNIP N°		159					
Financiamiento		BEI, BID, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES					
Costo del Proyecto		USD	227.285.710		GS.	1.418.117.767.775	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
1.225.985.167.711			192.132.600.064			86,45 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/07/2014			31/07/2021			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción, Central, Presidente Hayes					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
15.959.472.797			3.377.461.199			21,16 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

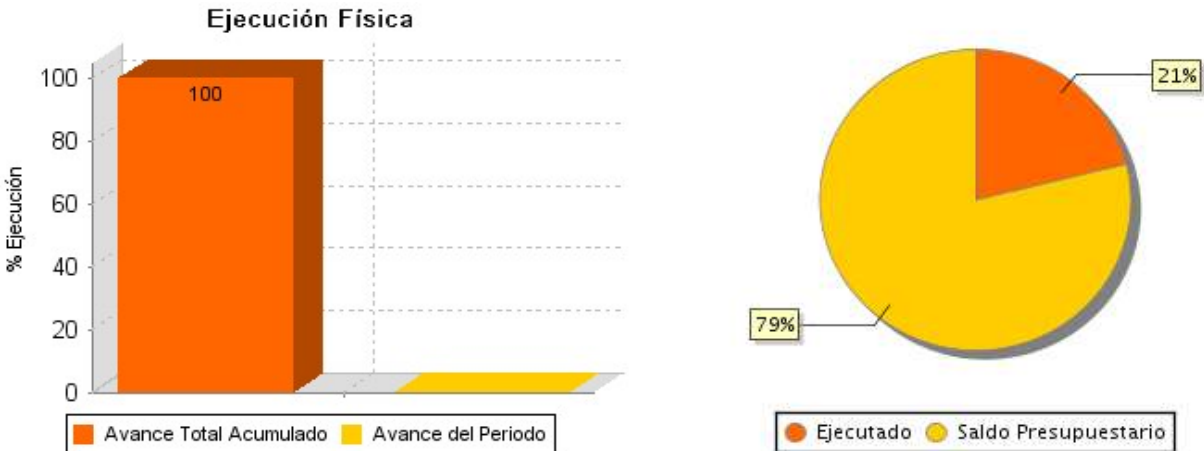


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto		Capacitación y Evaluación de Educación Superior				
OEE		AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR				
Código SNIP N°		644				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	25.561.255.799.
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
22.372.448.197			795.363.083		87,52	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/05/2016			27/05/2019		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				83,97 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
2.007.560.232			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

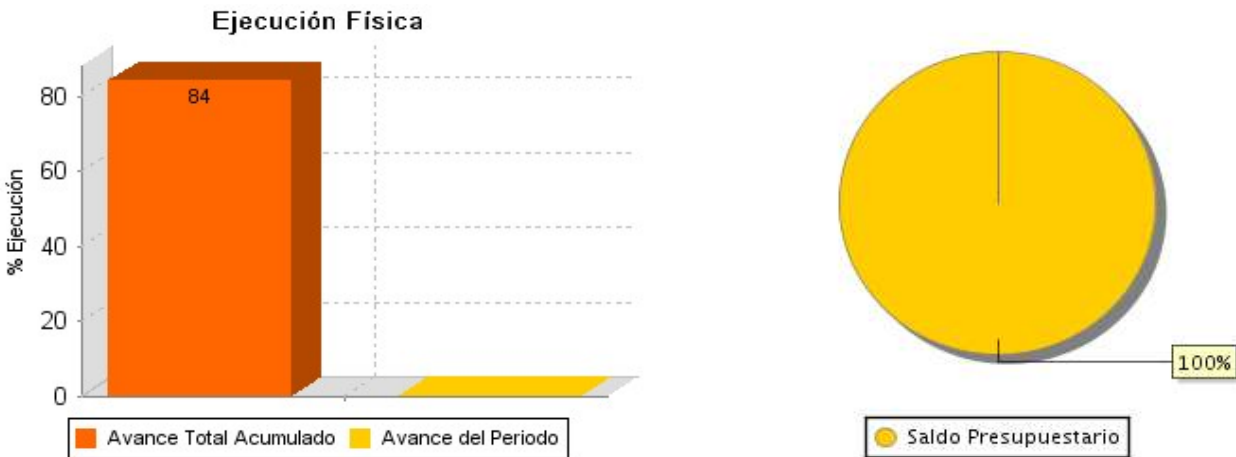


SITUACIÓN ACTUAL

A través de la Resolucion CAFEEI N° 14/24 se extendió el plazo del proyecto hasta el 31/12/26. La Unidad Ejecutora informó que en el primer cuatrimestre no se avanzó debido a la falta de pago a la empresa Cybira Consulting por el llamado a contratación para el desarrollo de un sistema de información, a la espera de una ampliación presupuestaria y aun no se realizó el llamado para el servicio de auditoria externa del programa FEEI - correspondiente al ejercicio 2024.

Proyecto		Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia					
OEE		CORTE SUPREMA DE JUSTICIA					
Código SNIP N°		155					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	122.000.000		GS.	1.038.323.935.698	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
839.119.323.713			199.204.611.985			80,81	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
11/03/1996			11/03/2016			30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,90 %				26,85 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
132.035.539.759			9.177.770.426			6,95	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

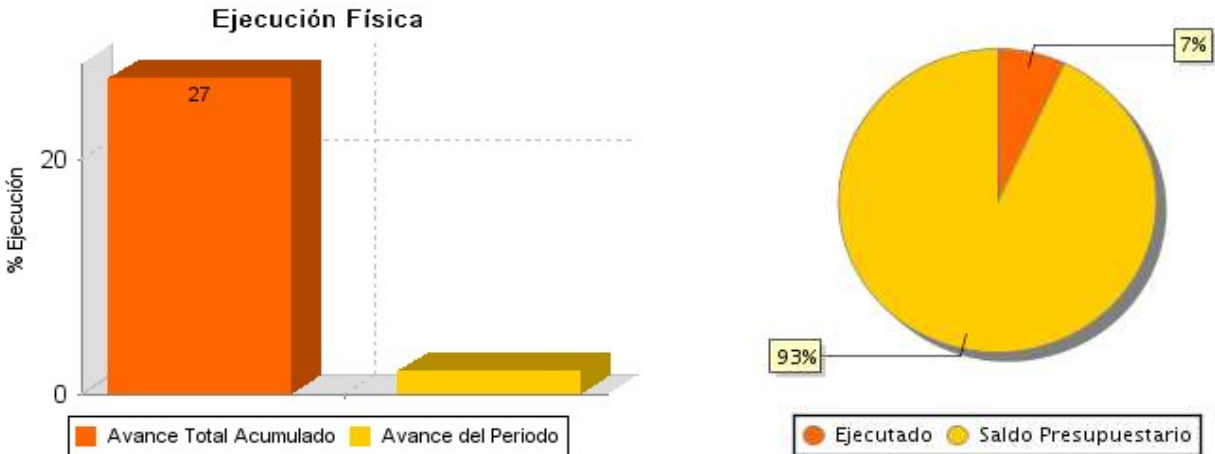

SITUACIÓN ACTUAL


En el presente cuatrimestre la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron pagos de los Certificados N° 6 Y 7, correspondiente al Contrato N° 05/2023, por construcción de las Obras Civiles por instalaciones especiales y mantenimiento del Juzgado de 1º Instancia de Fernando de la Mora.

Así también, en el Juzgado de J.A. Saldivar, se realizó colocación de vallado de obra, cartel de obra, movimiento de suelo,relleno y capacitación,obrador con baño.

En lo referente al Juzgado de Yby Yau el llamado ID N° 45744, se encuentra en etapa de adjudicación.

Proyecto		Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar							
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA							
Código SNIP N°		984							
Financiamiento		COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL							
Costo del Proyecto		USD		13.500.000		GS.		94.500.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
67.741.305.426			26.758.694.574			71,68 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
25/10/2022			25/12/2025			N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Nacional		N/A							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
2,78 %					50,74 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
27.062.406.267			303.711.693			1,12 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

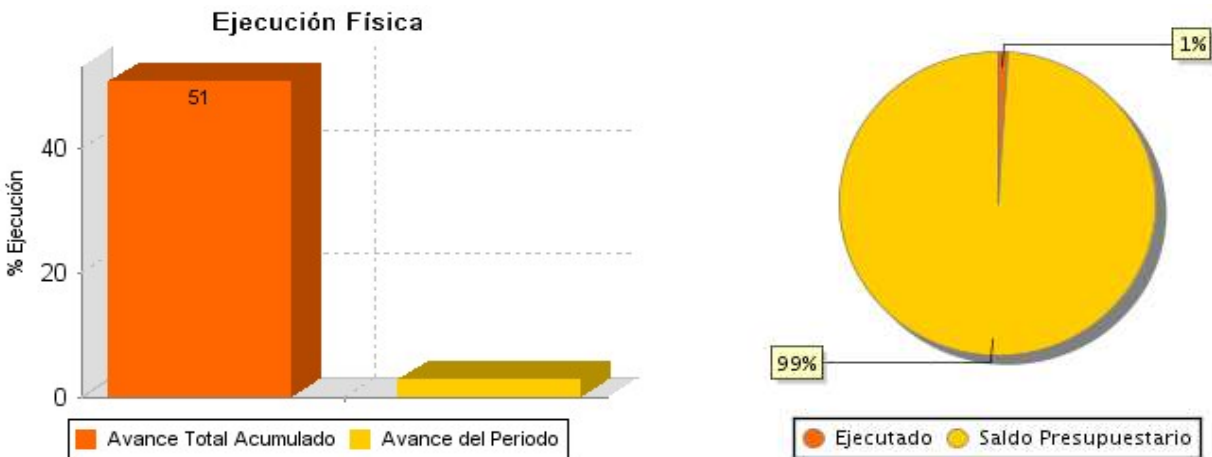

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron los trabajos de evaluación de los proyectos productivos presentados por las diferentes organizaciones que conforman los Departamentos de Central, San Pedro, Canindeyú y Concepción. Se financiaron solicitudes para dichas organizaciones para compra de tractor agrícola con implementos, rastra aradora, sembradora, arado para motocultivador, forrajera, motocultivador; desmalezadoras, kit de producción hortícola (semillas de pimiento, semillas de tomate, malla media sombra, mulching, fertilizantes, bandeja de germinación, entre otros), kit de producción avícola – doble propósito (pollitos, kit veterinario, comedero, bebedero, tejido de alambre, balanceados, chapas de zinc, ladrillo, cemento, etc.).

De igual manera se aprobó la transferencia de recursos para 5 organizaciones de productores de la Agricultura familiar, las mismas se enfocan en el fortalecimiento de la producción agrícola familiar, mejoramiento de la producción agropecuaria, mejoramiento de la producción avícola y fortalecimiento de la producción hortícola.

Los Departamentos beneficiados son San Pedro, Concepción, Canindeyú y Central, según el siguiente detalle: San Pedro (97 beneficiarios), 1 (un) proyecto productivo actualmente en proceso de pago. Los 4 (cuatro) proyectos productivos restantes corresponden a los departamentos de San Pedro (46 beneficiarios), Canindeyú (61 beneficiarios), Concepción (75 beneficiarios) y el Departamento Central (46 beneficiarios).

Proyecto		Mejoramiento de inserción a mercados Región Oriental y Occidental					
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA					
Código SNIP N°		904					
Financiamiento		BIRF					
Costo del Proyecto		USD	100.000.000		GS.	733.429.005.918	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
393.439.251.299			241.560.748.701			53,64 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
26/03/2020			30/06/2026			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
3,92 %				80,63 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
65.215.722.117			30.599.641.420			46,92 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

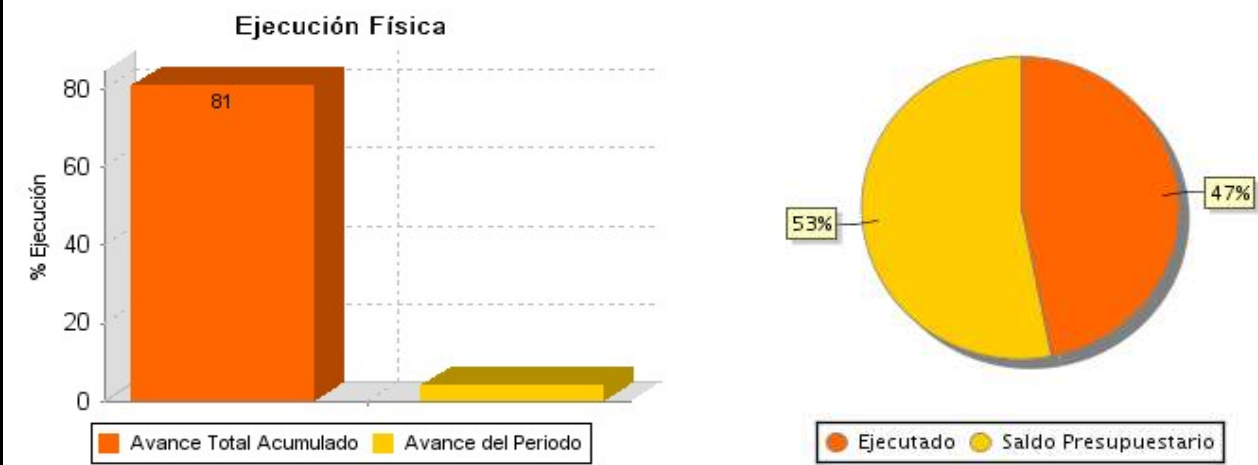

SITUACIÓN ACTUAL

A través del correo SNIP N° 225 de fecha 29/04/2025 se actualizó costo del proyecto en guaraníes por diferencia cambiaria, quedando la suma de Gs. 733.42.9005.918.


Durante el primer cuatrimestre del año 2025 se obtuvo la resolución de transferencia para el financiamiento de 30 subproyectos de Inversión beneficiando a 2.046 productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas de la Región Oriental (1.143 hombres y 903 mujeres), destinados a la producción de caña de azúcar, producción frutihortícola, granos, frutilla, leche, mandioca, queso, yerba mate, hortalizas y feria agropecuaria.

Un total de 3.665 (1.708 varones y 1.957 mujeres) productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas fueron capacitados en temas de cadenas de valor, buenas prácticas agrícolas, uso adecuado de plaguicidas, cambio climático, conservación de la biodiversidad, fortalecimiento organizacional, temas tributarios y emprendedurismo juvenil, en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú.

Se brindaron 11.506 servicios de asistencia técnica a 8.673 productores de la Agricultura Familiar y miembros de Comunidades Indígenas (4.893 mujeres y 3.780 varones), a través de 120 técnicos extensionistas; de los cuales 9 son técnicos contratados para la asistencia técnica a comunidades indígenas.

Proyecto		Censo y Encuestas Agropecuarias				
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°		714				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	12.315.661		GS.	109.893.595.654
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
79.112.310.076			22.631.529.336		71,98 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/05/2019			25/05/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional		N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,17		%		83,58 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
14.178.686.863			2.393.077.715		16,88 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

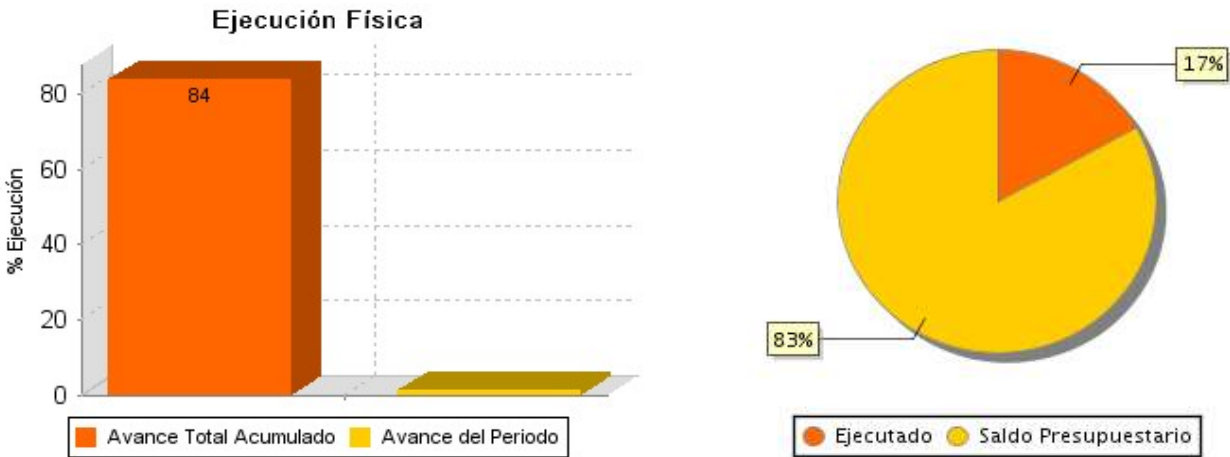

SITUACIÓN ACTUAL

En virtud al Correo SNIP N° 142 de fecha 27/03/25, se actualizó el costo del proyecto en guaraníes por diferencia cambiaria quedando en Gs. 109.893.595.654.


Se contrataron bajo la modalidad de "Contratación Directa" la consultoría "Especialistas en imágenes satelitales"; a tres especialistas en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para integrar y combinar trabajos de imágenes satelitales con cartografía bajo.

Se renovaron los contratos mediante adendas a las distintas especialidades que dan soporte a la realización de los operativos Encuesta Nacional Agropecuaria desde la etapa previa hasta el procesamiento de los datos relevados. Por otro lado, se realizó el operativo de campo para relevamiento datos relacionado a la primera encuesta Nacional Agropecuaria en los 14 departamentos de la región oriental del Paraguay.

El servicio de Auditoría Externa del Proyecto presentó su informe sobre los Estados Financieros del ejercicio 2024, el cual se puso a conocimiento del banco como cumplimiento de cláusula contractual del Contrato de préstamo.

Proyecto	Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales				
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°	664				
Financiamiento	KFW				
Costo del Proyecto	USD	8.463.250		GS.	52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
17.788.859.626		34.293.980.366		34,15 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
13/09/2017		13/02/2022		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6,32 %			60,60 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
20.423.805.863		3.385.684.828		16,58 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

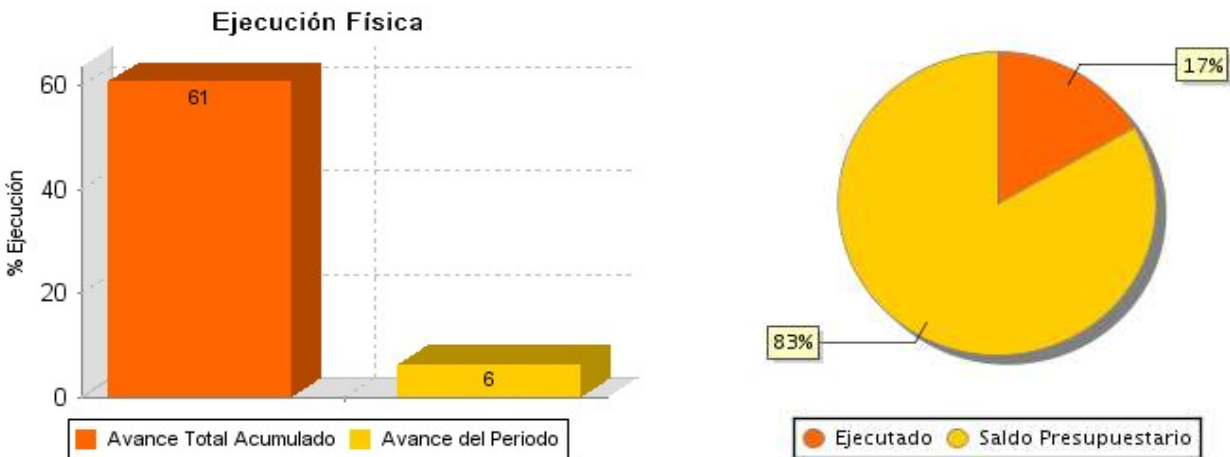

SITUACIÓN ACTUAL


En el primer cuatrimestre 2025 se realizó la provisión y fiscalización de incentivos financieros para la adquisición de insumos técnicos, equipos e implementos a 7 organizaciones de la Agricultura Familiar para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada de los Departamentos de Caaguazú y San Pedro.

Se realizó la promoción y difusión del Proyecto a técnicos y agricultores de 20 organizaciones en los Departamentos de San Pedro, Caaguazú, Caazapá y Concepción.

Igualmente se realizaron capacitaciones y giras técnicas dirigidas a productores y técnicos en los Departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Caaguazú.

Proyecto	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental				
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°	567				
Financiamiento	FIDA				
Costo del Proyecto	USD	22.468.000		GS.	151.493.947.358
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
84.267.126.594		37.132.873.406		55,62 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018		08/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,40 %			82,54 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
34.828.580.000		497.915.096		1,43 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

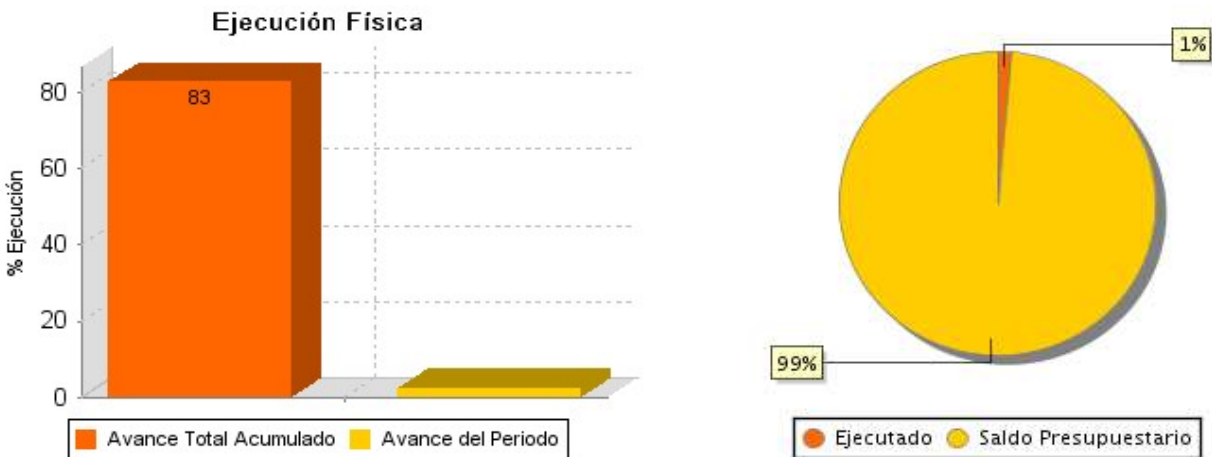


SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre del 2025 la Unidad Ejecutora de Proyectos informó que realizaron Intercambios de experiencias del Proyecto con 4 Organizaciones Rurales.

Proyecto	SP FOCM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM				
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°	13				
Financiamiento	FOCEM, LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	5.261.440	GS.	36.605.310.707	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
33.090.631.284		3.514.679.423		90,40	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
28/05/2007		28/05/2009		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional					
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			99,93 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
1.816.367.605		36.230.494		1,99	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

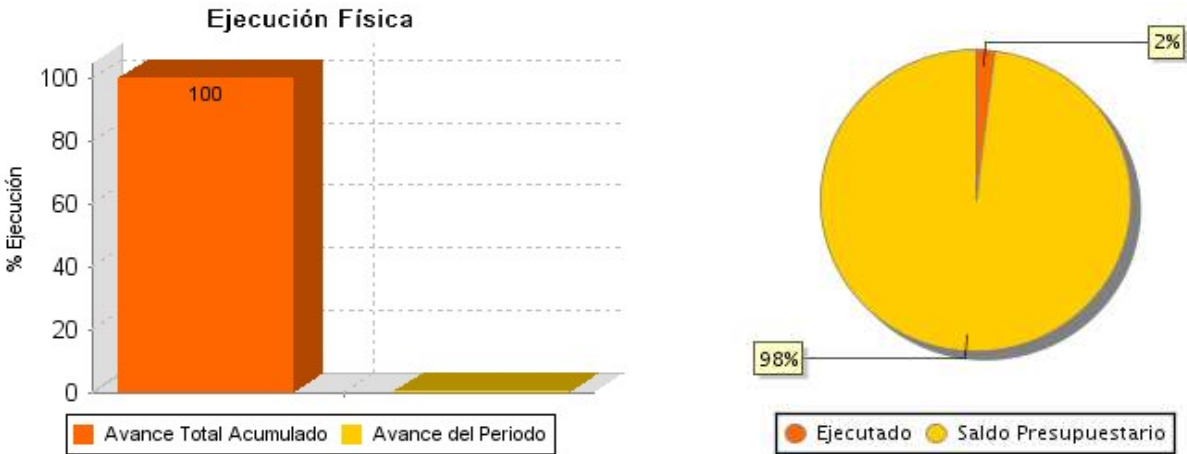

SITUACIÓN ACTUAL


El proyecto se encuentra en fase de cierre de actividades, conforme al plazo de ampliación aprobado. Los principales productos del proyecto presentan el siguiente estado de avance:

a) Construcción del Laboratorio de Bioseguridad NSB2A: registra un avance físico acumulado del 100%. Durante el presente período, la empresa contratista culminó las actividades complementarias de obra, específicamente la adecuación y climatización del piso técnico, actualmente en proceso de pruebas operativas.

b) Se continúa con las actividades de gerenciamiento para la culminación del contrato de obra, incluyendo la recepción final, el pago de compromisos pendientes, y acciones administrativas orientadas al cierre del proyecto, tales como la carga de informaciones en el Sistema de Rendición de Cuentas FOCM, la contratación y ejecución de la Auditoría Externa, entre otras gestiones de cierre técnico y financiero.

Proyecto		Mejoramiento de establecimientos escolares e IFD			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		1073			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BIRF			
Costo del Proyecto		USD	75.810.000	GS.	546.113.003.153
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
145.158.811.935		400.954.191.218		26,58	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2023		7/1/2030		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
9,76 %			20,50 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
193.312.716.308		72.950.694.986		37,74	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

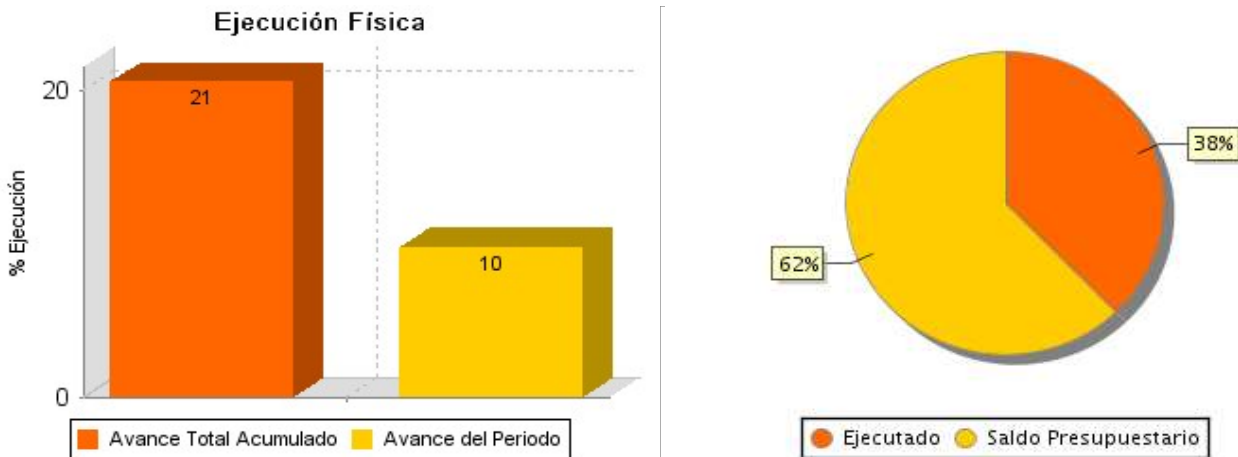

SITUACIÓN ACTUAL

Según la Resolución CAFEEI N° 03 del 25 de abril de 2025 se modificó el costo del proyecto quedando la suma de Gs. 392.010.003.153 por la porción del FEEI. La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que se completaron los relevamientos técnicos en 316 instituciones educativas del modelo Locales Escolares a Potenciar (LEAP), y actualmente se encuentran en curso los relevamientos en los seis Centros Experimentales de Formación Especializada Docente (CEFED),los mismos se encuentran en los departamentos de: Capital, Itapúa, Concepción, Central, Alto Paraná, Amambay.


Por otro lado,se realizaron 227 transferencias destinadas a reparaciones menores en 227 instituciones, según el siguiente detalle por departamentos: Alto Paraná: 10 Leap, Amambay: 3 leap, Boquerón: 11 leap, Caaguazú: 17 leap, Caazapá: 22 leap, Canindeyú: 27 leap, Central: 4 leap, Concepción: 6 leap, Cordillera: 16 leap, Guairá: 16 leap, Itapúa: 23 leap, Ñeembucú: 1 leap, Paraguarí: 15 leap, Presidente Hayes: 7 leap, San Pedro: 49 leap.

En el ámbito educativo, se inició la distribución de 492.600 libros a 1.327 instituciones escolares, abarcando todas las regiones del país.

Finalmente, se avanzó con la entrega de equipos informáticos y pantallas inteligentes, con pagos realizados conforme al cronograma de ejecución establecido.

Proyecto		Capacitación de las competencias profesionales de educadores				
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°		1071				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	166.330.000.000
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
16.486.135.919			158.513.864.081		9,42 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
21/04/2023			21/04/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional		N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				29,81 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
52.315.000.000			1.428.096.689		2,73 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

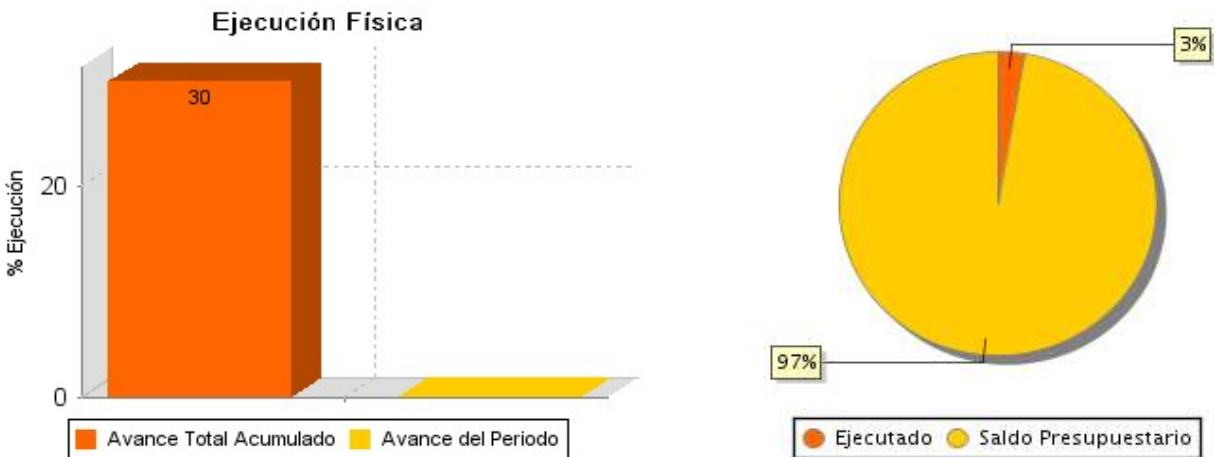


SITUACIÓN ACTUAL

Según la Resolución CAFEI N° 02 del 25 de abril de 2025 se modificó el costo del proyecto quedando la suma de GS. 166.330.000.000.La Unidad Ejecutora informó que en el primer cuatrimestre se realizó la suscripción del contrato N° 1/2025 entre la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) y el MEC para la implementación de un programa de formación de directivos,técnicos y docentes para la aplicación del proceso de orientación profesional en bachilleratos técnicos en la educación media. Se prevé que el programa de formación se desarrolle hasta marzo de 2027, beneficiando a 4.000 educadores por año serán formados a través de la modalidad de tutorías, en 100 instituciones educativas focalizadas.

Por otra parte, se halla en proceso de evaluación la propuesta formativa denominada Programa de Formación a Educadores para la implementación del diseño universal de aprendizaje en el sistema educativo nacional,que beneficiará la formación de 4.500 educadores de diversos niveles educativos y modalidades.

Proyecto		Mejoramiento de infraestructura y equipamiento de Colegios Técnicos				
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°		972				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	202.172.259.397
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
15.659.483.051			186.512.776.346			7,75 %
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
21/01/2022			31/07/2025			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,05 %				4,62 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
129.392.950.007			3.720.561.600			2,88 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

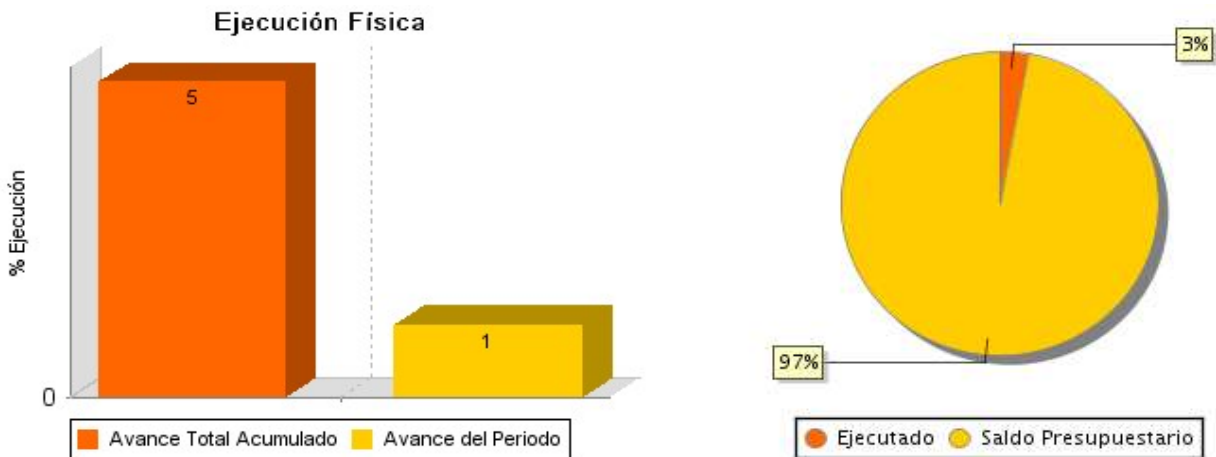


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del año 2025 la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizó el relevamiento edilicio de obras en 100 Instituciones Escolares correspondientes a los Dptos. de Concepción, Alto Paraná, Guaira,Canindeyú, Caazapá, Paraguarí,Itapúa, San Pedro, Cordillera,Misiones, Ñeembucú, Central y Pte. Hayes.

Proyecto	Fomento y apoyo operativo para la ejecución de proyectos del MEC				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	709				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	80.864.841.017
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
52.560.180.803		6.434.660.214		64,99 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/01/2017		30/06/2019		31/12/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,69 %			88,65 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
13.281.922.477		2.001.818.450		15,07 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

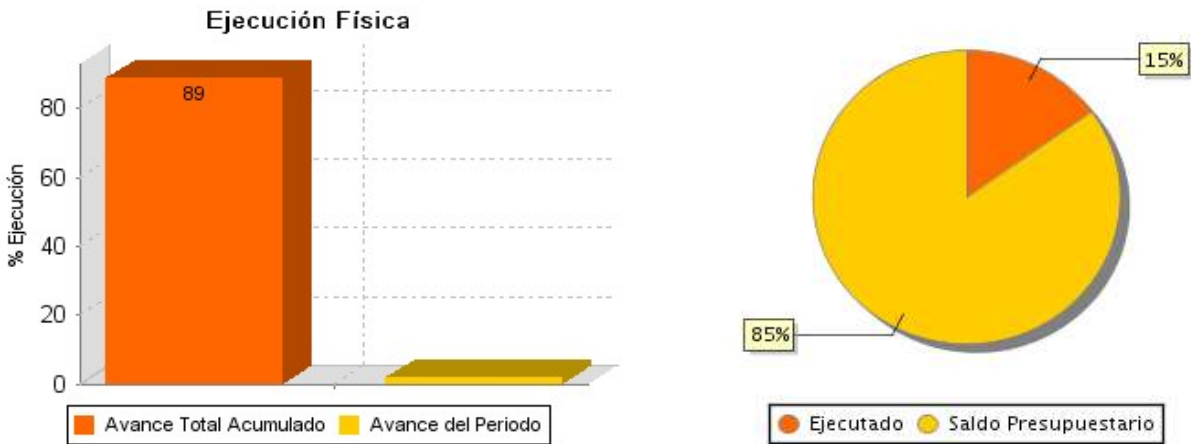

SITUACIÓN ACTUAL

Conforme a la Resolución CAFFEI N° 01/2025 del 25/04/25, el proyecto Fomento y Apoyo Operativo recibió transferencia de los siguientes proyectos: “Capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los educadores de instituciones educativas del sector oficial de los diferentes niveles/modalidades a nivel país, 2023-2026” - ¢ 8.670.000.000. “Mejoramiento de los entornos de aprendizaje en establecimientos escolares e institutos de formación docente de gestión oficial del Paraguay” - ¢ 7.300.000.000.“Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado” – ¢.¢ 5.500.000.000. “Evaluaciones estandarizadas de desempeño de los estudiantes en áreas curriculares a nivel país y proceso participativo para el diseño del Instituto de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP) – ¢ 400.000.000.

Durante el cuatrimestre se realizaron las siguientes acciones en el marco del funcionamiento y ejecución de programas y proyectos de la UEPP:


Se renovaron los contratos del personal contratado y se solicitó el comisionamiento de funcionarios para distintas coordinaciones de la UEPP. Se contrató personal adicional para la Coordinación de Proyectos de Formación Docente, así como para los proyectos TAPE e Infraestructura. Asimismo, se activaron contratos vigentes con sus respectivos códigos y se llevaron a cabo llamados conforme a los PAC aprobados. Se abonaron los sueldos y beneficios correspondientes al personal contratado y funcionarios.

Por otro lado,se abonaron los contratos de servicios de mantenimiento de vehículos, mantenimiento de aires acondicionados y limpieza (ID 421951, 443731, 423855). Se gestionaron los pagos por consumo de combustible a Petropar, así como los correspondientes a servicios básicos (electricidad y agua). Se efectuó el pago del alquiler de las oficinas administrativas de la UEPP en los edificios Presto y Natura por los últimos seis meses del 2025 (proceso excluido). Asimismo, se gestionó el pago de las patentes del parque automotor para el año 2025. El llamado para el seguro de vehículos (ID 462499) fue realizado, encontrándose aún en proceso de adjudicación.

Asi también,se realizó el monitoreo a dos instituciones del departamento de Presidente Hayes focalizadas en los programas y proyectos de la UEPP.

Proyecto		Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes.							
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS							
Código SNIP N°		571							
Financiamiento		BID							
Costo del Proyecto		USD		280.000		GS.		2.012.847.200	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
1.261.939.141			750.908.059			62,69 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
31/10/2017			10/05/2025			10/06/2025			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Nacional		N/A							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
28,80 %					79,59 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
766.561.440			0			0,00 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

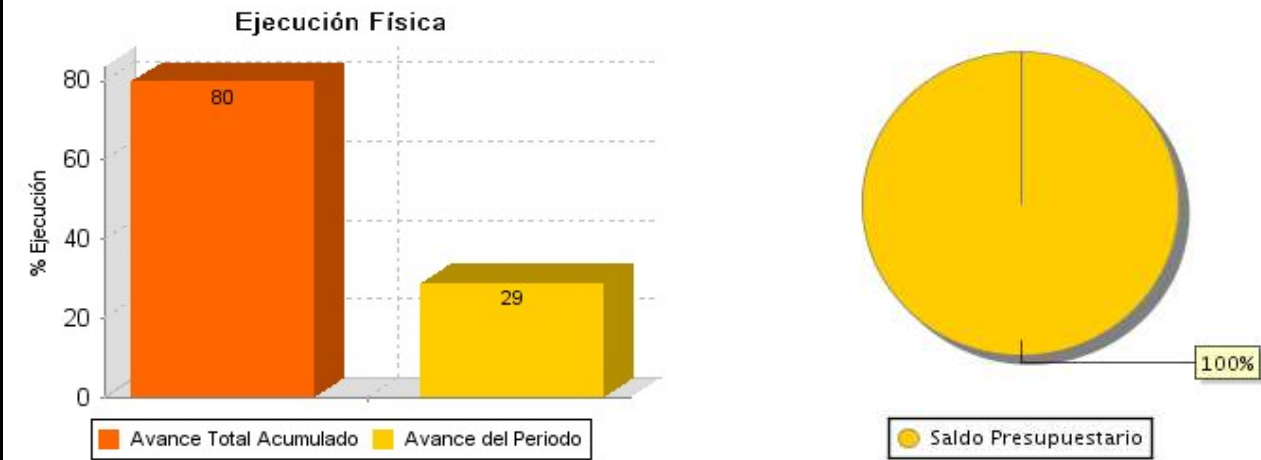


SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre la Unidad Ejecutora reportó que se avanzó en la implementación del piloto de provisión de tarjetas de billeteaje electrónico con perfil estudiantil, a través de la adjudicación de dos empresas proveedoras. En total, se entregaron 9.877 tarjetas, distribuidas de la siguiente manera: 2.329 a estudiantes de 158 instituciones educativas en la Capital; 7.425 a estudiantes de 660 instituciones en el Departamento Central; y 123 a estudiantes de 30 instituciones en Presidente Hayes.

Proyecto	Capacitación apoyo a la ampliación de la jornada escolar.				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	570				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	19.720.000		GS.	141.761.952.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
125.202.026.352		16.559.926.448		88,32	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/05/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6,56 %			87,97 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
32.579.975.079		15.786.838.612		48,46	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

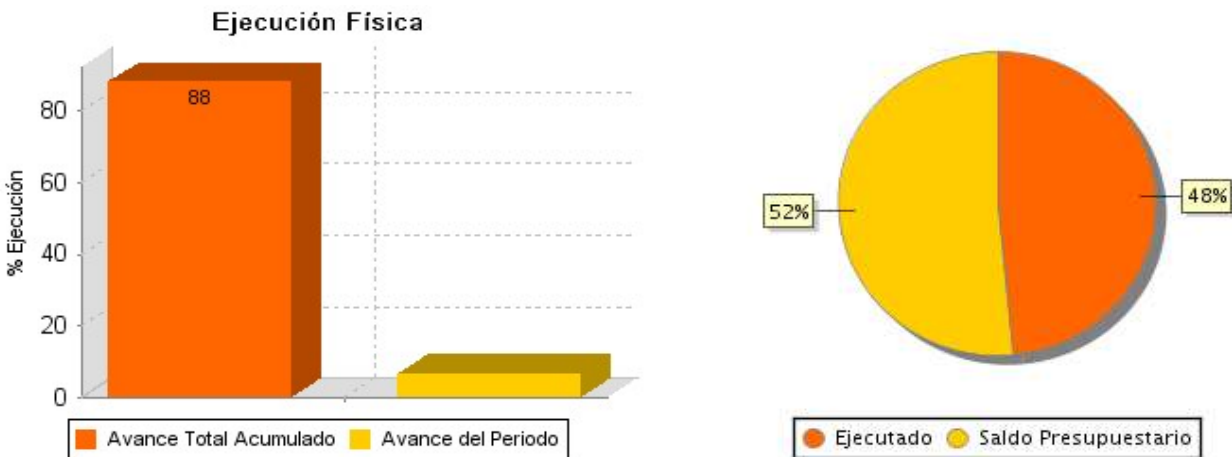

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora de Proyectos informó que en el primer cuatrimestre se realizó la impresión y diseño editorial de materiales educativos para varias asignaturas, y se implementó el programa Inglés sin Límites Paraguay. Así también, se distribuyeron libros para bibliotecas de aula. Además, se ejecutó el piloto “Cocinando en las Escuelas con JEE”, que incluyó adecuaciones en cocinas escolares y adquisición de equipamiento gastronómico.

Se encuentran en desarrollo consultorías para tutorías remotas en Matemáticas y Lengua Castellana, en varias instituciones educativas de todo el país.

Por otro lado, culminaron tanto la evaluación de impacto como la auditoría externa del proyecto correspondientes al año 2024.

Proyecto		Mejoramiento de condición de aprendizaje con incorporación de TIC			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		394			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 639.856.204.101
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
617.717.012.690		22.139.191.411		96,54 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/11/2015		25/12/2019		30/6/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,35 %			77,23 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
5.425.000.000		681.792.000		12,57 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

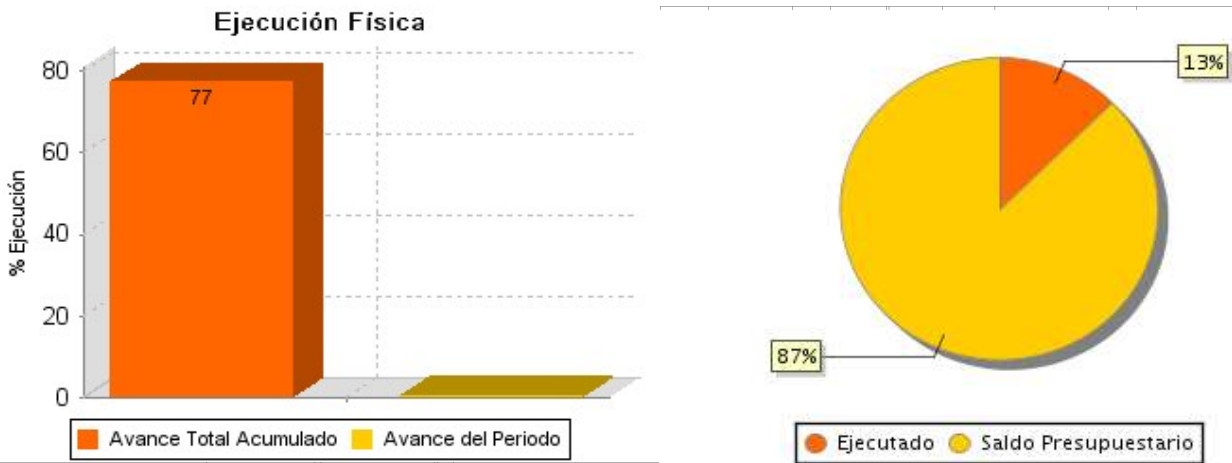


SITUACIÓN ACTUAL

A través de la Resolución CAFEEI 08 del 14 de agosto del 2024 se amplía el plazo del proyecto hasta el mes de junio del año 2026. En el primer cuatrimestre del año 2025, continuó la ejecución de los contratos de servicio de internet satelital a 53 establecimientos educativos; por equipamiento de infraestructura tecnológica en 512 instituciones a través del llamado ID N° 386029; y por equipamiento de infraestructura tecnológica en 300 instituciones a través del llamado ID N° 417928.

Proyecto		Investigación evaluación estandarizadas de desempeño a estudiantes.				
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°		389				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	76.513.289.274
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
63.312.635.262			478.115.311			99,25 %
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
30/12/2014			30/12/2021			31/7/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,64 %				66,84 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
4.000.000.000			178.041.050			4,45 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

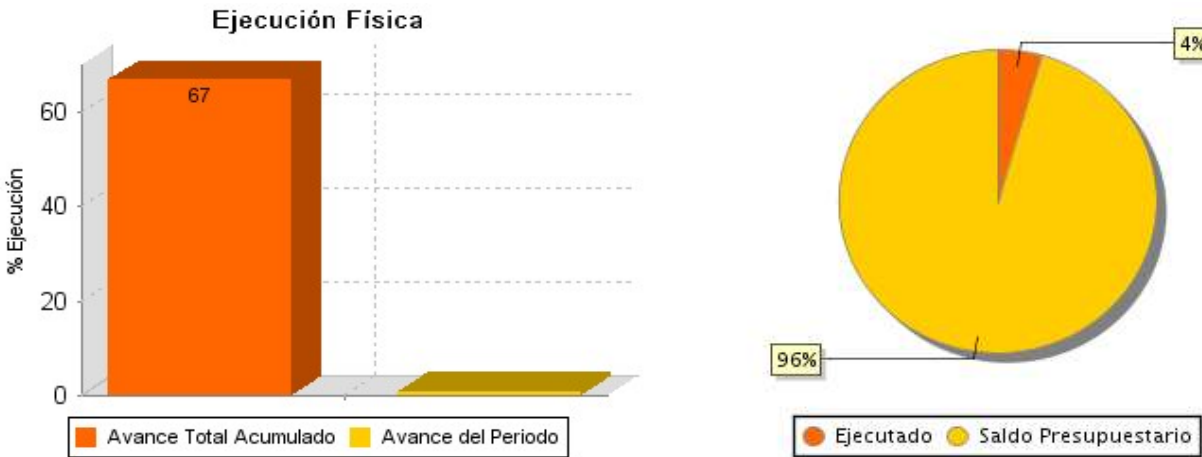


SITUACIÓN ACTUAL

Según la Resolución CAFEEI N° 05 del 25 de abril de 2025 se modificó el costo del proyecto quedando la suma de GS. 76.513.289.274. La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se realizaron capacitaciones a los diferentes actores educativos dinamizadores y miembros de la red a nivel país de las diferentes evaluaciones a ser realizadas.

Proyecto	Ampliación en la atención educativa desde la gestación hasta 5 años				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	388				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	586.138.288.812
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
435.849.977.005		155.788.311.807		74,35 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/05/2015		31/12/2018		30/06/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,99 %			83,26 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
81.034.225.511		9.295.398.687		11,47 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

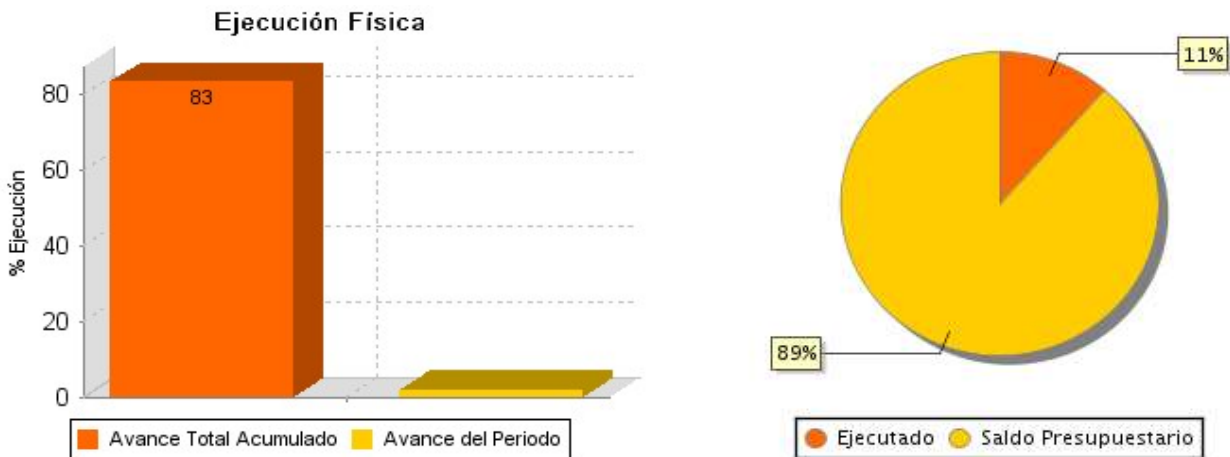

SITUACIÓN ACTUAL


Conforme a la Resolución FEEI N° 4 del 25/04/25 se modificó el costo del proyecto SNIP N° 388 quedando la suma de Gs.586.138.288.812. Se emitieron órdenes de servicios a las firmas CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO, ECOSERVICE GROUP S.A, HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA, MW INGENIERIA S.A. y TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA para 49 de las 60 obras adjudicadas mediante el ID 444.094. Se realizaron 5 supervisiones de obras adjudicadas.

Así también, se asignaron 1143 contratos a recursos humanos para los cargos de docentes titulares, docentes auxiliares, psicólogos de educación inicial, maestras mochileras y educadoras comunitarias, para la prestación de servicios educativos para la primera infancia en las instituciones del sector oficial indígena y no indígena a través de Concurso Público de Méritos para la contratación de personal para los programas y proyectos financiados con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) – Convocatoria N° 04/2024.

Por otra parte,se desarrollaron actividades de formación continua a docentes y educadoras comunitarias de una Institución de educación indígena, específicamente en la Escuela Básica N° 7.750" Mbo'ehao Ñevanga Renda – Tarumandymi.

Proyecto	Ampliación, reparación de 822 establecimientos educativos en Asunción y 17 departamentos.				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	325				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	578.568.001.943
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
542.065.249.374		36.502.752.569		93,69 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/09/2014		11/09/2017		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,12 %			98,13 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
30.000.000.000		3.950.271.958		13,17 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

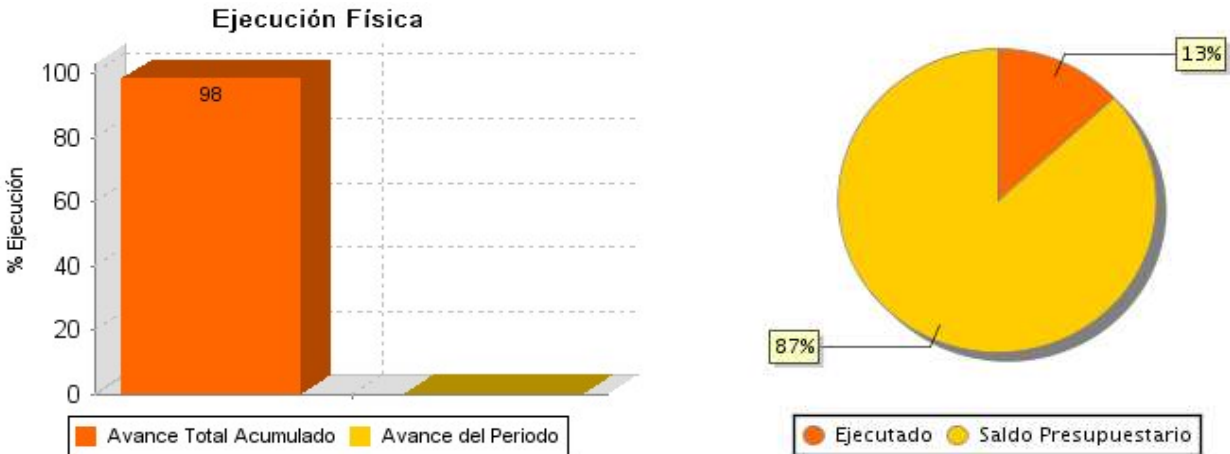

SITUACIÓN ACTUAL

El Proyecto SNIP 325 tiene una prórroga en su plazo hasta el 31/12/2025, aprobado a través de la Resolución CAFEEI N° 13 del 10 de diciembre de 2024. Se encuentra en su etapa final de ejecución física.

Se realizaron pagos en concepto de honorarios profesionales a los supervisores de obras; viáticos a los profesionales por realizar la fiscalización y supervisión de obras en los Dptos. de San Pedro, Pte. Hayes y Canindeyú.

Asi también, pagos en concepto de combustible a la empresa PETROPAR. Además se realizaron pagos en concepto de certificados de obras N° 13 a la Empresa Heidecom, Lote N° 17. Dpto. Capital y Misiones

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública			
Proyecto		Mejoramiento de la Gestión del VAF (FASE III)			
OEE		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
Código SNIP N°		954			
Financiamiento		COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	26.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
5.350.266.710		20.649.733.290		20,58 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2022		31/12/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional		N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5 %			60 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
7.400.000.000		571.669.201		7,73 %	

Ejecución Física

60

40

20

0

60

5

Avance Total Acumulado

Avance del Periodo

8%

92%

Ejecutado

Saldo Presupuestario

SITUACIÓN ACTUAL

Desde la Unidad Ejecutora se ha informado el avance de las siguientes gestiones de procesos de contratación:

1. Consultoría evaluación de programas públicos:

ITEM 1: consultoría evaluación de del rol del gasto público para la mejora de los indicadores de seguridad de la población

ITEM 2: consultoría para la evaluación de la eficacia en la cobertura de servicios públicos otorgados a personas con discapacidad (PCD) ID N° 464.257/2025:

* Ajuste de Monto de llamado, en atención a que, de las 3 consultorías planificadas inicialmente, serán gestionadas y financiadas por el Proyecto 2 disminuyendo el monto, se encuentra a consideración de la Coordinación de Gabinete desde el 13/05/2025.

* Pliego de Bases y Condiciones (PBC) finalizado, en coordinación con la Unidad Requirente (Dirección General de Presupuesto).

* Dictamen de Estimación de Precios Referenciales finalizado.

* En etapa de elaboración de la Resolución para aprobación del PBC e inicio de llamado

2. Adquisición de equipos audiovisuales, comunicación y enseres:

* En instancia de la Unidad Requirente (Departamento Administrativo de la Dirección General de Gabinete del Viceministerio de Administración Financiera), en etapa de elaboración de las especificaciones técnicas (EETT) de los bienes y estimación de precios referenciales, planificado para el Segundo Cuatrimestre 2025.

3. Actualización de ADC, Balanceador y SSL OFFLOAD para DATACENTER de la DGIC:

* Pliego de Bases y Condiciones (PBC) y Dictamen de Estimación de Precios Referenciales finalizado, en coordinación con la Unidad Requirente (Dirección General de Informática y Comunicaciones - DGIC)


• Se espera autorización por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para el inicio del procedimiento. • En etapa de elaboración de la Resolución para aprobación del PBC e inicio de llamado.

4. Adquisición de Software de Gestión de Servicios De TI – ITSM: Llamado publicado en el portal de DNCP

La financiación de los requerimientos solicitados por las Dependencias del VAF, se han realizado conforme a la disponibilidad presupuestaria y financiera del Proyecto.

Proyecto	Capacitación Programa de Becas para Estudios en el Exterior				
OEE	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS				
Código SNIP N°	867				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	30.000.000		GS.	186.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
49.564.971.069		136.435.028.931		26,65 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
21/11/2022		21/11/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
12 %			48 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
44.477.227.531		3.422.490.824		7,69 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

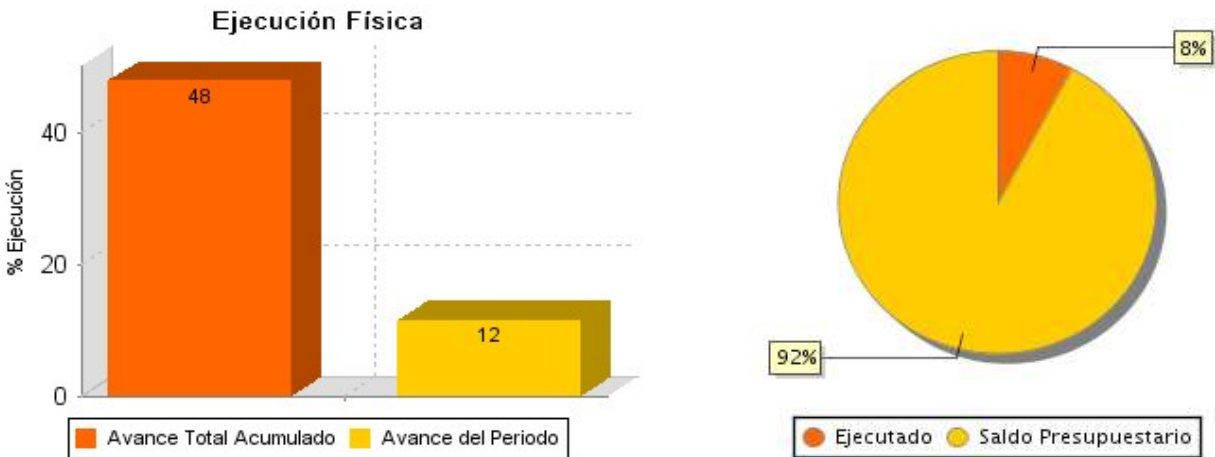

SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, se informa que se continuaron con los pagos pendientes de beneficios a becarios correspondientes a todas la convocatorias anteriores del ejercicio fiscal 2023 y 2024. Asimismo, se continuaron también con los pagos a consultores del plantel de BECAL que se encuentran con contratos o adendas vigentes del ejercicio fiscal 2024, por otro lado se ha contratado una consultoría nueva para el área de adquisiciones.


Se ha realizados los desembolsos en concepto de alquiler y expensas al proveedor STEROMAR y pagos por compras de pasajes a becarios a beneficio del proveedor MAYARA TRAVEL.

En cuanto a los llamados planificados se encuentran en elaboración de Especificaciones Técnicas para servicio de eventos como también para adquisiciones de equipos informáticos y renovación de licencias y sistemas.

Se ha realizado las auditorias a BECAL III FF20 correspondientes a los ejercicios fiscales 2023 y 2024, cuyos informes finales ya fueron aprobadas y actualmente se encuentran en el proceso de pago a favor del proveedor GESTIÓN EMPRESARIAL.

Proyecto		Mejoramiento de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible					
OEE		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					
Código SNIP N°		795					
Financiamiento		BID , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	26.340.000		GS.	180.032.640.355	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
106.317.158.953			73.715.481.402			59,05 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
14/01/2021			14/01/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2 %				56 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
42.232.153.901			5.944.560.251			14,08 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

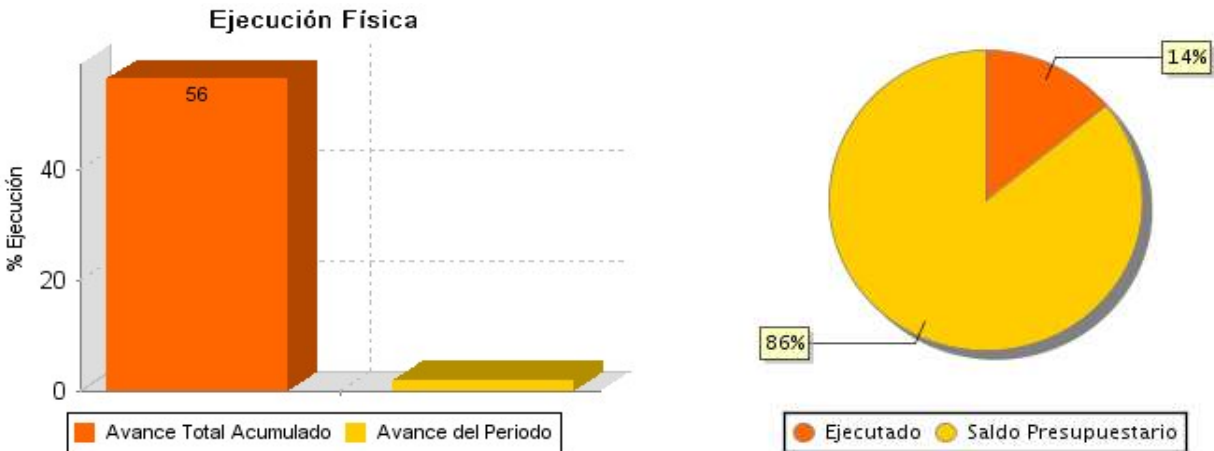

SITUACIÓN ACTUAL

Avances al Primer Cuatrimestre 2025

Componente I: Implementación del SIFEN

1. Elaboración del mapa e inventario de procesos de la Gerencia General de Aduanas.

2. Ejecución de mejoras al sistema Ekuatia’í 1.0, incluyendo el análisis y la propuesta técnica para la Factura Electrónica de Exportación.

Componente II: Fortalecimiento del SIARE

Avances en las funcionalidades del SIGEBys:

1. Modificaciones en el Módulo de Patrimonio y Bienes (MPV) relacionadas con la recepción y registro de bienes del PPE.

2. Implementación del control físico de bienes —toma y recuento físico de inventario— con un avance del 50%.

3. Cierre del desarrollo de la funcionalidad “Contratos Abiertos” y procesos sin centro de costo (CC).

Componente III: Implementación del SIARE Municipal

1. Consultoría funcional para el Módulo de Tesorería Municipal, culminada.

2. Elaboración en curso de las especificaciones técnicas para la adquisición del software de ajuste funcional y operativización del SIARE Municipal.

3. Módulo de Presupuesto Municipal, actualmente en ejecución.


Componente IV: Mejora de la Gestión de las Finanzas Públicas

Actividades en ejecución correspondientes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP):

- Desarrollo del Sistema de Administración de Perfiles y Detección de Necesidades de Capacitación.
- Implementación de un Sistema de Trámites por medio de eventos.
- Diseño y desarrollo del software de gestión académica y administrativa para el Instituto Técnico Superior de Compras Públicas de la DNCP.

Proyecto		Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II			
OEE		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS			
Código SNIP N°		782			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	60.000.000	GS.	429.540.672.600
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
268.089.813.610		161.450.858.990		62,41	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/11/2017		23/11/2023		31/12/2030	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			97 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
55.809.250.447		9.716.548.151		17,41	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

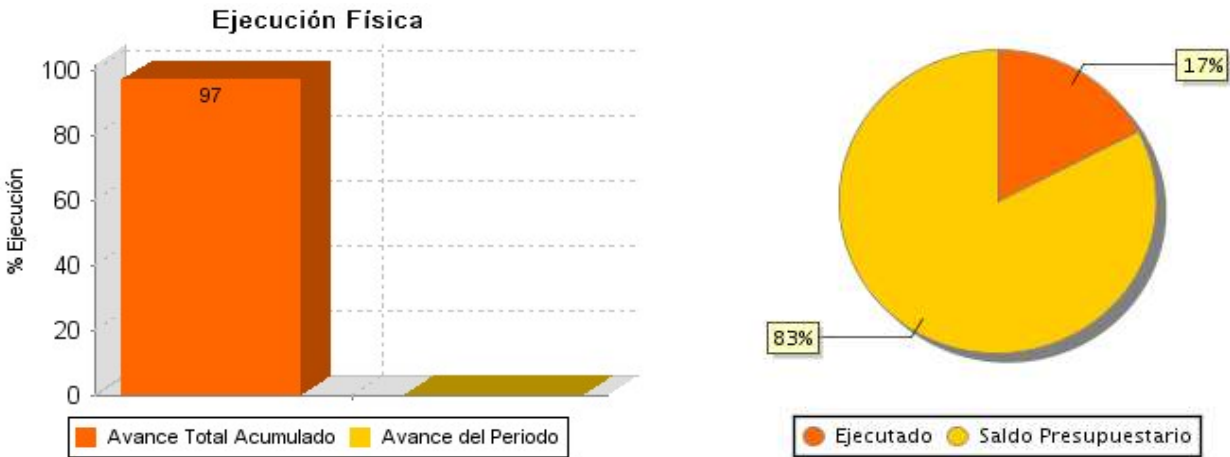

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se dio continuidad al cumplimiento de obligaciones financieras correspondientes a convocatorias anteriores, efectuándose pagos pendientes de beneficios a becarios de programas de maestría, doctorado e idiomas, así como a las Agencias Especializadas responsables de la gestión académica de dichas convocatorias.


Asimismo, se realizaron pagos a proveedores vinculados a la adquisición de pasajes aéreos para becarios en el marco del componente de movilidad académica.

Por otra parte, se informa que el Comité de Suministros otorgó su conformidad para el inicio del proceso de llamado a contratación de un proveedor de auditoría externa para el Programa BECAL II – Fuente de Financiamiento 30 (FF30), en cumplimiento de los requisitos de control y transparencia establecidos para la ejecución del programa.

Cabe señalar que el proyecto obtuvo una prórroga del plazo de ejecución hasta el año 2030, a fin de dar continuidad al financiamiento de nuevos becarios y garantizar la culminación de los programas de formación actualmente en desarrollo.

Proyecto	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py					
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
Código SNIP N°	707					
Financiamiento	BID					
Costo del Proyecto	USD	10.000.000		GS.	71.885.355.667	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
51.666.012.111		20.219.343.556			71,87	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
03/07/2018		03/07/2023			3/5/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,65 %				79,07 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
18.709.447.732		2.572.663.423			13,75	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

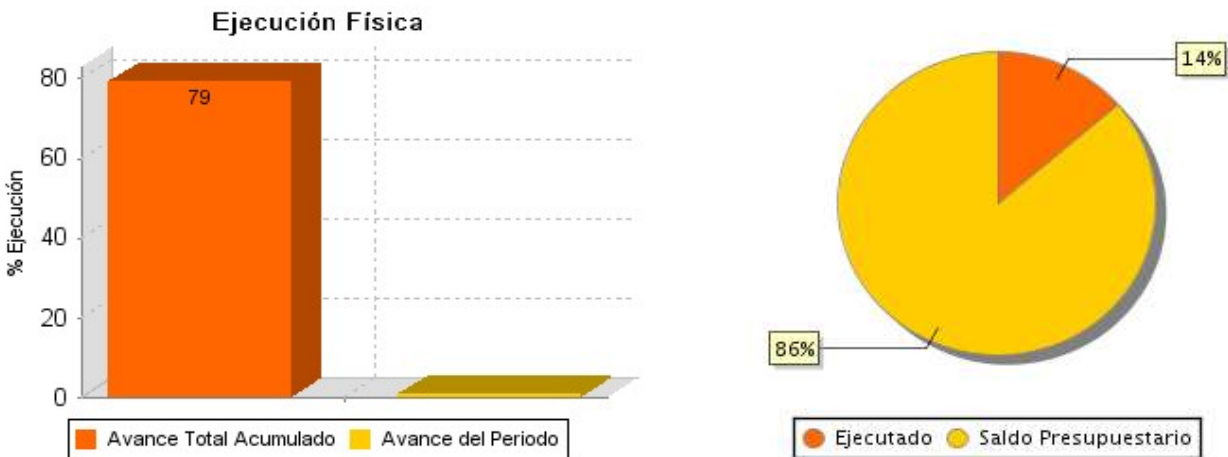


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora reportó que se encuentran en ejecución 3 subproyectos “Promoción del Circuito Turístico Trinacional del Parque Aventura Monday”, “Capacitación en Gestión de Calidad en Estándares Internacionales y Sostenibilidad Empresarial Orientado a Exportadores y Potenciales Exportadores del Departamento de Alto Paraná”, y "Simposio Regional e Internacional de la cadena productiva de la COLZA 2025,con énfasis en sostenibilidad",cofinanciamiento dirigido a empresas exportadoras elegibles ubicadas en zona de frontera.

Igualmente se realizó la auditoria de estados financieros del periodo 2024 .Además, informó que se encuentra en ejecución una capacitación para REDIEX, Ministerio de Industria y Comercio y Ministerio de Relaciones Exteriores.

Proyecto		Promoción Atención Integral a niños de 0 a 3 años					
OEE		MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA					
Código SNIP N°		909					
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	72.505.527.680	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
29.432.643.612			43.072.884.068			40,59 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
24/09/2021			31/12/2026			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Abaí, Ciudad del Este, Concepción, Encarnación, Gral.Francisco Isidoro Resquín, Horqueta, Itakryr, Luque, Pilar, San Antonio, San Estanislao, San Ignacio, San Juan Nepomuceno, San Pedro del Paraná, Santa Rosa						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
13,72 %				56,39 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
28.771.062.515			4.030.345.176			14,01 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

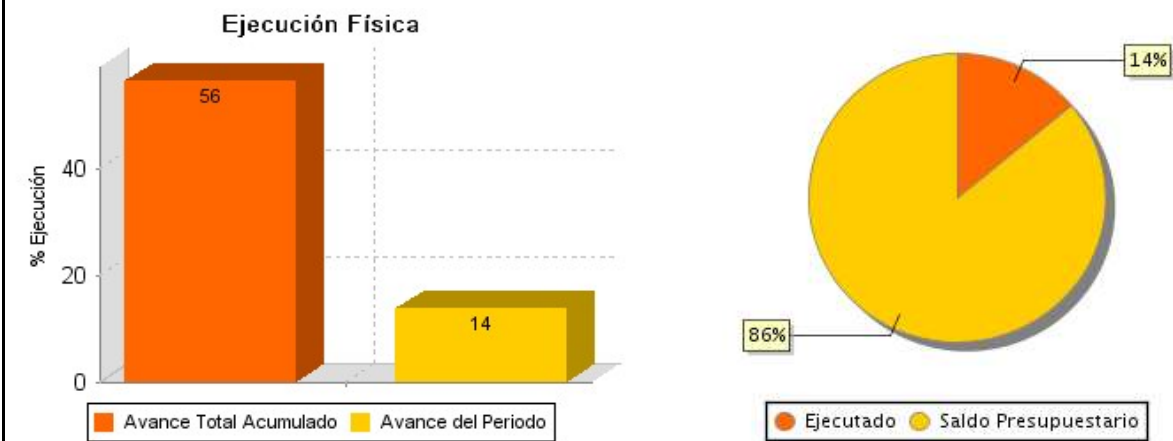

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances registrados corresponden a la puesta en funcionamiento de Espacios de Desarrollo Infantil (EDI), que actualmente se encuentran en operación, pago de salarios de coordinadores locales, educadores de sala, apoyos educativos de sala, educadores itinerantes, cocinera, ayudante de cocina y de limpieza. Provisión de útiles de oficina, artículos de limpieza, pago de servicios básicos requeridos para el funcionamiento y equipamiento de los EDI's. Pago por la provisión de alimentos a los EDI, conforme al contrato (ID N° 406867).


Provisión de viáticos a funcionarios para el desarrollo de actividades de estudios cualitativos, cuantitativos y monitoreo de la operación de los Espacios de Desarrollo Infantil EDI's. (Visitas a los EDI's de Asunción y Central: Sajonia, Terminal; Ñemby; San Lorenzo y Lambaré. Visitas en el interior del país: Caaguazú; Puerto Falcón; General Eugenio A. Garay; Pte. Franco).

Pago por servicios de comunicación para la difusión del proyecto, conforme al cronograma. Servicio de publicidad televisiva spots de 30 segundos. Servicio de publicidad en radios de la capital, de 30 segundos y pago al proveedor realizó el diseño, puesta en funcionamiento y actualización del apartado referente al proyecto en la página institucional del MINNA. Se presentaron propuestas de distribución y diseño del apartado WEB durante los primeros días de ejecución del proyecto.

En lo que respecta a los costos administrativos del proyecto, se realizan los pagos a funcionarios de la UEP, así como el pago de honorarios profesionales al especialista en primera infancia contratado para apoyar desde la UEP a los EDI's, en la implementación de la pedagogía enmarcada dentro del proyecto, así como seguimiento de las modalidades de atención (sala e itinerante), capacitaciones de manera presencial y virtual a educadores de sala sobre ambientación, fundamentación y lineamientos generales.

Proyecto		Construcción de una red para instituciones educativas					
OEE		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
Código SNIP N°		856					
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.					
Costo del Proyecto		USD	60.377.223		GS.	428.557.528.854	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
227.603.019.105			200.954.509.749			53,10 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/04/2020			16/04/2025			31/12/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
4,11 %				33,70 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
130.008.559.429			1.149.996.909			0,88 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

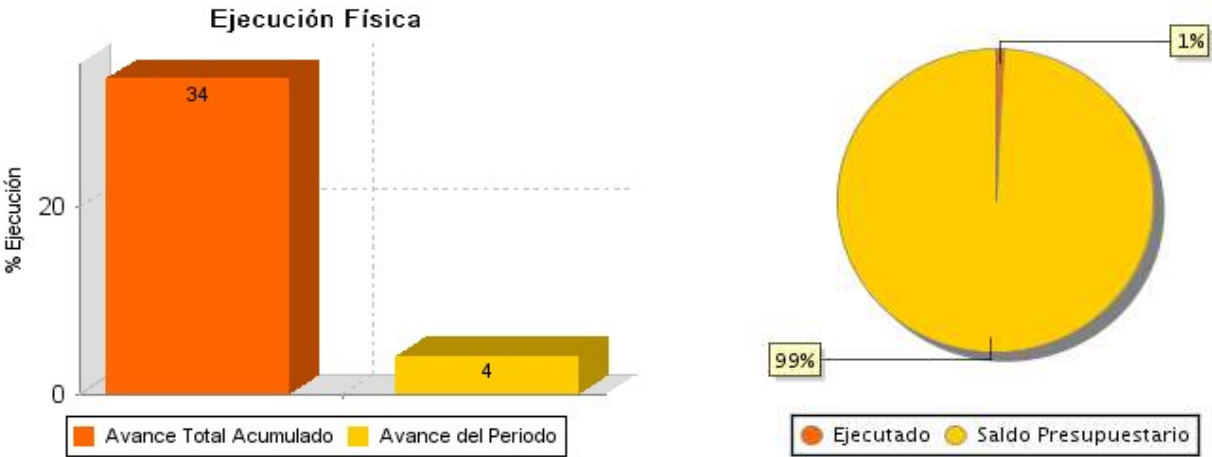

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad Ejecutora reportó que en el presente cuatrimestre el proyecto continúa con implementación de los servicios de conectividad en establecimientos educativos, así también se siguen realizando tareas de fiscalizaciones in situ, de soporte y mantenimiento de equipos instalados. La intervención se realizó en capital y los Departemanentos de: Concepción , San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay.

Se encuentra en ejecución el convenio MITIC - COPACO para conectividad en establecimientos educativos MEC, y Convenio MITIC- CONATEL por medio de compromisos sociales para conectividad en establecimientos educativos.

Además,se encuentra en ejecución la evaluación para el Servicio de Consultoría de la auditoria externa de los periodos fiscales 2022-2024.

Proyecto	Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay					
OEE	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN					
Código SNIP N°	793					
Financiamiento	BID					
Costo del Proyecto	USD	130.000.000		GS.	747.370.000.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
234.670.210.588		512.699.789.412			31,40 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
06/05/2019		06/05/2025			31/5/2028	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				57,02 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
118.342.181.564		8.876.269.901			7,50 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

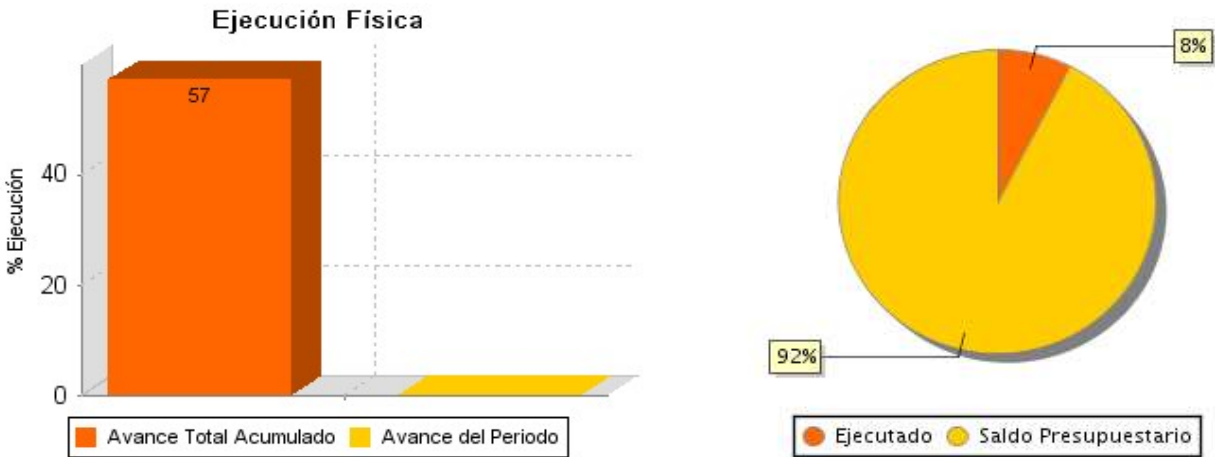

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Construcción de la sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	1147		
Financiamiento	N/A		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 8.510.635.107
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
0		8.510.635.107	0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
3/2/2025		3/2/2026	N/A


Ubicación Geográfica del Proyecto

Caaguazu	Distrito de Yhu
----------	-----------------

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total
0 %	0 %

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025	Porcentaje Ejecutado
800.000.000	0	0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

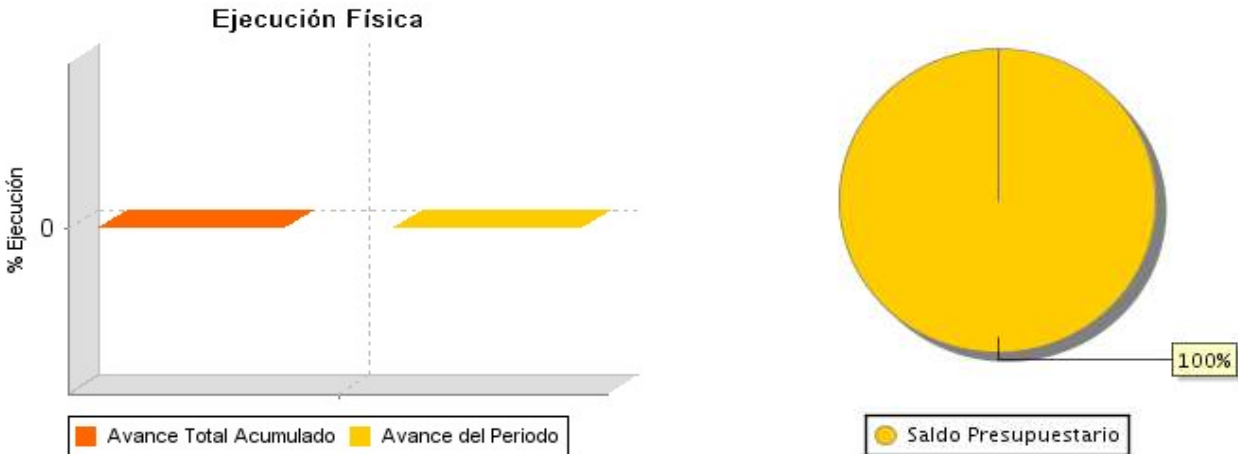

SITUACIÓN ACTUAL


El proyecto se encuentra es sus primeras etapas y la Licitación 468429 - LLAMADO MOPC N° 40/2025 LPN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA SEDE DEL INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDIGENA - INDI, DISTRITO DE YHU. DEPARTAMENTO DE CAAGUAZU se encuentra en Convocatoria en el portal de Contrataciones Públicas

Proyecto	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar - Humaitá - Paso Patria			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	1145			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	47.863.687	GS.	375.729.924.906
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		375.729.924.906		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
28/2/2024		28/2/2026		N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Ñeembucu			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0 %			0 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado
19.000.000.000		0		0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

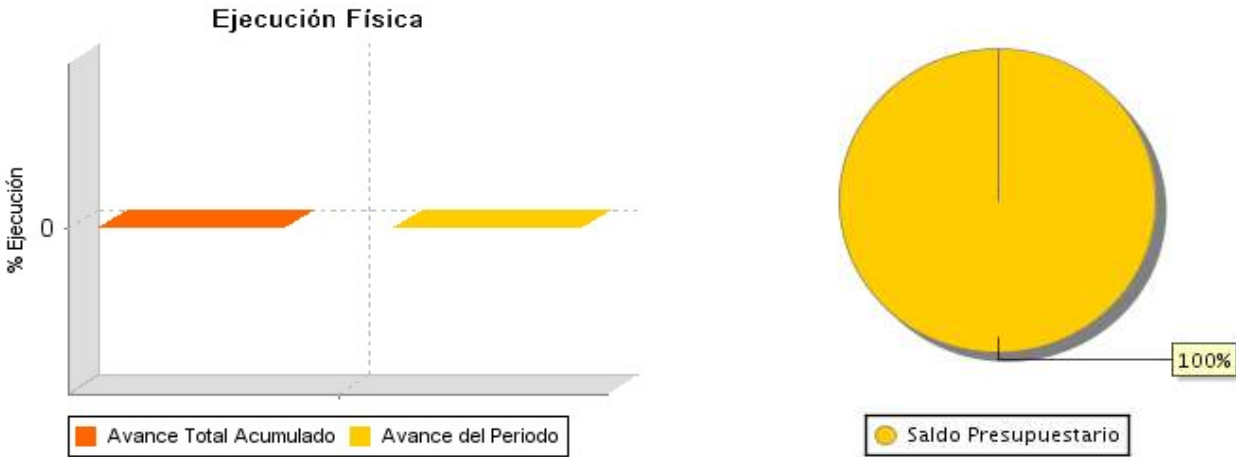


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del primer cuatrimestre el llamado a licitación de obras ID 461867 se encuentra publicado en el Portal de Contrataciones Públicas en etapas iniciales del proceso.

Proyecto		Reconstrucción de la Academia Militar-Capiatá			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		1135			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	46.788.000	GS.	352.126.488.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		0		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
3/6/2024		1/7/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			0,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
35.264.000.000		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

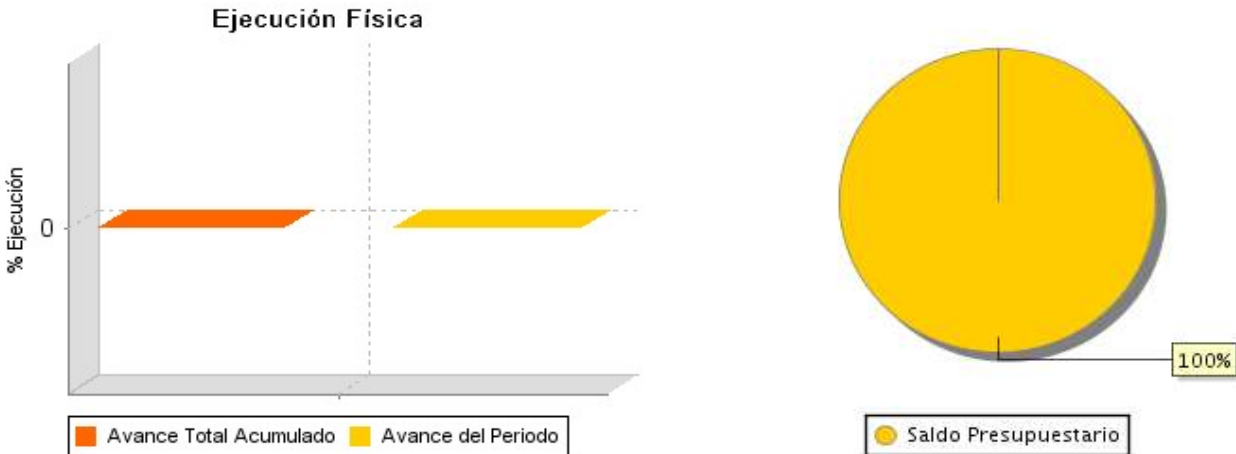


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de proyectos informó que se encuentran en proceso de llamados para licitaciones varias.

Proyecto	Mejoramiento travesía urbana de Coronel Oviedo					
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°	1131					
Financiamiento	LOCAL					
Costo del Proyecto	USD	14.969.183		GS.	110.771.956.864	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
9.879.098.588		100.892.858.276			8,92 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/10/2024		16/10/2025			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Municipal		Coronel Oviedo				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,81 %				0,81 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
19.318.072.000		2.000.000.000			10,35 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

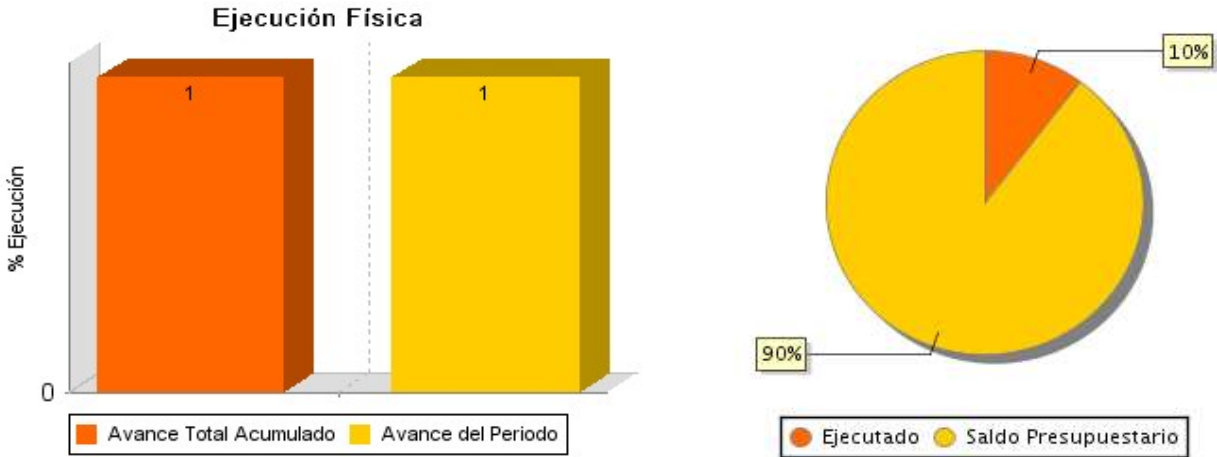

SITUACIÓN ACTUAL


Actualmente por la zona de obras se ejecutan trabajos de movimineto de suelo, conformación del paquete estructural y obras de drenaje. Abarca la modernización de 7,5 kilómetros de la ex Ruta 02.

El diseño contempla tres tramos principales: las colectoras norte y sur, que funcionarán como vías paralelas para descongestionar la ruta principal; el tramo Maristas, que conecta con instituciones educativas y zonas de servicio; y el tramo troncal, considerado el eje central, preparado para soportar el mayor flujo vehicular.

Además de estas intervenciones, la iniciativa incluye la construcción de un Parque Lineal de tres kilómetros en el sector central, un espacio recreativo y ambiental destinado al esparcimiento y la integración social de los pobladores.

Proyecto	Mejoramiento Quyquyho-Maria Antonia-Ñandu Rugua-Mbuyapey									
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES									
Código SNIP N°	1129									
Financiamiento	LOCAL									
Costo del Proyecto	USD	28.083.418				GS.	196.583.923.796			
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución				
4.408.003.127		192.175.920.669				2,24		%		
Fecha de Inicio		Fecha de Fin				Fecha de Prórroga				
17/3/2025		17/9/2026				N/A				
Ubicación Geográfica del Proyecto										
Departamental		Paraguarí								
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total					
0,00		%			4,77		%			
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado				
12.191.402.576		4.408.003.127				36,16		%		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

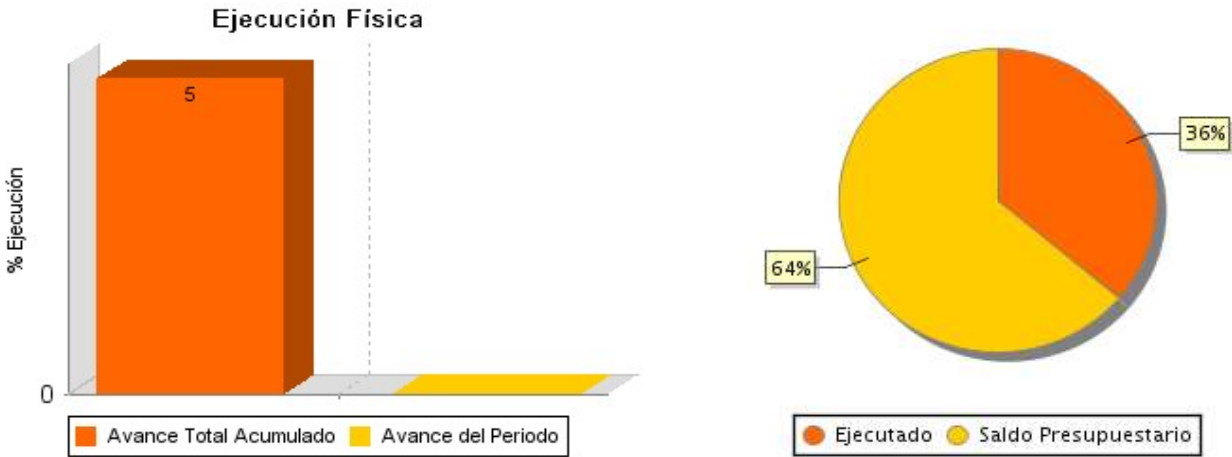


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago de anticipo financiero de la obra, mientras que el llamado a fiscalización se encuentra en etapa de evaluación.

Proyecto		Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		1111											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		17.458.784				GS.		149.268.104.273			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
7.463.405.213				141.804.699.060				0,05 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
17/3/2025				17/9/2026				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Caazapá											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00 %						0,99 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
9.635.427.725				7.463.405.213				77,46 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

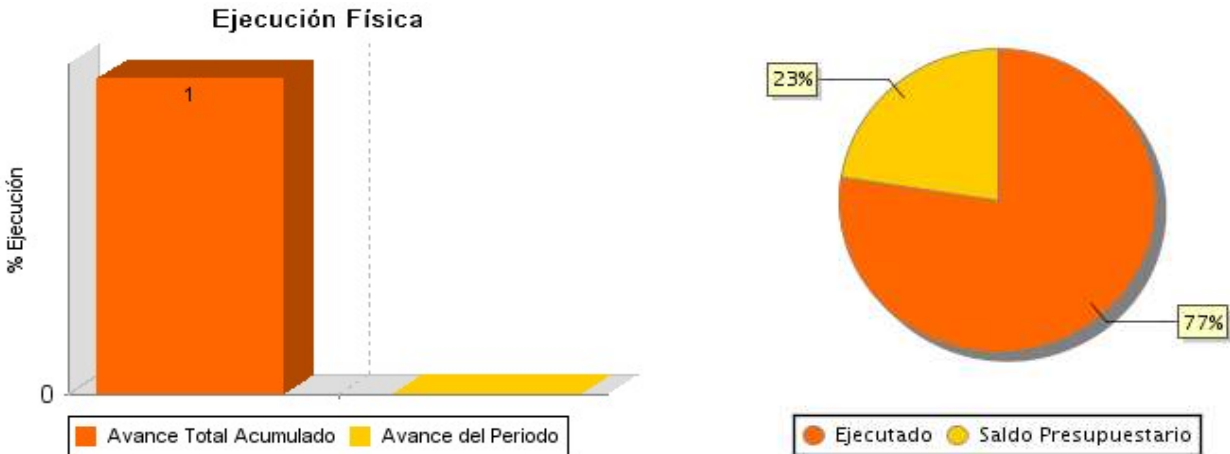


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago anticipo financiero (5%) de los contratos de la obra de mejoramiento de caminos vecinales.

Proyecto	Ampliación de establecimientos educativos e IFD				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	1075				
Financiamiento	BIRF				
Costo del Proyecto	USD	104.190.000		GS.	760.587.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		0		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
7/1/2025		7/1/2030		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
14.938.805.907		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

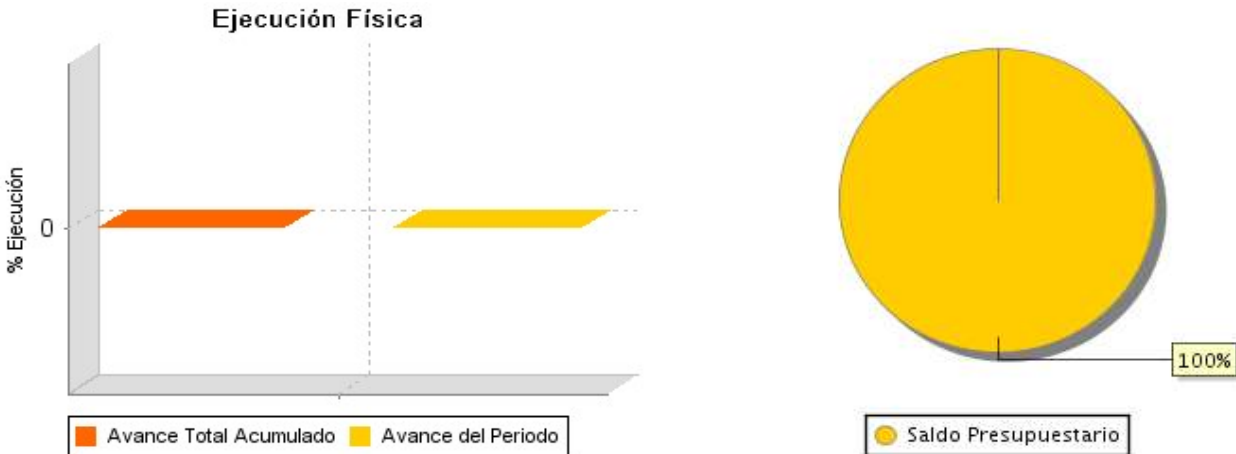

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se prevé iniciar las fiscalizaciones mediante consultorías individuales. Los Términos de Referencia (TDR) para las áreas de seguridad y salud ocupacional (SYSO), ambiental, social y civil ya fueron remitidos al Banco Mundial para su verificación.


Asimismo,se elaboró el pliego de bases y condiciones (PBC) para el primer llamado de obras y se encuentra en proceso de revisión por parte del Banco Mundial,

Por otro lado, se prevé contratar especialistas técnicos y administrativos para conformar el equipo de la UEP-IE en áreas como técnica, fiduciaria, socioambiental, SYSO y apoyo operativo se avanzó en la revisión y aprobación de los TDR. Además, se contempla la adquisición de equipos informáticos para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura.

El MOPC y el MEC lideran la elaboración de los TDR para los llamados de Auditoria en concordancia con las regulaciones del Banco Mundial.

Proyecto	Construcción y equipamiento Hospital Gral. San Estanislao												
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES												
Código SNIP N°	1026												
Financiamiento	Banco Interamericano de Desarrollo												
Costo del Proyecto	USD		34.050.000				GS.		268.416.150.000				
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.					Porcentaje de Ejecución					
0			268.416.150.000					0,00 %					
Fecha de Inicio			Fecha de Fin					Fecha de Prórroga					
19/12/2024			19/12/2027					19/12/2029					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental			San Pedro										
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total								
1 %					1 %								
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025					Porcentaje Ejecutado					
3.050.000.000			0					0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

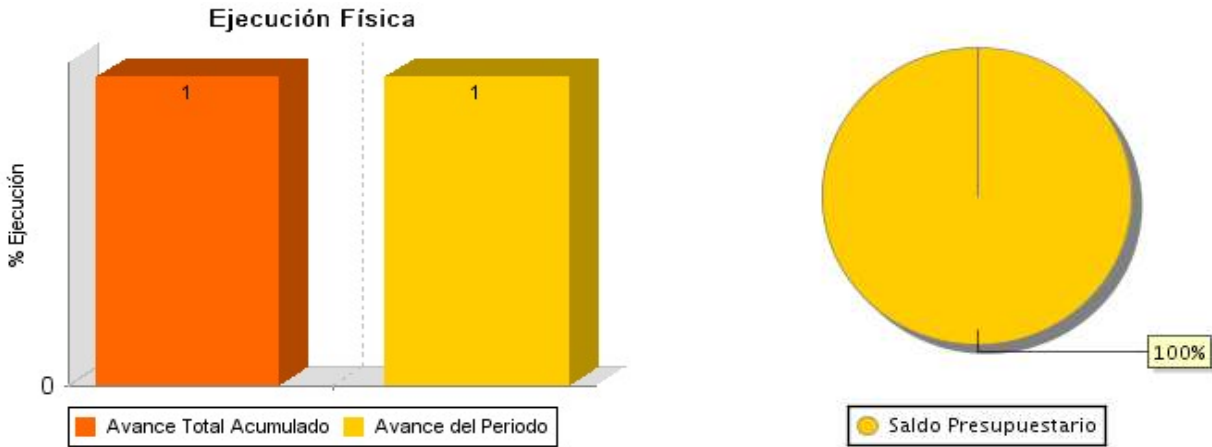

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que se impulsaron las tareas administrativas y de gestión tendientes al logro de las condiciones previas necesarias para la Elegibilidad del proyecto; las cuales se informan:

Respecto a las Estipulaciones Especiales como contar con la Unidad Ejecutora: cumplido según No Objeción BID Nota O-CSC/CPR-67/2025; Convenio de Cooperación MOPC y MSPBS: cumplido según No Objeción BID Nota O-CSC/CPR-67/2025; Designación de profesionales clave: cumplido según No Objeción BID Nota O-CSC/CPR-254/2025; Posesión legal del inmueble: cumplido según No Objeción BID Nota O-CSC/CPR-84/2025; Designación de especialistas: cumplido según No Objeción BID Nota O-CSC/CPR-254/2025; Comunicación de la fecha de entrada en vigor: cumplido según Nota MEF N° 102/2025.


Respecto a las Normas Generales: Condiciones previas al primer desembolso de los recursos del Préstamo, se ha cumplido con las siguientes gestiones: Remisión de Informes Jurídicos; Registro de Firmas; Apertura de Cuenta; Sistema de Información financiera y estructura de control interno.

Respecto a los procesos de llamados de obras y su fiscalización, se encuentra en etapa de elaboración de documento de licitación de obras: Ajustes y modificaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) con sus correspondientes especificaciones técnicas (ET's) para la totalidad de productos, con la preparación Licitación Pública Internacional LPI "Diseño, Construcción y Mantenimiento de Obras" de Supervisión de la Obra. Etapa de elaboración de documento de licitación de fiscalización: Se ha realizado la publicación de la Manifestación de Interés (MI) para Elaboración de Lista Corta de los oferentes interesados.

Respecto a los trámites administrativos, financieros y presupuestarios: Creación de la estructura presupuestaria en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 y asignación presupuestaria.

Proyecto	MEJORAMIENTO TRAMO JUAN E OLEARY – SAN CRISTOBAL					
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°	1008					
Financiamiento	LOCAL					
Costo del Proyecto	USD	32.690.011		GS.	246.419.750.881	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
12.320.987.543		234.098.763.338			5,89 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
17/3/2025		17/3/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Alto Paraná					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,94 %				5,79 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
15.911.656.288		12.320.987.543			77,43 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

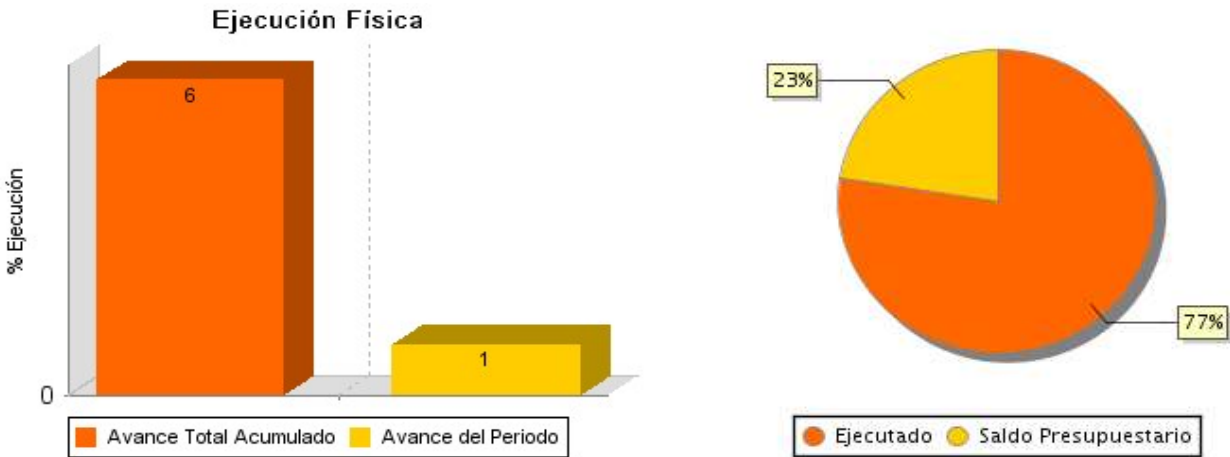


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago de anticipo financiero. La fiscalización en etapa de evaluación de oferta. El Tramo O'Leary - San Cristóbal tien una longitud 62,29 km.

Proyecto		Construcción y protección de márgenes del Arroyo San Lorenzo											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		1007											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		N/A				GS.		45.752.075.133			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.						Porcentaje de Ejecución			
4.463.685.541				41.288.389.592						9,76 %			
Fecha de Inicio				Fecha de Fin						Fecha de Prórroga			
15/3/2024				15/3/2026						N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Municipal		San Lorenzo											
Avance Físico Reportado del Periodo							Avance Físico Acumulado Total						
1,00		%								1,00		%	
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025						Porcentaje Ejecutado			
14.100.000.000				4.463.685.541						31,66 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

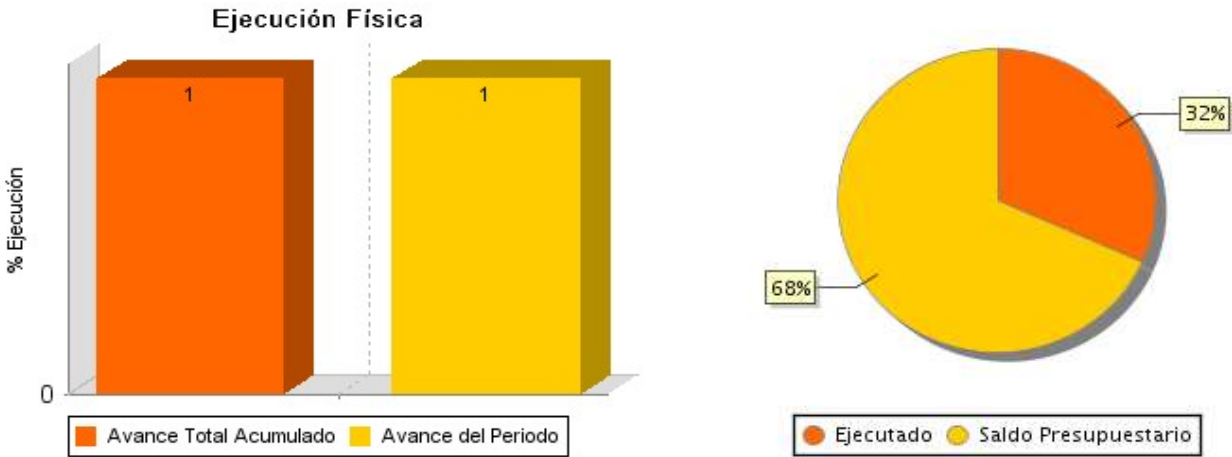


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que se ha realizado el pago por Anticipo Financiero por un monto de Gs. 4.463.685.541, el cual fue honrado en fecha 11/03/2025. Asi mismo, se ha emitido la orden de proceder en fecha 01/04/2025. Se tiene previsto el inicio de las obras en el segundo cuatrimestre del año.

Proyecto		Mejoramiento del tramo: “Casilla 2 – Tembiapora”					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		988					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	158.420.952.975	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
18.222.271.729			140.198.681.246			11,50	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
1/1/2025			1/1/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Caaguazú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00		%		4,75		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
27.061.929.913			18.222.271.729			67,34	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

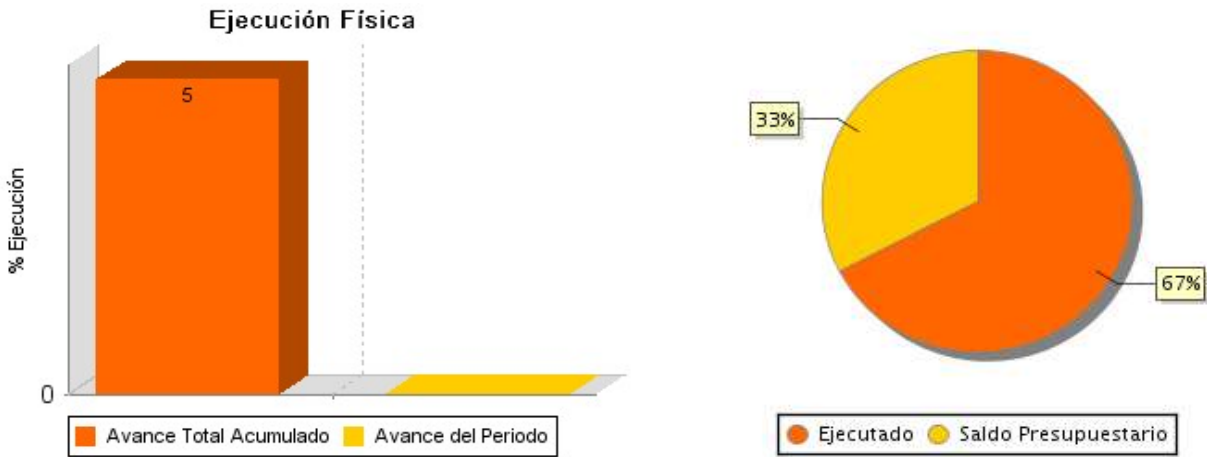


SITUACIÓN ACTUAL

La UEP no ha reportado su avance del primer cuatrimestre en el plazo establecido.

Proyecto		Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		987			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	13.726.991	GS.	96.088.938.750
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0		96.088.938.750			0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/11/2023		29/12/2028			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
0,07 %				2,46 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
8.067.023.000		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

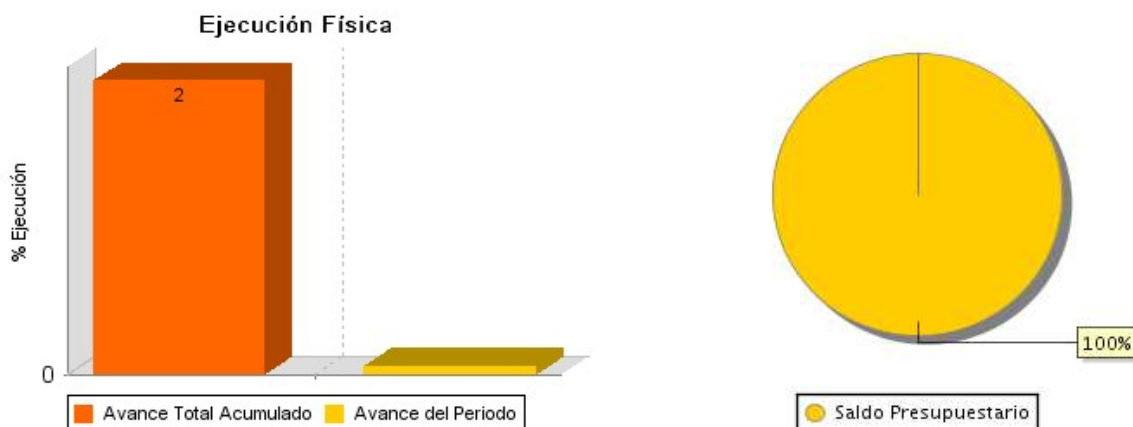

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente cuatrimestre, se informa que lo referente a las obras de Parque Caballero, el documento de licitación de diseño e infraestructura ya cuenta con la No Objeción del Banco y se prevé la publicación del llamado para el próximo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

Así también, los Términos de Referencia para el estudio de Factibilidad ya cuentan con la No Objeción del Banco y se encuentran realizando los trámites previos a la publicación del Llamado. Por su parte, los Términos de Referencia de la consultoría de Fiscalización de obras se encuentran en ajustes finales para la No Objeción del Banco y posterior publicación del Llamado.

En relación con la administración del proyecto, se informa que algunos servicios de consultorías individuales para el fortalecimiento de la UEP se encuentran en etapa de revisión y aprobación de los Términos de Referencia, y para otros casos en proceso de firma de contrato.


Se informa que actualmente la UEP se encuentra situado en las nuevas Oficinas de Gobierno (ODG).

Respecto al componente de implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social, se informa que durante la elaboración de los TDR para el Parque Caballero se ha considerado lo establecido en el MAS y lo comprometido en el PCAS, por lo que se da por cumplida la actividad en el presente cuatrimestre.

Así también, desde el Componente 3 se empezó a implementar de forma general para toda la población de la chacarita, incluyendo el Parque Caballero, por medio de encuestas para diagnosticar las necesidades y recorridos barriales. Con relación al diseño urbano participativo, participación de las instituciones relacionadas (Municipalidad y Ministerio de Urbanismo), así mismo con la comunidad afectada directamente (vecinos del barranco y sociedad civil organizada).

Proyecto		Mejoramiento y revitalización urbanística del Centro Histórico de Asunción (CHA)					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		985					
Financiamiento		BIRF					
Costo del Proyecto		USD	20.958.011		GS.	146.706.073.500	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			146.706.073.500			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
24/11/2023			29/12/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal		Asunción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,05 %				2,43 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado		
9.610.477.997			0		0,00 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

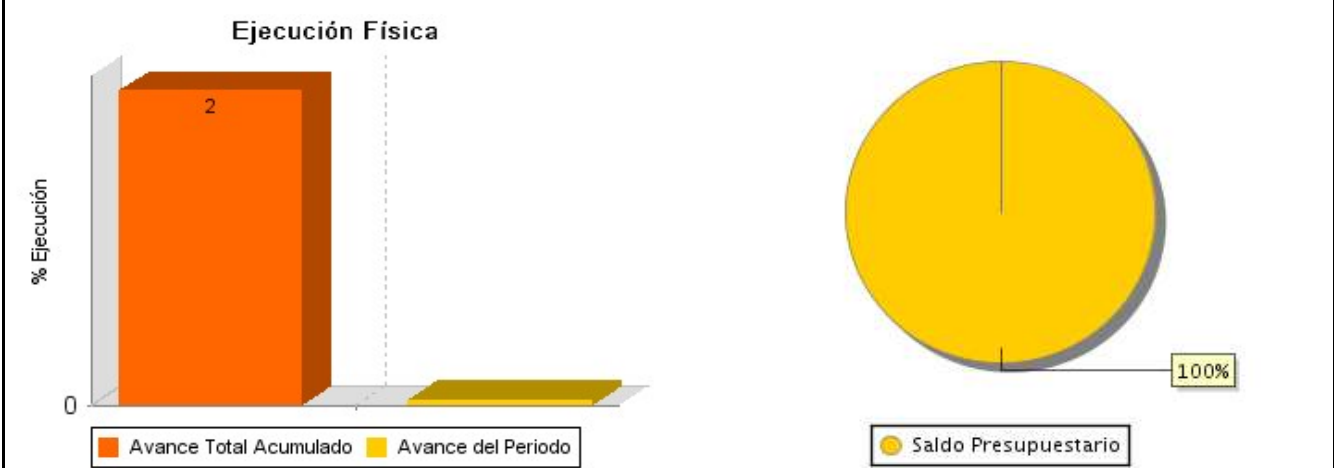

SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de este Proyecto, se reporta que el desarrollo de los Términos de Referencia de Diseño e Infraestructura se encuentra en la etapa final, previa a la No Objeción del Banco, así también el llamado correspondiente a la Fiscalización de obra. Por su parte, la consultoría para el estudio de Factibilidad ya cuenta con la No Objeción del Banco y se encuentran realizando los trámites previos a la publicación del Llamado.


En relación con la administración del proyecto, se informa que algunos servicios de consultorías individuales para el fortalecimiento de la UEP se encuentran en etapa de revisión y aprobación de los Términos de Referencia, y para otros casos en proceso de firma de contrato.

Se informa que se han iniciado los trámites necesarios para el proceso de adjudicación de la Auditoría Externa y que actualmente la UEP se encuentra situado en las nuevas Oficinas de Gobierno (ODG).

Finalmente, Con respecto al componente de implementación del PGAS y servicios ambientales se informa que se han elaborado las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), instrumento que define los programas para el PGAS y se encuentra en elaboración el Plan de afectación de activos.

Proyecto	Construcción del Distrito Eco-inclusivo de Asunción				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	983				
Financiamiento	BIRF				
Costo del Proyecto	USD	66.761.641	GS.	467.331.485.250	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
16.416.691.264		450.914.793.986		3,51	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/11/2023		29/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,50 %			3,45 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
44.584.618.630		14.323.080.681		32,13	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

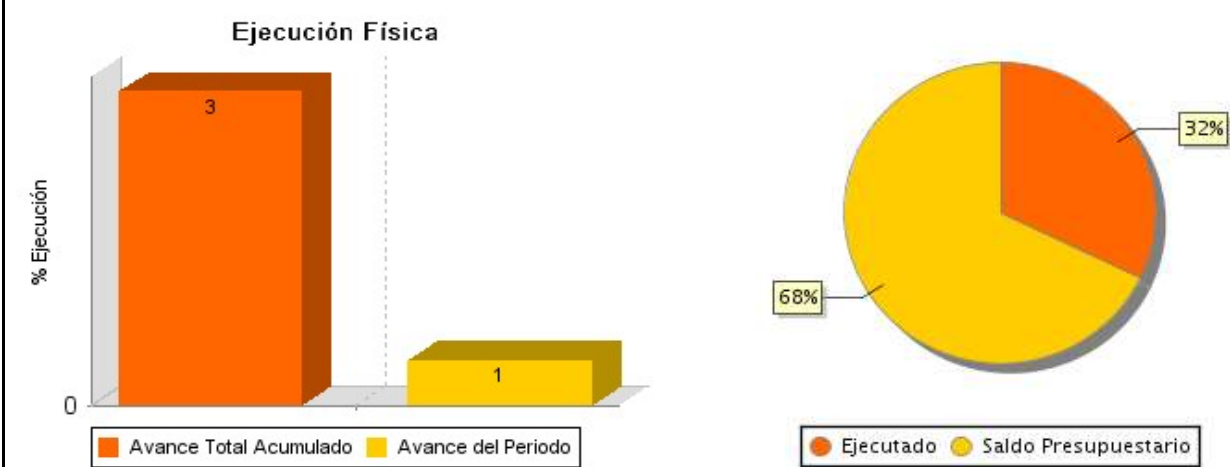

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente cuatrimestre, se informa que se han avanzado en los estudios preliminares y Máster plan del proyecto, insumos necesarios para el proceso de adquisición del Llamado de Diseño e Infraestructura del Distrito Eco Inclusivo. Así también, los Términos de Referencia para el estudio de Factibilidad se encuentran en fase final para aprobación; como así también lo que respecta a Fiscalización de obras.


Con relación a la administración del proyecto, se informa que algunos servicios de consultorías individuales para el fortalecimiento de la UEP se encuentran en etapa de revisión y aprobación de los Términos de Referencia, y para otros casos en proceso de firma de contrato.

Se informa que se han iniciado los trámites necesarios para el proceso de adjudicación de la Auditoría Externa y que actualmente la UEP se encuentra situado en las nuevas Oficinas de Gobierno (ODG).

Con respecto al componente de implementación del PGAS y servicios ambientales se informa que el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) fue considerado para las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del Llamado MOPC N°: 102/2024. Soterramiento de LAT, como así también para próximo Llamado de Diseño e Infraestructura del Distrito Eco-inclusivo. Además, que se ha establecido la metodología de los talleres participativos en la comunidad a llevarse a cabo durante el próximo cuatrimestre.

Proyecto		Construcción Instalaciones Reserva Bco San Miguel, Asunción					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		982					
Financiamiento		BIRF					
Costo del Proyecto		USD	11.137.827		GS.	77.964.786.690	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			77.964.786.690			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
24/11/2023			29/12/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal		Asunción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				1,88 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
2.087.760.000			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

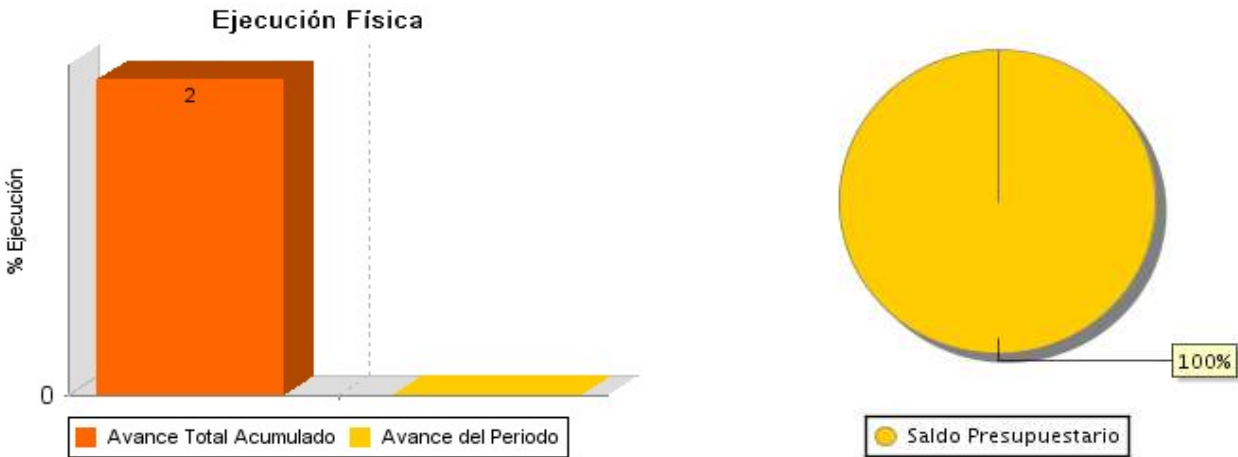


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente cuatrimestre, los Términos de Referencia para el estudio de Factibilidad se encuentran en elaboración. Se prevé avanzar con el proceso de adquisición para dicho estudio durante los próximos meses. Con relación a la administración del proyecto, se informa que se han iniciado los trámites necesarios para el proceso de adjudicación de la Auditoría Externa y que actualmente la UEP se encuentra situado en las nuevas Oficinas de Gobierno (ODG). Respecto a los componentes referentes a la Implementación del PGAS y de servicios ambientales, se reporta que la actividad no tuvo avance, ya que aún no hubo intervención en obras.

Proyecto		Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		974							
Financiamiento		LOCAL							
Costo del Proyecto		USD		87.199.728		GS.		601.678.122.876	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
45.954.584.073			555.723.538.803			7,64 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
13/3/2024			13/3/2026			N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Municipal		Pilar							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
1,36 %					1,36 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
108.071.481.522			45.954.584.073			42,52 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

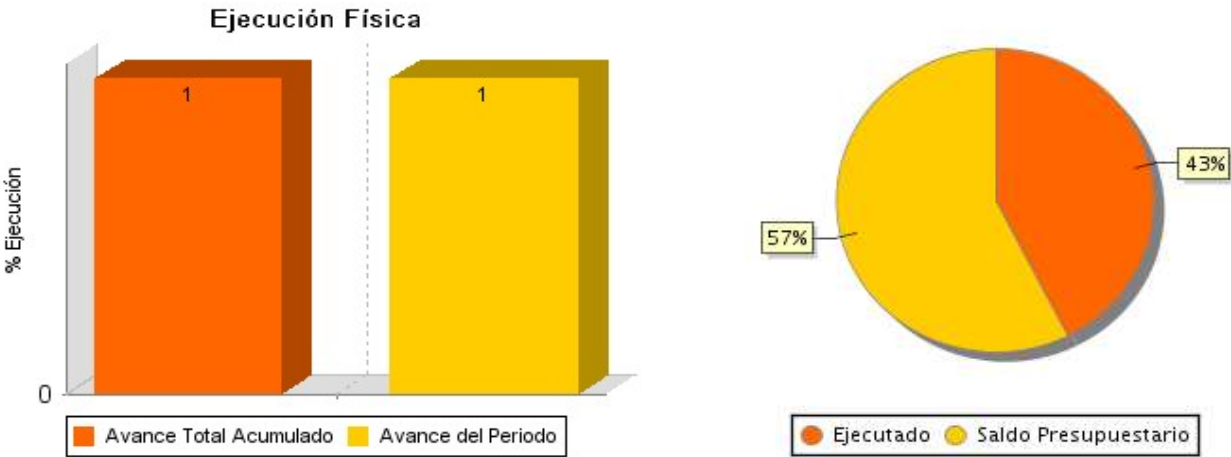


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta lo siguiente: En fecha 19 de febrero de 2025, se ha emitido la Orden de Inicio de los trabajos, se realizó el pago de anticipo financiero, dando inicio a los trabajos de movilización, mejoramiento de los caminos de acceso a la obra, instalación de contenedores para el equipamiento de oficinas del obrador, colocación de carteles, trabajos topográficos y geotécnicos e Implementación del PGA, resultando un avance de 1,20% ejecutado. La prestación de los servicios por parte de la fiscalización ha iniciado en fecha 19 de marzo de 2025 y ya cuenta con el pago de anticipo financiero.

Proyecto	Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 y Ramal 1a Linea, 33Km				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	962				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	13.972.812.086		GS.	135.972.812.086
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
74.162.228.540		61.810.583.546		54,54 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2022		01/04/2024		21/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Capiibary, Yhú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
7,14 %			78,13 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
20.293.305.955		10.411.053.456		51,30 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

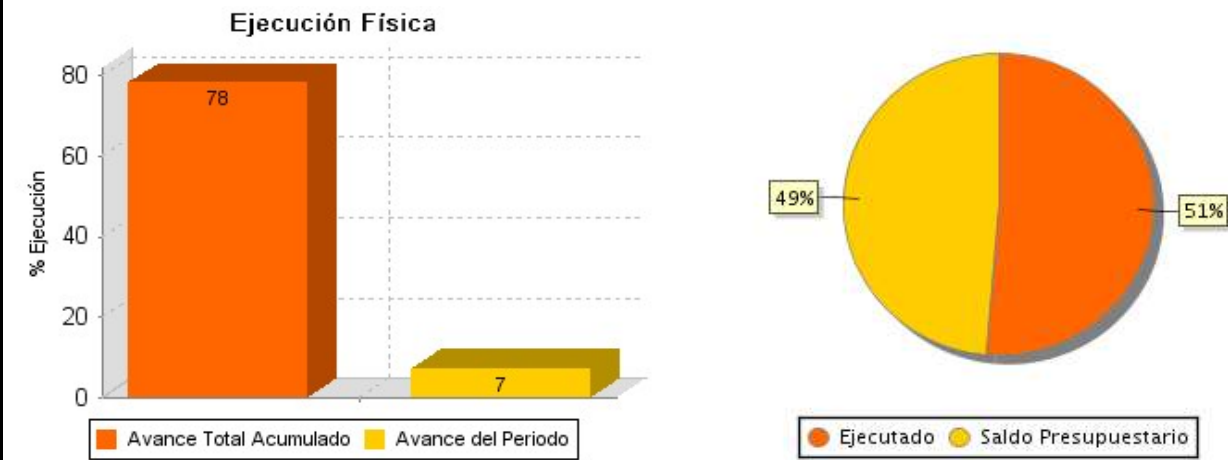


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Mejoramiento del edificio central del MINNA				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		957				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	10.905.509.073
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
8.841.605.059			2.063.904.014		81,07 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/06/2022			01/06/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				52,00 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
0			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

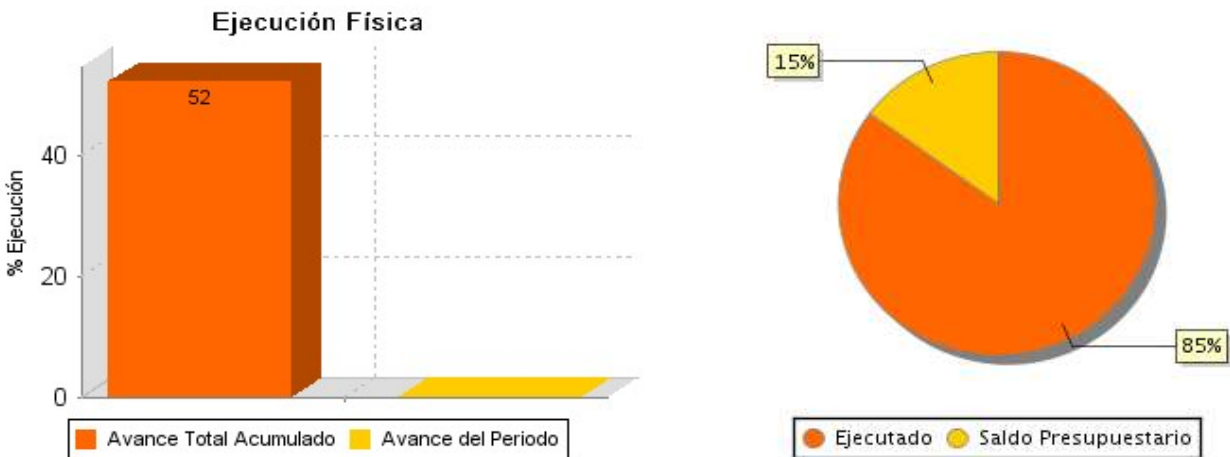


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que la obra del edificio de MINNA se encuentra con recepción definitiva, y cuenta con proceso de intereses moratorios.

Proyecto		Mejoramiento de gestión de infraestructura vial pavimentada					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		956					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	52.666.659		GS.	342.333.286.666	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
198.367.267.739			143.966.018.927			57,95 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/10/2022			01/10/2024			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional	N/A						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,00		%		53,76		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
109.568.113.718			31.853.859.643			29,07 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

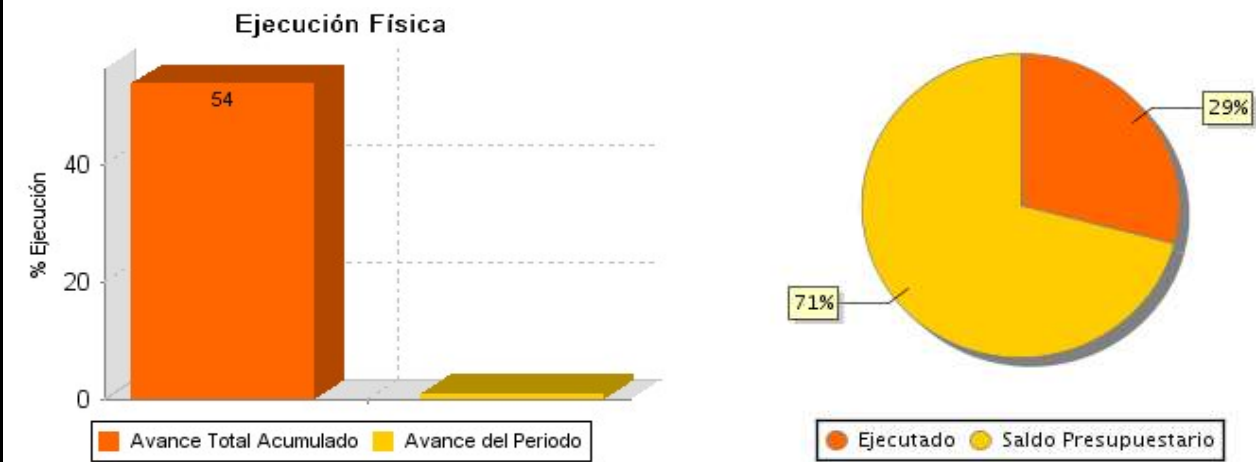


SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre el MOPC reporta los siguientes avances: Se realizaron pagos a la empresa TECO S.R.L. por trabajos de mantenimiento de túneles y viaductos. Por otro lado, en el llamado 20/2024 de limpieza de franja de dominio, se ha reportado limpieza en los lotes adjudicados, pero no se realizaron pagos, sigue pendiente la emisión de los códigos de contratación por parte de la DNCP para que una vez emitidos se pueda honrar los pagos con las empresas adjudicadas.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Guarambaré					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		946					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	1.205.470		GS.	11.648.603.554	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
1.099.166.236			10.549.437.318			9,44	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/12/2024			16/12/2025			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Guarambaré						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,86 %				6,51 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
2.580.091.266			1.099.166.236			42,60	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

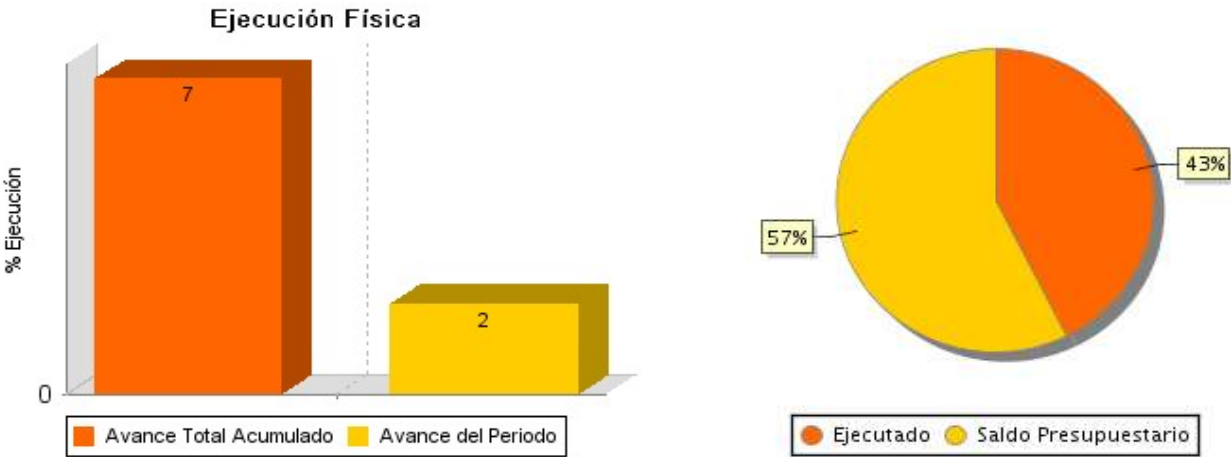


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago de anticipo financiero, y se dio orden de inicio, además se avanzó 0,80 km de caminos distritales mejorados.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		941					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	6.562.546		GS.	51.581.512.029	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
4.947.672.627			46.633.839.402			9,59 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
14/3/2025			14/3/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Itá						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,86 %				13,02 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
10.641.955.951			4.947.672.627			46,49 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

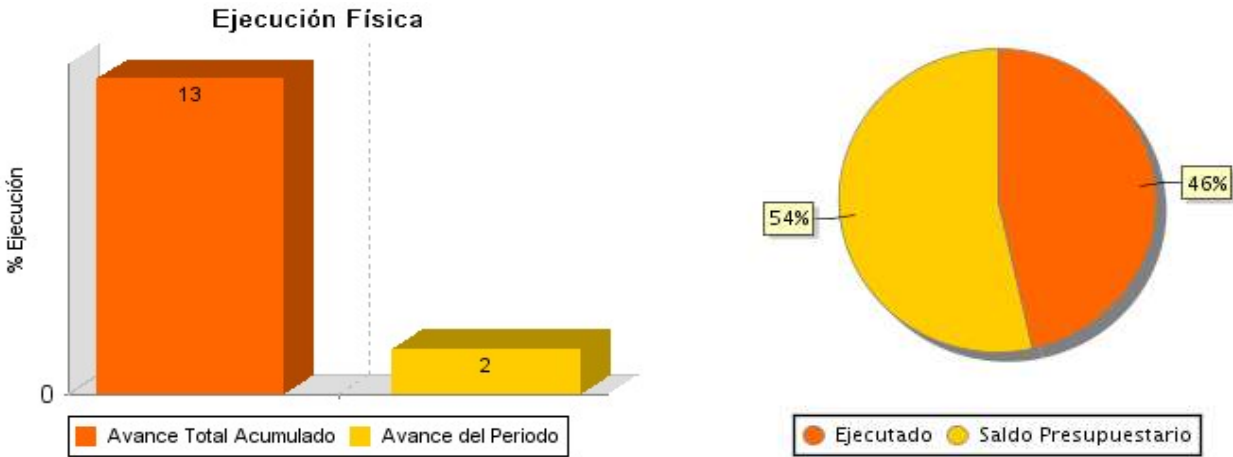


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago de anticipo financiero de la obra y la presentación del primer certificado con un avance del 1.74% de la obra de mejoramiento de 29,74 km.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		939											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		6.190.230				GS.		56.818.770.246			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
5.681.588.457				51.137.181.789				13,11 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
10/2/2025				10/2/2027				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Municipal		Areguá											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,93 %						5,58 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
9.957.084.249				5.681.588.457				57,06 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

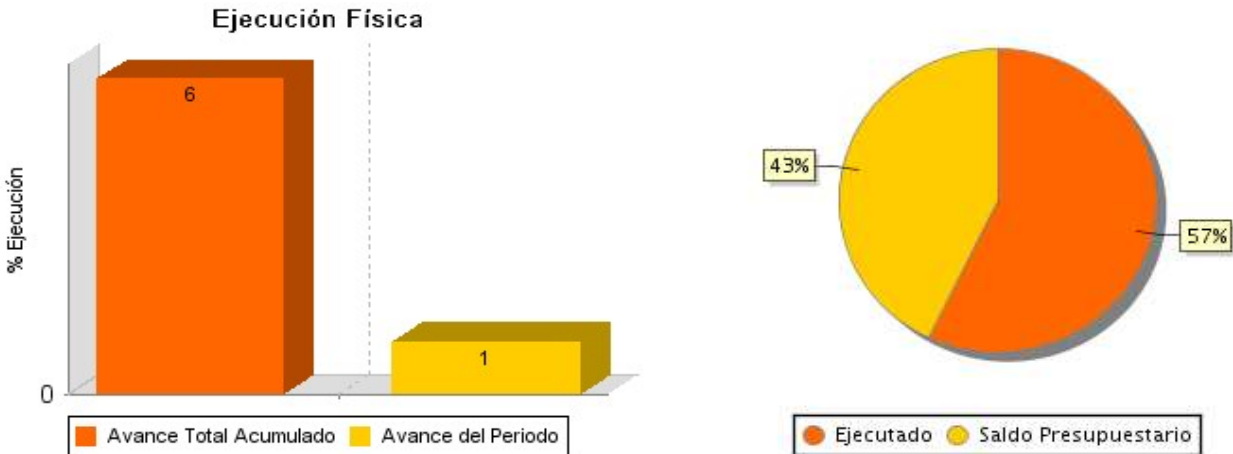


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago de anticipo financiero pagado y por avance contractual del 1,22% por la obra Mejoramiento de 22,86 km.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Distritales de Ñemby					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		938					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	4.737.130		GS.	46.594.414.216	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
4.396.664.950			42.197.749.266			13,26 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
3/10/2024			3/10/2026			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Ñemby						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
3,72 %				8,37 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
7.604.231.355			4.396.664.950			57,82 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

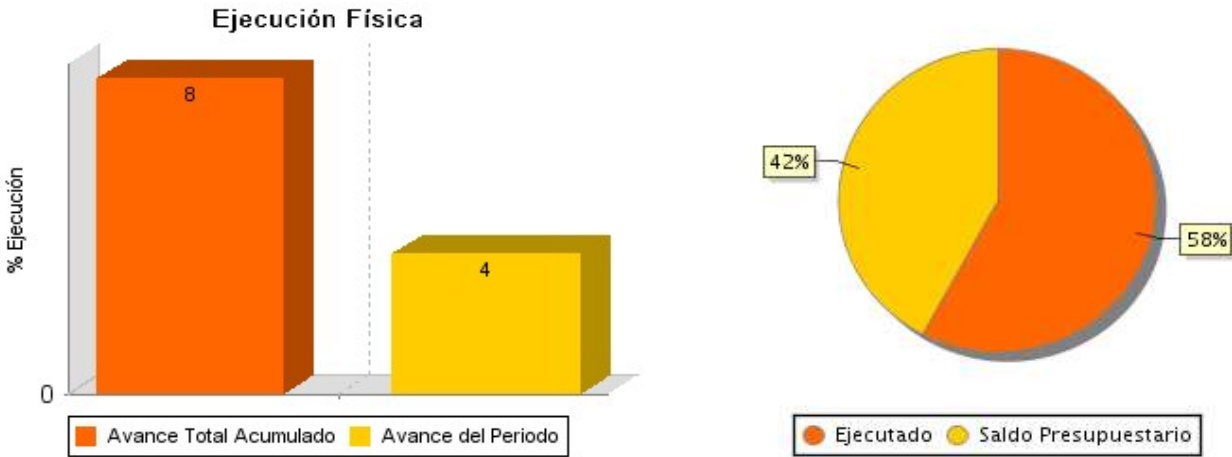


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago del anticipo financiero de 10%, más avance contractual del 3,73% en obras

Proyecto		Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		936					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	9.744.865		GS.	79.967.763.760	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
7.921.921.361			60.292.135.251			11,61	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/12/2024			16/12/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	San Lorenzo						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2,79 %				7,44 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
15.802.468.358			7.921.921.361			50,13	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

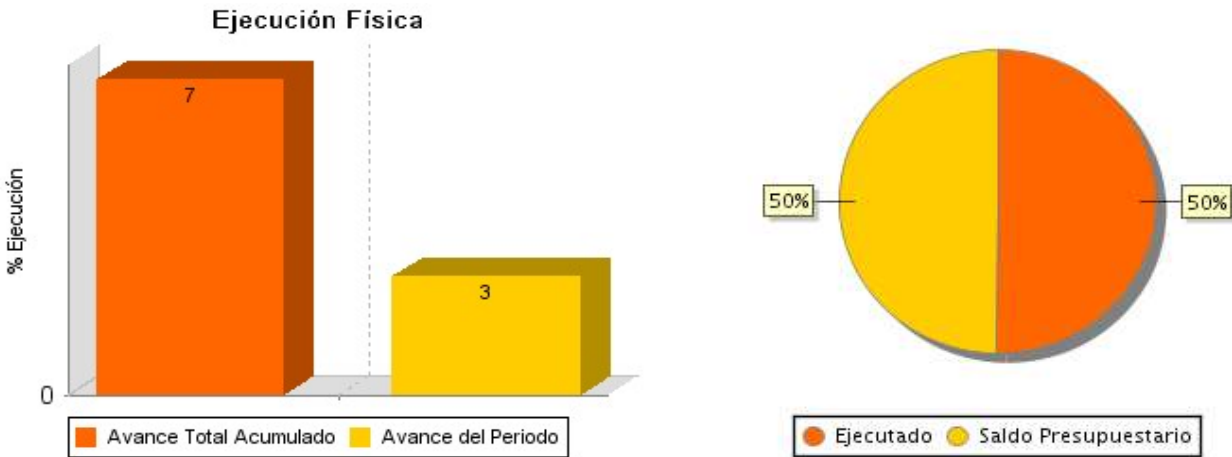


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago del anticipo financiero correspondiente al 10% del contrato, más el avance en certificación de obras del 3,16% de la obra de mejoramiento de 33,18 km.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		935					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	8.533.170		GS.	82.299.997.253	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
9.089.226.212			73.210.771.041			11,04	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/12/2024			16/12/2026			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Capiatá						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2,79 %				7,44 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
13.725.740.078			9.089.226.212			66,22	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

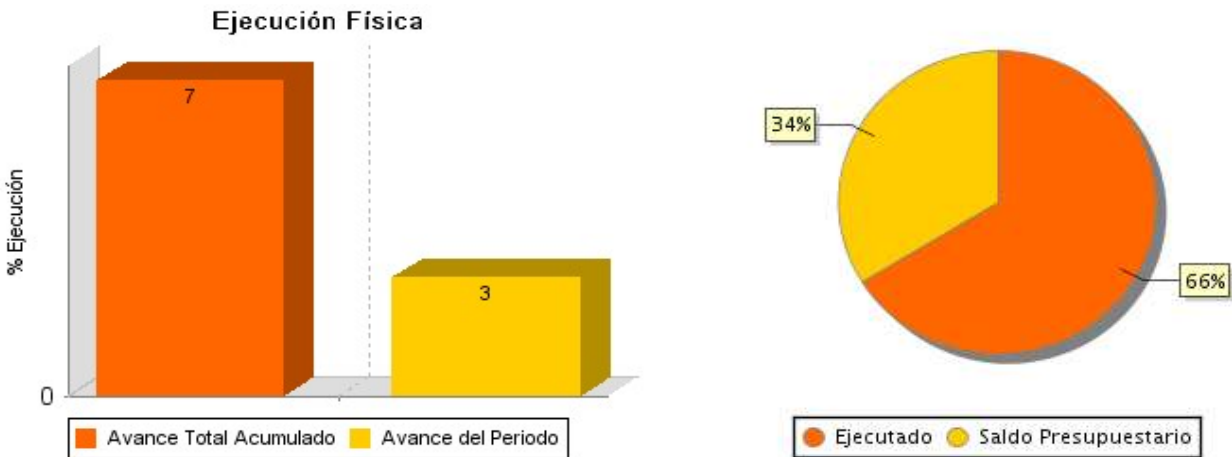


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del 1er cuatrimestre se realizó el pago de anticipo financiero correspondiente al 10% contratado, más avance en certificación de obras del 3,45% por la obra, correspondiente a 27,32 Km

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR PARA LA CUENCA M Roque Alonso			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		933			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	160.000.000	GS.	1.211.528.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
		-	1.211.528.000.000	0,00	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
18/10/2023		24/10/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			0,48 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
42.642.167.399		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

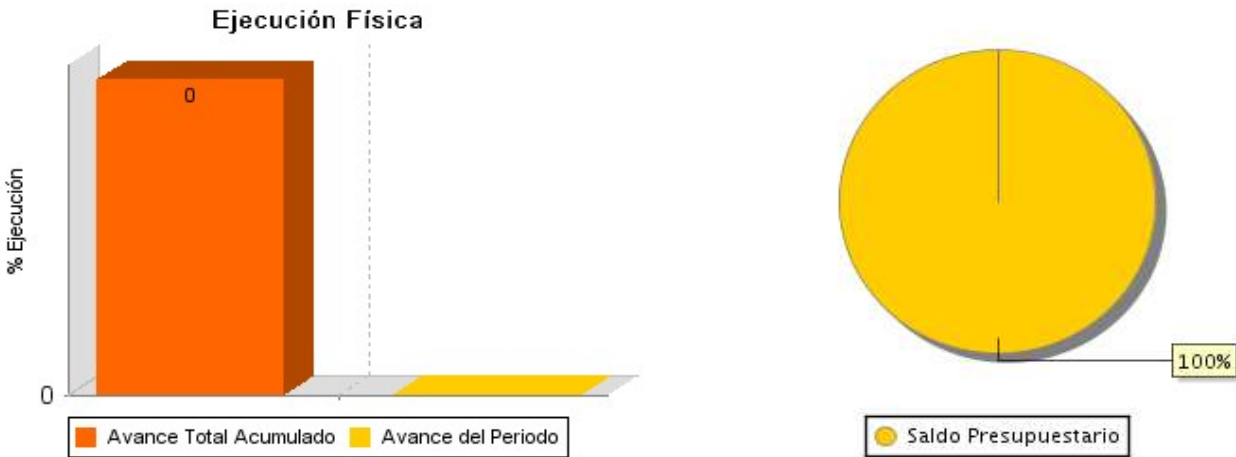


SITUACIÓN ACTUAL

Con relación a las Obras el MOPC reporta que se encuentra en proceso de Licitación el Llamado MOPC N°137/2024 ID N°459.961, en etapa de consulta hasta el 22 de mayo del corriente. Con respecto al Componente de Administración y Gestión del Programa se encuentra en proceso la licitación para firma consultora de Fiscalización del Diseño y Construcción Llamado MOPC N°104/2024 ID N°459.964. Además, se cuenta con contrato adjudicado SG N°47/2025 - Consorcio Grupo TYPSA para el Gerenciamiento de Ciudades con orden de proceder de fecha 26 de marzo. Con respecto a la Auditoría Interna, la misma se encuentra en proceso de Licitación a cargo de la Dirección de Crédito Público del MOPC ID N°469746 Llamado MOPC N°32/2025.

Proyecto	Mejoramiento Ruta D087 Tramo Nueva Esperanza-Puerto Marangatu				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	929				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	303.219.233.185
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		303.219.233.185		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/8/2024		23/8/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental		Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
23.453.989.550		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

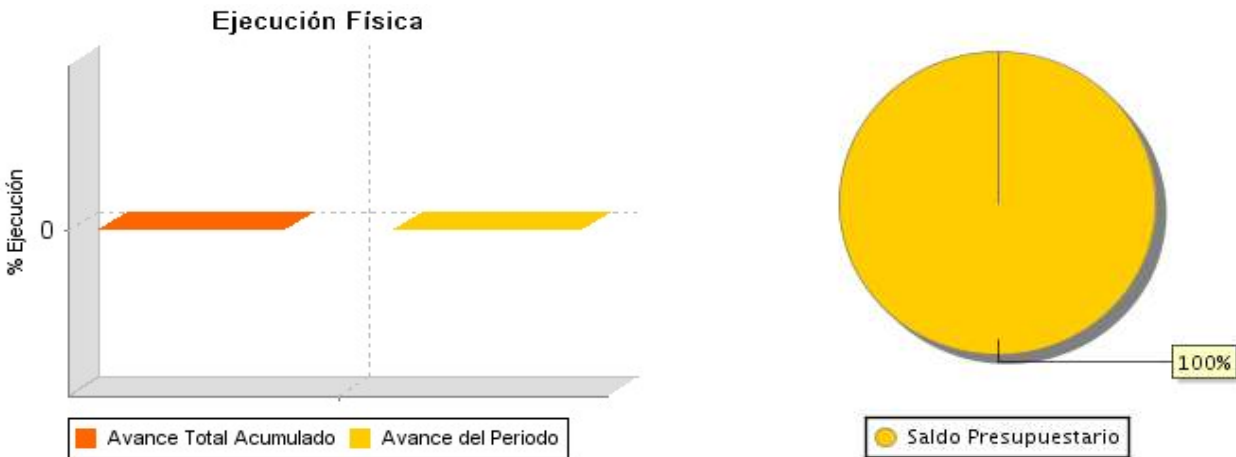


SITUACIÓN ACTUAL

No se registran avances financieros en este período, procesos administrativos pendientes para honrar deudas

Proyecto	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora-Santa Inés												
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES												
Código SNIP N°	925												
Financiamiento	LOCAL												
Costo del Proyecto	USD		N/A				GS.		139.543.694.577				
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.					Porcentaje de Ejecución					
6.262.288.512			133.281.406.065					4,49 %					
Fecha de Inicio			Fecha de Fin					Fecha de Prórroga					
13/1/2023			13/1/2025					N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Itapúa											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00 %						0,99 %							
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025					Porcentaje Ejecutado					
8.084.670.602			6.262.288.512					77,46 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

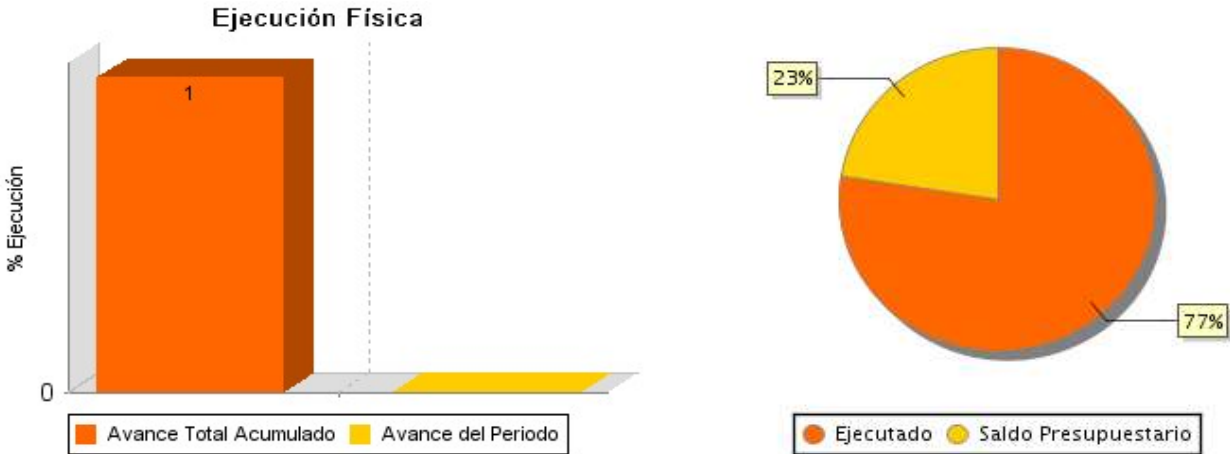


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo se realizó el pago de anticipo financiero, mientras que el llamado a fiscalización se encuentra en etapa de evaluación de ofertas.

Proyecto		Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy-San José de los Arroyos											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		921											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		8.644.569			GS.		56.345.300.061				
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
15.715.279.893				40.630.020.168				27,89 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/10/2022				01/10/2024				1/10/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Caaguazú, Cordillera											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1,50 %						13,00 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
16.639.090.914				0				0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

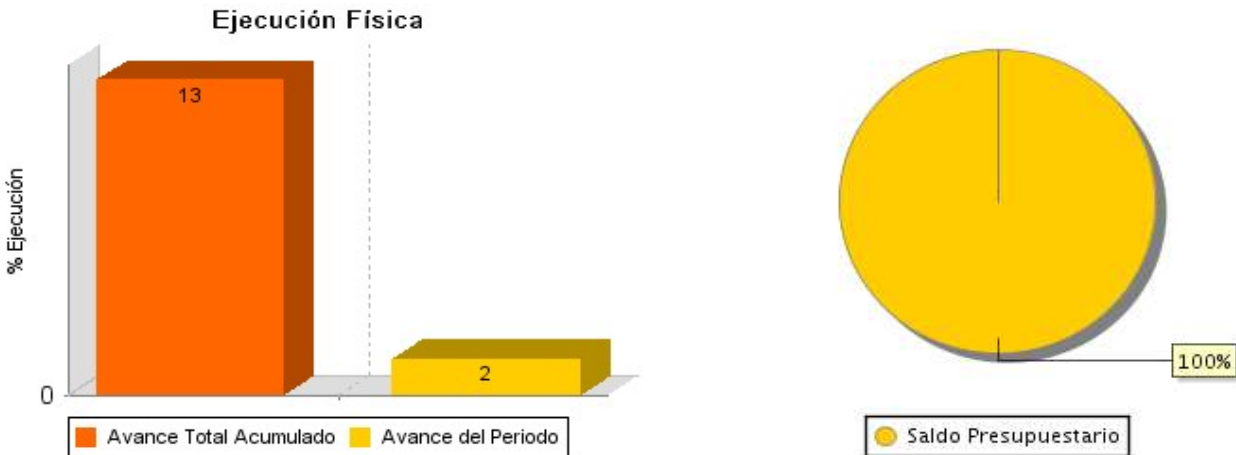


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo los trabajos en zona de la obra se centraron en la pavimentación Asfáltica del Tramo Mbocayaty del Yhaguy – San José de los Arroyos, presentación de certificados mensuales, a la espera de disponibilidad presupuestaria para dar cumplimiento.

Proyecto	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	906				
Financiamiento	BID , ICO				
Costo del Proyecto	USD	165.000.000	GS.	1.193.250.300.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.566.500.000		1.191.683.800.000		0,13 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2024		25/4/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,70 %			6,69 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
64.069.027.651		659.050.000		1,03 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

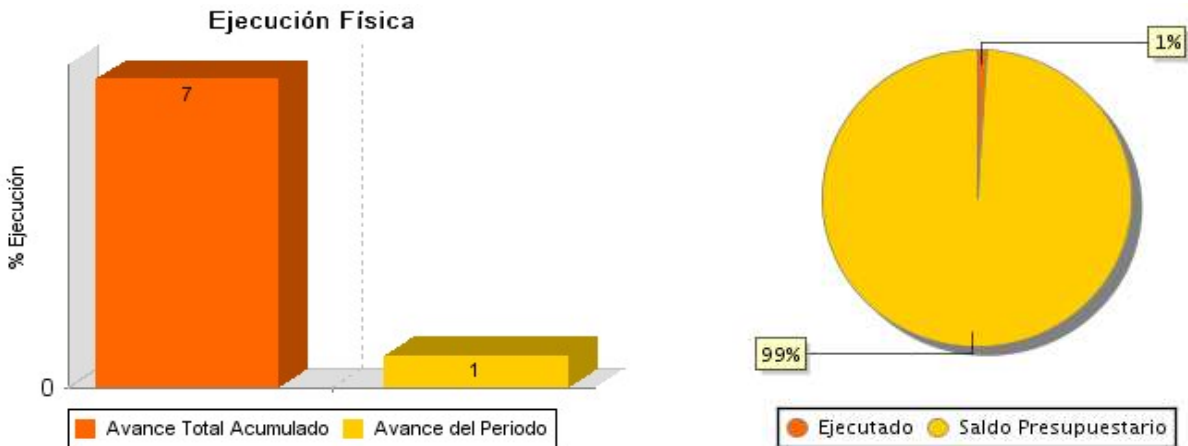

SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en el primer cuatrimestre 2025 se ha avanzado en los procesos de los llamados de adquisición y el estado de los mismos es el siguiente:

a) El Llamado MOPC N° 90/2024 “Contratación de Servicios del Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial Cuenca Lambaré” ID N°449.344, se encuentra en Etapa de Evaluación Técnica.

b) Llamado MOPC N° 69/2024 “Licitación Pública Internacional Diseño y Construcción Cuencas Menores y Principal de Lambaré” ID 451.810, se encuentra en etapa de Evaluación Económica.

c) Llamado MOPC N° 132/2024 “Diseño y Construcción de las obras Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial Cuenca Lambaré” ID N°459.555, se encuentra publicado en el Portal de la DNCP.

d) El Llamado MOPC N° 21/2025 “Ing. FIDIC Diseño y Construcción Cuencas Menores y Principal de Lambaré”, se encuentra en etapa de publicación en el portal de la DNCP.


e) El Llamado MOPC N° 130/2024 “Contratación del Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de las Redes Secundarias y Terciarias de Alcantarillado Sanitario, Estaciones de Bombeo y Líneas de Impulsión de la Zona 1 (Norte) Zona 2 (Intermedia) y La Zona 3 (Sur) de la Cuenca de Lambaré ID de Precalificación N° 811, se halla para la conformación de la Lista Corta en el Comité de Evaluación de Oferta del MOPC.

f) El Llamado N° 31/2025 “Contratación de Servicios de Gerenciamiento para la Ejecución de los Proyectos: (i) Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana De Asunción-Cuenca Lambaré y (ii) Área Metropolitana De Ciudad del Este Id 365.088, se encuentra en proceso de publicación en la DNCP.

Cabe mencionar que al momento del cierre del presente informe, el MOPC no habia remitido oficialmente los ajustes solicitados en el reporte de avance físico del Banco de Proyectos, hecho que posteriormente fue subsanado.

Proyecto	Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	892				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	54.987.954.652
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
53.053.385.657		1.934.568.995		96,48 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/11/2019		25/11/2022		25/11/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
898.746.558		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

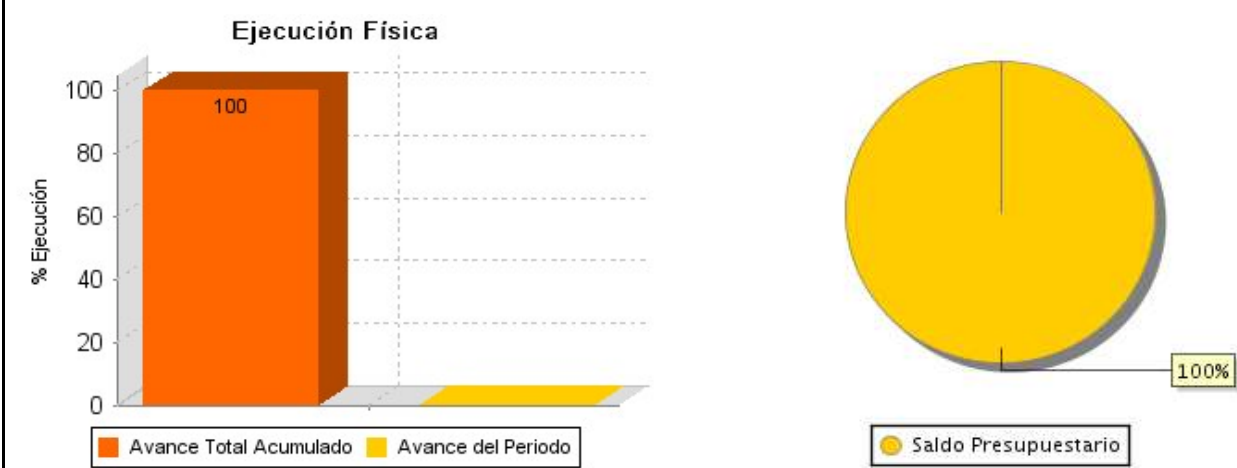


SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras han culminado, cuentan con recepción definitiva que fue firmada el 27 de enero del 2025. Actualmente queda pendiente la cancelación de la deuda total en concepto de intereses moratorios.

Proyecto		Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de CDE y PTE FRANCO				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		883				
Financiamiento		BID , JICA				
Costo del Proyecto		USD	200.000.000		GS.	1.276.400.000.000
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
-			1.276.400.000.000		0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/05/2023			12/5/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Alto Paraná				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,78 %				6,95 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
76.412.638.835			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

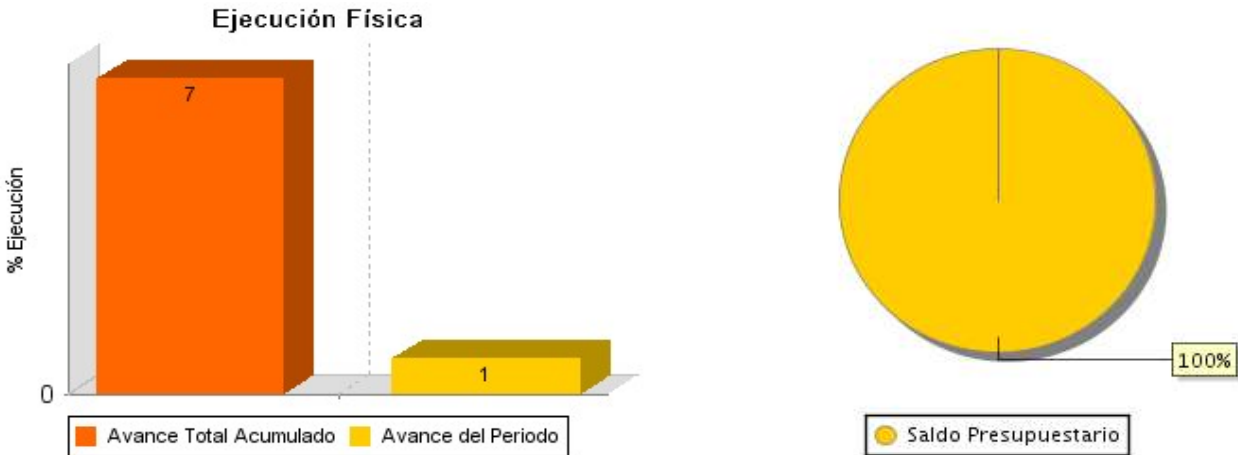

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del Primer Cuatrimestre, el MOPC manifiesta que se tuvo avances en los procesos licitatorios, los cuales se detallan a continuación:

a) Llamado MOPC N° 55/2024 “Licitación Pública Internacional para el Diseño y Construcción para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales. Ciudad del Este”. ID N° 451167: Se encuentra en etapa de evaluación económica.

b) Llamado MOPC N°88/2024 “Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de las obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Aguas Tratadas para el Área Metropolitana de Ciudad del Este ID 449.344”, que se encuentra en etapa de Evaluación Económica

c) Llamado MOPC N° 143/2024 “Diseño y Construcción de las obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este” ID 449.800, se encuentra publicado en el portal de la DNCP.

d) Llamado MOPC N° 21/2025 “Contratación de Ing. FIDIC para el Diseño y construcción de las obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Aguas Tratadas para el Área Metropolitana de Ciudad del Este”, se encuentra en proceso de publicación en el portal de la DNCP.


e) Llamado MOPC N° 33/2025 “Contratación de Firma Consultora para la Asistencia Técnica Operativa y Especializada para Ciudad del Este”, se encuentra en proceso de publicación en el Portal de la DNCP.

f) Llamado N° 31/2025 “Contratación de Servicios de Gerenciamiento para la ejecución de los proyectos: (i) Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de Asunción-Cuenca Lambaré y (ii) Área Metropolitana de Ciudad del Este ID 365.088, se encuentra en proceso de publicación en la DNCP.

Cabe mencionar que al momento del cierre del presente informe, el MOPC no habia remitido oficialmente los ajustes solicitados en el reporte de avance físico del Banco de Proyectos, hecho que posteriormente fue subsanado.

Proyecto		CONSTRUCCION DE LA RUTA PY 12 TRAMO CHACO´I-GENERAL BRUGUEZ										
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES										
Código SNIP N°		882										
Financiamiento		BID										
Costo del Proyecto		USD	215.000.000				GS.	1.660.864.646.912				
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
503.571.105.895			1.157.293.541.017				30,32 %					
Fecha de Inicio			Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
09/09/2022			16/3/2029				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto												
Departamental		Presidente Hayes										
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total						
9,54		%						47,10		%		
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado				
270.944.617.230				116.424.546.985				42,97 %				

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

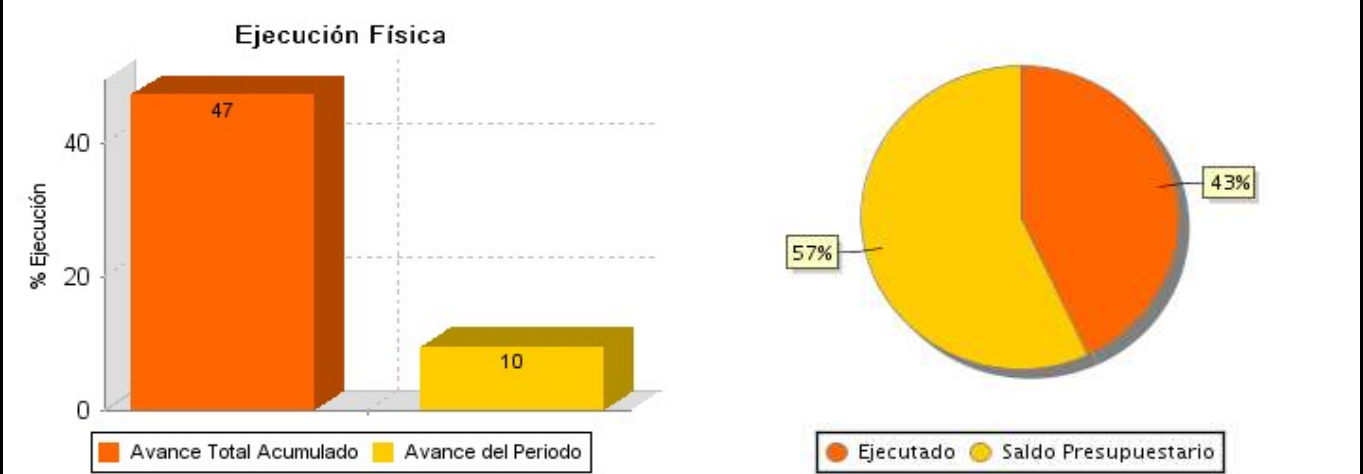

SITUACIÓN ACTUAL


A continuación se detallan los siguientes avance en el marco del contrato LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 12 (PY12). TRAMO CRUCE NANAWA - GRAL BRUGUEZ Y ACCESOS REGION OCCIDENTAL, correspondientes a los 4 lotes adjudicados:

Lote 1 – 22,71%, Lote 2 – 50,63%, Lote 3 – 49,45% y lote 4 – 31,53%.

La obra comprende un total de 166 kilómetros y se divide en cuatro lotes: el Lote 1, a cargo del Consorcio TEC, comprende 35,02 km e incluye el acceso a Nanawa; el Lote 2, de 42,80 km, fue adjudicado al Consorcio Avanza Chaco; el Lote 3, que abarca 44,43 km y contempla el acceso a la comunidad Ninfa, está bajo la responsabilidad del Consorcio Vial Chaco; finalmente, el Lote 4, de 43,3 km, lo lleva adelante el Consorcio Chaco Sur, que incluye un ramal hacia General Bruguez.

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		875					
Financiamiento		CAF					
Costo del Proyecto		USD	12.694.902		GS.	98.330.393.066	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
8.700.494.777			89.629.898.289			8,85 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/07/2023			10/7/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Paraguarí					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				9,22 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
20.804.890.914			8.700.494.777			41,82 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

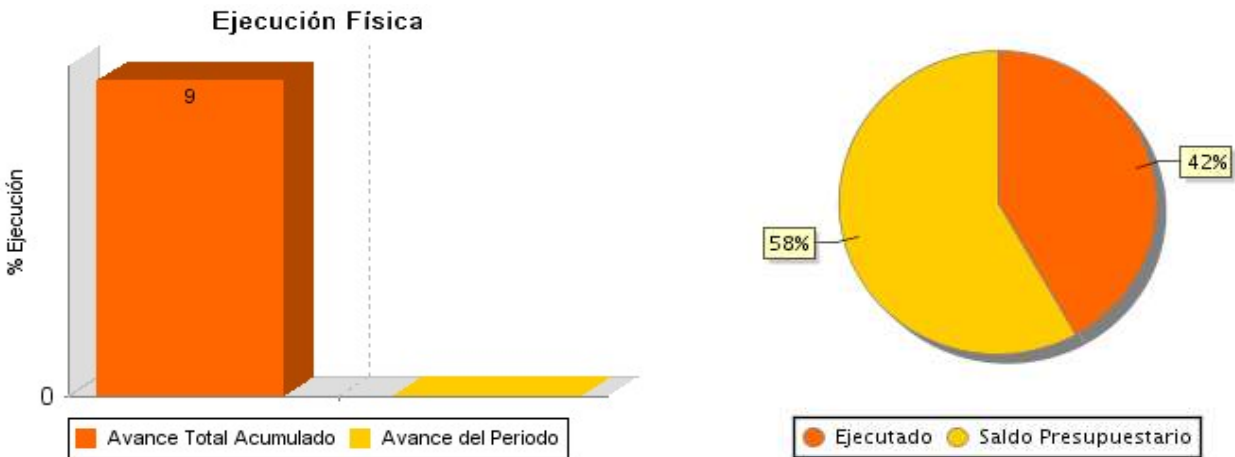


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre se han realizado los pagos de anticipos financieros por obras. Con respecto a la Fiscalización de obras, se realizó el contrato el cual se encuentra en proceso de verificación en la DNCP. Además, se ha adjudicado el Contrato SG N°47/2025 Consorcio Grupo TYPsa Gerenciamiento de Ciudades con orden de proceder de fecha 26 de marzo. Mientras que la Auditoría externa se encuentra en proceso de Licitación a cargo de la Dirección de Crédito Público del MOPC, ID N°454517 Llamado MOPC N°121/2024.

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		874											
Financiamiento		CAF											
Costo del Proyecto		USD		12.108.048				GS.		93.784.825.347			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
8.245.938.005				85.538.887.342				8,79 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
07/07/2023				10/7/2028				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Alto Paraná											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00 %						9,39 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
19.895.777.370				8.245.938.005				41,45 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

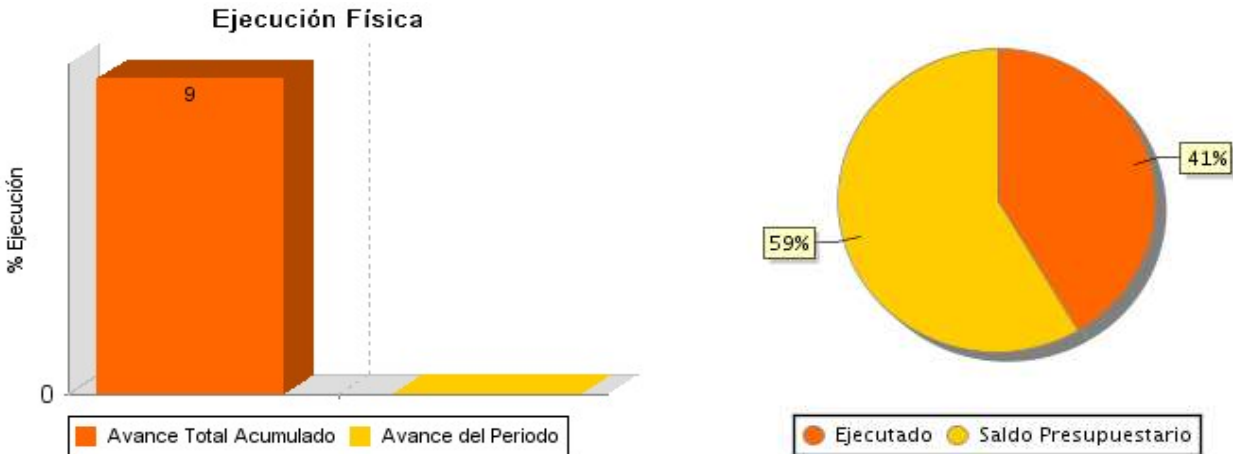


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre se han realizado los pagos de anticipos financieros por obras. Con relación a la Fiscalización de obras, se elaboró el contrato el cual se encuentra en proceso de verificación en la DNCP. Además, se ha adjudicado el Contrato SG N°47/2025 Consorcio Grupo TYPsa Gerenciamiento de Ciudades con orden de proceder de fecha 26 de marzo. La Auditoría externa en proceso de Licitación a cargo de la Dirección de Crédito Público del MOPC, ID N°454.517 Llamado MOPC N°121/2024.

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		871					
Financiamiento		CAF					
Costo del Proyecto		USD	16.234.735		GS.	125.748.738.514	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
11.442.329.322			114.306.409.192			9,10 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/07/2023			10/7/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Misiones					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				9,46 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
26.288.560.003			11.442.329.322			43,53 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

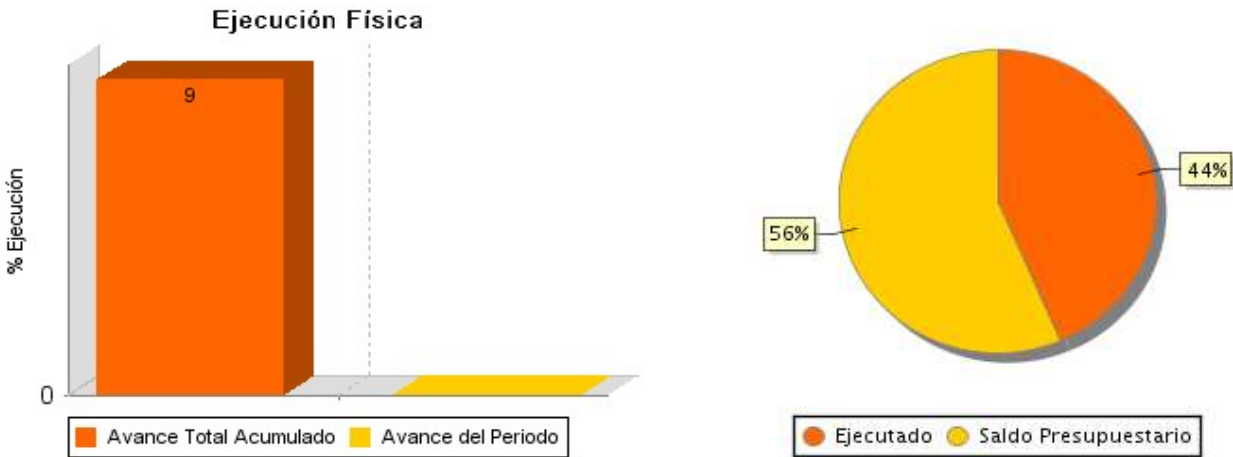


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre del presente ejercicio se ha realizado el pago de los anticipos financieros para las obras. Con relación a la Fiscalización de obras, se realizó la firma de contrato que encuentra en proceso de verificación en la DNCP. Además, se ha adjudicado el Contrato SG N°47/2025 Consorcio Grupo TYPsa de Gerenciamiento de Ciudades con orden de proceder de fecha 26 de marzo. La Auditoría externa se encuentra en proceso de Licitación a cargo de la Dirección de Crédito Público del MOPC con ID N°454.517 Llamado MOPC N°121/2024.

Proyecto		Mejoramiento y Mant. del Corredor Agroind. Region Oriental				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		864				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	100.657.134		GS.	685.804.896.001
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
346.479.090.341			339.325.805.660		50,52 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020			24/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,11 %				91,87 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
62.824.111.888			28.734.128.078		45,74 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

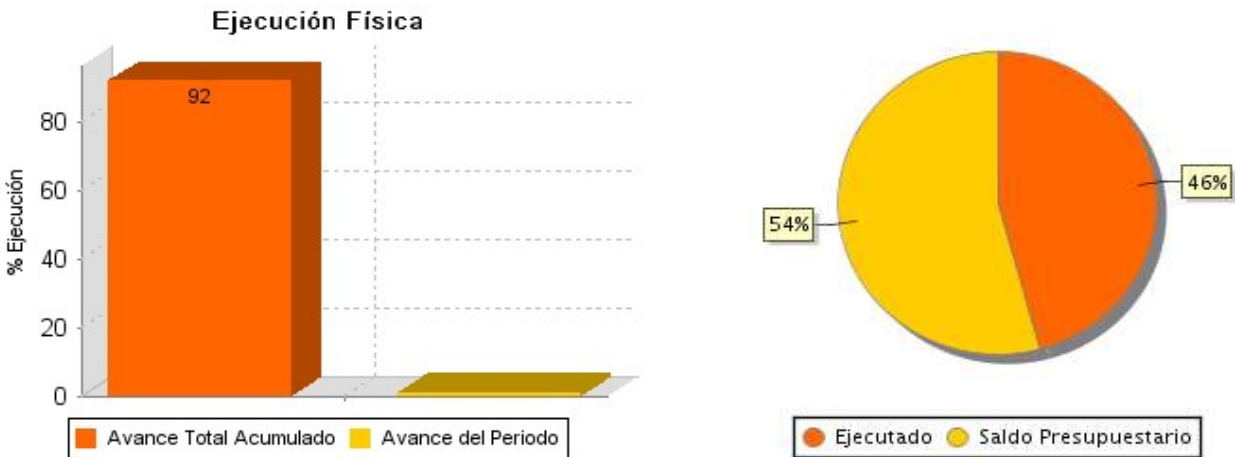


SITUACIÓN ACTUAL

A continuación se detallan los avances del periodo:

1. Lote 1: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo (Incluye Accesos a Volendam (4 Km Zona Urbana) y Puerto Mbopicua (6 Km) y Volendam San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Río Jejuí e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (77,9 Km) cuenta con un avance físico real del 87,64 %
2. Lote 2: San Pablo - Empalme PY 11 (Cruce Yacaré Ñe'e) tiene un avance físico eal 77,90 % y.
3. Los contratos de las fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Mejoramiento CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		863							
Financiamiento		BID							
Costo del Proyecto		USD		134.342.866		GS.		1.288.128.933.825	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
1.023.388.535.148			264.740.398.677			79,45 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
23/12/2020			24/12/2027			N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Boquerón, Presidente Hayes							
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total					
3,13 %				77,14 %					
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
55.891.734.614			22.092.905.272			39,53 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

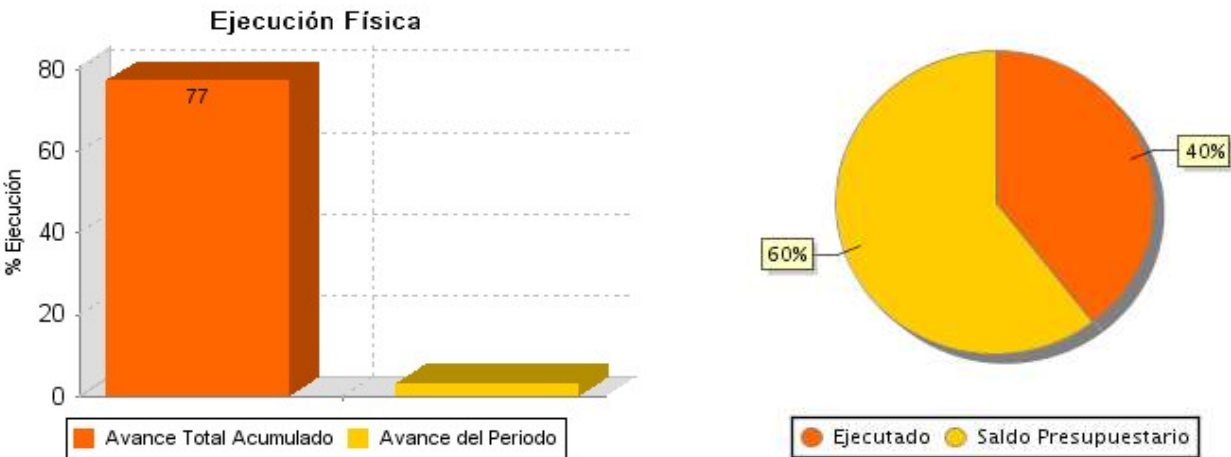

SITUACIÓN ACTUAL


Se detallan los siguientes avances del periodo: Componente 1 - Obras de Mantenimiento y Pavimentación Asfáltica: 1) Lote 1 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76Km), han culminado la etapa de Puesta a Punto con una Pavimentacion asfáltica de 64.76 km y en proceso de Recepción Definitiva.

En el año 2025 2do cuatrimestre se tiene previsto la etapa de mantenimiento de 2) Lote 2 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo – Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100, el acceso a Campo Aceval y el tramo Campo Aceval - Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 0+000 hasta progresiva 29+500 (71,47 Km), que han culminado la etapa de Puesta a Punto con una pavimentacion asfáltica de 71,47 km y en proceso de Recepción Definitiva

Componente 2 - Construcciones y Mantenimiento de Obras Básicas; Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y Tramo Campo Aceval – Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500, ha culminado la etapa de Puesta a Punto y en Proceso de Recepción Definitiva. En el año 2025 comienza la etapa de mantenimiento Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		860				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	759.815.980.019
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
729.942.339.551			29.873.640.468		96,07	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
08/08/2019			08/08/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Municipal	Pilar					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				95,91 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
7.932.975.911			984.254.442		12,41	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

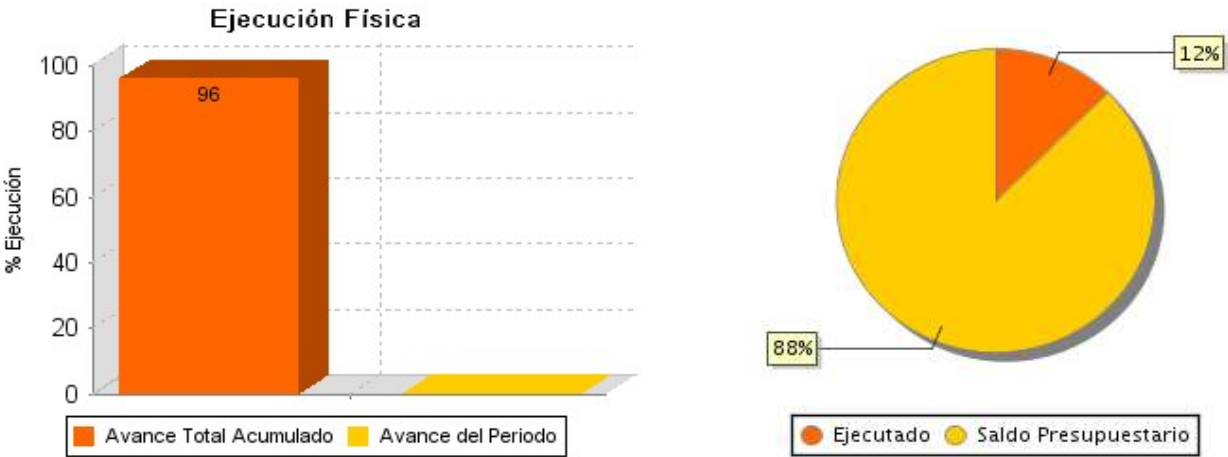


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia prosiguen los trabajos de: a) Mantenimiento de reservorios b) Mantenimiento de Canales de derivación y Cauce del Arroyo San Lorenzo (Limpieza de cauces y canales, corte de pasto y control de vegetación. - Reposición de empastado mediante hidrosiembra - Reacondicionamiento de suelos en taludes. - Perfilado de caminos auxiliares y coronamiento del muro) y c) Mantenimiento y operación de sistemas de compuertas y electro bombas (Mantenimiento electromecánico de bombas, sistemas de alimentación, grupos electrógenos, mecanismos de compuertas y sistemas de iluminación solar y eléctrica).

Proyecto		Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km)				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		857				
Financiamiento		CAF				
Costo del Proyecto		USD	99.100.000		GS.	783.220.609.178
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
166.015.885.587			617.204.723.591		21,20 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/04/2022			03/03/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Alto Paraná					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
8,81 %				36,35 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
83.731.098.297			33.677.561.630		40,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

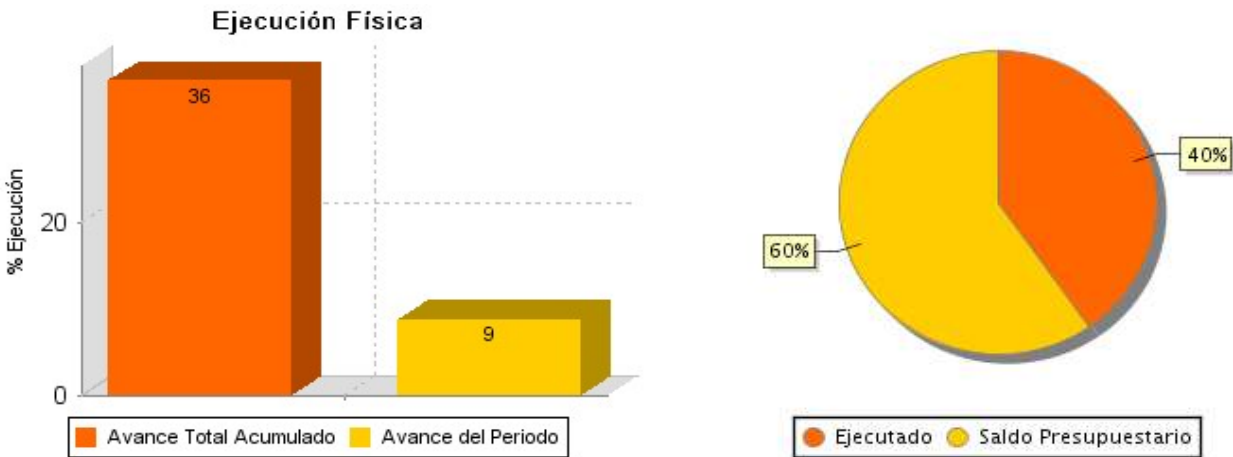


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo se reporta lo siguiente: La obra presenta 5 kilómetros de avance en la capa asfáltica, con respecto al Plan de Gestión Ambiental, el mismo ha sido adjudicado y a la espera del pago del anticipo financiero. Asimismo, se ha procedido al pago de indemnizaciones por mejora, como así también indemnizaciones por terrenos a afectados por las obras. Con respecto a la fiscalización en el periodo se presentó 3 informes mensuales.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 km											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		854											
Financiamiento		FONPLATA											
Costo del Proyecto		USD		418.266.335				GS.		2.918.033.081.600			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
395.178.774.139				2.522.854.307.461				13,54 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/04/2022				11/4/2029				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Boquerón											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,41 %						5,49 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
314.270.195.294				34.002.112.104				10,82 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

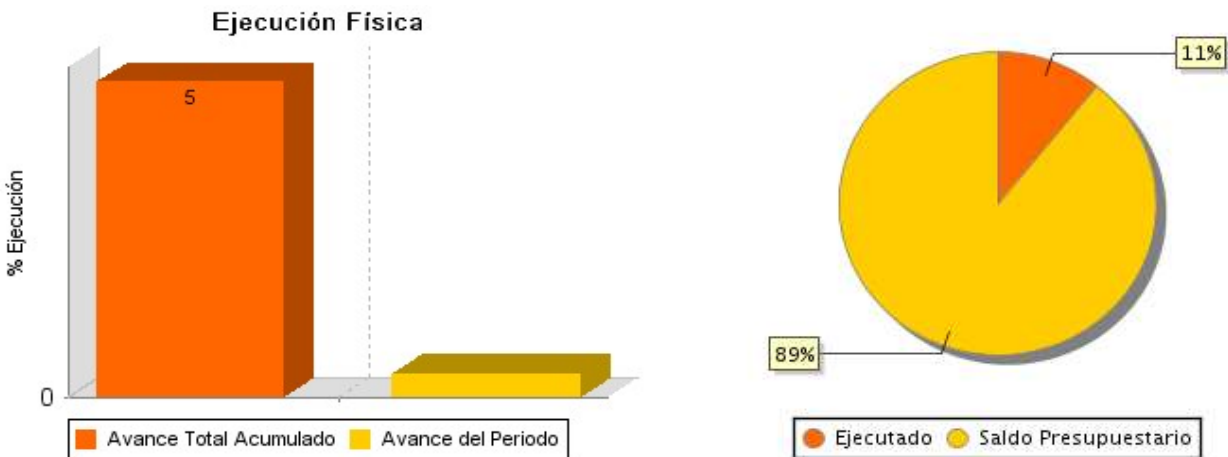


SITUACIÓN ACTUAL

Al inicio de este periodo, empresas contratistas encargadas de la ejecución de los cuatro tramos de la Ruta - PY 15 Tramo Mariscal Estigarribia-Pozo Hondo y Acceso a Mariscal Estigarribia, Dpto de Boquerón realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a lo reportado por el MOPC: Reparaciones menores y la instalación de señalización preventiva. Mantenimiento de caminos de servicio tanto en la traza principal como en accesos.Desbosque, desbroce y despeje en varios sectores de la obra. Construcción de alcantarillas celulares en Loma Plata y Mariscal Estigarribia. Ejecución de lecho de asiento para alcantarillas celulares.

A inicio del mes de abril de 2025, las continuas precipitaciones y el elevado grado de humedad impidieron la ejecución de la mayoría de los movimientos de suelos (terraplén, subrasante mejorada con cal y sub base de suelo cemento), limitando las labores de campo a tareas puntuales de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura existente

Proyecto	Construcción Caminos Vecinales Pavimentados y no Pavimentados en el Departamento de Paraguari.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	842				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	54.987.954.652
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
52.144.888.780		2.843.065.872		94,83 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/10/2019		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,78 %			35,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
236.793.677		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

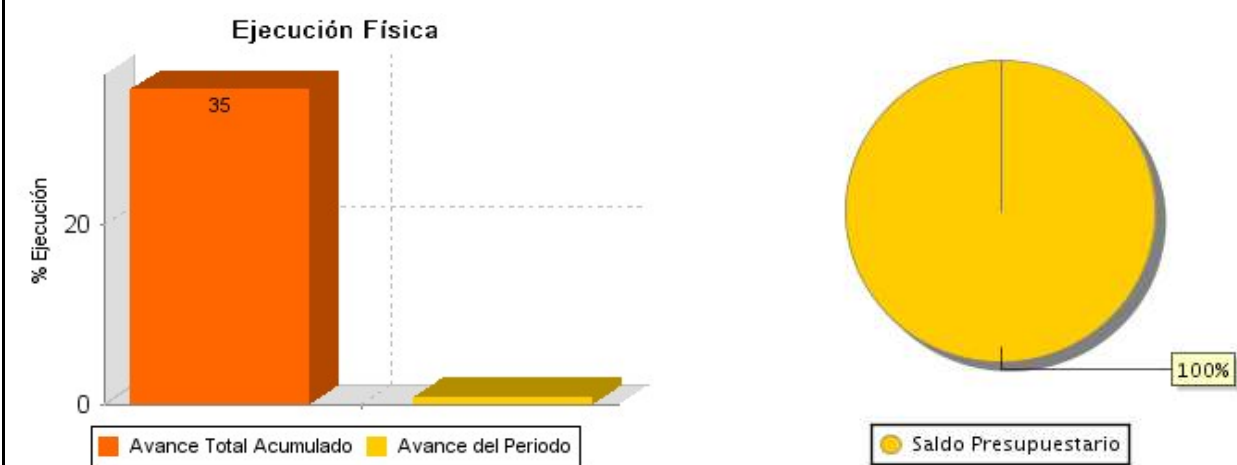


SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras que comprende el proyecto ha finalizado. Actualmente en proceso administrativo el pago de deudas pendientes de los contratos de obras.
Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.614/2020 que limita su alcance de ejecución

Proyecto		Construcción Caminos Vecinales Pavimentadas y no Pavimentadas en el Departamento de Ñeembucú.					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		841					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	108.459.128.663	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
91.217.783.094			17.241.345.569			84,10 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/11/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00		%		40,30		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
48			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

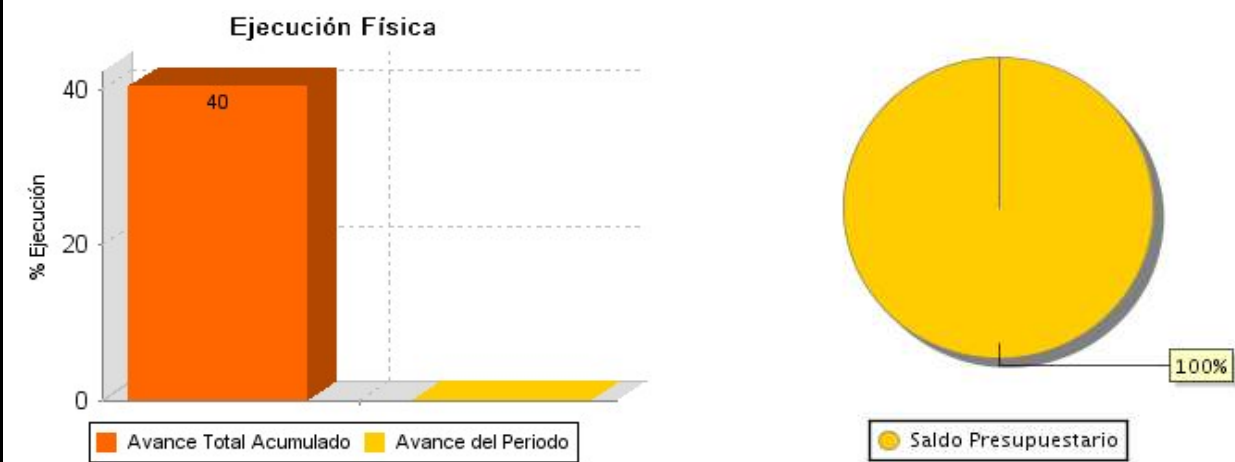

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto están culminadas en su totalidad, queda pendiente el pago de la deuda por intereses moratorios del contrato de construcción de empedrados del Tramo Alberdi - Pilar - San Juan de Ñeembucu. Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.614/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Ampliación tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	832				
Financiamiento	FONDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL, FONPLATA, LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	38.000.670		GS.	281.357.148.552
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
208.172.043.377		73.185.105.175		73,99 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/05/2016		16/05/2018		31/12/2024	


Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Presidente Hayes
---------------	------------------

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
5 %		80 %	

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025	Porcentaje Ejecutado
25.317.411.970	727.487.000	2,87 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

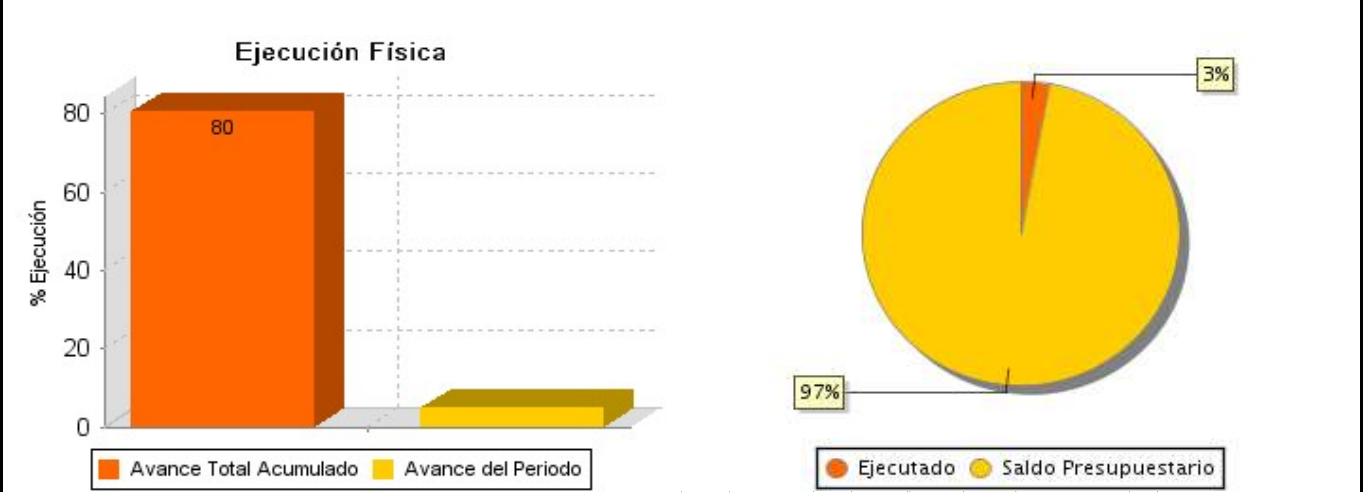


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo, la empresa contratista ha ejecutado trabajos de reparación en los tramos ya terminados, además de avanzar en la ejecución de Obras Complementarias, tales como revestimiento con vegetación mediante tepes, mejoramiento de accesos a fincas, fresado y reposición de zonas con observaciones en la carpeta asfáltica.

En cuanto a las expropiaciones, se realizaron pagos de indemnización a los afectados por mejoras e inmuebles ubicados en el tramo crítico, permitiendo con ello la liberación total del tramo inicialmente identificado como crítico.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Central					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		828					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	133.062.949.138	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
124.104.925.046			8.958.024.092			93,27 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Central					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				94,90 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
842.174.015			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

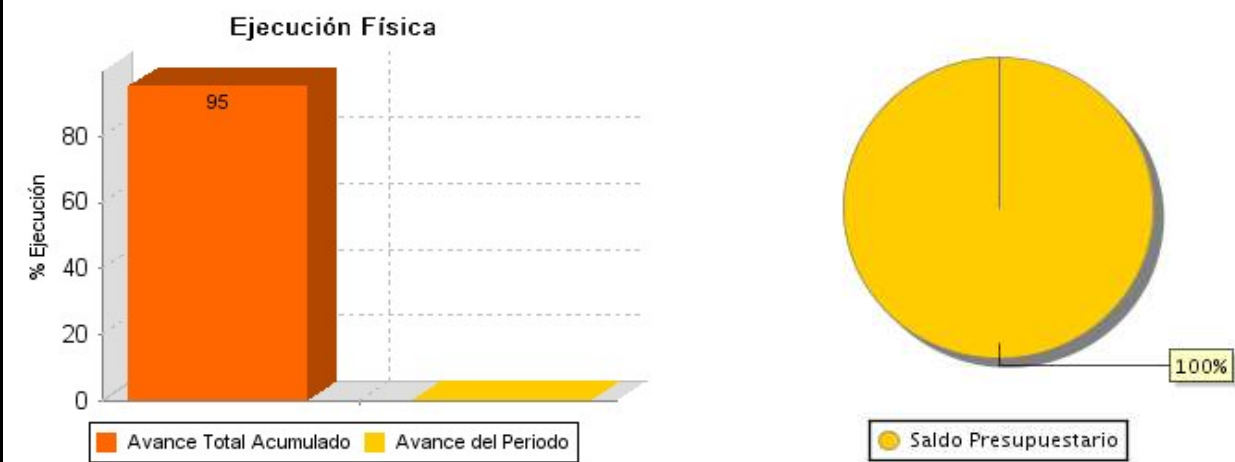


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	827				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	283.005.776.870
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
277.061.759.806		5.944.017.064		97,89 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Itapúa				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			97,25 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
664.580.709		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

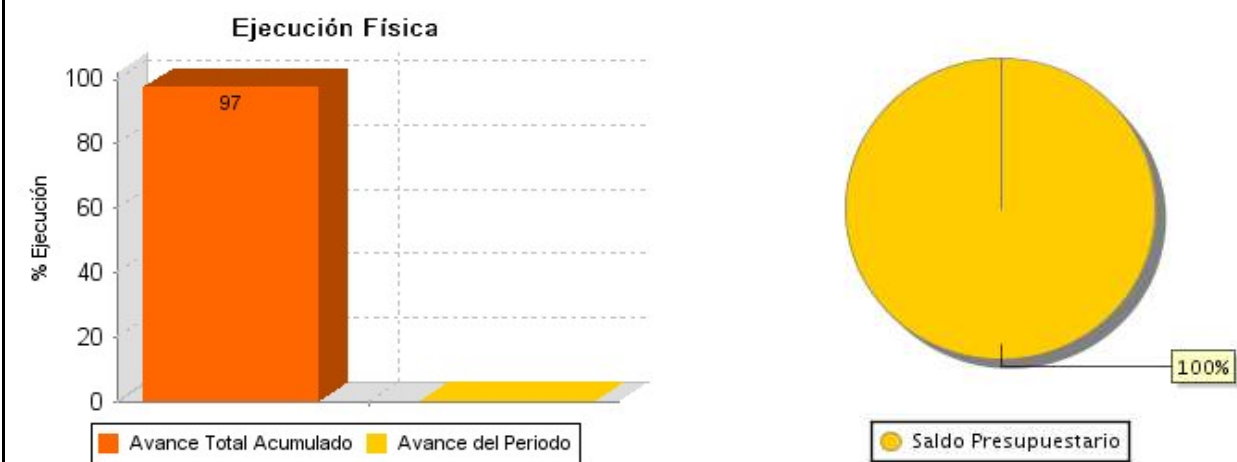


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendientes para honrar deudas.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Concepción				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	826				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	56.605.555.891
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
54.070.681.439		2.534.874.452		95,52 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Concepción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			92,50 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
973.610.590		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

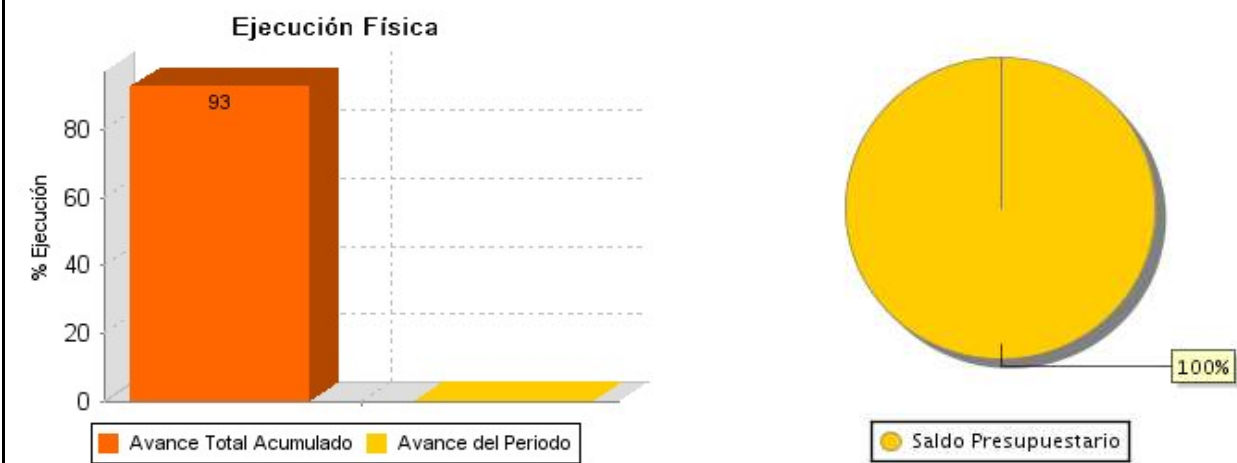

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.


[illegible]



Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendientes para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Guairá						
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
Código SNIP N°		824						
Financiamiento		LOCAL						
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	159.627.862.420		
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución		
152.674.797.455			30.835.453.930			95,64	%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga		
05/07/2019			31/12/2020			31/12/2025		
Ubicación Geográfica del Proyecto								
Departamental		Guairá						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total				
0,00				%		86,76		%
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado		
472.648.166			0			0,00		%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

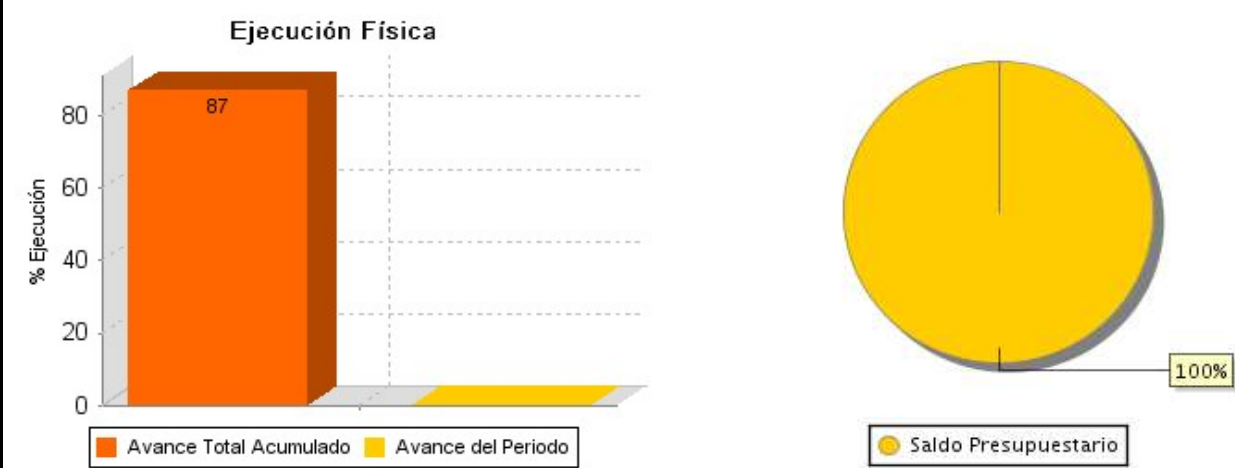


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativos pendientes para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		822					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	110.267.520.130	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
69.533.135.063			40.734.385.067			63,06 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
05/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Canindeyú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
25.775.574.890			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

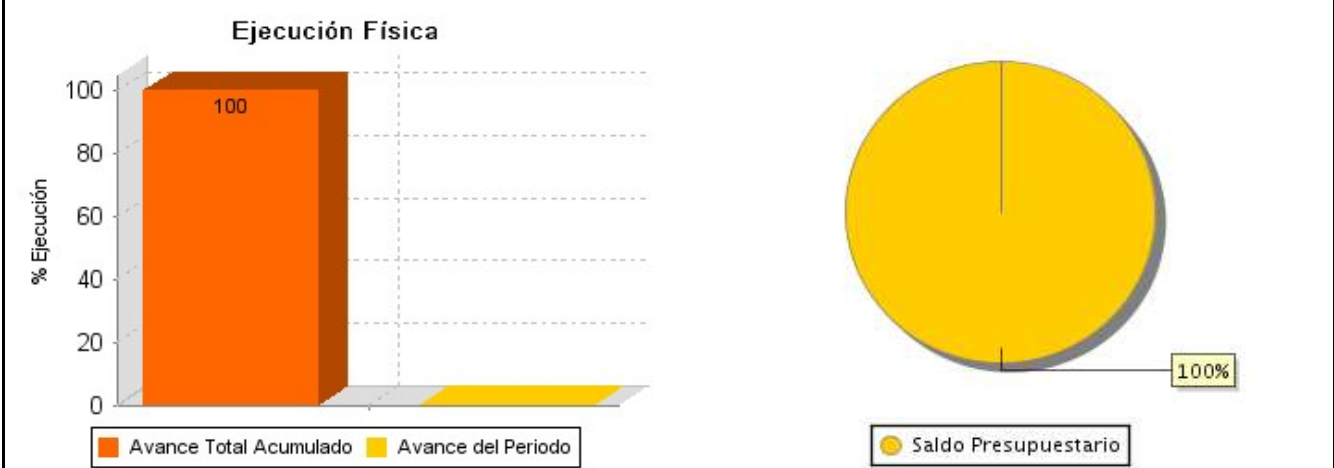


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativos pendientes para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		821					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	181.981.991.824	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
143.236.675.362			38.745.316.462			78,71 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				97,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
2.112.646.004			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

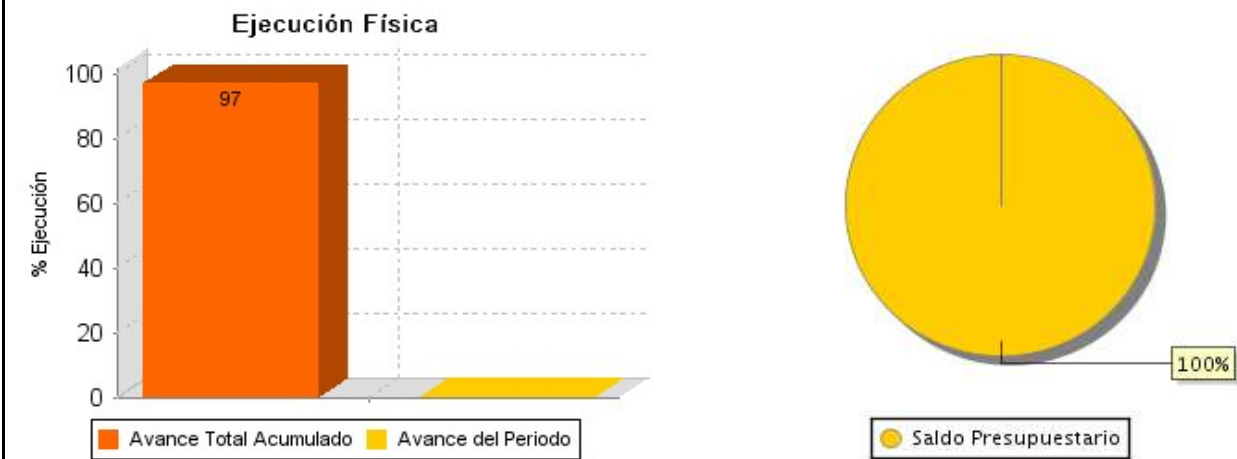


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendientes para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		820					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	154.593.491.989	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
137.131.402.572			17.462.089.417			88,70 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Cordillera					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				77,40 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
2.520.235.958			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

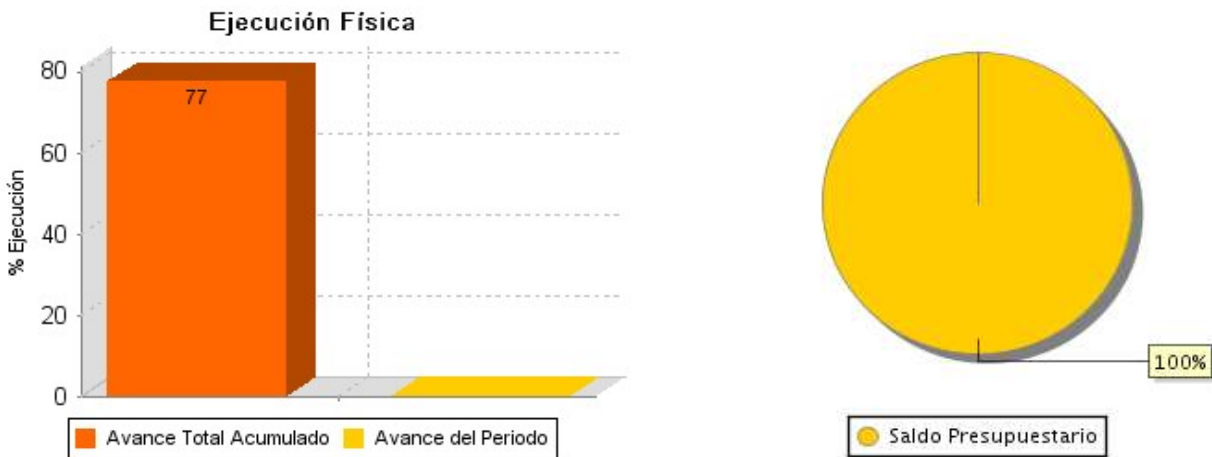


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Misiones				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	818				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	120.199.268.503
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
116.439.555.126		3.759.713.377		96,87	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Misiones				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			79,20 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
1.248.000.000		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

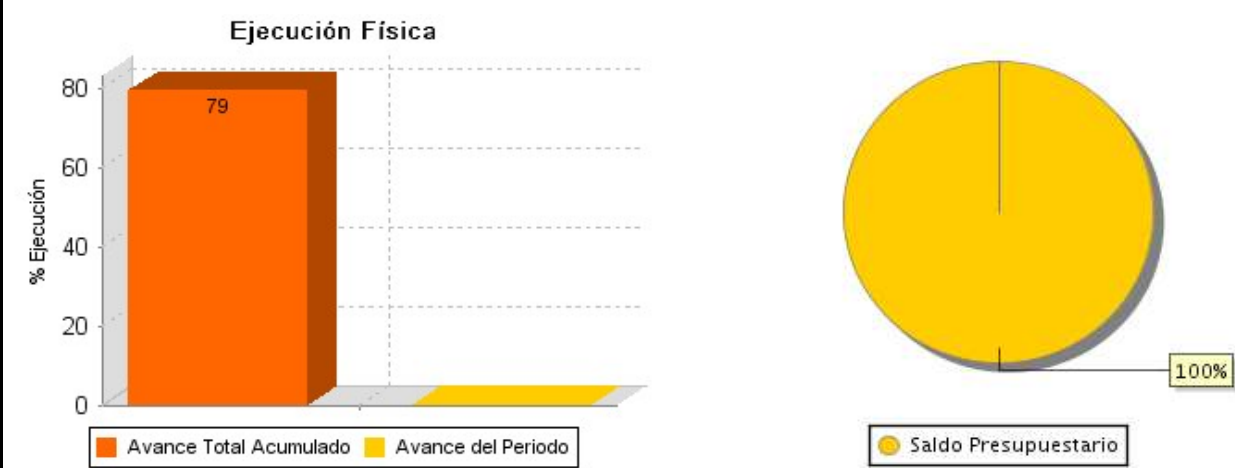


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativos pendientes para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		817					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	148.941.083.602	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
145.194.761.116			3.746.322.486			97,48 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				85,72 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
1.461.065.770			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

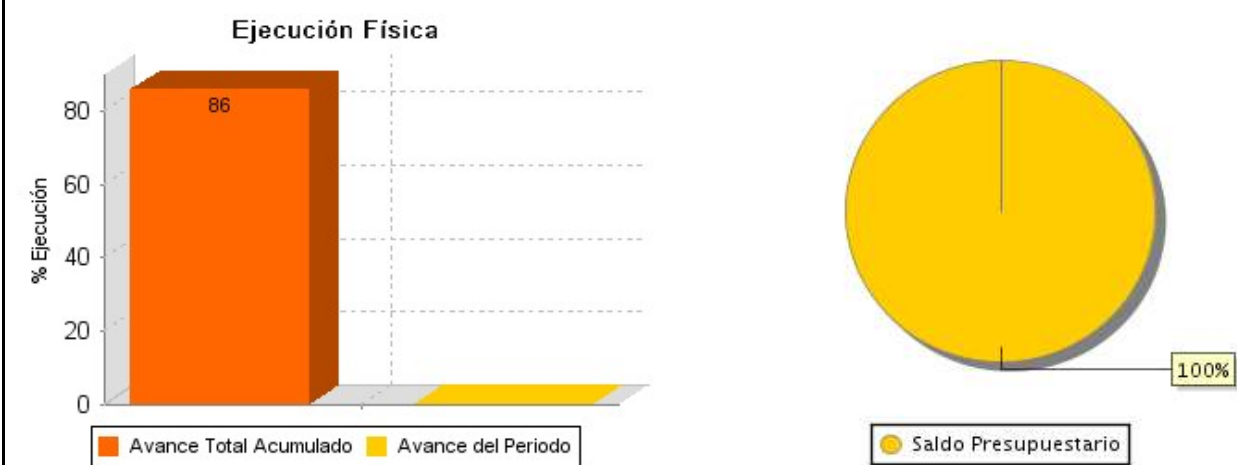


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		815					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	169.799.522.159	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
142.176.428.105			27.623.094.054			83,73	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
05/07/2019			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		San Pedro					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				89,88 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
1.461.600.180			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

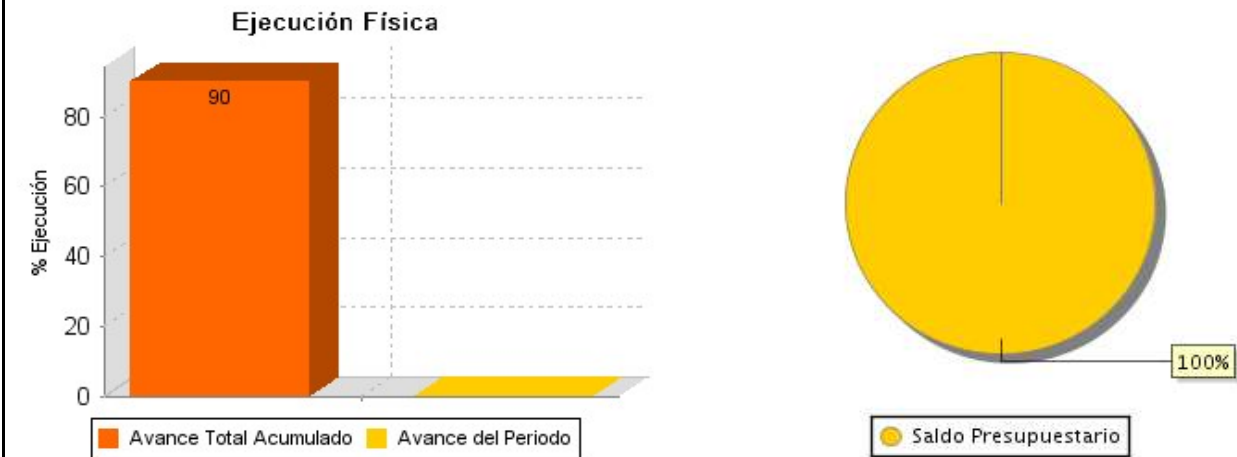


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		806				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	798.710.000.000
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
677.414.780.471			121.295.219.529		84,81	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/05/2019			24/05/2023		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,23 %				78,79 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
105.134.315.480			17.556.038.858		16,70	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

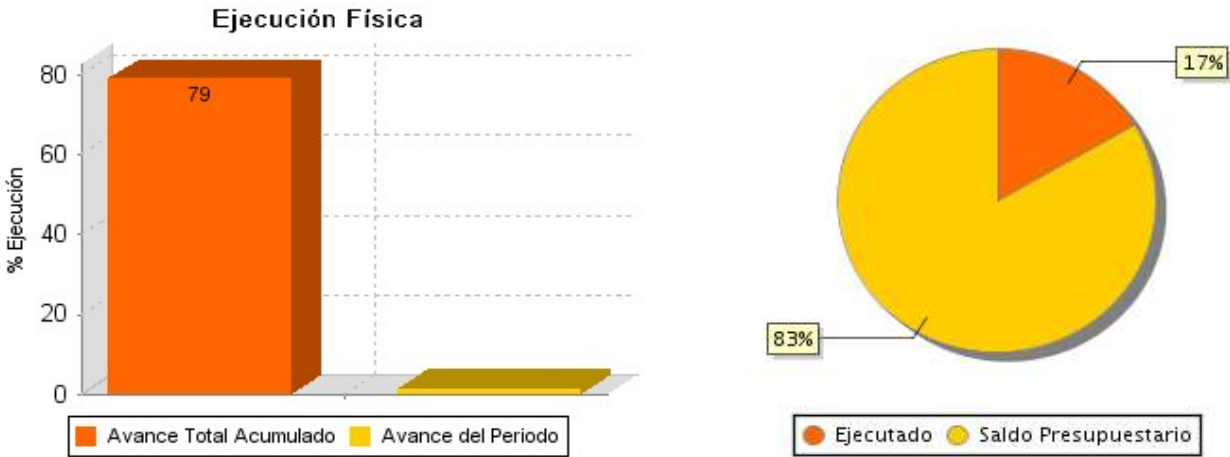


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer informe cuatrimestral se obtuvo el 81,21 ml de puentes metálicos construidos en varios departamentos del país además de pago de viáticos a funcionarios asignados a la supervisión.

Proyecto		Capacitación y Mejoramiento Formacion Ejecucion de Proyectos de la DIPE					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		798					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	0		GS.	138.000.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
43.476.383.704			94.523.616.296			31,50 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
22/11/2018			22/11/2023			22/11/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional	N/A						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,55 %				95,05 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
9.201.017.500			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

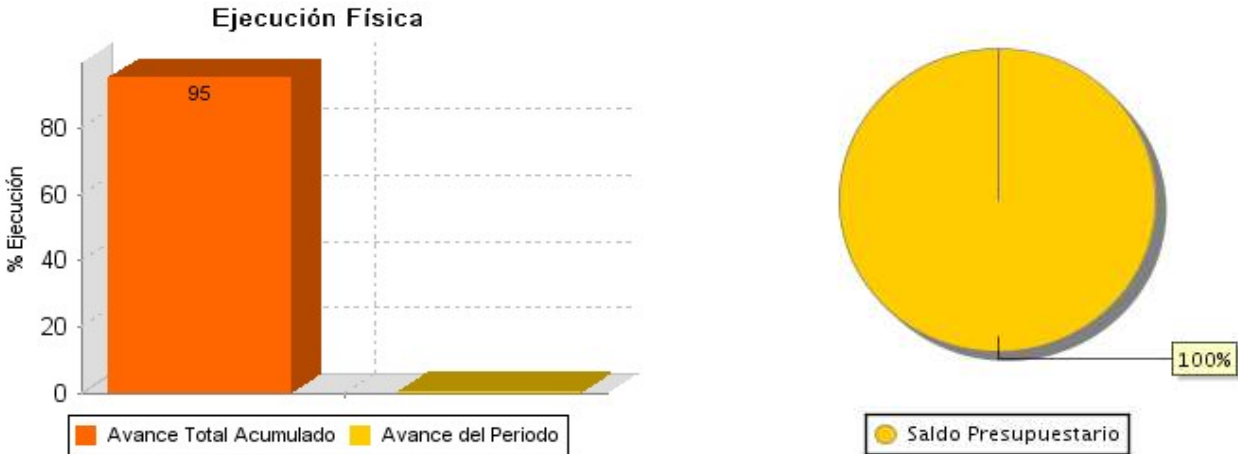

SITUACIÓN ACTUAL


Se realizó la contratación de profesionales especializados en las distintas áreas conforme a requerimientos de los procesos de Estructuración de Proyectos estratégicos a cargo de la DIPE. Se brindó asistencia profesional especializada para varios proyectos, en diferentes etapas de análisis y estudios.

También se acompañó la elaboración de normas y en la elaboración de los PBC de precalificación además de varios estudios: catastrales, geométricos, geotécnicos, hidrológicos y de tráfico.

Las tareas incluyeron apertura de las ofertas técnicas correspondientes a la licitación para la pavimentación de la ruta PY10, conocida como la “Ruta de la Integración”, además del apoyo técnico, jurídico y económico a la Unidad de Concesiones del MOPC para la Firma de Adenda al contrato de la APP Ruta PY 02, en cuanto al Acceso a la Interconexión Ypacaraí - Areguá - Luque.

Proyecto		Construcción de 1500 viviendas en el Bañado Sur			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		797			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	100.000.000	GS.	750.676.701.105
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
37.909.401.433		712.767.299.672		5,05 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/11/2019		11/11/2025		31/12/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,15 %			10,89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
306.670.459.388		1.706.795.440		0,56 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

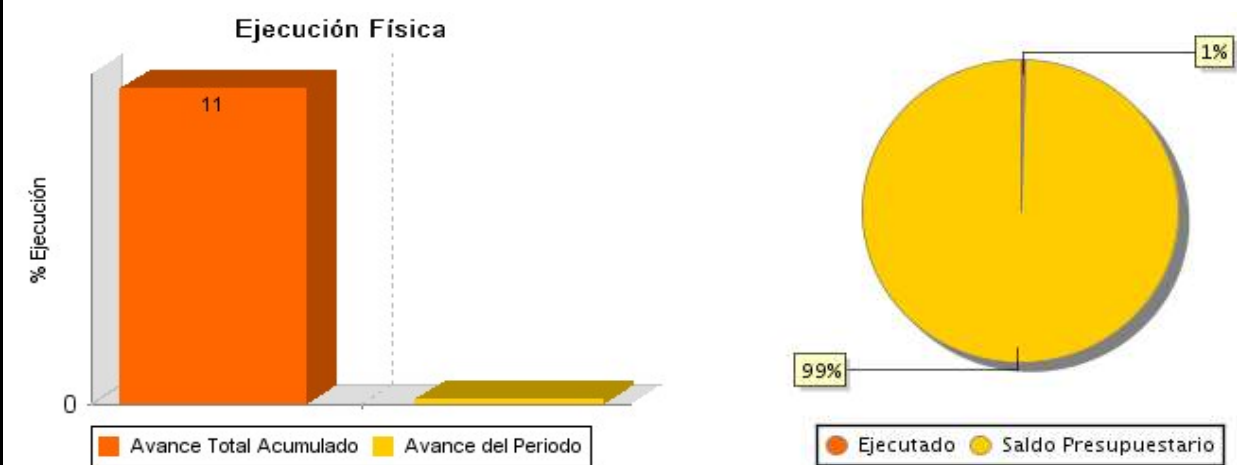

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, se reportan los avances siguientes:

Se ha adjudicado el llamado de Obras de Infraestructura LPI Construcción de Obras de Infraestructura Sostenible y Servicios Urbanos ID N° 449366 y se ha firmado el contrato respectivo con el Consorcio T&C – CIVSA.

Se encuentra en proceso de adjudicación el llamado a Licitación para Fiscalización de las Obras de Infraestructura, ID 445073. Firma consultora calificada y en proceso de adjudicación, HYTSA.

Se encuentra en proceso de aprobación el Producto 4 Anteproyecto de la Consultoría de Saneamiento de la Laguna Yrupé.


Apoyo técnico y logístico a las acciones sociales del Programa. Acompañamiento a las familias beneficiarias, en el marco del Plan de Reasentamiento Temporal.

Diseño e implementación de la Estrategia de Comunicación del Programa de Rehabilitación y Vivienda del Bañado Sur de Asunción (Barrio Tacumbú) Coberturas de prensa. Supervisión y acompañamiento del Bloque del PRVBT en el Programa de radio.

Se ejecutan los contratos de Consultorías de apoyo técnico a los Componentes del Proyecto, así como, el contrato de Auditoría Externa del Programa con la firma AUDICON, la cual ha presentado los informes correspondientes al ejercicio 2024 y remitidos al BID para su aprobación.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero - Capitán Bado - Ypejhu											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		796											
Financiamiento		FONPLATA											
Costo del Proyecto		USD		220.000.000				GS.		1.638.315.800.000			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
206.697.616.825				1.431.618.183.175				12,62 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
14/02/2023				19/12/2029				31/12/2024					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Amambay, Canindeyú											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1,00 %						7,53 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/12/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
305.915.266.053				144.033.650.364				47,08 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

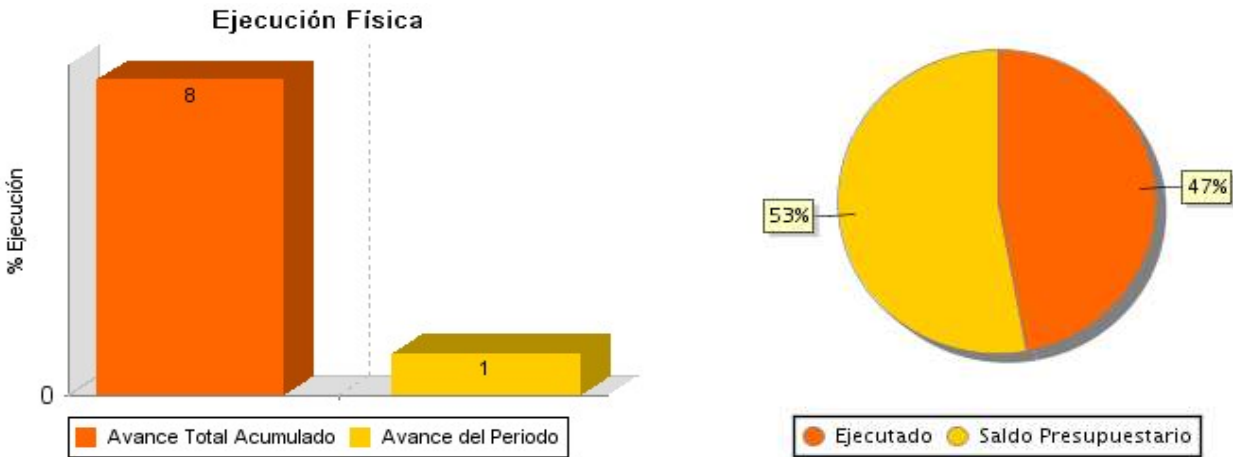


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo se le ha otorgado a las 4 (Cuatro) empresas Contratistas el pago del 2° Anticipo Financiero para iniciar la ejecución de los cuatro tamos de la Obra de la Ruta Nacional PY-17, Tramo Pedro Juan Caballero-Zanja Pyta-Capitan Bado-Itanara-Ypejhu, del Dpto.de Amambay - Canindeyu

Proyecto		Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		787											
Financiamiento		FOCEM, LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		155.708.655				GS.		1.231.967.589.299			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
532.263.090.635				699.704.498.664				43,20 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
18/12/2018				18/12/2022				31/12/2024					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Concepción, San Pedro											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
14 %						81 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
214.855.387.433				70.266.299.557				32,70 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

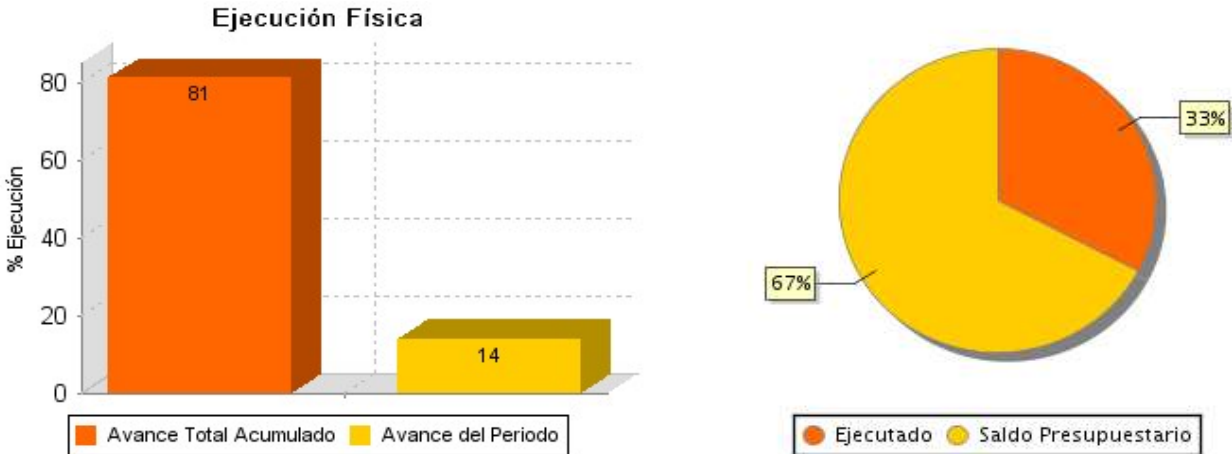

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informa que, durante el presente cuatrimestre, el proyecto ha mantenido un nivel de ejecución satisfactorio, conforme a lo previsto en el plan de trabajo.


Los avances se desarrollaron de la siguiente manera: en relación con la ejecución de obras, la construcción de la ruta registra un promedio del 98% de avance físico en los tres lotes. En cuanto a las actividades de fiscalización, las mismas se desarrollan conforme al cronograma establecido.

Asimismo, el Plan Comunicacional y el Plan de Gestión Ambiental y Servicios Ambientales se encuentran en proceso de obtención de los recursos presupuestarios necesarios para el posterior llamado.

En términos generales, el proyecto continúa avanzando dentro de los plazos y condiciones previstos, sin contratiempos significativos que afecten su normal desarrollo

Proyecto		Habilitación y Mant. tramo Pozo Colorado - Concepción				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		770				
Financiamiento		CAF, FONPLATA, LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	74.934.028		GS.	1.202.076.857.474
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
585.805.289.417		616.271.568.057			48,73 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
23/11/2018		23/11/2025			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Concepción, Presidente Hayes					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
5 %				72 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
170.738.560.872		65.861.163.202			38,57 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

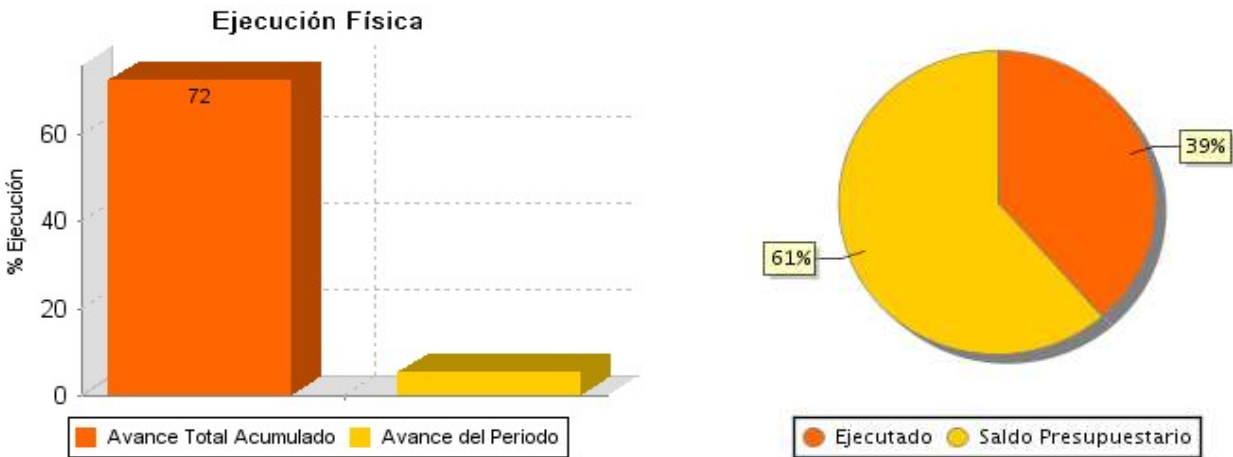


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente período, inició la ejecución de obras, correspondientes a los Lotes 2 y 3, que habían sido objeto de rescisión contractual con ejecución de pólizas, a raíz del incumplimiento de las obligaciones contractuales y la consecuente paralización de los trabajos, quedando inconclusos los tramos correspondientes. Fueron adjudicados las empresas Avanza Chaco y Ecomipa SA, a finales de diciembre

Unicamente el Lote 1 concluyó la ejecución física prevista, alcanzando una extensión de 40 km, encontrándose actualmente en etapa de mantenimiento rutinario. Las actividades ejecutadas en esta fase comprenden la limpieza de la franja de dominio por exceso de vegetación, bacheo superficial y sellado de fisuras, a fin de preservar la transitabilidad y las condiciones operativas del tramo intervenido.

Proyecto		Construcción Gran Hospital General				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		765				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	0		GS.	546.300.000.002
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
0			546.300.000.002			0,00 %
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
01/01/2018			31/12/2020			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Asunción, Central					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
2 %				2 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
4.900.000.000			0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

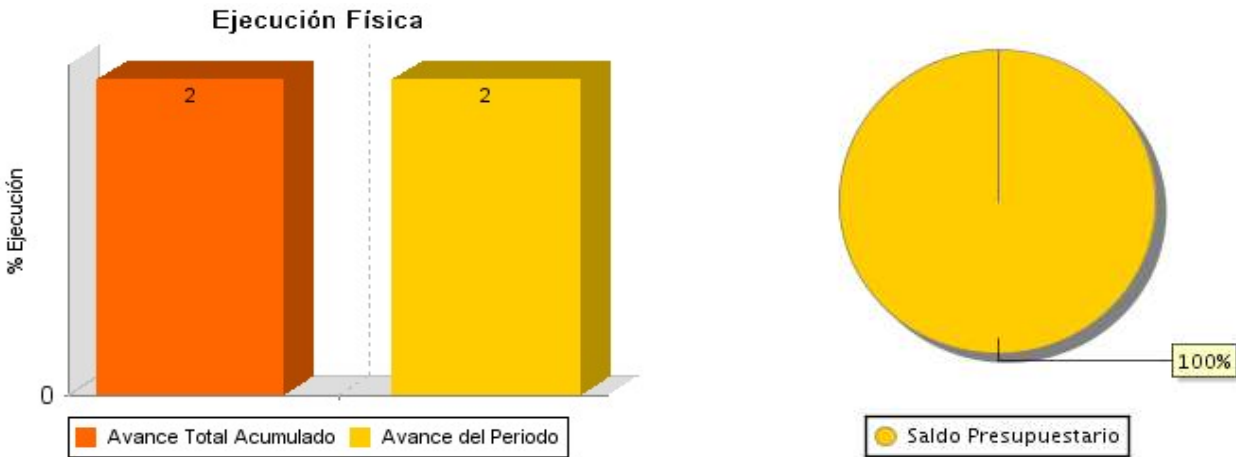

SITUACIÓN ACTUAL


Durante el primer cuatrimestre 2025 la Unidad Ejecutora avanzó con los siguientes trabajos relacionados al proyecto:

1. Trámites y preparación de documentación de rigor orientadas al cumplimiento normativo y procedimental con stakeholders relacionados a la Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción, en el marco de la Ley N° 7390/2024 “Que aprueba el Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación Bilateral entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de China (Taiwan)” y del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MOPC y el MSPBS.

2. Ajustes y modificaciones a los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) con sus correspondientes especificaciones técnicas para el Proyecto, con la preparación de los siguientes llamados en proceso: i) “Licitación Pública Nacional (LPN) para el Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción-Ad Referéndum”, ii) Contratación de la “Firma Consultora para la Fiscalización del Llamado de Diseño, Construcción y Mantenimiento del Hospital General de Asunción – Ad Referéndum”, obteniéndose el resultado previsto con la evidencia correspondiente: Publicación 23-04-2025 - 09:20 | LLAMADO MOPC N° 24/2025 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ASUNCIÓN- AD REFERÉNDUM.

Proyecto		Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		764				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	194.800.960.023
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
194.510.217.299			290.742.724		99,85 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				100,00 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
1.564.633.008			549.375.723		35,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

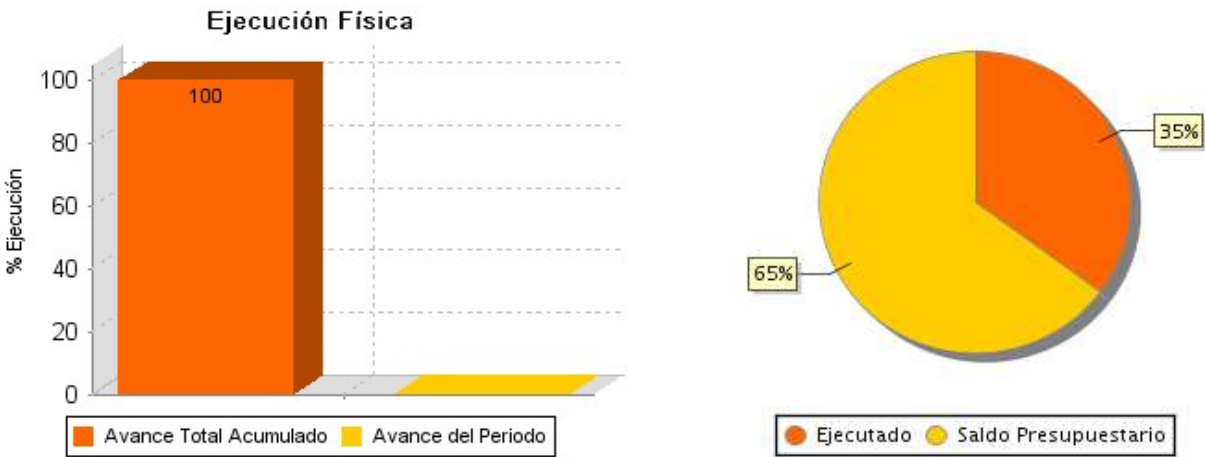


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción y mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	762				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	403.343.600.758
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
144.388.336.581		258.955.264.177		35,80 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Misiones, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
23.599.589.532		1.988.781.162		8,43 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

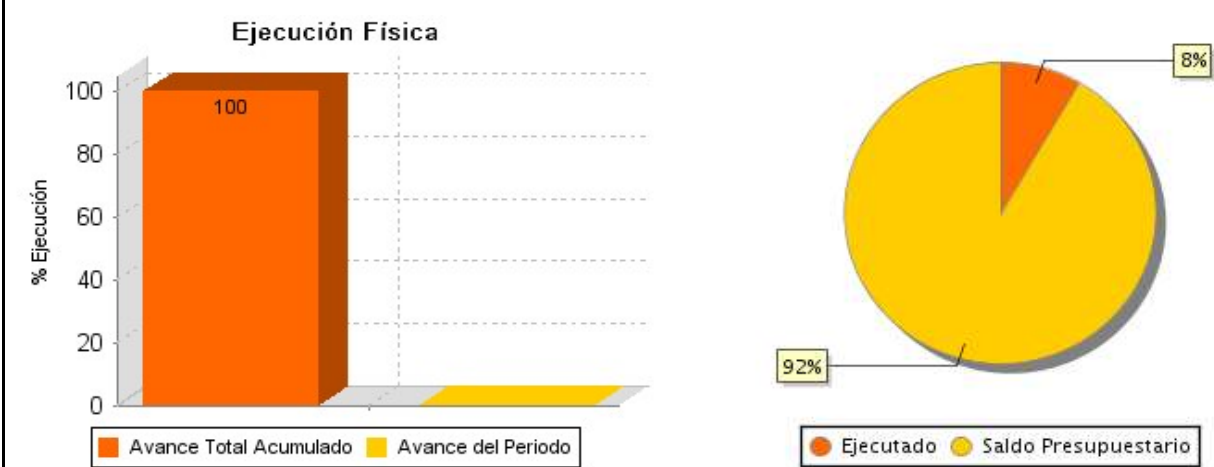


SITUACIÓN ACTUAL

La UEP no ha reportado su avance del primer cuatrimestre en el plazo establecido.

Proyecto		Construcción y mantenimiento Ruta N° 3 tramo km 21.8-170.3					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		761					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	378.545.281.810	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
108.936.490.809			269.608.791.001			28,78 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Central, Cordillera, San Pedro					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
19.411.917.717			351.075.269			1,81 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

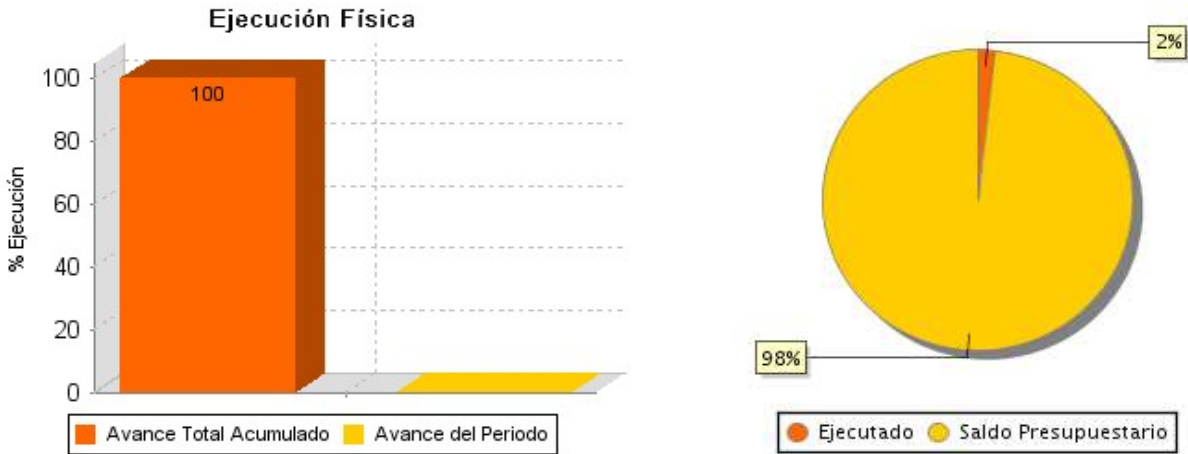


SITUACIÓN ACTUAL

La UEP no ha reportado su avance del primer cuatrimestre en el plazo establecido.

Proyecto		Habilitación y Mant. de la Ruta 1 tramo Carapegua - SJB					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		760					
Financiamiento		CAF, FONPLATA, LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	53.501.521		GS.	280.884.636.738	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
205.014.455.590			75.870.181.148			72,99 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
04/01/2018			15/12/2025			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Misiones, Paraguarí					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,99 %				86,85 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
26.884.117.148			2.868.744.176			10,67 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

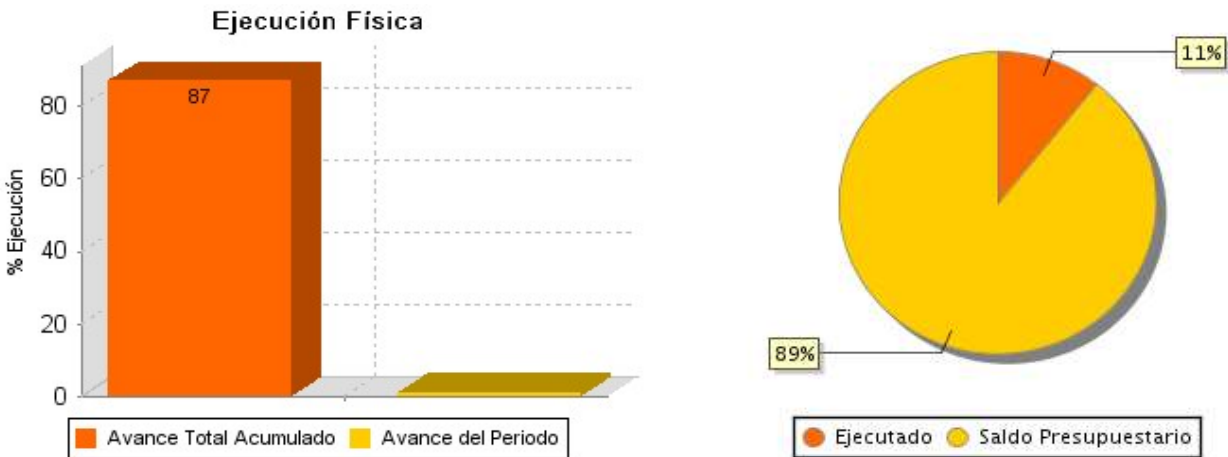

SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo el Consorcio Contratista CONTEC, en el marco de sus obligaciones contractuales se encuentra abocado en satisfacer los indicadores de mantenimiento establecidos para los distintos elementos de la carretera en todos los tramos de la Infraestructura contratada, para la ejecución de las Obras de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicio(Crema). Los trabajos realizados conforme al reporte del MOPC fueron: La limpieza de la Franja de Dominio con tractores con rotativa y personal con desmalezadoras, trabajos en alcantarillas, corte de vegetación con máquina y manual, con seguridad vial en el tramo del contrato, remoción, re acondicionamiento y recolocacion de la señalización vertical. Eliminación desperdicios y basuras de la vía pública. Se colocaron señales y elementos de seguridad. Las cargas de basuras, sedimentos y todo material retirado fueron dispuestos adecuadamente según lo reportado.



MINISTERIO DE
**ECONOMÍA
Y FINANZAS**
PARAGUAY


PARAGUÁI
**TEMBIGUEREOITA
HA VIRUÑANGAREKO**
MOTENONDEHA



Sistema Nacional
de Inversión
Pública

Proyecto	Conservación de rutas pavimentadas por administracion				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	746				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	185.928.766.059
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
181.418.793.929		4.509.972.130		97,56 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			76,59 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
12.744.005.486		618.303.266		4,85 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

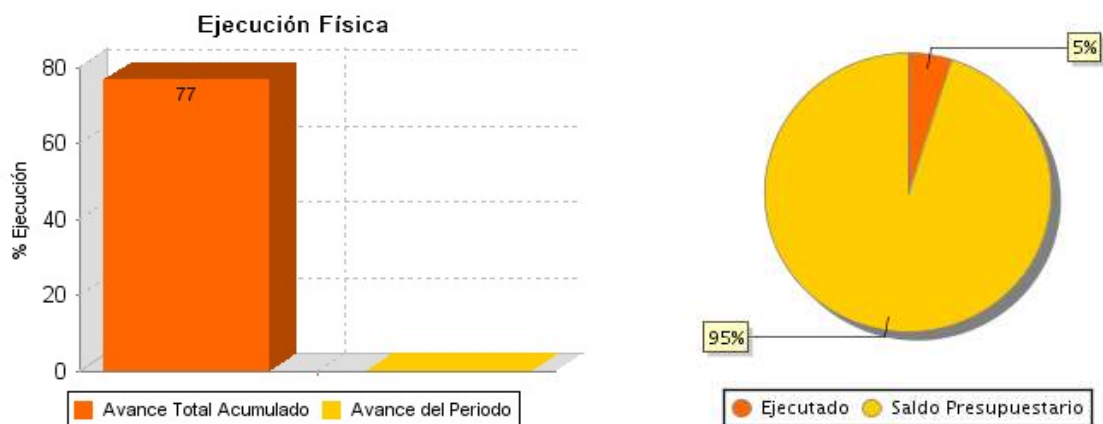


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	Construcción de Pavimento Tipo Empedrados y Puentes. Región Sur.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	737				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	435.991.771.762
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
35.334.543.924		400.657.227.838		8,10 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			98,80 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
354.247.310		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

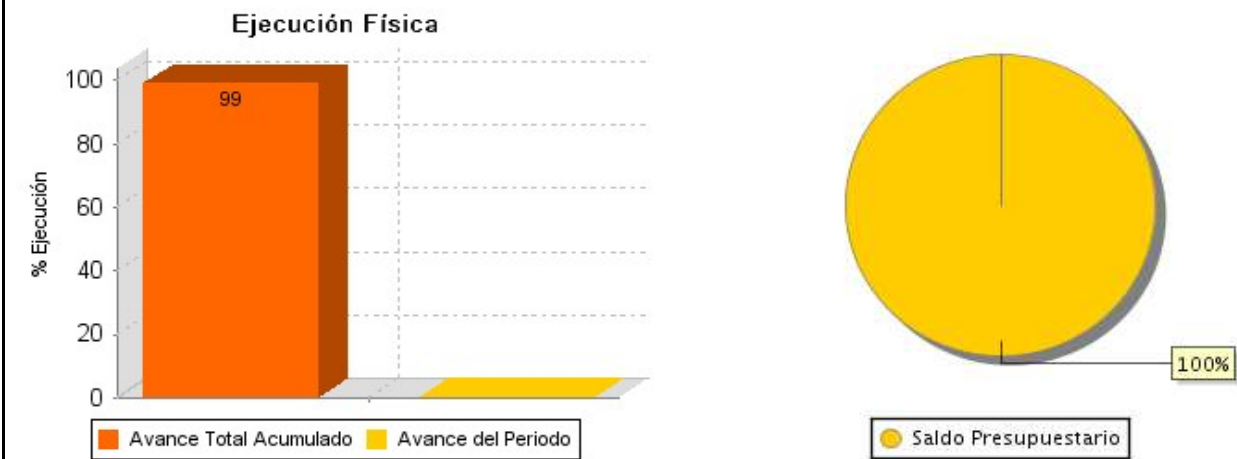


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativo pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Construcción de Pavimento tipo Empedrado y Puentes - Región Centro.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	736				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	28.060.365.090
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
26.214.560.425		1.845.804.665		93,42 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Cordillera, Guairá, Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,36 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
1.016.469.604		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

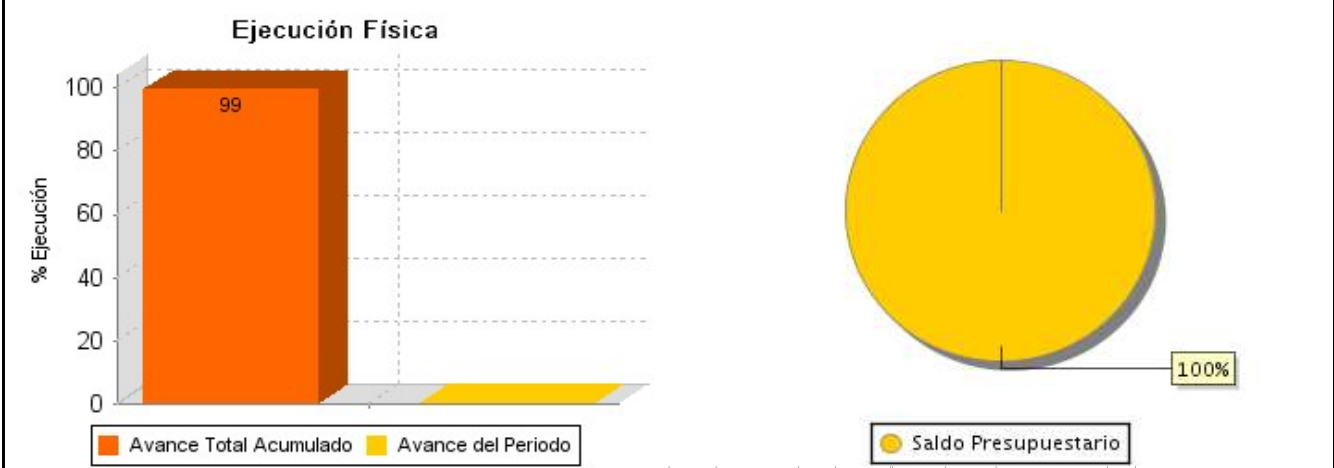


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Noreste.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	732				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	272.415.685.907
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
271.112.097.479		1.303.588.428		99,52 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,83 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
574.000.000		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

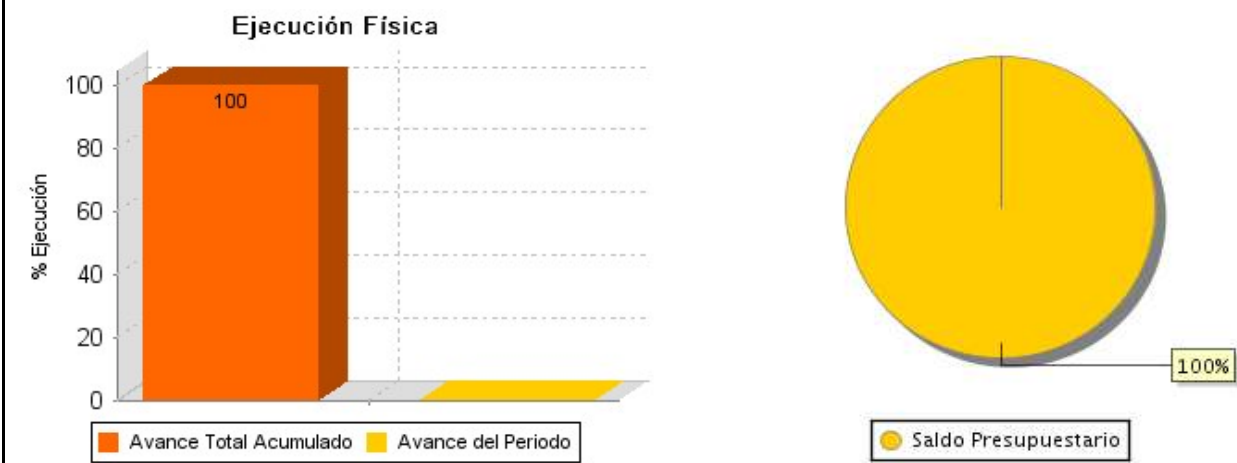


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en la Región Este						
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
Código SNIP N°		730						
Financiamiento		LOCAL						
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	161.967.754.975		
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución		
160.887.188.373			1.080.566.602			99,33	%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga		
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025		
Ubicación Geográfica del Proyecto								
Departamental		Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total				
0,00				%		98,80		%
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado		
545.068.950			0			0,00		%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

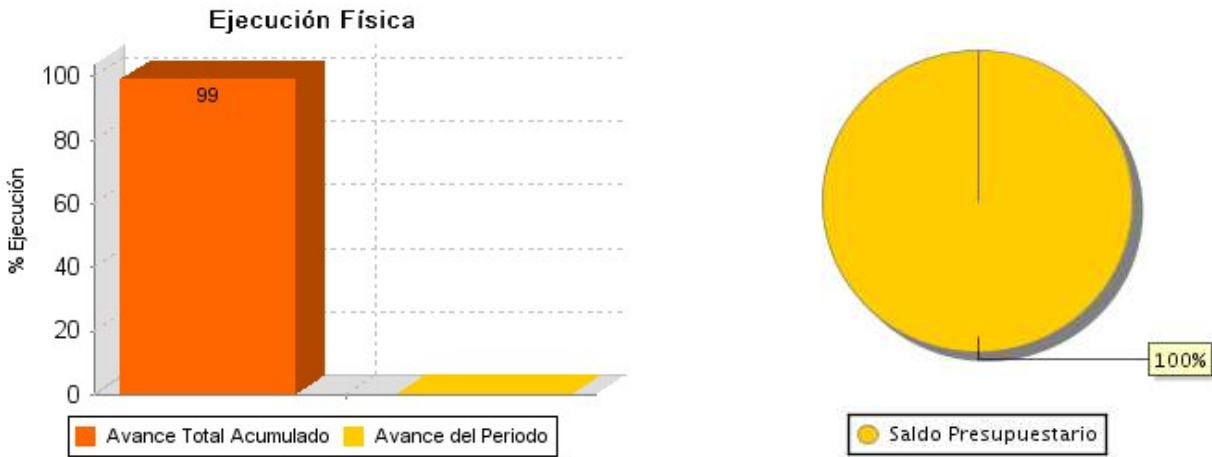


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en la Región Centro.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	729				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	422.124.494.510
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
407.539.688.686		14.584.805.824		96,54 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Guairá, Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,44 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
719.943.324		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

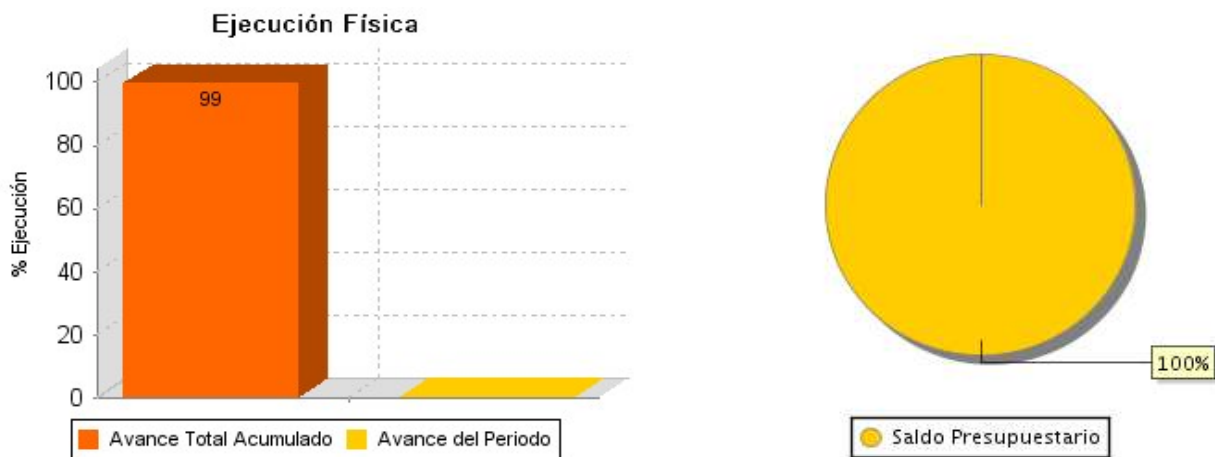


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Construcción de Pavimentos sobre empedrados en Región Este				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	725				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	37.686.822.499
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.552.368.499		17.134.454.000		54,53 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			98,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
948.001.517		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

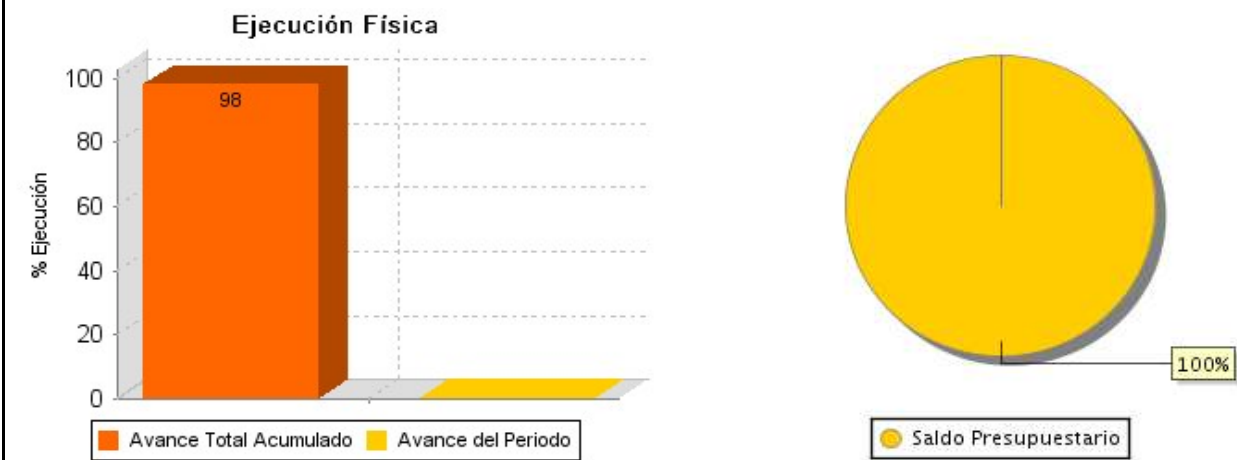


SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras que comprende el proyecto ha finalizado. Actualmente en proceso administrativo el pago de deudas pendientes de los contratos de obras.
Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.614/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Construcción Asfalto sobre empedrados - Región Sur					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		724					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	21.884.404.330	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
21.364.292.276			520.112.054			97,62 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Itapúa, Misiones, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				99,50 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
3.680.609			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

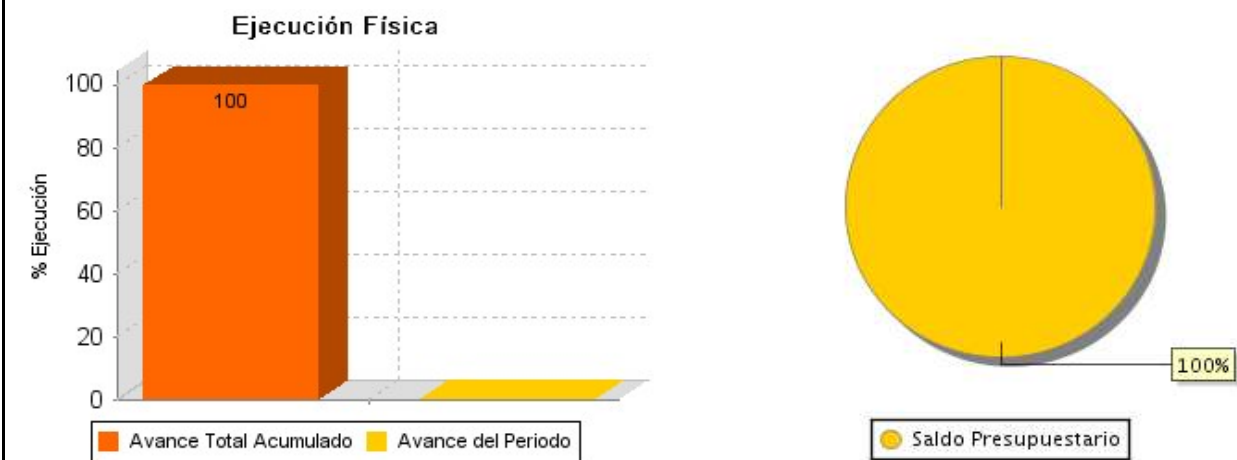


SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativo la cancelación de deudas pendientes de sus contratos de obras.

Proyecto		Restauración de Edificios Patrimoniales					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		719					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	42.509.174.802	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
42.462.436.475			46.738.327			99,89 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
21.738.327			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

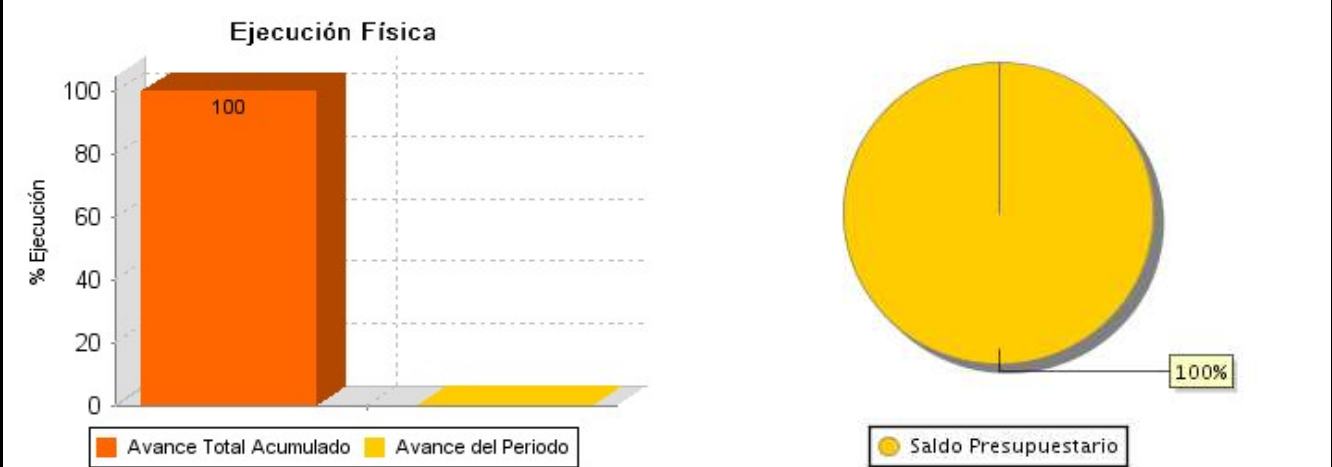


SITUACIÓN ACTUAL

La totalidad de las obras que comprende el proyecto han finalizado, queda pendiente el pago de reajuste de precio del contrato de obra de Restauración de la Fachada del Palacio Alegre sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto		Diagnóstico y Protocolo de intervención Edificios Históricos					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		718					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	3.113.663.408	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
2.979.663.408			134.000.000			95,70 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción, Central, Paraguari					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				69,67 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
134.000.000			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

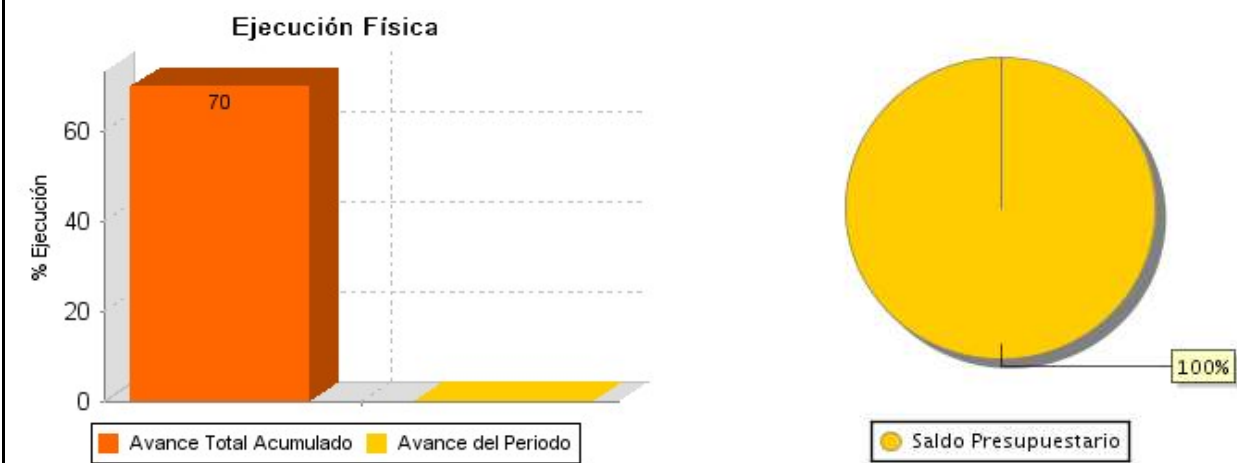


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		649											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		60.000.000				GS.		336.000.000.000			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
197.965.552.716				138.034.447.284				58,92 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/01/2018				31/12/2020				31/12/2024					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Caaguazú											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1 %						59 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
20.801.221.661				8.102.738.857				38,95 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

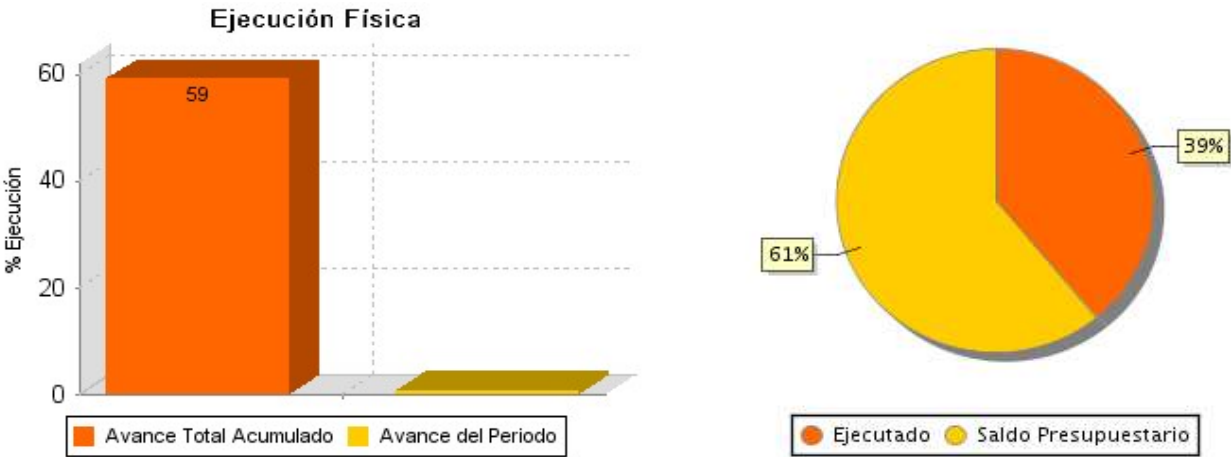


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que, en fecha 25 de marzo de 2025, se realizó la Recepción Provisoria de la Primera Etapa del Hospital, el cual se encuentra actualmente en funcionamiento. Quedan pendientes los trabajos correspondientes al Sistema de Impulsión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Hospital hacia el río Tebicuarymí, los cuales fueron modificados a solicitud de la comunidad, que requirió el cambio de trayecto para derivar la impulsión desde la PTAR del Hospital hacia la PTAR de la ESSAP. Esta modificación se encuentra incluida en el Convenio Modificadorio N.º 7, actualmente pendiente de aprobación, y tendrá un plazo de ejecución estimado de cuatro meses.

Proyecto		Construcción del HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		648					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	100.000.000		GS.	560.200.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
243.542.205.974			316.657.794.026			43,47 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/12/2021			01/12/2023			01/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Itapúa					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2 %				48 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
48.210.840.709			17.504.043.197			36,31 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

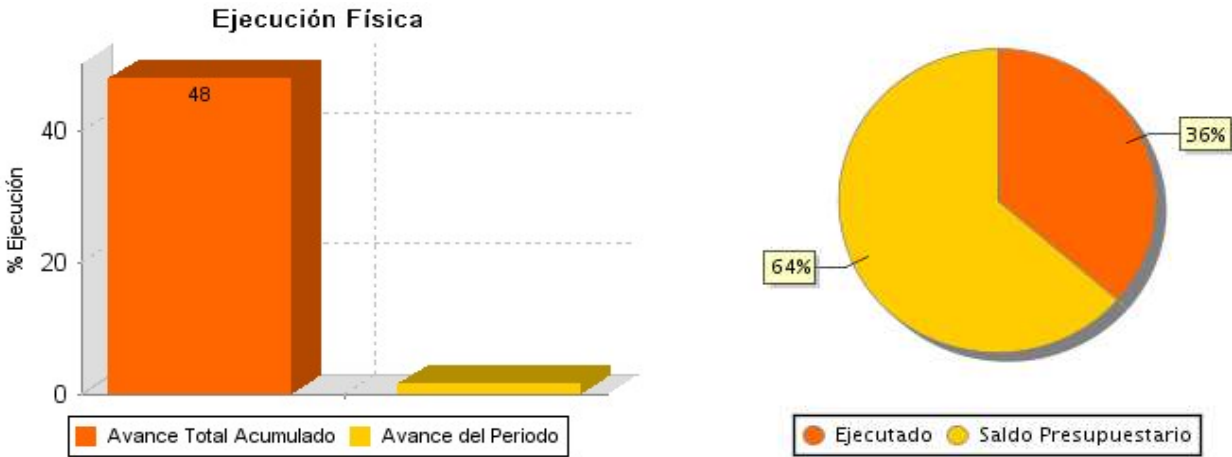

SITUACIÓN ACTUAL


La Unidad ejecutora informó que en la Sección 1 - Obra principal y obras complementarias: El desarrollo del proyecto ejecutivo (todo lo referente a las instalaciones eléctricas, gases medicinales, sanitarias, prevención contra incendios y señales débiles) fue finiquitado a finales del 2022, en cuanto a la Construcción de Obra Civil (incluyendo todo lo referente a instalaciones eléctricas, gases medicinales, sanitarias, prevención contra incendios, señales débiles y estructura) fue finiquitada en el último cuatrimestre el año 2024, las obras complementarias al hospital (estacionamiento vehicular, planta de tratamiento de aguas, planta generadora de oxígeno, depósito de residuos hospitalarios) fue finiquitada en el último cuatrimestre del año 2024. Siendo todo lo anteriormente citado parte de la Sección 1, ha culminado con satisfacción y actualmente la sección 1 cuenta con Recepción Provisoria.

Con relación a la Sección 2 Acceso Vial, tramo de 2km de desarrollo desde la Ruta PY06 hasta el Hospital del Sur, durante el primer cuatrimestre del año 2025 se ha culminado con 600 m de pavimentación asfáltica correspondiente a el tramo frente al hospital, en cuanto a el tramo restante se avanza con la liberación de franja de dominio, en el primer cuatrimestre del corriente año se han avanzado con los trabajos de movimiento de suelo, drenaje y protección de la plataforma y se ha finalizado con el puente de Hormigón ya a la espera de la capa asfáltica final.

En lo referente a la Sección 3: Albergue de familiares y Residencia médica, durante el primer cuatrimestre del año 2025 se ha dado la orden de inicio de ejecución del mismo, y a la par fueron ejecutados y finalizados todos los trabajos correspondientes a movimiento de suelo, estructura de hormigón armado, estructura metálica (techado) e instalaciones sanitarias. Actualmente se avanzan con los trabajos de albañilería, instalaciones eléctricas y obras exteriores (camineros, pasarelas, techados, etc).

Proyecto		Mejoramiento y Conserv. tramo Caaguazu - Yhu. - Emp. RN 10											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		647											
Financiamiento		BID											
Costo del Proyecto		USD		6.994.000				GS.		52.153.436.228			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
36.799.074.843				15.354.361.385				70,56 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
23/11/2018				30/11/2025				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Caaguazú, Canindeyú											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1,00 %						96,06 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
2.134.834.062				0				0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

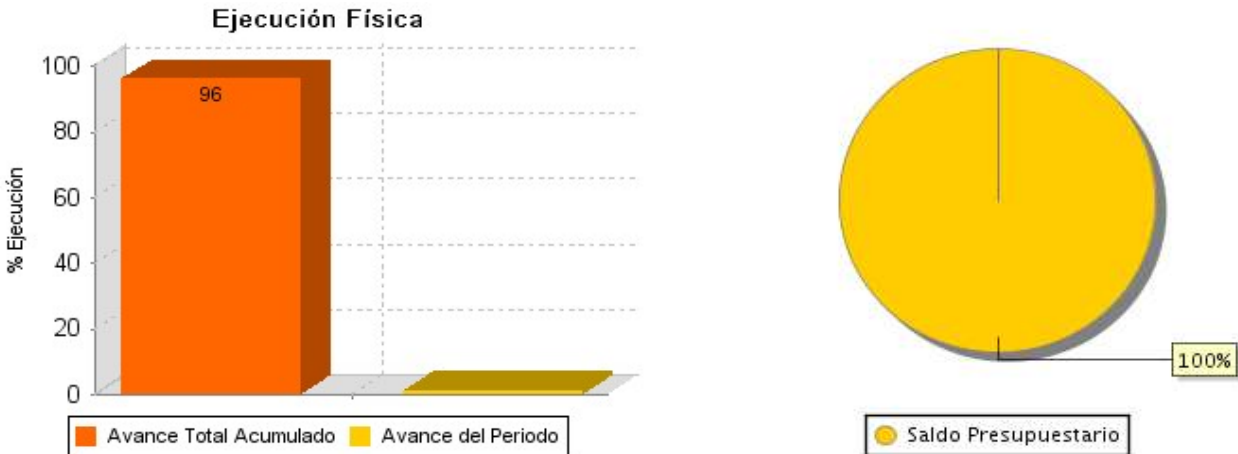


SITUACIÓN ACTUAL

La obra de mejoramiento y conservación por niveles de servicio de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N° 10, continua en etapa de mantenimiento y los trabajos realizados en el periodo fueron: Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas rehabilitada, calzada existente y las Operaciones de Báscula Móvil. Las obras de mantenimiento son los mismos en todo el tramo en donde el objetivo principal es mantener los niveles de servicios óptimos.

Proyecto		Mejoramiento y Conserv. tramo Ñumi - San Juan N. - Emp. RN6				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		646				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	48.747.500		GS.	342.424.871.123
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
323.028.280.570			19.396.590.553		94,34 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/11/2018			30/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Caazapá, Guairá				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
2,89 %				93,30 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
18.448.889.009			8.095.961.090		43,88 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

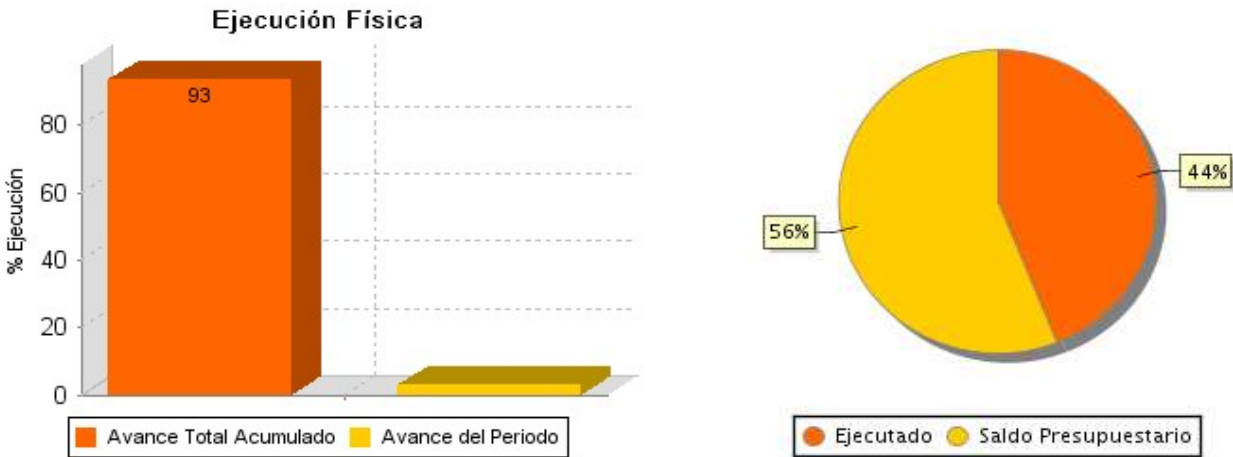


SITUACIÓN ACTUAL

Las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6. se encuentran en etapa de mantenimiento. Con respecto a las actividades realizadas en el periodo continúan los trabajos de limpieza de la franja de dominio y de los drenajes, bacheo en las calzadas rehabilitadas y las operaciones de bascula móvil. El objetivo de estos trabajos es mantener los niveles de servicio óptimos en todo el tramo. Asimismo, se continúa trabajando en los TDRs de los Servicios de Consultoría para el Plan de Gestión Ambiental. El Contrato de Pago de Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno Programa, se encuentran CULMINADOS. La Consultoría de la ECATEF se encuentra culminada y la Auditoría Externa en donde se presentó el Informe Correspondiente al año 2024.

Proyecto		Habilitación de la Red Pav., Dptos de Misiones e Itapúa				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		595				
Financiamiento		BIRF				
Costo del Proyecto		USD	46.540.241		GS.	480.928.554.027
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
232.802.390.349			248.126.163.678		48,41 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018			31/12/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Itapúa, Misiones				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
2,79		%		37,78		%
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
87.532.637.240			27.970.657.085		31,95 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

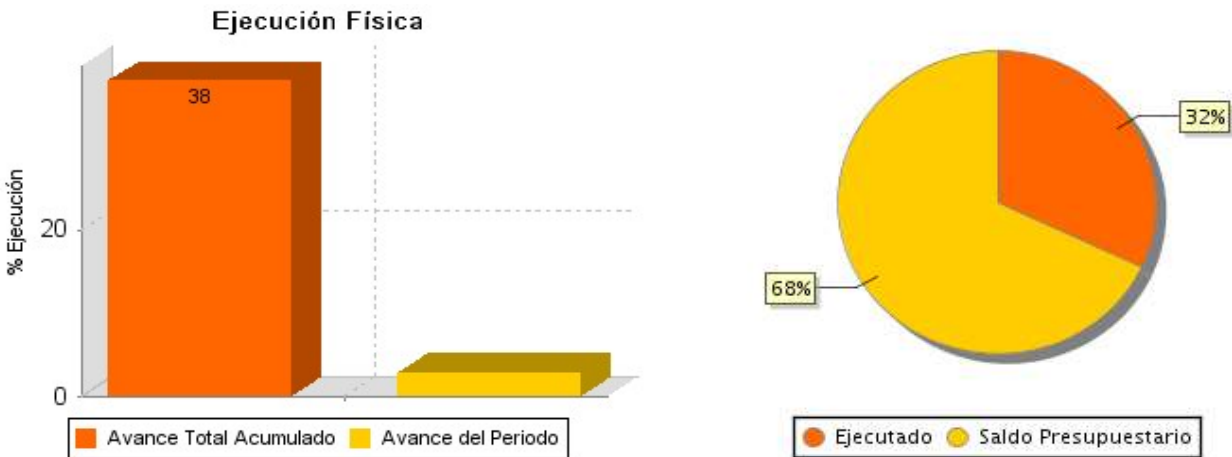


SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del Primer Cuatrimestre el MOPC reporta lo siguiente: Los avances de obras en la etapa de mantenimiento se consideran en la longitud total del tramo, ya que se verifica mensualmente el estado general del mismo. Las intervenciones en obras según datos de los especialistas técnicos de la UEP son las siguientes: Se han reparado y solucionado, desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, reducción de espesor de pavimento, materiales sueltos, obstrucciones al escurrimiento de la vía, exceso de vegetación, pozos entre otros. Con respecto al servicio de consultoría para la elaboración de Material Educativo para escolares y Plataforma Web de Escuela Virtual y el servicio de Selección de Consultores para Auditoría Financiera y Contable Externa del Proyecto para los siguientes ejercicios 2024 al 2025 se encuentra en etapa de aprobación del pliego de bases y condiciones, se espera completar todos los procesos en el siguiente cuatrimestre para lograr su ejecución efectiva.

Proyecto		Habilitación de la Red Pav. Dptos. S. Pedro, Caag. y Canind.			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		594			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	53.057.700	GS.	411.614.354.995
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
238.531.085.472		173.083.269.523		57,95 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018		31/12/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caazapá, Canindeyú, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
3,04 %			53,78 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
103.455.146.971		28.179.010.879		27,24 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

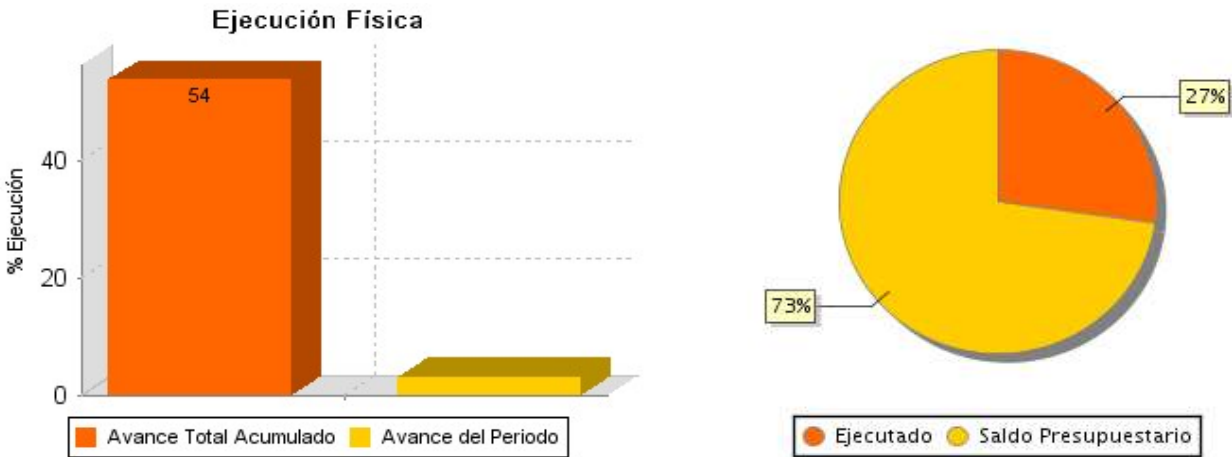


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que al cabo del primer cuatrimestre las intervenciones fueron las siguientes: Limpieza de franja de dominio, construcción de acceso a comunidad indígena, construcción de dársenas para control de peso, bacheo superficial, limpieza de franja y obstrucción del escurrimiento, materiales sueltos. Se procesaron sin inconvenientes los Informes presentados en la institución por parte del consorcio encargado de la fiscalización de rutas rehabilitadas y mantenidas. Con respecto a las Obras correspondientes a Planes Urbanos Malla Norte con ID N° 435.069, se procesaron sin inconvenientes los certificados presentados a la institución.

En cuanto a la Licitación 451.737 - Llamado MOPC N° 64/2023 Adquisición Equipos Educativos para Campañas de Seguridad Vial, el MOPC reporta que por Resolución 2260 de fecha 03 de diciembre/2024 se adjudica el lote 1. Dicho llamado al cierre del cuatrimestre aun no fue efectivo ya que la empresa adjudicada está en proceso final de fabricación y provisión total de los equipos licitados, se espera poder concretar todos los procesos en el siguiente cuatrimestre.

Proyecto		Mejoramiento de 160km de caminos vecinales en la R Oriental				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		564				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	62.000.000		GS.	537.761.224.043
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
393.164.065.999			144.597.158.044		73,11 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018			05/01/2023		17/01/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,58 %				94,61 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
43.809.489.261			19.571.472.550		44,67 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

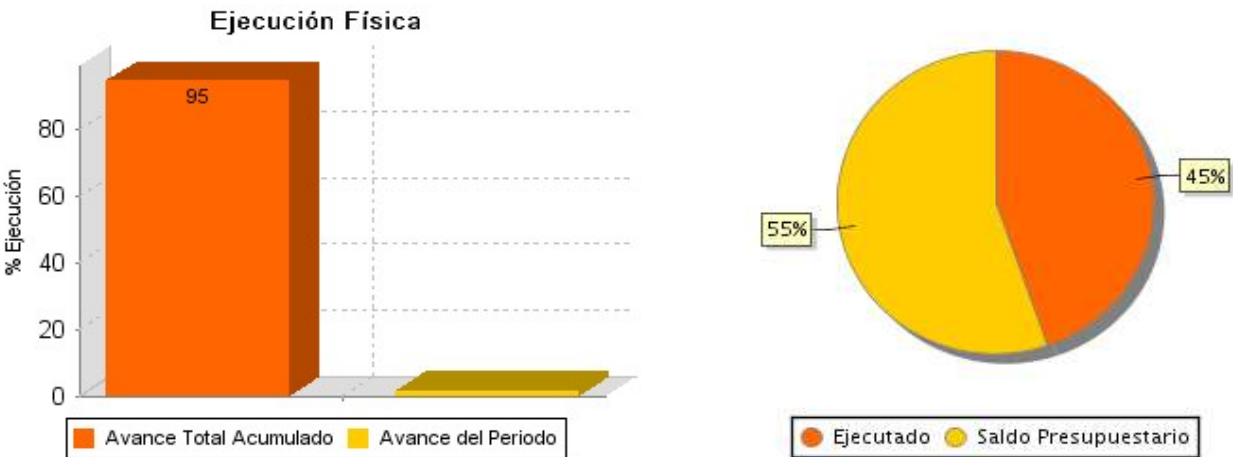


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de este primer periodo el MOPC detalla cuanto sigue: Para los caminos Rehabilitados dentro del Proyecto, se registran un total de 1,74 km de caminos rehabilitados dentro de la Región Oriental de 745,37 km a rehabilitar, así también se informa que no hubo avance físico en puentes construidos debido a que los mismos se encuentran en etapa de Recepción Provisoria. Así también las empresas fiscalizadoras acompañan a cabalidad todo lo concerniente a las aprobaciones de las obras construidas. Cabe mencionar también que los certificados correspondientes a las consultorías se procesan con normalidad honrando el pago de acuerdo al visto bueno de la Dirección de Caminos Vecinales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones dentro del proyecto siguen su curso conforme al cronograma previsto en el PEP.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		455											
Financiamiento		CAF, FONPLATA											
Costo del Proyecto		USD		31.889.950				GS.		189.562.926.102			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
152.926.437.227				36.636.488.875				80,67 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
04/01/2018				04/01/2025				31/12/2025					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Central											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1,22 %						97,46 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
13.578.337.393				652.808.220				4,81 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

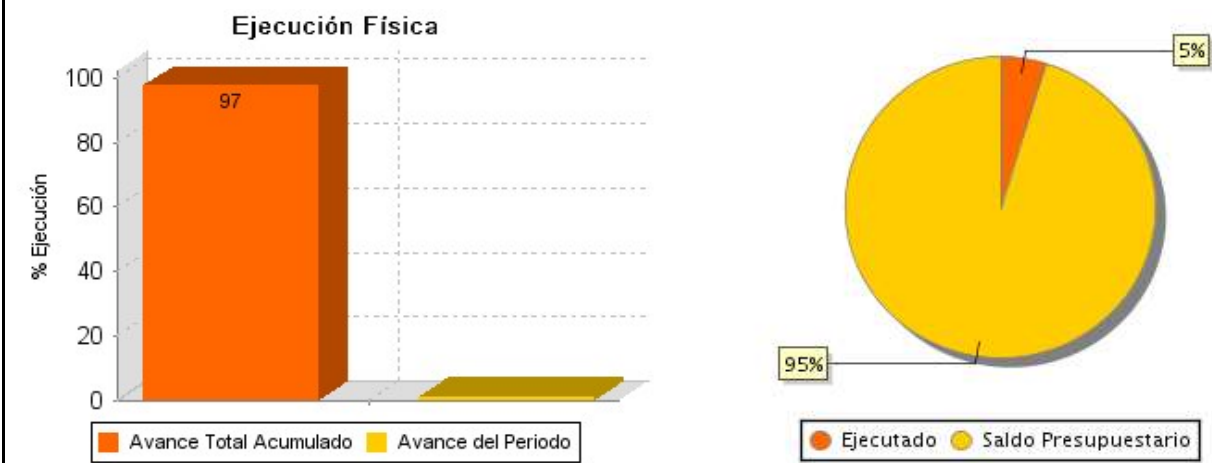


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada en el Departamento de San Pedro			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		454			
Financiamiento		CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	34.157.721	GS.	251.942.708.325
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
189.769.038.415		62.173.669.910			75,32 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
04/01/2018		04/01/2025			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %				90,13 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
11.917.229.296		3.388.328.816			28,43 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

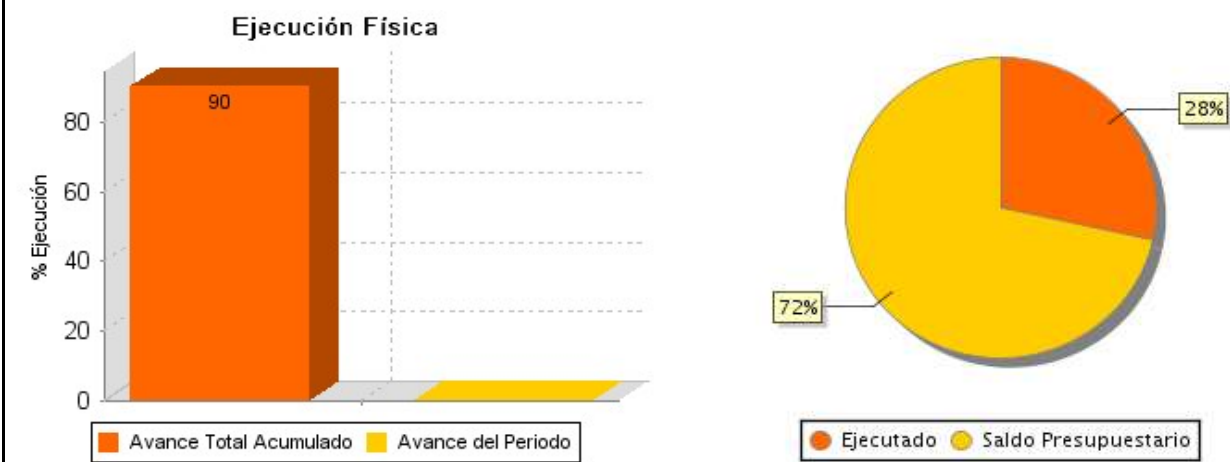


SITUACIÓN ACTUAL

La UEP no ha reportado su avance físico del presente cuatrimestre en el plazo establecido.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguairí, Caaguazú, Guairá y Caazapá.					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		451					
Financiamiento		CAF, FONPLATA					
Costo del Proyecto		USD	201.878.982.976		GS.	593.091.656.828	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
538.085.427.372			55.006.229.456			90,73 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
04/01/2018			04/01/2025			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguairí					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
1,54 %				88,97 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
29.817.565.067			5.884.808.049			19,74 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

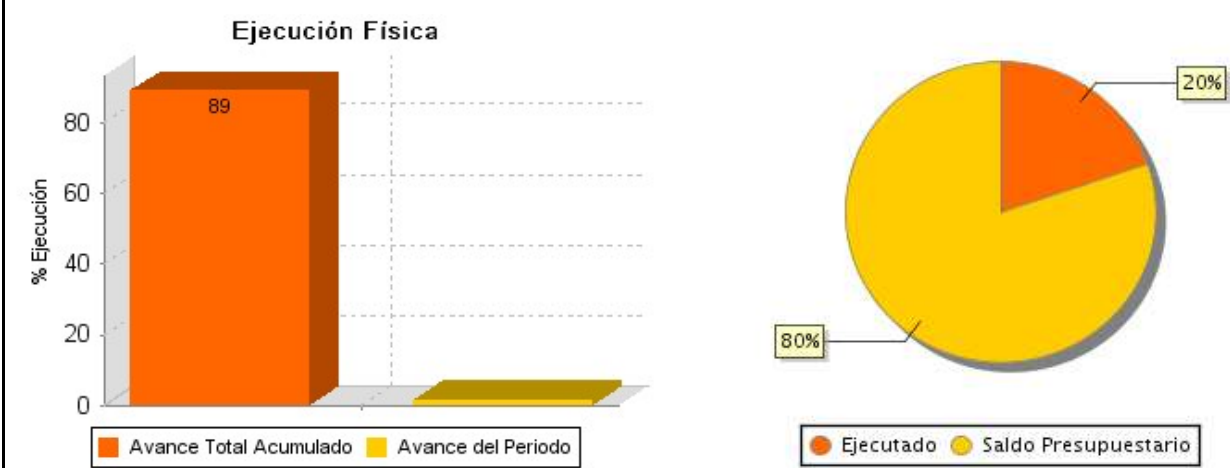


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Construcción y protección de márgenes del Arroyo Rosedal					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		443					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	27.184.631.727	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			27.184.631.727			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
3/6/2024			3/6/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Villa Elisa						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,66 %				0,66 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
10.005.000.000			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

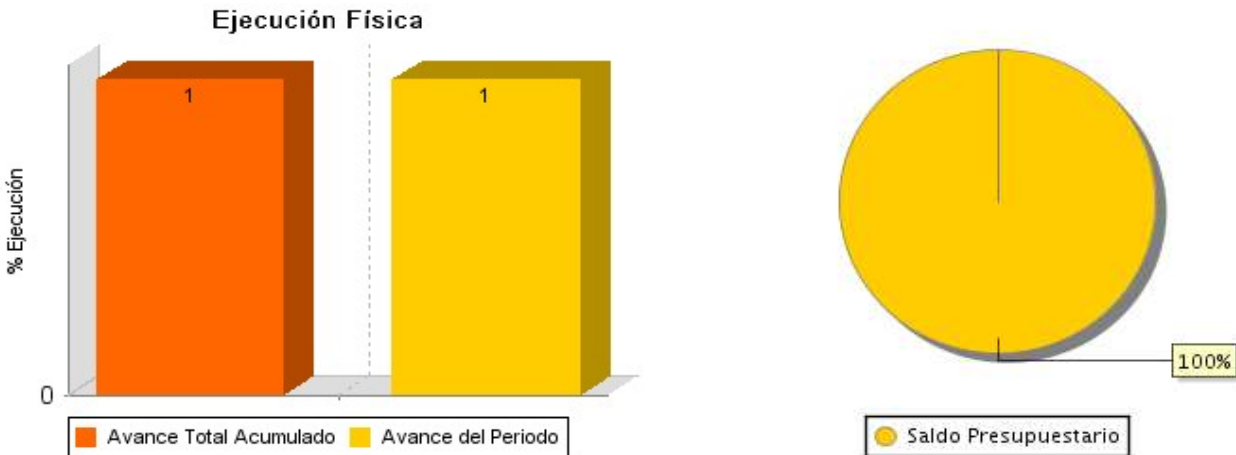


SITUACIÓN ACTUAL

En el primer cuatrimestre se ha concretado la firma de Contrato para la Obra “Construcción y protección de márgenes del Arroyo Rosedal” Llamado MOPC N° 62/2024.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		384			
Financiamiento		CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	142.911.000	GS.	1.068.447.150.635
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
898.606.081.635		169.841.069.000			84,10 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
31/12/2018		31/12/2022			5/6/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,59 %			88,53 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
86.495.058.206		19.745.868.136			22,83 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

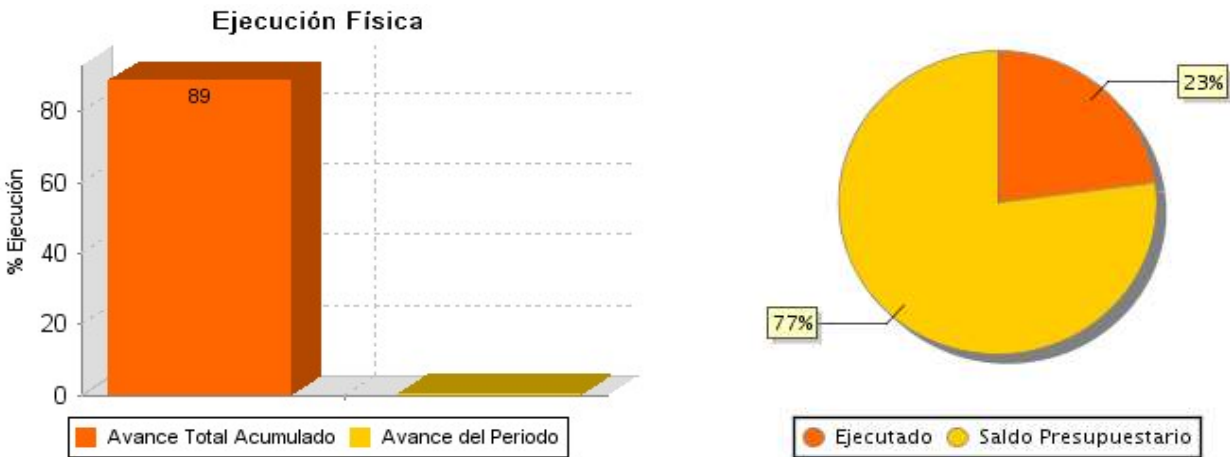

SITUACIÓN ACTUAL


El proyecto comprende la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y rurales, así también la construcción de puentes de Hormigón Armado (HºAº) en varios puntos de la Región Oriental. Actualmente en plena etapa de ejecución. En cuanto al primer contrato Rehabilitación y Mantenimiento de caminos vecinales las obras poseen Contratos con Recepción Definitiva, más 2 contratos con Recepción Provisoria y mantenimiento rutinario, el segundo contrato ha finalizado, el tercer contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance de 3.78 Km de caminos rehabilitados. El cuarto contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de tramos de caminos vecinales tuvo un avance de 0,75 km. de caminos rehabilitados. En cuanto a la construcción de puentes de hormigón armado se encuentra en ejecución un contrato que abarca los Departamentos de Canindeyú, Caazapá y Paraguari, esta actividad tiene 5 lotes de los cuales tres lotes cuenta con Recepción Provisoria más 2 lotes en ejecución. El segundo contrato de construcción de puentes se encuentra con un avance de 44,53 ml de puentes construidos, esta actividad tiene 7 lotes. El tercer contrato Construcción de Puentes de Ho Ao FONPLATA en el Departamento de San Pedro corresponde a una Licitación adjudicada.

Con respecto a la fiscalización de las obras del Grupo 1 en los Departamentos de Guaira, Misiones, Amambay-Concepción y del Grupo 3 en el Departamento de Caazapá cuentan con servicio finalizado. Mientras que la fiscalización de obras en el Departamento de San Pedro cuenta con ampliación y regularización de plazos. La fiscalización de las Obras de Puentes Primera tanda CAF cuenta con servicio finalizado al igual que la fiscalización de las Obras de Puentes Segunda tanda. La fiscalizacion de Construcción de Puentes de Ho Ao FONPLATA en el Departamento de San Pedro se encuentra en etapa de evaluación.

En cuanto al servicios de Consultoría de Apoyo Técnico y Fiduciario al Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental (Financiación CAF-FONPLATA) tuvo tres Informes presentados y aprobados. El Contrato de Auditoria Externa, tuvo informe presentado y aprobado Año 2023.

Proyecto		Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		383				
Financiamiento		BID , CAF, LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	670.386.143		GS.	4.688.049.304.307
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
4.300.885.104.656			387.164.199.651		91,74 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
18/09/2018			20/9/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Boquerón, Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,39 %				94,26 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
343.846.176.268			86.274.839.402		25,09 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

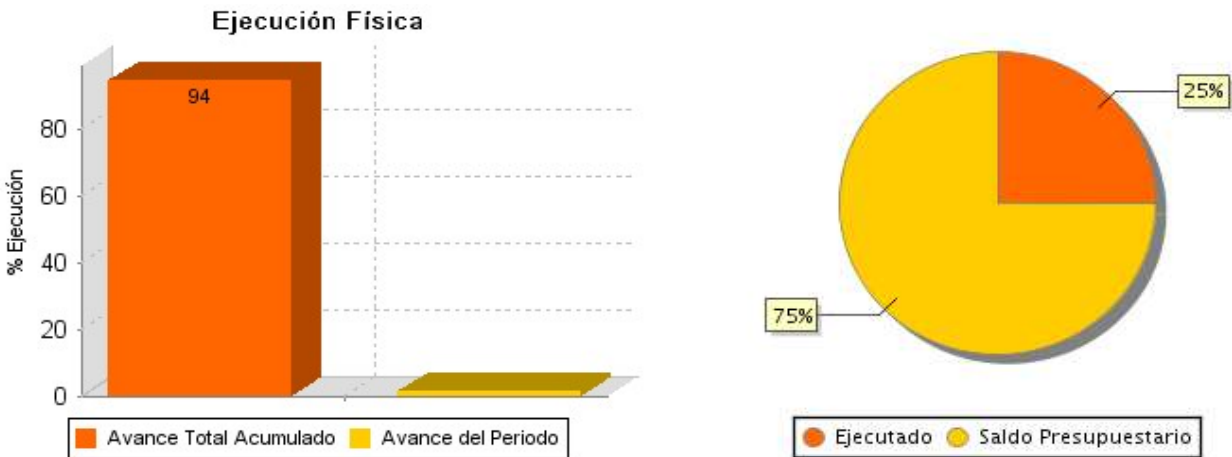


SITUACIÓN ACTUAL

El estado de las obras es el siguiente: Supervisión y Aprobación de los Certificados de Obras de Habilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional N° 9 y accesos: Tramo 1, Lote 1 (PROG. 50+000 a PROG. 112+000) tiene un avance físico de 100%, con una pavimentación asfáltica de 60 kilómetros que se encuentra en Etapa de Mantenimiento; Lote 2 (PROG. 112+000 a PROG. 173+000), tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 61 kilómetros y en etapa de mantenimiento. Tramo 2, Lote 3 (PROG. 173+000 a PROG. 250+000). tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 74 kilómetros se encuentra en etapa de manteneiminto, Lote 4 (PROG. 250+000 a PROG. 326+000). tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 73 kilómetros se encuentra en etapa de mantenimiento. Tramo 3, Lote 5 (PROG. 326+000 a PROG. 390+000). tiene un avance físico de 100%, y en etapa de mantenimiento, Lote 6 (PROG. 390+000 a PROG 450+000), tiene un avance físico de 100%, y en etapa de mantenimiento. Tramo 4, Lote 7 (PROG. 450+000 a PROG. 525+000), tiene un avance físico de 100% se encuentra en etapa de mantenimiento . Habilitación y Mantenimiento de la Ruta N° 9 y accesos, Lote 8 (Accesos), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en la etapa de Mantenimiento. El mantenimiento de todos los Tramos contempla el trabajo de Limpieza de la Franja de Dominio y de los Drenajes, Bacheo en las calzadas habilitadas y la Operaciones de Bascula Móvil.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		329					
Financiamiento		BID , ICO					
Costo del Proyecto		USD	125.000.000		GS.	805.881.066.227	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
792.432.285.221			13.448.781.006			98,33 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
25/11/2015			25/11/2020			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,04 %				91,38 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
3.844.362.494			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

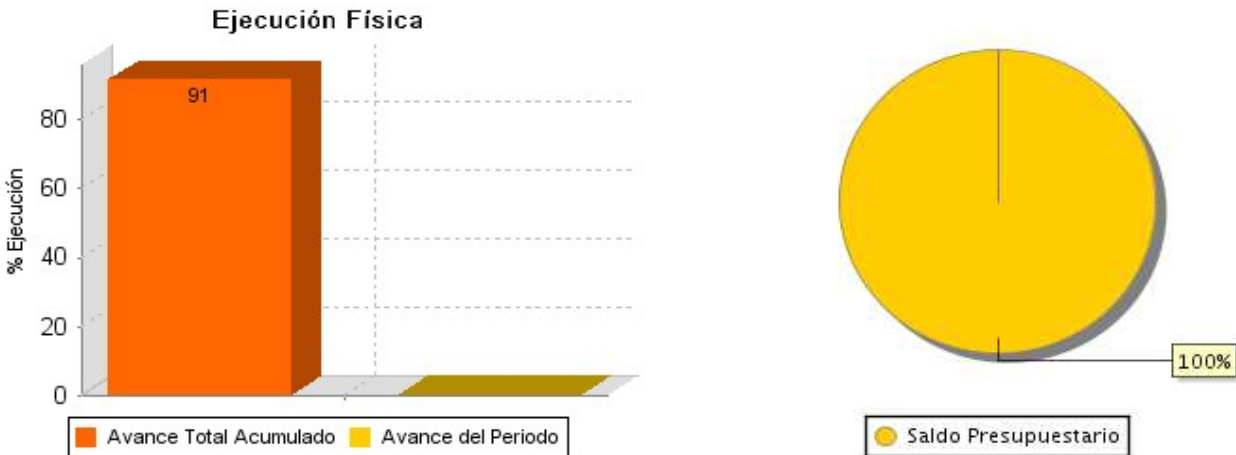


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del primer cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para caminos rehabilitados, puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y consultorías, se encuentran finalizadas y en proceso de pagos finales. Por otra parte, se informa que los procesos de contrataciones fueron ejecutados en su totalidad conforme al cronograma previsto en el PEP de acuerdo a lo manifestado por el MOPC.

Proyecto	Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	311				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	48.120.000	GS.	312.293.363.651	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
290.432.576.498		21.860.787.153		93,00	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/06/2016		23/06/2021		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	San Lorenzo				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,24 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
21.864.998.448		3.489.191.851		15,96	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

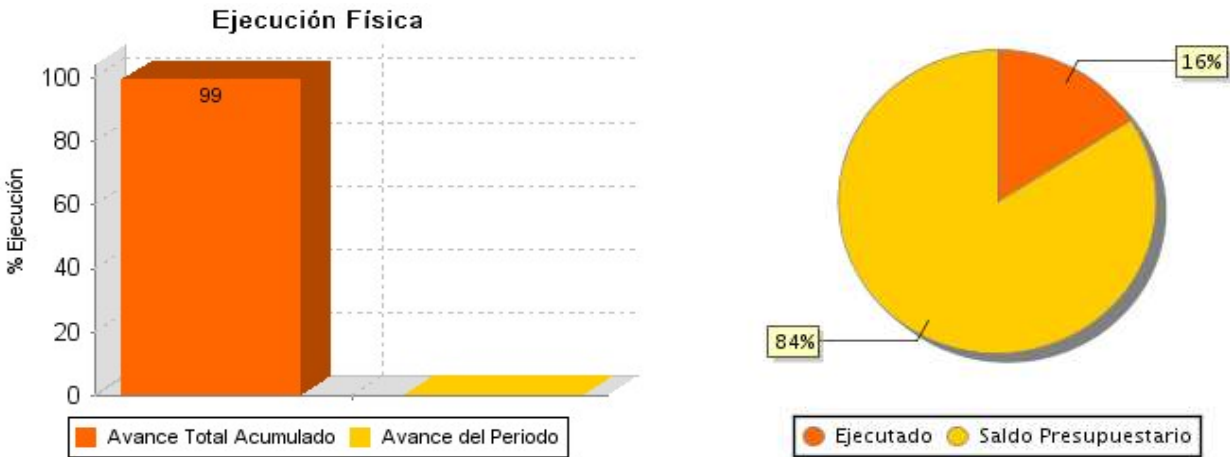


SITUACIÓN ACTUAL

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la ciudad de San Lorenzo se encuentra con recepción definitiva. La operación se encuentra actualmente a cargo de la ESSAP. En este primer cuatrimestre se ha cancelado parte de la deuda de los contratos de las firmas Constructoras y Fiscalizadoras para las Obras de Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo.

Proyecto		Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bah. Asunción					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		310					
Financiamiento		BID					
Costo del Proyecto		USD	62.317.000		GS.	491.585.661.429	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
451.927.986.123			39.657.675.306			91,93	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/06/2016			23/06/2021			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				96,29 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
34.773.629.536			6.716.393.062			19,31	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

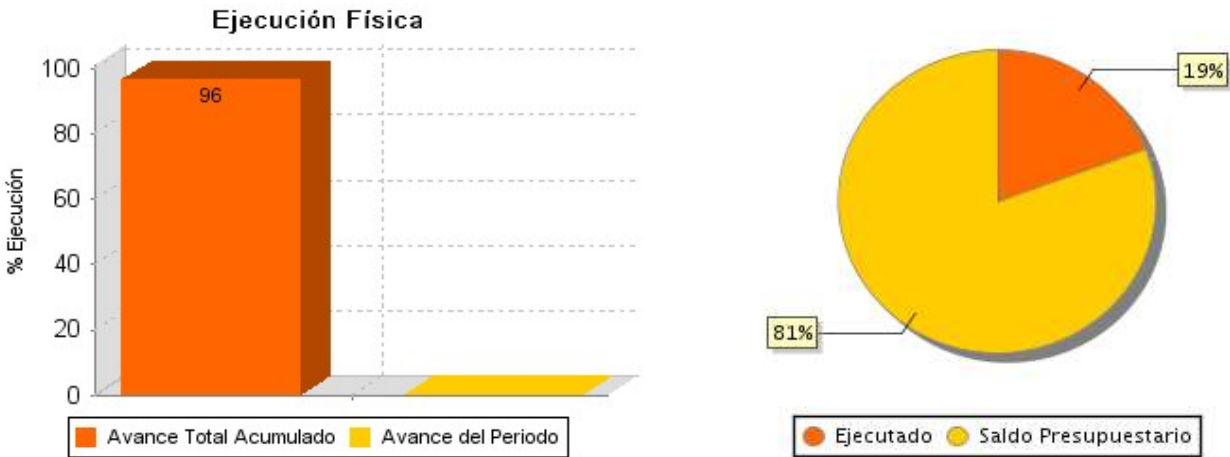


SITUACIÓN ACTUAL

En este primer cuatrimestre se ha cancelado parte de la deuda de los contratos de las firmas Constructoras y Fiscalizadoras para las Obras de Alcantarillado Sanitarios para Asunción. Cabe mencionar que las obras de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) han culminado.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Departamento Central			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		278			
Financiamiento		CAF, OFID, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto		USD	93.467.494	GS.	734.419.637.564
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
585.744.292.141		148.675.345.423			79,76 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/01/2018		31/12/2020			31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			97,15 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
78.779.834.999		2.378.146.059			3,02 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

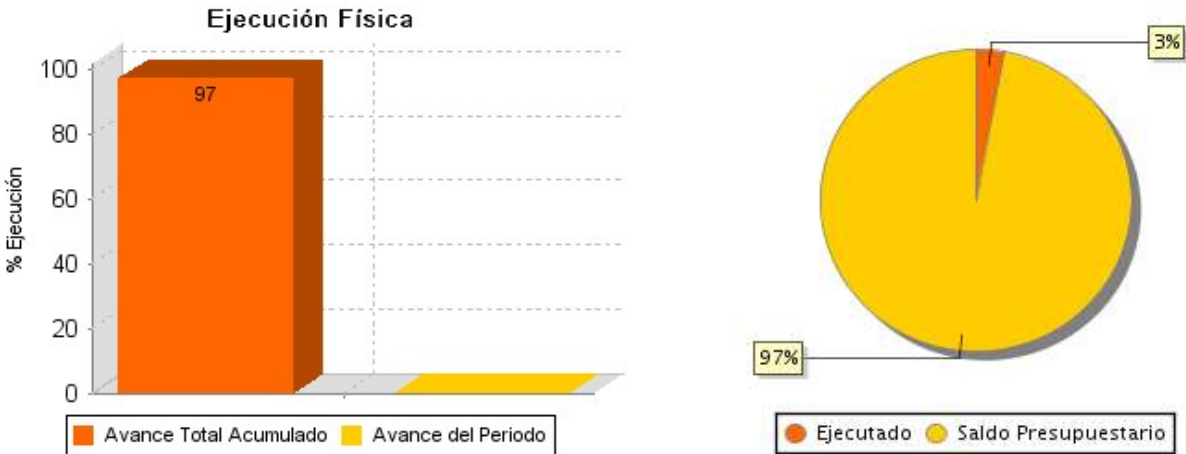

SITUACIÓN ACTUAL


Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Mejoramiento Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	275			
Financiamiento	CAF, OFID, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	121.195.993	GS.	813.749.161.145
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
731.565.116.206		82.184.044.939		89,90 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		24/03/2021		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Central		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00	%	100,00	%
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025	Porcentaje Ejecutado
27.300.000.000		0	0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

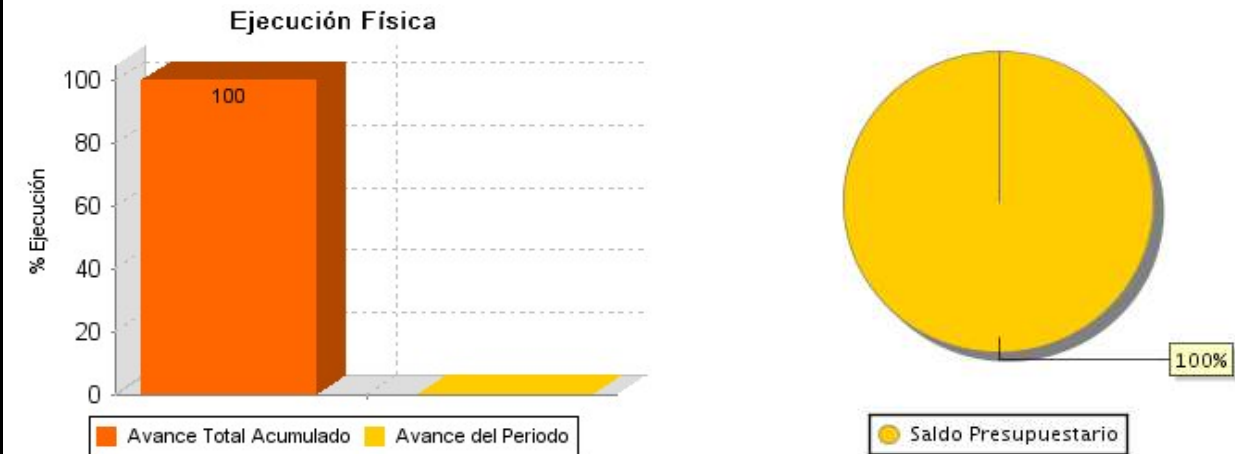


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no reportó la descripción de los avances correspondientes al primer cuatrimestre del año en curso.

Proyecto	Construcción del CIRS de Emboscada				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	273				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	49.800.000		GS.	224.100.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
172.884.330.756		51.215.669.244		77,15 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/02/2016		16/02/2018		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Asunción, Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			89,75 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
1.561.983.016		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

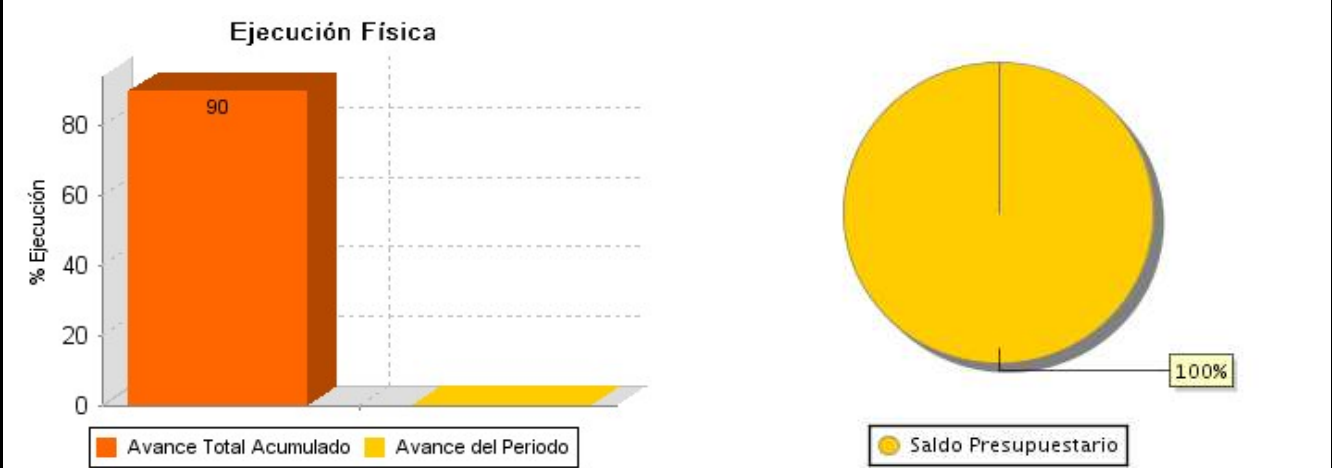


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del primer cuatrimestre del periodo fiscal 2025 la Unidad Ejecutora de Proyectos,no dio respuestas a las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		259			
Financiamiento		FONPLATA, LOCAL, OFID			
Costo del Proyecto		USD	125.250.000	GS.	1.129.367.243.085
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.071.065.920.916		58.301.322.169		94,84 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/05/2016		22/06/2021		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Alberdi, Guazú Cuá, Pilar, San Juan B. de Ñeembucú, Villa Franca				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,73 %			95,76 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
43.328.055.781		3.415.018.853		7,88 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

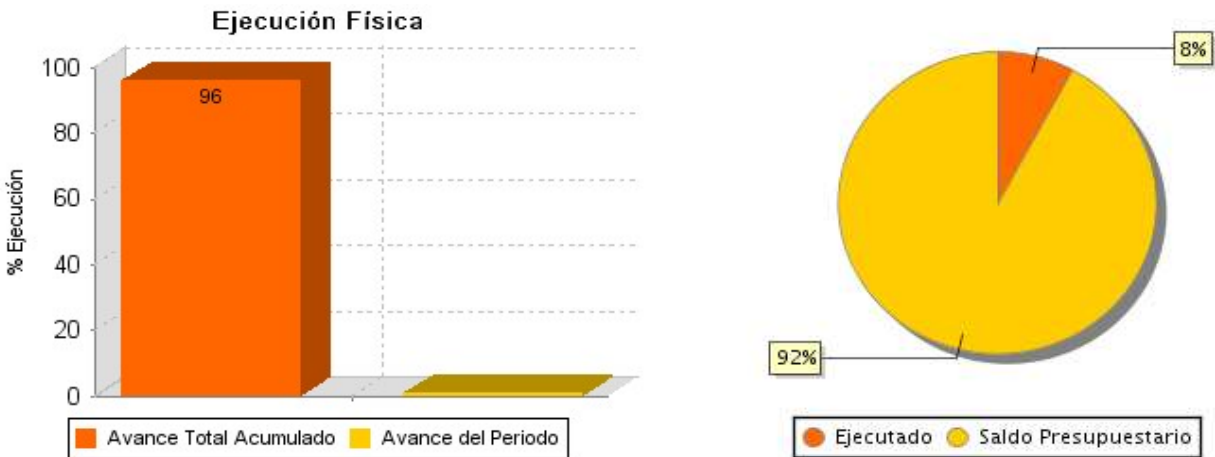


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, la Obra 1: que abarca desde el desvío de Alberdi hasta el Río Tebicuary y la travesía urbana de Villa Franca, se encuentra en etapa de recepción provisoria con obras culminadas. La recepción final esta prevista para Octubre/ 2025.

Con respecto a la Obra 2: Que se extiende desde el Río Tebicuary hasta Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar, la misma cuenta con Recepción Final.

Proyecto		Construcción Av. Costanera Norte, 2ª Etapa				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		235				
Financiamiento		FOCEM, LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	116.598.275		GS.	602.391.588.859
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
568.437.025.343			33.954.563.516		94,36 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
17/12/2014			17/12/2019		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0 %				96 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
2.418.493.004			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

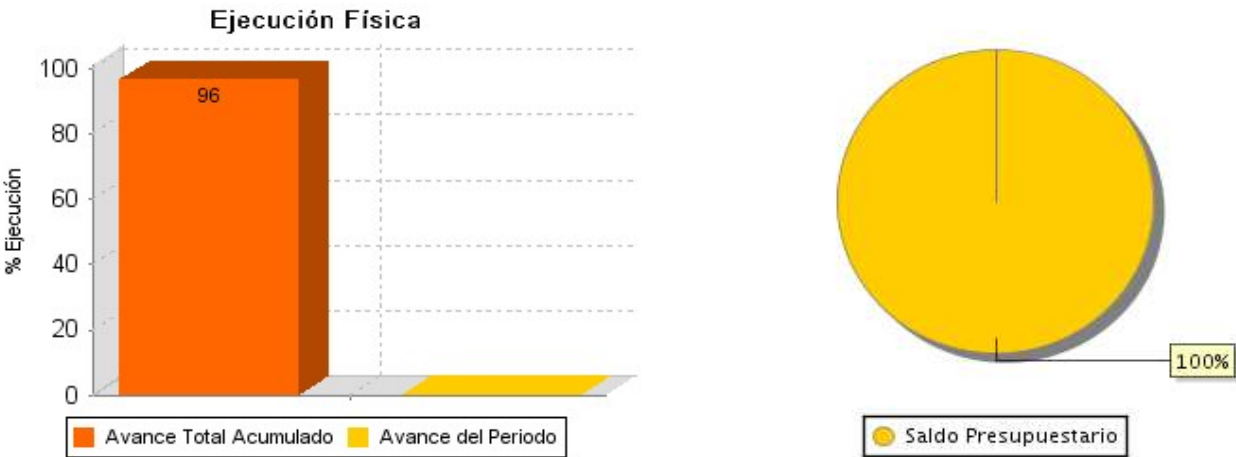


SITUACIÓN ACTUAL

La obra del proyecto se encuentra finalizada. La Unidad Ejecutora informó que se encuentran realizando gestiones dentro de la institución para los pagos de devolución de retenciones, intereses moratorios y saldos de deducciones pendientes. Así también la carga de gastos en el Sistema de Rendición de Cuentas del Organismo Financiador con el fin de enviarlo para correcciones o aprobación, para la posterior Auditoria Final del proyecto.

Proyecto	Mejoramiento Pavimentación, Corredores de Integración. Mantenimiento Red Vial (Fase II)				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	195				
Financiamiento	BID , LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	200.800.000		GS.	1.527.309.460.265
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.477.869.053.758		49.440.406.507		96,76 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/11/2013		16/09/2021		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
61.758.587.497		12.319.027.305		19,95 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

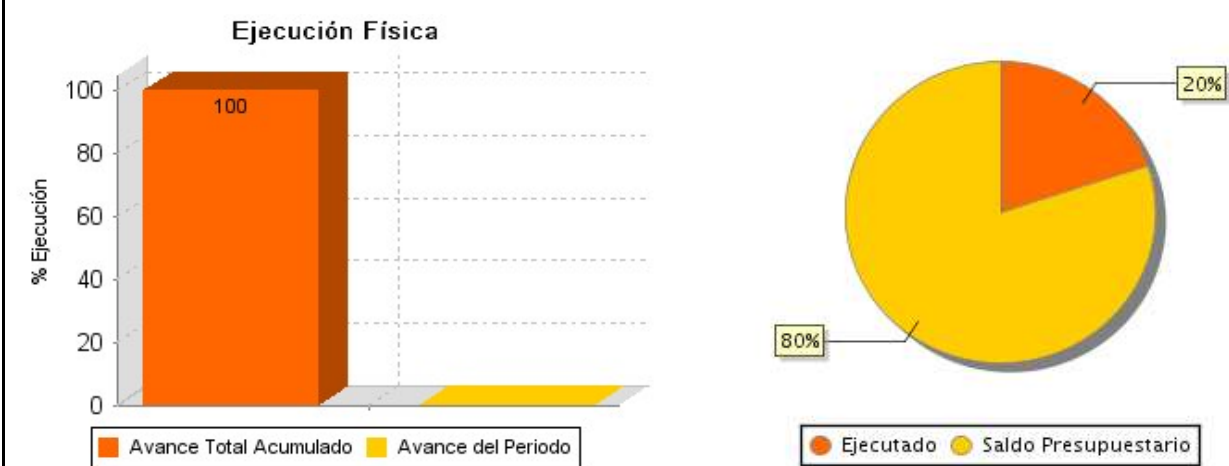


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto		Construcción Accesos Viales al Segundo Puente con Brasil			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		191			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	212.355.188	GS.	1.492.480.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
830.344.823.219		662.135.176.781			55,64 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
23/12/2020		23/12/2023			23/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Los Cedrales, Minga Guazú, Presidente Franco				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
22 %				80 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
284.746.882.939		76.078.552.377			26,72 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

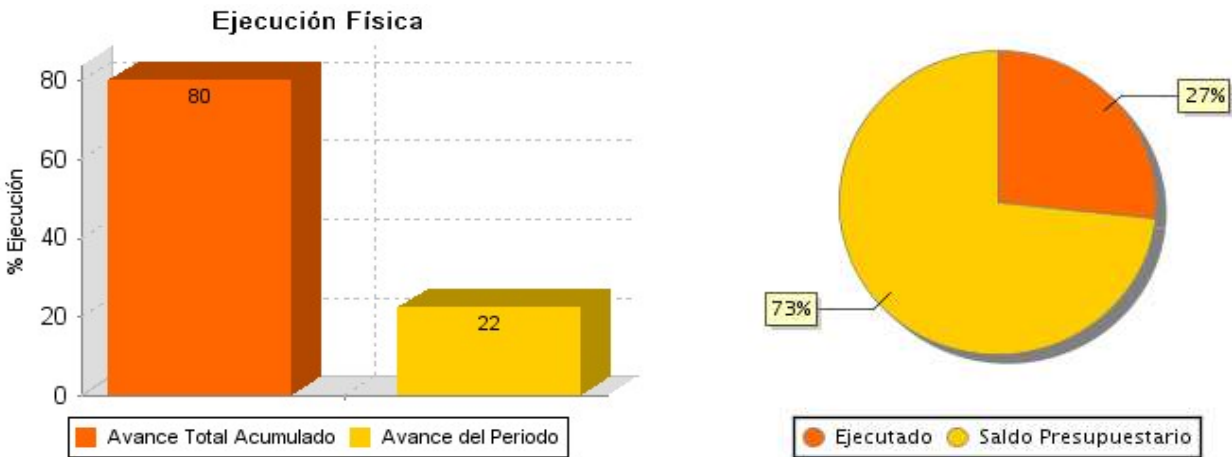

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo el proyecto presenta los siguientes avances:
Dentro Componente 1: Se encuentran concluidas las obras de construcción del Centro Fronterizo Primario de los accesos del lado paraguayo al Segundo Puente y la Terminal de Cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en la Ciudad de Presidente Franco junto con sus respectivas fiscalizaciones.


En lo referente a la actividad de Conexión a la Red Urbana existente, la obra se encuentra en la última etapa de construcción, siendo las principales actividades: sellado de las juntas de ambas alcantarillas celulares del tramo Interurbano, limpieza de las cunetas revestidas colmatadas en el tramo Interurbano, bacheo superficial en la Avenida Bernardino Caballero, tramo comprendido entre la Supercarretera y la Avenida Monday, repintado de la señalización horizontal en zonas mas desgastadas y limpieza de franja de dominio.

Con relación a la actividad de Acceso Rural (Lote 1 y 2) la obra presenta avances en los siguientes ítem: excavación no clasificada, terraplen, disipadores de hormigon, base granular CBR - Sub base granular estabilizada, capa de concreto asfáltico convencional de 1,5 km.

En tanto lo correspondiente al Componente 2, la construcción del Puente sobre el Río Monday, contiene avances en voladizos sucesivos + vigas pre-fabricadas, pilas, tablero, instalación de Servicios especiales.

Proyecto		Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstruccion Vial						
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
Código SNIP N°		162						
Financiamiento		CAF, LOCAL						
Costo del Proyecto		USD	285.000.000			GS.	1.643.841.538.888	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución		
1.484.557.365.438			159.284.173.450			90,31 %		
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga		
29/10/2014			31/12/2018			31/12/2025		
Ubicación Geográfica del Proyecto								
Departamental		Central, Ñeembucú						
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total			
2,27 %					95,22 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado		
126.970.374.538			14.487.628.468			11,41 %		

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

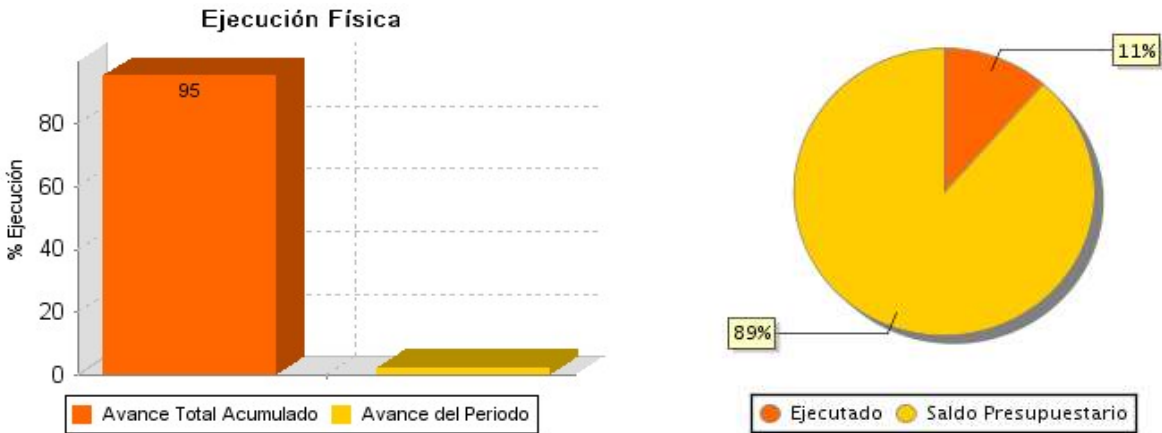

SITUACIÓN ACTUAL


En el presente periodo presentan los siguientes avances:

Componente 1
Las actividades 1, 2 y 3 estan concluidas.
Actividad 4; mantenimiento de 57,9 km de rutas pavimentadas mantenidas, siendo las principales actividades la limpieza de franja de dominio y bacheo superficial.
Actividad 5: presenta avances de 1,5 kilometros de carpeta asfáltica.
Las Actividades 6 y 7 se encuentran en etapa de corrección de los Pliegos de Bases y Condiciones.
Actividad 8: se encuentra concluida.
Actividad 9; se procedió al pago del Anticipo Financiero.

Componente 2
Actividad 1; servicio concluido.
Actividades 2 y 3, los servicios se encuentran concluidos, a la espera de los pagos de las últimas carpetas de afectación para liberación de franja de dominio.
Actividad 4; el servicio fue rescindido por Resolución Ministerial.
Actividad 5: el servicio presentó 4 informes mensuales, el servicio concluyó el 30/04/2025, a la espera de la presentación del informe final.
Actividad 6; la fase de diseño, ubicación y traza concluido, el servicio se encuentra en etapa de catastro (liberación de franja de dominio).
Actividad 7; el servicio presentó 3(tres) informes mensuales, servicio concluido, a la espera de presentación de informe final.
Actividades 8 y 9, se encuentra a la espera de la adjudicación de las obras,
Actividad 10 y 11; Servicios han concluido.
Actividad 12; Sin movimiento en el presente periodo, a la espera la presentación del informe correspondiente a la Auditoria al Ejercicio Fiscal 2024.
Actividad 13; la adjudicación esta con protesta en la DNCP.

Proyecto		Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		154					
Financiamiento		BID , JICA , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	332.984.000		GS.	2.026.829.087.180	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
1.641.373.700.846			385.455.386.334			80,98 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/10/2014			28/10/2021			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Alto Paraná, Itapúa						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,28 %				93,42 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
74.060.280.418			29.166.267.973			39,38 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

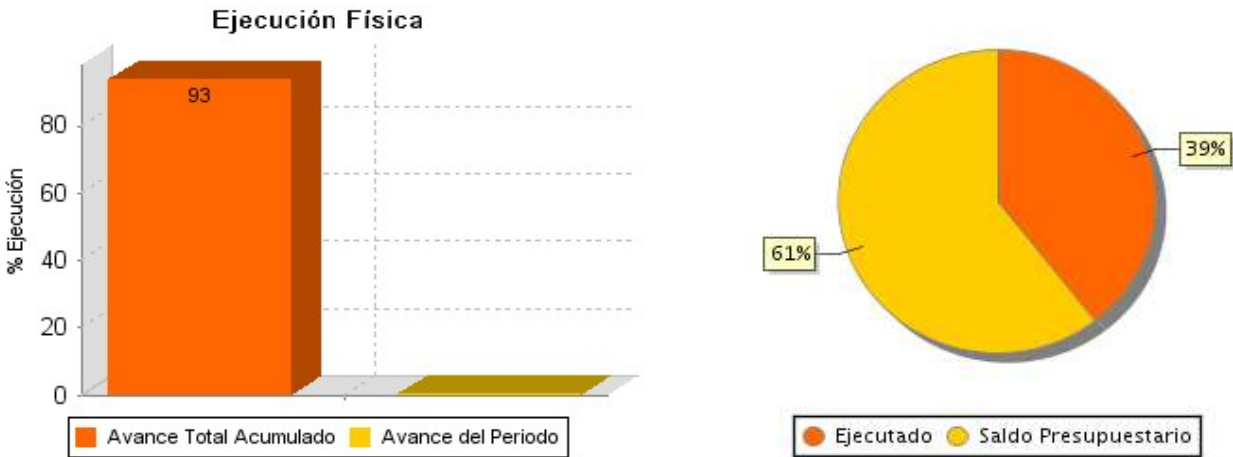


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto		SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		149					
Financiamiento		AECID, BID , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	88.000.000		GS.	635.532.769.647	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
584.090.964.550			51.441.805.097			91,91 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
23/11/2012			23/11/2017			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00		%		99,98		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
39.972.087.208			4.797.327.410			12,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

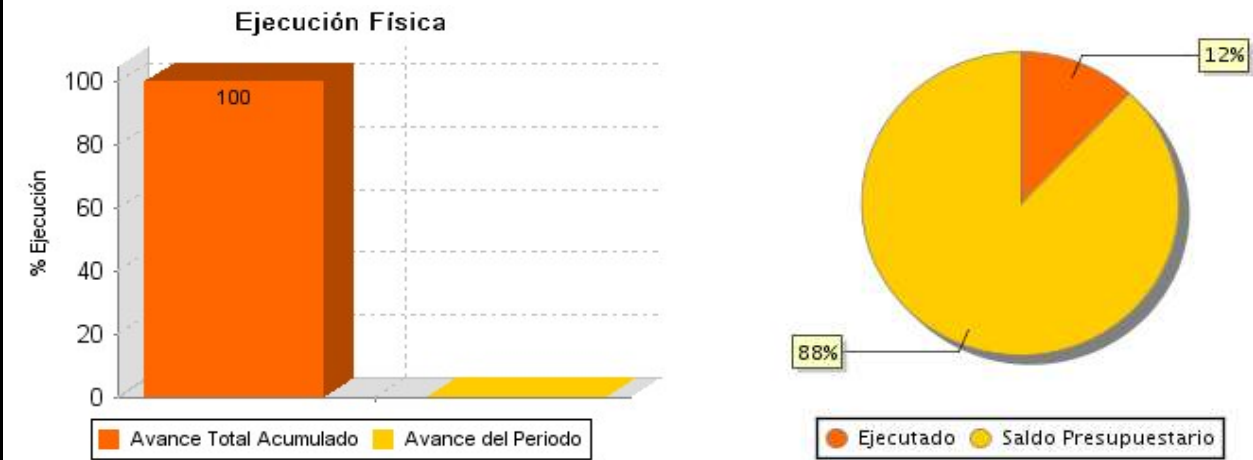

SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de Construcción de Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central, las mismas cuentan con recepción definitiva. Asimismo, las obras de Construcción de Redes de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Indígenas y localidades menores beneficiarias del Proyecto del Acueducto del Chaco Central, se encuentran concluidas.

En cuanto a las obras de Infraestructura para Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias, se reporta lo siguiente:


Frente de Obra Ciudad de Tobati: Avances acumulados registrados al cierre del primer cuatrimestre 2025: Redes Básica: 88%, Redes Condominiales: 86,9%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión: 20,2%, PTAR: 30,15%.

Frente de Obra Ciudad de Caacupé: Avances acumulados registrados al cierre del primer cuatrimestre 2025. PTAR avance general: Tratamiento preliminar 100%, Lagunas artificiales 100%, Obras civiles 100%, Servicio de agua potable 100%, Desagüe pluvial 88%, Humedales artificiales 100%, Empastado 95%, Cercado perimetral 60%, Construcción redes nuevas: 100%, Construcción de Línea de Impulsión: 96% (cruce con tunelera: 100%), tendido de tuberías 99%, registros contruidos 100%, Estaciones de Bombeo: EB1: 55%, EB2: 95%, EB Intermedia: 60%, Conexiones Domiciliarias: 2.439 conexiones en total. Se financiarán con contrapartida local.

Mientras que en la ciudad de Horqueta las obras concluyeron en el primer semestre del año 2024 e Inauguradas en noviembre de 2024 que incluye Redes Condominiales 100%, Redes Básicas 100%, PTAR 100%, Mejoramiento de Sistema de Agua 100% (En Proceso de Traspaso a la Junta de Saneamiento San Antonio de la Ciudad de Horqueta, que será la responsable de la Operación y Mantenimiento respectivo).

Proyecto	SP Reconversión Zona Puerto de Asunción Centro Oficina, Contrato P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	83				
Financiamiento	BID , LOCAL, OFID				
Costo del Proyecto	USD	199.000.000		GS.	1.102.749.246.391
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.107.005.907.043		-4.256.660.652		100,39 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/12/2013		27/12/2018		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			59,81 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
6.944.538.090		1.822.569.340		26,24 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

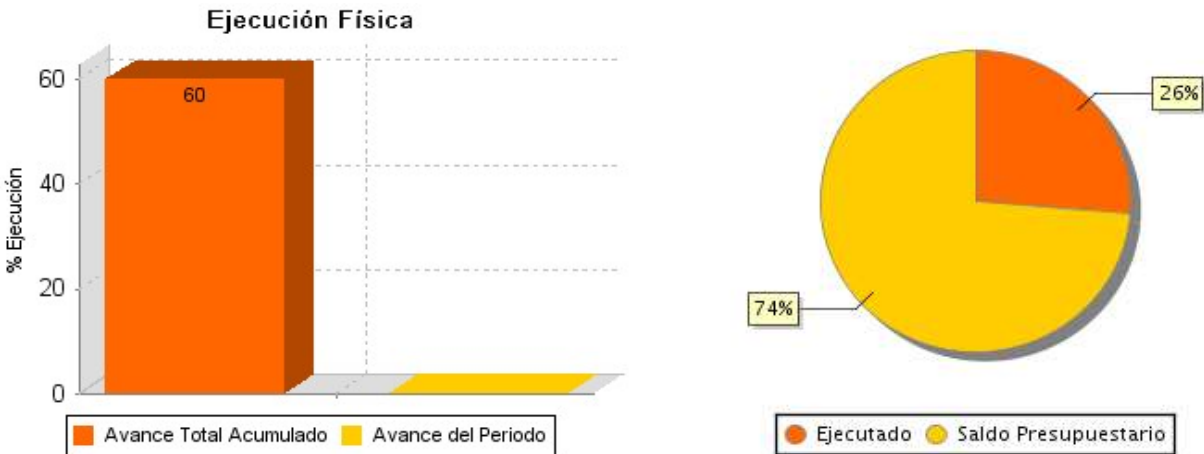


SITUACIÓN ACTUAL

La UEP no ha reportado su avance físico del presente cuatrimestre en el plazo establecido.

Proyecto		SP Proyecto Acueducto					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		80					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	506.204.353.201	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
435.500.123.970			70.704.229.231			86,03 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
26/10/2012			26/01/2015			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
13.487.527			8.610.160			63,84 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

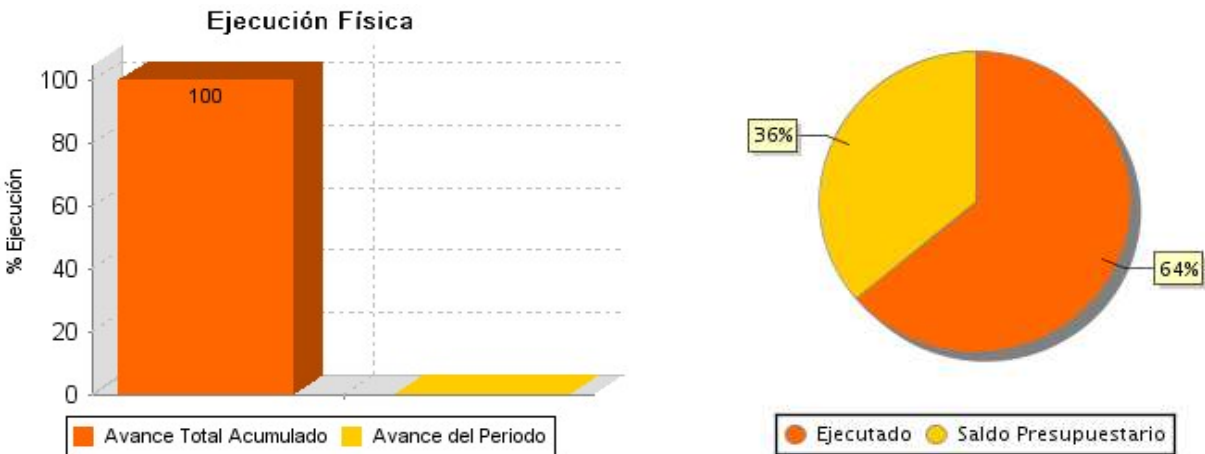


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre de la elaboración de éste informe, la Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido a las observaciones remitidas por ésta dirección.

Proyecto	SP FOCM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	38				
Financiamiento	FOCEM, LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	160.295.050		GS.	865.659.762.653
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
754.214.069.832		111.445.692.821		87,13	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/10/2010		14/08/2016		31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Concepción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,5 %			99,8 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
2.490.696.004		44.698.338		1,79 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

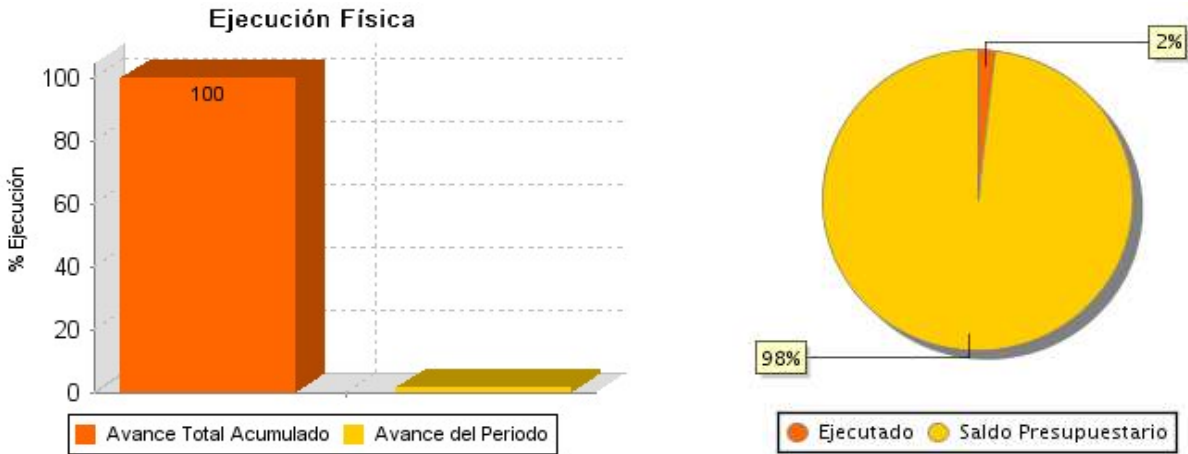


SITUACIÓN ACTUAL

La obra se encuentra culminada. La Unidad Ejecutora informó que se aguarda la emisión de los códigos de reajuste correspondientes para proceder al pago de las deudas pendientes, las cuales corresponden a saldos por ejecución de obras (certificados de obra, devolución de retenciones, IVA y Renta). En relación con el componente de Plan de Gestión Ambiental, se ha solicitado autorización al MADES para ejecutar dicho proceso mediante contrato con la Corporación Andina de Fomento en la zona de intervención

Proyecto	SP Programa Nacional de Caminos Rurales 2da Etapa Fase II BID 2163/OC-2164/BL-OFID				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	36				
Financiamiento	BID, JICA , LOCAL, OFID				
Costo del Proyecto	USD	170.000.000		GS.	925.666.587.755
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
838.089.630.148		87.576.957.607		90,54 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2011		04/01/2016		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
97.142.475		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

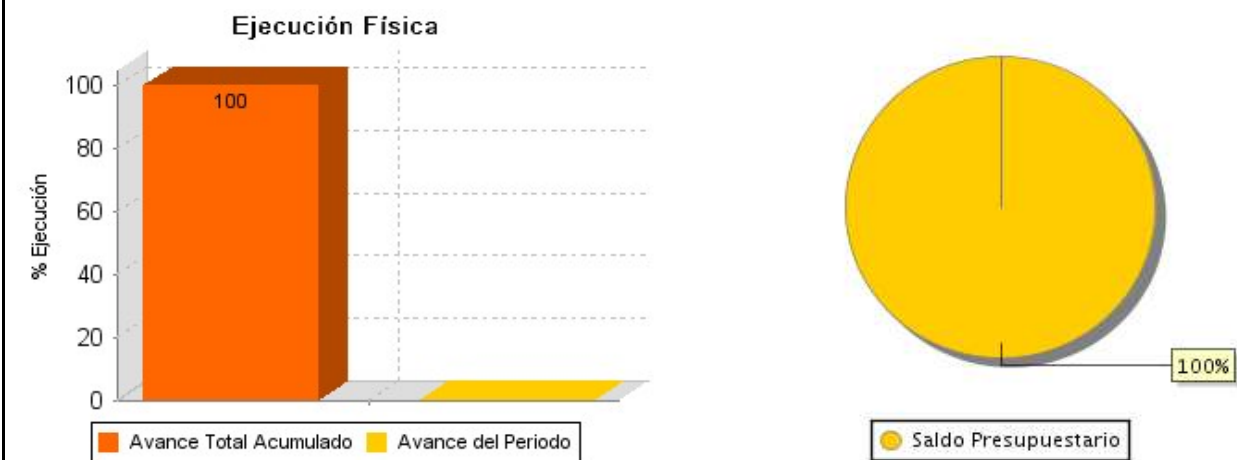


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras de éste proyecto están terminadas en su totalidad. Los porcentajes pendientes en ejecución, corresponden a los pagos por Devoluciones de Retenciones, reajustes e interés moratorios de los llamados 09/2014 - Construcción de Obras de la Muestra de los Caminos Vecinales en los Departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y Concepción, 62/2014 Rehabilitación de tramos de Caminos Vecinales en el Departamento en Concepción, 81/2012 - Construcción de Puentes de HºAº en los Departamentos de Guaira, Misiones y Paraguari, 199/2015 - Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los de Departamentos de Guaira y Misiones. Para el llamado 93/2012 - Consultoría para la implementación de Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Construcción de Puentes en los Departamentos de Paraguari, Guairá y Misiones.

Se encuentra pendiente el pago de intereses moratorios. Al respecto se informa también que se encuentran en proceso la obtención de los Códigos de Contratación ante las instancias del MOPC. Por tanto, una vez terminado el proceso de la obtención del Código de Contratación se procederá a honrar todos los certificados de acuerdo a la disponibilidad Presupuestaria de este Proyecto.

Proyecto		Transferencia PROCENCIA II			
OEE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			
Código SNIP N°		958			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 663.549.337.479
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
200.691.935.765		398.582.064.235			30,24 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
23/06/2021		22/06/2027			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
2,62 %				47,94 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado
148.363.069.401		10.698.111.097			7,21 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

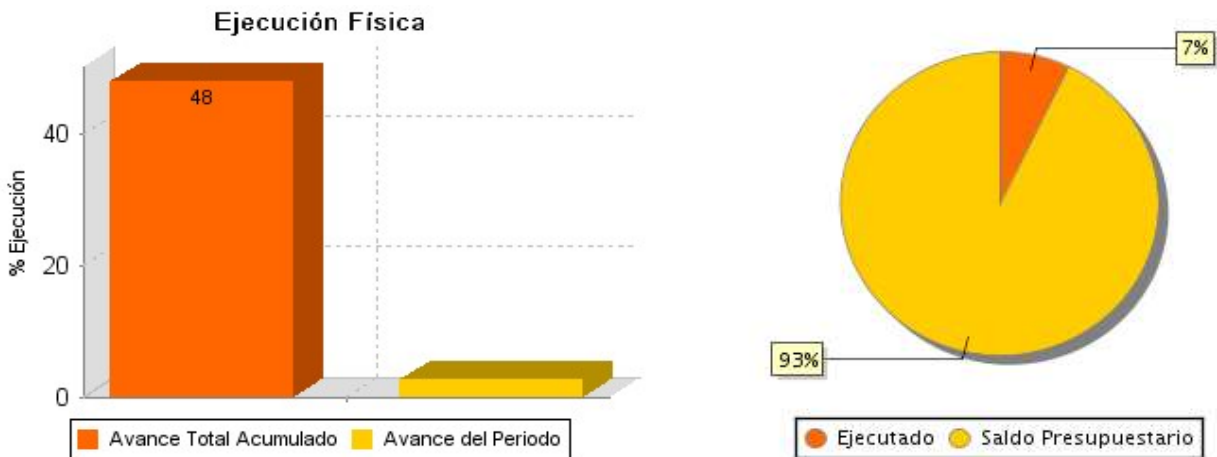

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre la Unidad Ejecutora de Proyectos reportó que se gestionaron desembolsos y se aprobaron informes técnicos en las convocatorias de Iniciación (INIC01) y Proyectos de I+D (PINV01); además, en las nuevas convocatorias INIC02 y PINV02 se recibieron más de 600 postulaciones, actualmente en proceso de admisión.

Se aprobaron las guías de bases y condiciones para eventos científicos y se avanzó en la evaluación de proyectos estratégicos y multicéntricos. Se adjudicaron más de 60 nuevas becas, se firmaron contratos y se realizaron desembolsos en los instrumentos de posgrados e incentivos, y se lanzó una nueva convocatoria de estancias con más de 25 postulaciones en etapa de evaluación.


En el Sistema Nacional de Investigadores se completaron más de 300 evaluaciones para la convocatoria de permanencia 2024, se implementaron flujos operativos en las convocatorias de inserción, y se formalizaron contratos para los tres nuevos adjudicados. Así también, se avanzó en la implementación de la Estrategia Nacional, se revisaron los reglamentos del Premio MERCOSUR y del Concurso de Fotografía, y se avanzó en el cierre de proyectos de comunicación.

Por otro lado, se aprobó el informe final de diseño del Espacio Interactivo, se adecuó la infraestructura y se realizaron pagos, mientras que en Ferias y Olimpiadas se firmaron 12 actas de cierre y se aprobó la Guía de Bases y Condiciones de la nueva convocatoria COFA04, con lanzamiento previsto para mayo.

Se dio continuidad a la auditoría externa y se elaboró el TDR para la Evaluación Intermedia del Programa.

Proyecto	Innovación en Empresas del Paraguay				
OEE	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				
Código SNIP N°	568				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	10.000.000		GS.	74.701.408.760
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
67.962.622.059		6.738.786.701		90,98 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
21/09/2017		21/09/2022		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,27 %			94,83 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
6.975.643.999		3.045.533.258		43,66 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

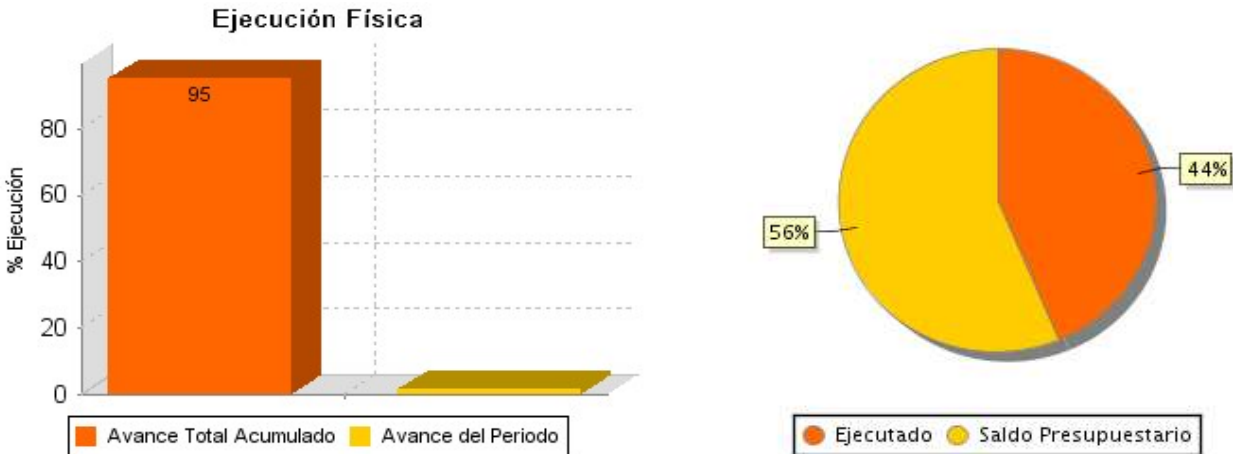

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el primer cuatrimestre del año 2025, se realizaron transferencias finales a proyectos finalizados en el mes de diciembre 2024, como también, acompañamiento técnico y financiero a un proyecto de servicios tecnológicos en proceso de finalización.

Se ejecutaron los contratos de consultoría de los estudios prospectivos de los desafíos, agua y energía para el futuro; alimentos de alto valor y productos de la bioeconomía, ciencia paraguaya más competitiva y conectada con la frontera del conocimiento.

Además, se realizó encuesta de Innovación, que se encuentra en etapa de final de informe, como también transferencias en concepto de premiación a 26 MIPYMES que fueron formadas en Gestión tecnológica y de la Innovación, y 4 transferencias en concepto de premiación a iniciativas de Innovación Pública.

Por otro lado, finalizó la auditoria correspondiente al periodo enero a diciembre 2024. Se encuentra en proceso el llamado para la evaluación final y de impacto del proyecto.

Proyecto	Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Salud				
OEE	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
Código SNIP N°	855				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	45.000.000	GS.	279.000.000.620	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.917.347.020		277.082.653.600		0,69 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2023		24/04/2029		N/A	


Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional	N/A
----------	-----

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4	%	7	%

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025	Porcentaje Ejecutado
111.573.131.410	1.087.375.663	0,97 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

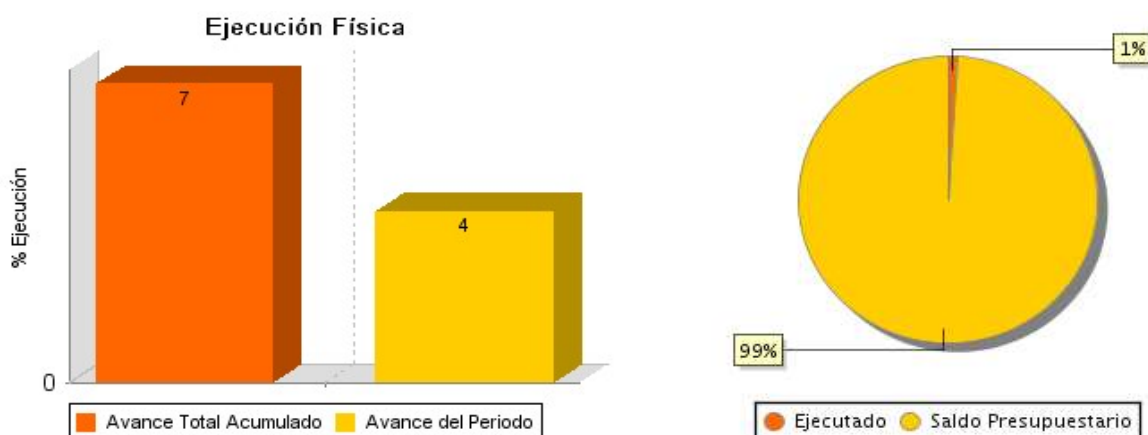

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora informó que se publicó el llamado LPI 01/2025 para la contratación de empresas constructoras para la Construcción de 55 Unidades de Salud Familiar (USF) de la primera etapa.

En cuanto a la firma Consultora para fiscalización de 55 USF de la 1ra etapa (LPI), Al 24/04/2025, se ha solicitado la verificación de los Pliegos a DNCP, para publicación.

Se encuentra en etapa preparación los Términos de Referencias para contratación de firma Consultora para Diseño de 45 USF - 2da. Etapa.

En proceso de Resolución Ministerial para el inicio de llamado de manifestación de interés para firma Consultora para el Fortalecimiento de los Agentes Comunitarios y Unidades Regionales de Promoción de la Salud.

En fecha 23/04/2025 se publicó el llamado para contratación de una firma consultora para el Curso de Formación en Factores Determinantes de la Salud para Agentes Comunitarios y Unidades de Promoción de la Salud.

En preparación de Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas para contratación de firma Consultora para la actualización de manuales de APS y Promoción de la Salud.


Por resolución SG N° 226/2025 se autorizó el llamado de manifestación de interés para la contratación de firma Consultora para la actualización de la guía de planificación de la comunicación comunitaria.

Asimismo, se ha iniciado los siguientes procesos de Adquisiciones: Tablet para APS y Equipos Informáticos, se recibe comunicación de DGTIC vía correo electrónicos las observación emitida por MITIC a las especificaciones técnicas.

Adquisición de equipamiento para unidades de promoción de la salud a nivel local y regional, al 28/03/2025, se emite a la DGTIC las documentaciones a fin de solicitar la autorización y verificación a las especificaciones técnicas a la DGTIC.


Contratación de Firma Consultora para el Desarrollo de aplicaciones para el MSPBS (Desarrollo de APP + provisión de licencias), se ha remitido a la DTIC, los Términos de Referencia para su verificación.

Adquisición de rodados UGP, se ha remitido al equipo económico nacional, nota de solicitud de autorización.

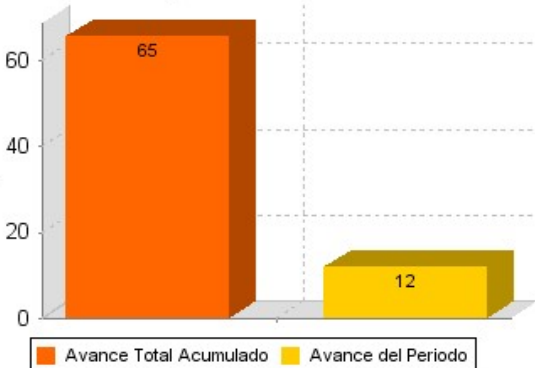 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública					
Proyecto		Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud					
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
Código SNIP N°		805					
Financiamiento		BIRF					
Costo del Proyecto		USD	115.000.000		GS.	875.598.712.272	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución		
506.432.004.105		369.166.708.167			57,84 %		
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga		
26/03/2020		26/03/2024			30/06/2026		
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Amambay, Central, Cordillera, Paraguari					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
12 %				65 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado		
203.443.084.114			38.522.236.340		18,94 %		
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO							
Ejecución Física  Avance Total Acumulado Avance del Periodo  Ejecutado Saldo Presupuestario							
SITUACIÓN ACTUAL							
La Unidad Ejecutora informó que actualmente existen 188 obras en distintas fases de ejecución: 28 Unidades de Salud Familiar (USF) operativas, 48 terminadas a la espera de RRHH, y 32 con finalización prevista en 2025 (algunas en etapa de proyecto ejecutivo y otras en construcción). En salud mental, se contrataron servicios para diseño de proyectos ejecutivos para la Construcción de 2 Centros Comunitarios y Readecuación de 4 Hospitales Distritales. Respecto al equipamiento: las USF operativas cuentan con dotación completa; además se dispone de equipamiento pendiente de distribución según cronograma de habilitación para 56 USF. Además, se realizó el llamado para Adquisición y puesta en marcha del Call Center (sistema de atención en crisis de salud mental). En cuanto a capacitación se realizaron a) cursos en Líneas de Cuidado Priorizados, dirigido a 3.318 profesionales, logrando una tasa de certificación del 70%; b) Capacitación sobre enfoque intercultural y derecho a la salud de pueblos indígenas, con 841 profesionales capacitados; c)Talleres de planificación participativa para municipios saludables, con 697 participantes; d) Formación en atención centrada en las personas, con 85 profesionales de hospitales y servicios de salud; e) Capacitación Formador de Formadores en la Guía de Intervención para mhGAP (programa de salud mental), con 170 participantes Se implementó el modelo de financiamiento basado en resultados en las 18 regiones sanitarias. Se transfirieron recursos a 248 Consejos Locales de Salud, por más de Gs. 10.500 millones. Se elaboraron 140 Planes de Microredes de Salud y 101 Planes Locales Participativos. Con relación al Plan de Pueblos Indígenas fue actualizado a reestructura del 2024 al 2026 en estado de implementación; Se planifican acciones alineadas a la nueva línea de salud mental (en revisión final); y se realiza seguimiento a la consultoría de apoyo al CONASAPI para 10 actividades previstas en el 2025. Se realizó la adquisición e instalación de 5 Plantas Generadoras de Oxígeno tipo PSA, con contrato firmado y ejecutado con avance físico del 100%, plantas instaladas en 5 hospitales (en etapa final de ajustes de un equipo instalado)b) Equipos de terapia intensiva: adjudicación parcial (8 ítems adjudicados, 2 desierto). En proceso de entrega de los ítems adjudicados y en proceso de gestiones para re licitación de los desierto. Logros acumulados: adquisición de 30 ambulancias Tipo 4x2 (11 unidades) y 4x4 (19 unidades) para el servicio de emergencia médica extrahospitalaria; provisión y distribución de insumos médicos y medicamentos a todo el país; y adquisición de 500 balones de oxígenos.							

Proyecto		Construcción Sist.AguaPot.y.San.Peq.Ciud.Com.Rural.e.Indig.			
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°		555			
Financiamiento		BID , GOBIERNO ESPAÑOL			
Costo del Proyecto		USD	60.000.000	GS.	467.760.332.466
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
361.593.817.877		106.166.514.589		77,30 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
28/08/2018		28/08/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			85 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
77.197.522.503		19.022.348.285		24,64 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

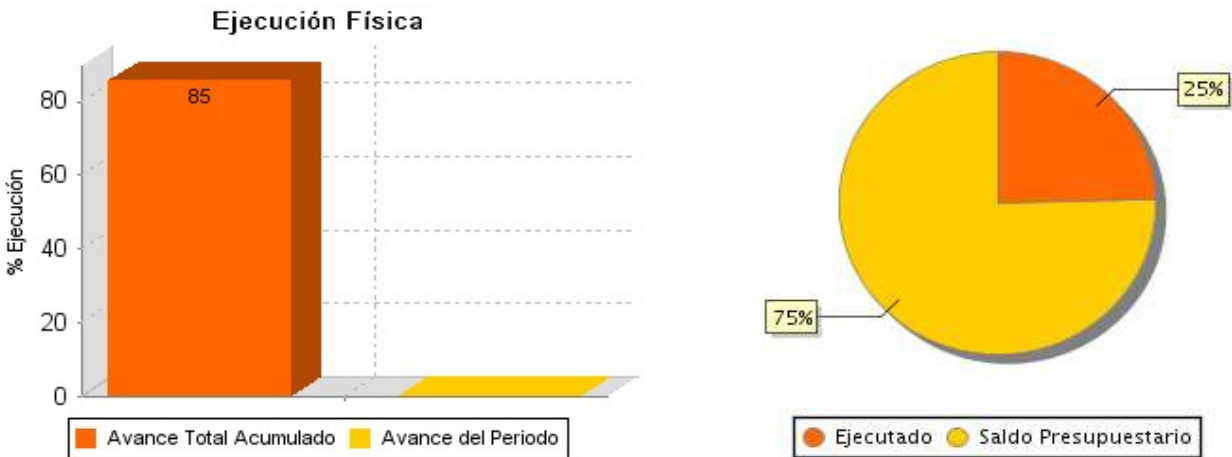


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.

Proyecto		Investigación ,Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud					
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
Código SNIP N°		153					
Financiamiento		FOCEM, LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	3.011.806		GS.	27.787.981.272	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
18.593.008.248			9.194.973.024			66,91 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
20/12/2011			20/12/2014			31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Internacional	Argentina, Brasil, Paraguay						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2 %				94 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
7.113.815.514			215.198.400			3,03 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

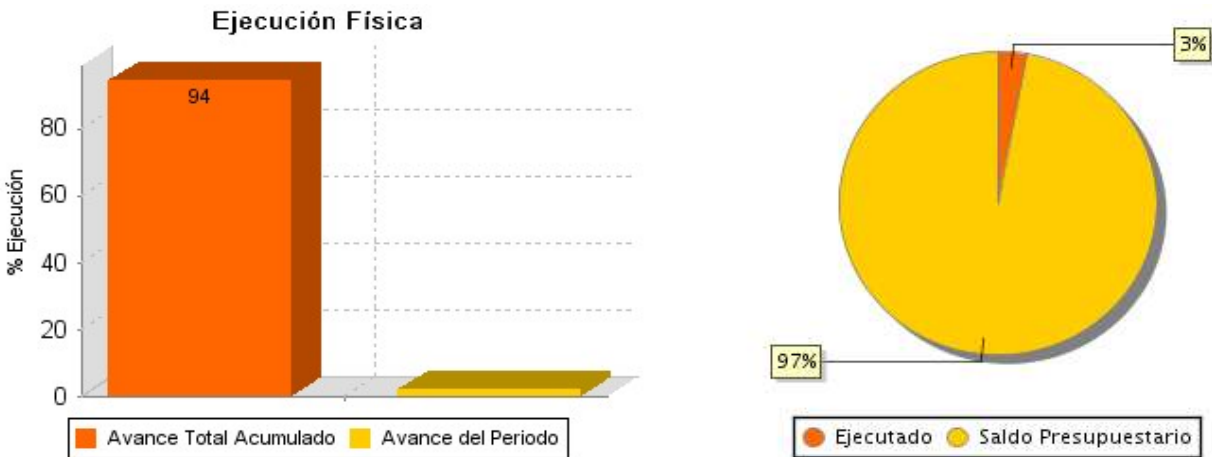

SITUACIÓN ACTUAL

El laboratorio se encuentra concluido; sin embargo, la auditoría contratada por la Unidad Técnica FOCEM ha señalado observaciones que deben ser subsanadas para proceder a la recepción provisoria de la obra, a cargo de la constructora Alfa y Omega S.A.


El proceso de adquisición de equipos de laboratorio se encuentra adjudicado y actualmente en etapa de firma de contratos con los proveedores para la posterior recepción de los equipos. Dado que algunos ítems fueron declarados desiertos, se prevé la realización de un nuevo llamado para completar la adquisición de dichos componentes.

Con relación al llamado para la provisión de reactivos e insumos, este se encuentra totalmente adjudicado, quedando pendientes pagos a los proveedores.

En cuanto al componente académico, se aguarda la defensa de dos tesis del Doctorado en Salud para la conclusión total del proceso. Los demás investigadores ya han defendido sus respectivas tesis de grado. Asimismo, dos bioquímicas investigadoras han tramitado la obtención del Título de Doctorado en Salud.

Proyecto		SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDIGENA (FOCEM)					
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL					
Código SNIP N°		50					
Financiamiento		FOCEM, LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	39.470.702		GS.	104.732.692.220	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
80.041.824.383			24.690.867.837			76,42 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/05/2008			16/05/2013			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0 %				95 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 30/04/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
8.723.460.055			3.349.214.493			38,39 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

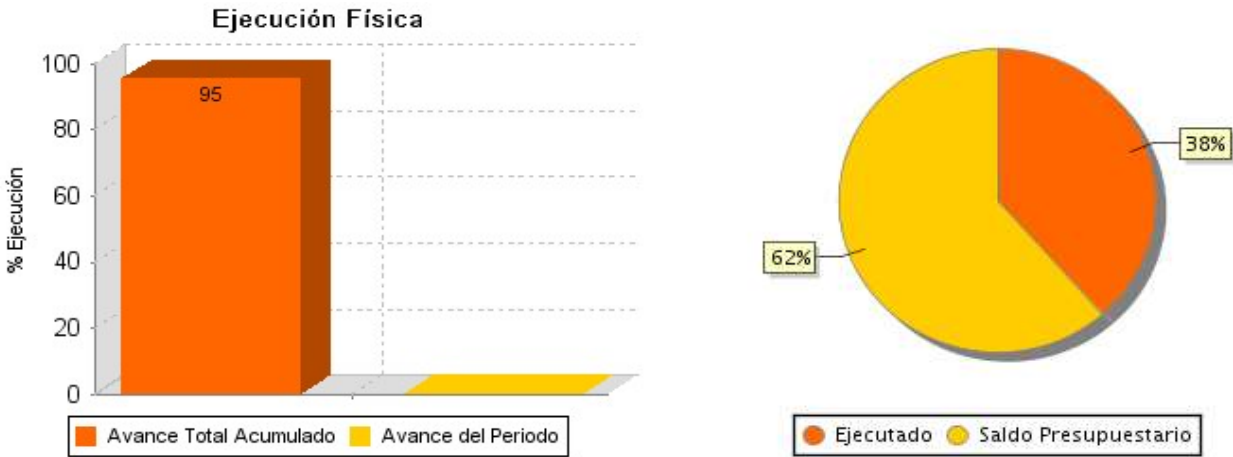

SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.
