

Informes cuatrimestrales


2do. Cuatrimestre

2025



Proyecto		Mejoramiento Energético en el Sector Industrial					
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO					
Código SNIP N°		784					
Financiamiento		BID , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	40.000.000		GS.	240.000.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
347.775.331			239.652.224.669			0,14 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
23/06/2022			23/06/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0 %				1 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
37.500.000.000			226.636.976			0,60 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

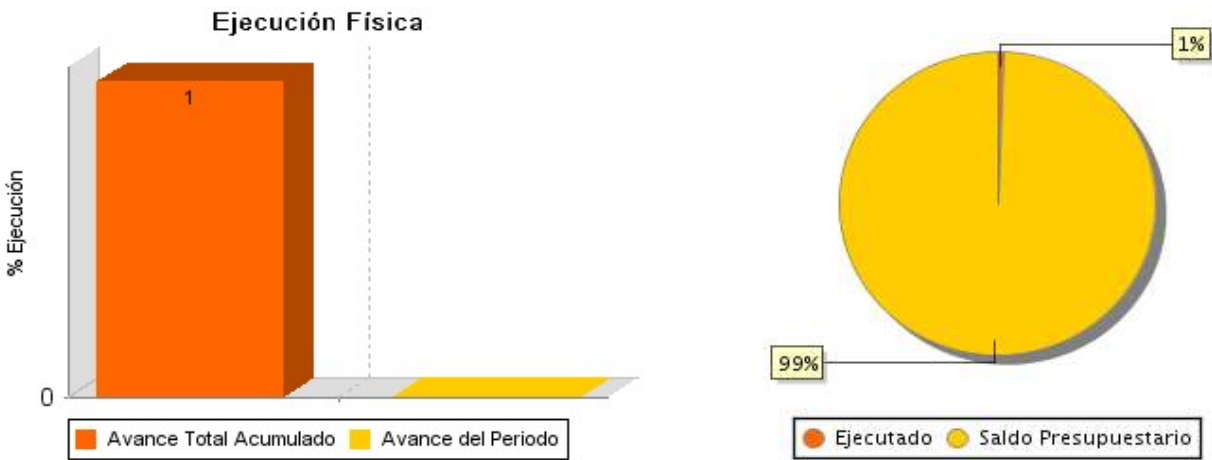


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó el informe de avance físico.



Proyecto		Mejoramiento y Amp. de Financ. de Inver. para el Sec Agrop.				
OEE		AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO				
Código SNIP N°		862				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	188.035.200.000
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
84.442.132.048			103.593.067.952		44,91 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
1/6/2024			1/7/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
16 %				33 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/2025		Porcentaje Ejecutado	
151.000.000.000			46.042.338.191		30,49 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

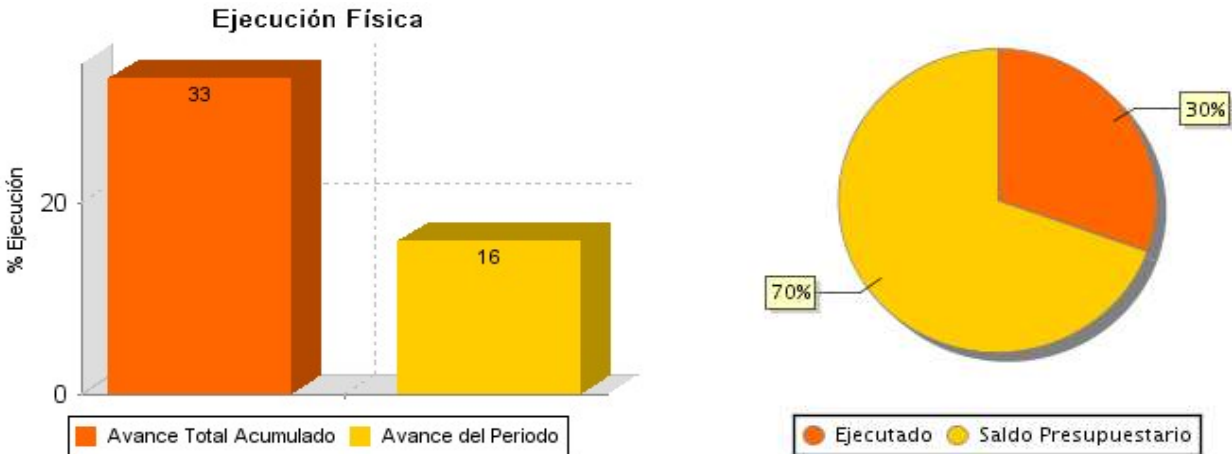


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó el informe de avance fisico en el presente periodo

Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión 500 kV Yacyreta-Villa Hayes			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	159			
Financiamiento	BEI, BID, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	227.285.710	GS.	1.418.117.767.775
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.228.710.328.336		189.407.439.439		86,64 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/07/2014		31/07/2021		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción, Central, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %		100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	
15.959.472.797		6.102.621.824	
		Porcentaje Ejecutado	
		38,24 %	

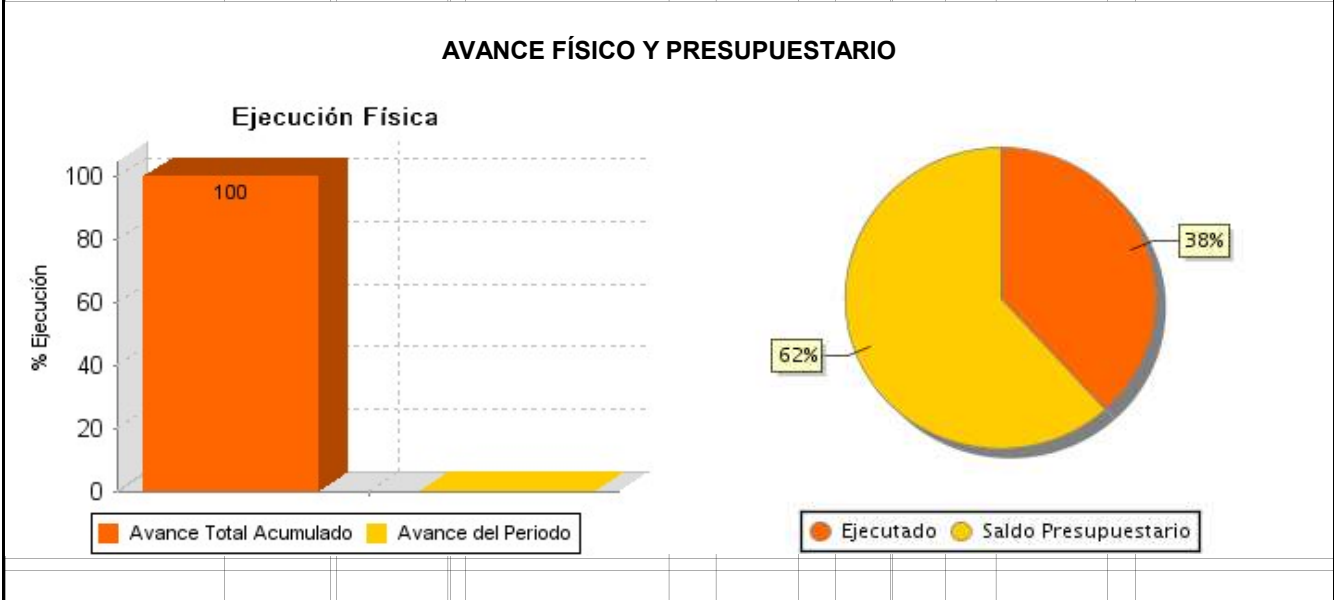

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el periodo de referencia, se encuentran en proceso los pagos de los Estados de Cuentas finales de los Contratos correspondientes a las siguientes Licitaciones: LPI 1503/2019; LPI 1340/2017 ; LPI 1514/2019; y, LPI 1563/2020.

Siguen realizándose los pagos pendientes por liberación de franjas de servidumbre a los propietarios afectados por la Línea de Transmisión de 500 kV.

Proyecto	Manejo de Pasivos Ambientales del Sist. Eléctrico de la ANDE			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	160			
Financiamiento	BID, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	5.286.000	GS.	53.708.085.988
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
21.820.851.767		31.887.234.221		40,63 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/07/2014		30/06/2022		31/12/2026


Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total
0,00 %	100,00 %

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
3.000.000.000	1.718.624.190	57,29 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

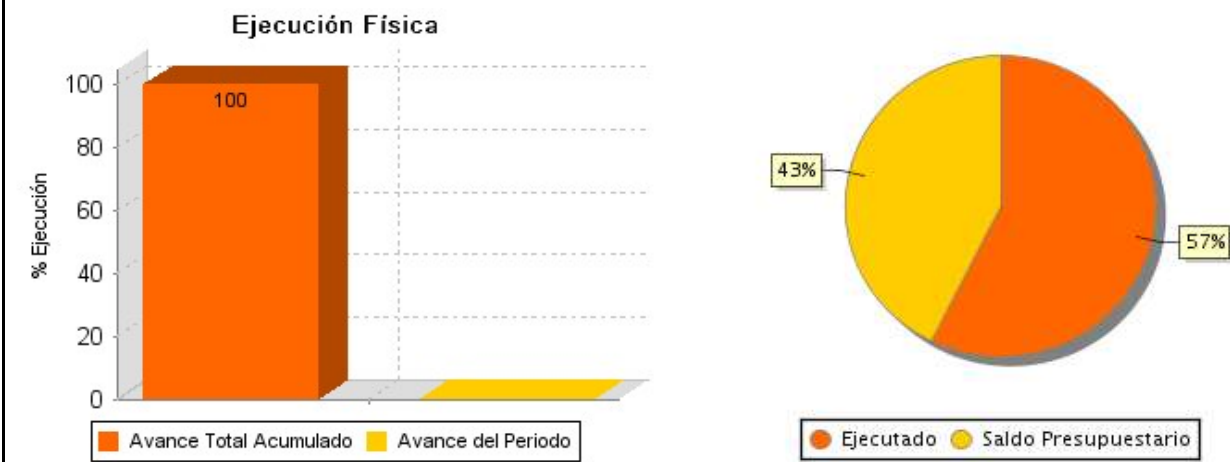


SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: LPN 1573-20 "Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución", fue solicitada por la UAC la prórroga de los plazos de ejecución por atrasos generados por liberación de zona (210 días) e inclemencias del tiempo (70 días)". Se encuentra en proceso los pagos correspondientes al Convenio Modificatorio N° 2 "Provisión y montaje de carro grúa, 3 tanques para aceite de 20.000 lts, mesadas de acero inoxidable para laboratorio", así mismo, se encuentran en desarrollo la elaboración de los estados de cuentas finales del proyecto.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctica en el Área Metropolitana			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	275			
Financiamiento	CAF, OFID, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	121.195.993	GS.	813.749.161.145
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
740.859.319.723		72.889.841.422		91,29 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		24/03/2021		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Central			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,00 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado
27.278.927.273		9.294.203.517		34,07 %

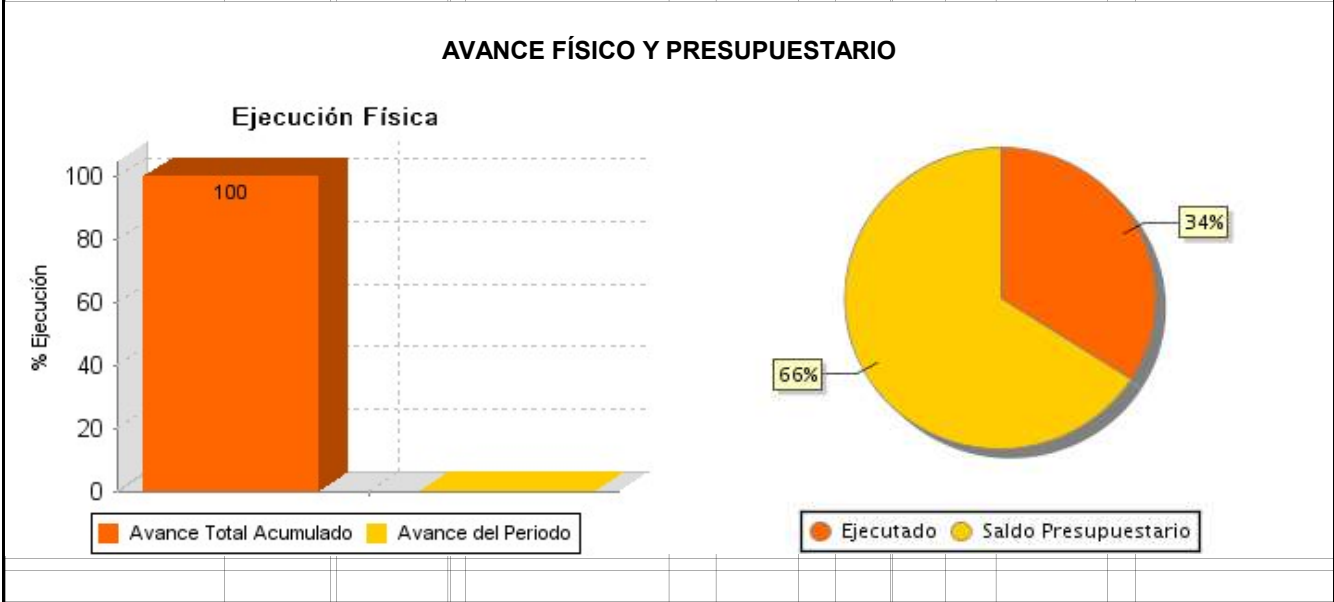


SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: Obras concluidas en el marco de la LPI 1207/2017 "Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en los distritos del Departamento Central, con provisión total de materiales. ANDE - CAF/OFID. Se continua la elaboración del estado de los estados de cuentas finales para los pagos por la devolución de los fondos de reparo de los Consorcios San Lorenzo y Metropolitano.

Proyecto		Mejoramiento del Sistema Eléctrico en la ciudad de Asunción											
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD											
Código SNIP N°		276											
Financiamiento		BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES											
Costo del Proyecto		USD		51.279.624				GS.		407.039.540.964			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
318.080.181.179				88.959.359.785				78,14 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
12/12/2018				12/11/2020				31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Asunción											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1,39 %						99,91 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
43.269.535.587				3.529.661.221				8,16 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

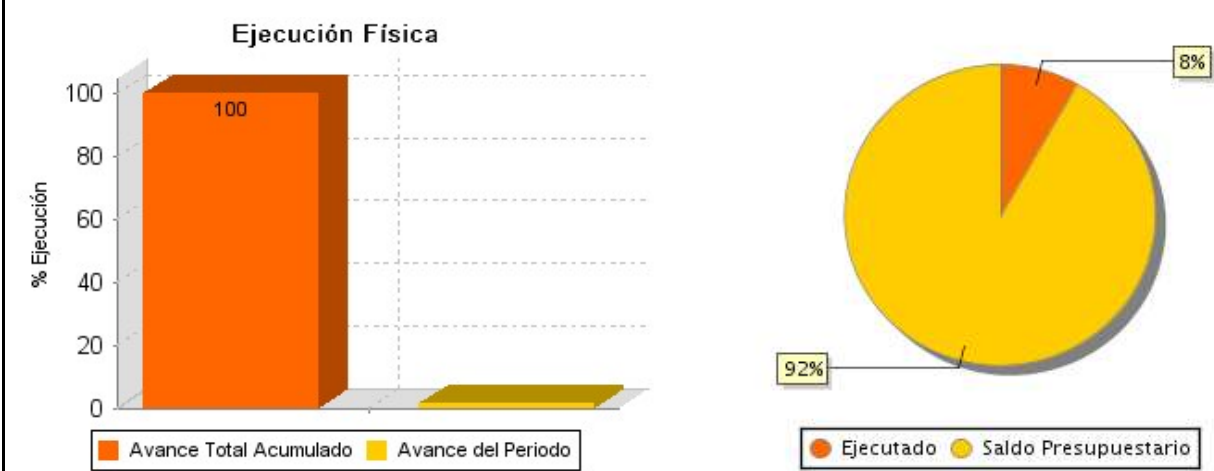

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: LPI 1484/2019, se encuentran en proceso los pagos por los convenios modificatorios que contenían obras no contempladas en el contrato original y necesarias para la puesta en servicio. Las adecuaciones de las instalaciones en servicio para construcción de la Casa GIS 66 kV y obras de montaje, condicionaron el normal avance. En la Ampliación de las Subestaciones de Parque Caballero y Puerto Botánico, Lote 1 Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Botánico, avance físico 97%. Lote 2 Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes Puerto Botánico Parque Caballero, avance físico 99%. En cuanto a la LPI 1481/2019 "Repotenciación de Líneas de Transmisión Subterráneas 66 kV, Central - General Díaz – Republicano", se cuentan con el contrato cancelado. La "Repotenciación de Líneas de Transmisión Subterráneas 66 kV, Central - General Díaz – Republicano" (Lote 2 - Ampliación de Subestaciones), se cuenta con obras concluidas.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico en los Departamentos de Caaguazú y Alto Paraná			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	277			
Financiamiento	BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	66.239.968	GS.	651.109.456.912
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
495.623.037.697		155.486.419.215		76,12 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
12/12/2018		12/11/2020		31/12/2028

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Alto Paraná, Caaguazú
---------------	-----------------------

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2,96 %		99,91 %	

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
73.903.717.887	10.538.376.892	14,26 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados correspondientes al periodo de referencia son los siguientes: LP 1480-19 "Ampliación de la Subestación Caaguazú"; LP 1482-19 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Alto Paraná 220/66/23 KV", en proceso de elaboración los estados de cuentas finales de ambas licitaciones. En cunato a la LPI 1483-19 "Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita", Construcción de SE Santa Rita y LT 220 Kv Panambú - Santa Rita, se encuentra con obras concluidas.

Proyecto	Mejoramiento del Sistema Eléctrico en el Departamento Central			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	278			
Financiamiento	CAF, OFID, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	93.467.494	GS.	734.419.637.564
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
592.694.805.061		141.724.832.503		80,70 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
05/01/2018		31/12/2020		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Central
---------------	---------

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total
0,65 %	97,80 %

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
113.903.707.021	9.328.658.979	8,19 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

Durante el periodo de referencia se reportan los siguientes avances: La LPI 1600/2021 Ampliación de la Subestación Luque y Capiatá ID 388095, se encuentran en plena ejecución. La ampliación de la SE Capiatá cuenta con el 52% de avance físico, en tanto que la ampliación de la SE Luque cuenta con el 60% de avance físico. Se encuentra en proceso el LLamado Ad Referéndum de Auditoría Financiera y Contable del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de distribución de electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay para los ejercicios 2025 y 2026.

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA <td colspan="2">  Sistema Nacional de Inversión Pública </td>		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución Energía Eléctrica. Fase II		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	621		
Financiamiento	BEI, CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES		
Costo del Proyecto	USD	152.075.474	GS. 1.006.027.561.101
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
666.754.153.357		339.273.407.744	66,28 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
12/12/2018		12/12/2021	31/12/2028
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Presidente Hayes		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
14,90 %		54,75 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
385.118.179.738		136.005.321.227	35,32 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física

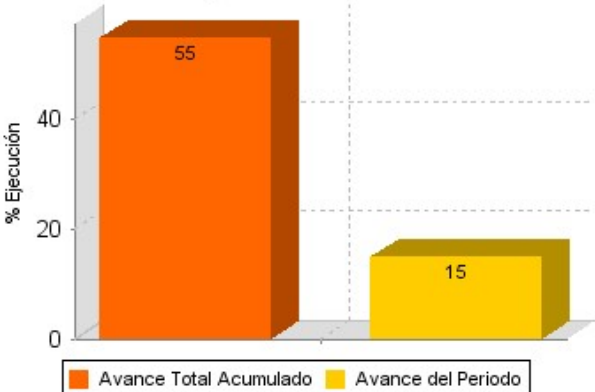

Avance Total Acumulado

Avance del Periodo



Ejecutado

Saldo Presupuestario

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el periodo de referencia:

Se registran: postación 113 unidades, tendido MT 3,10 km., tendido BT 5,47 km. y montaje de transformadores de distribución 6 unidades. Con relación a las obras prioritarias, comunicadas por la Unidad de Administración de Contratos (UAC) ANDE mediante la Orden de Trabajo N° 83, el Consorcio IBCC ha presentado el proyecto de 3 alimentadores para su verificación y aprobación, de los cuales 1 fue aprobado en el mes de junio y además se encuentra en proceso de relevamiento y diseño 2 alimentadores, lo que le permitirá avanzar en la presentación, asegurando así la continuidad del desarrollo del proyecto.

Al cierre del 30 de junio de 2025, se evidencian desviaciones significativas en el avance físico y financiero del proyecto. En términos financieros, el avance acumulado fue del 28,13%, reflejando un desvío negativo del 10,28% respecto al planificado. Este atraso se acentúa en el cronograma físico, donde el desvío negativo alcanza el 21,60%, es decir una diferencia significativa entre el avance previsto y el ejecutado.

Se destaca que el consorcio IBCC proveyó en el mes de junio 23 transformadores trifásicos de distribución de 150 KVA, totalizando 232 transformadores proveídos, equivalente al 90.27% del alcance contractual.

Considerando la fecha de provisión el atraso acumulado en la provisión de bienes es de 41.50 semanas, lo que genera una multa aplicable de 283.294.880 Gs, dentro de los límites establecidos en el PBC.

El proyecto enfrenta retos significativos que requieren atención inmediata, particularmente en la planificación, ejecución, y gestión de recursos, para alinear los avances físicos y financieros con las metas trazadas. Con respecto a prórroga de los plazos de ejecución en días a ser compensados al Consorcio IBCC, a la fecha de cierre de este informe se cuenta con un acumulado de 113 días de prórroga.


LPI 1788/2024 Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos del Departamento Central, con Provisión Total de Materiales, Previsto en el Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano del Paraguay – Fase II" LOTES 01, 02 y 03: Se ha atendido un total de veinticinco (25) expedientes: en los depósitos de los contratistas, en las fábricas de Postes y en las oficinas de ANDE. Los resultados de las inspecciones arrojaron resultados muy positivos, sin rechazos de ningún material.

Proyecto	Reposición Compensador Estático de Reactivos Subestación San Lorenzo			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	706			
Financiamiento	CAF, BEI, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	18.000.000	GS.	147.493.037.151
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución	
119.804.784.962		27.688.252.189	81,23 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga	
12/12/2018		13/02/2021	31/12/2028	

Ubicación Geográfica del Proyecto	
Departamental	Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí, Presidente Hayes

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total
1,00 %	100,00 %

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
20.089.435.105	672.916.884	3,35 %

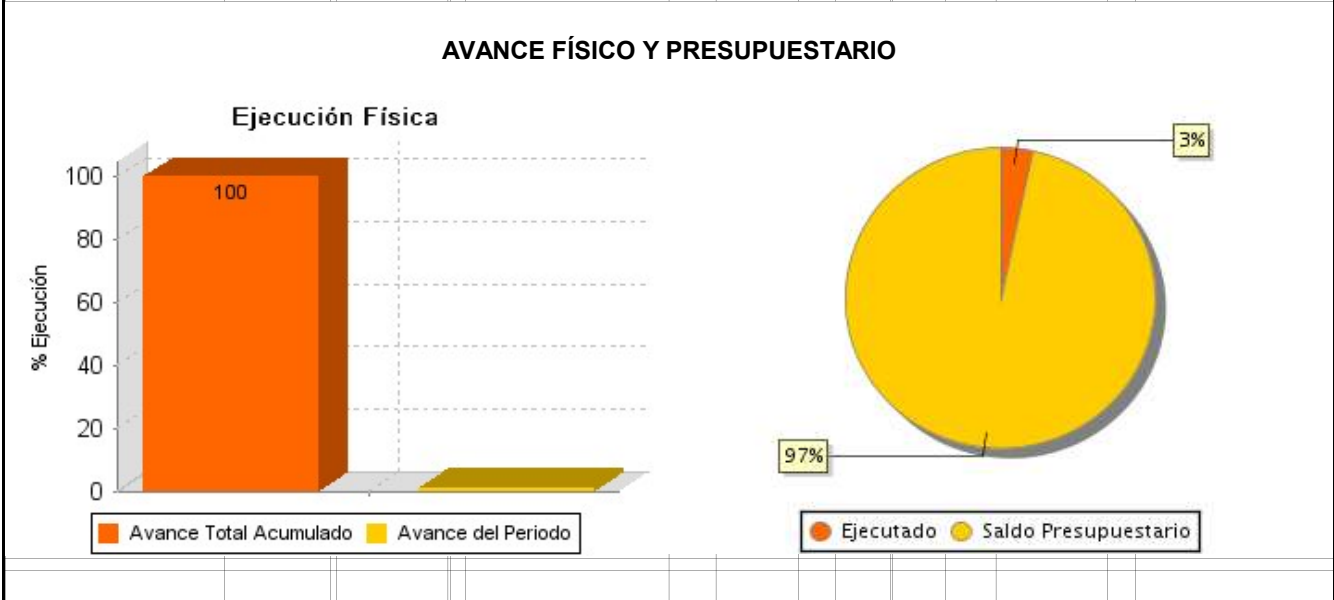


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia, la LPI 1487-19 Construcción e instalación de un Sistema de Compensación Estática Reactiva basada en Statcom de 220 KV en la Subestación San Lorenzo se encuentra con obras concluidas. Los Equipos están en la instancia de pruebas finales, y se encuentra en proceso la elaboración de de los estados de cuentas finales del proyecto.

Proyecto	Construcción de la Subestación Yguazú en 500 kV			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	717			
Financiamiento	CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	134.061.629	GS.	1.236.769.308.822
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
920.540.136.446		316.229.172.376		74,43 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
19/07/2019		24/07/2023		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto				
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Guairá, San Pedro			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total	
0,86 %			100,00 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado
29.054.302.970		12.996.514.676		44,73 %

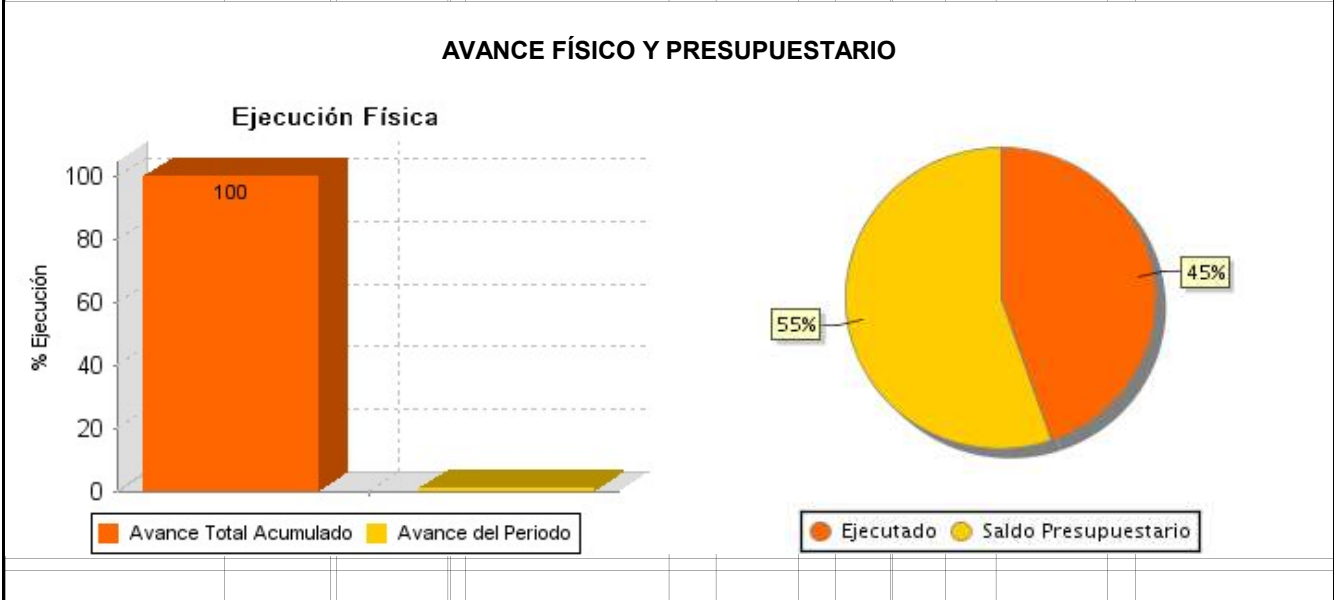

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia son los siguientes: Las Obras de la LPI 1542/2019 se encuentran concluidas (Subestación Yguazú 500/220 kV: Construcción – Montaje de dos bancos de autotransformadores de 500/220/23 kV de 600 MVA – Posiciones de Líneas y posiciones de Transformadores. Configuración interruptor y medio; 4 posiciones LT, 2 Posiciones Trafo 500/220 kV, 1 posición Trafo 220/23 kV – 42 MVA). La LT 500 kV, Subestación Margen Derecha y la Subestación Yguazú, están afectados por la Franja de servidumbre que consta de 80 propietarios afectados, 59 cuentan con indemnización y 21 se encuentran en trámite para el pago correspondiente.

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUERREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública			
Proyecto		Construcción de la Subestación Maria Auxiliadora y Linea de Transmisión de 220kV Sta. Rita - Ma. Auxiliadora			
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°		776			
Financiamiento		CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto		USD	41.754.450	GS.	296.922.382.856
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
200.172.033.699		96.750.349.157		67,42 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
19/07/2019		24/07/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental		Alto Paraná, Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
15,73 %			86,89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
51.541.817.744		12.742.810.271		24,72 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física



87

16

Avance Total Acumulado

Avance del Periodo



25%

75%

Ejecutado

Saldo Presupuestario

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances obtenidos en el periodo de referencia se señalan a continuación: En cuanto a las obras de la LPI 1596/2020 Proyecto de Construcción e interconexión de la Subestación María Auxiliadora, Lote 1 Construcción de la LT 220 kV Santa Rita - María Auxiliadora cuenta con un avance físico del 78%. El Lote 2: Construcción e Interconexión de la Subestación María Auxiliadora, cuenta con un avance físico del 98%.

Continúan los trabajos de construcción de 8 salidas para alimentadores de conductores de 240 mmm2 de longitudes; asi como también 6 salidas aéreas de longitudes de 5 Km y 2 alimentadores con longitudes de 5 Km conductores de 185 mms protegidas.

En cuanto al estado de la liberación de franja de servidumbre, se cuenta con 208 afectados. De los cuales, la cantidad de propietarios pagados es de 143; la cantidad de propietarios pendientes de documentos es de 40, la cantidad de propietarios en proceso para pagos es de 23 y la cantidad de propietarios fuera del país al momento del pago es de 2.

Se realizó la cesión de propiedad ANDE para convertir la calle perimetral existente en la avenida con paseo central en cumplimiento de la Ley 3966 de Planificación y Ordenamiento Territorial. Se evitó el desbroce de los árboles en dicha área. Se realizó la entrega de plantines a Municipalidad, segun la ley del arbolado urbano, de acuerdo a la cantidad desbrozada en el proceso de construcción.

Proyecto	Mejoramiento de 5.000 km de líneas de Baja Tensión y Media Tensión de Autoayuda			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	777			
Financiamiento	CAF, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	37.769.686	GS.	229.081.964.268
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
104.450.386.338		124.631.577.930		45,60 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
19/07/2019		24/07/2023		31/12/2026


Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú
---------------	--

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
22,47 %		84,05 %	

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
49.372.405.054	9.692.701.283	19,63 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

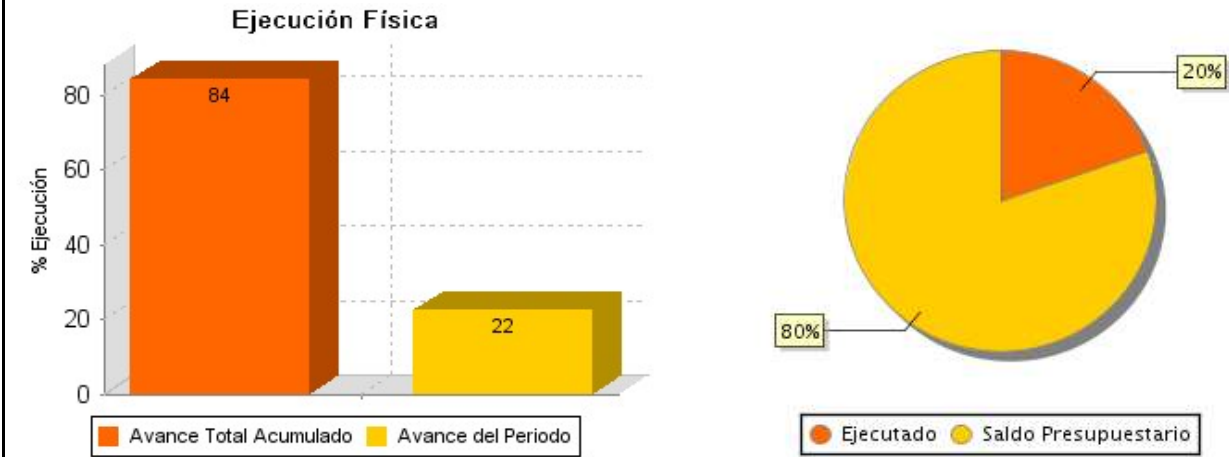

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia son los siguientes: En cuanto a la Licitación Pública Internacional N° 1526/20, “Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto”, varios lotes han alcanzado su etapa de finalización y cuentan con el Certificado de Recepción Provisoria, instancia previa al Acta de Recepción Definitiva. En función de ello, se encuentra en proceso la consolidación del estado de cuenta final conforme a los procedimientos establecidos.

Avance de ejecución al 31/08/2025, total de Km. ejecutados: Lote 1: 91; Lote 2: 76; Lote 3: 538; Lote 4: 288; Lote 5: 0; Lote 6: 392; Lote 7: 217; Lote 8: 127; Lote 9: 287; Lote 10: 124; Lote 11: 125; Lote 12: 59; Lote 13: 63.

Se encuentran en proceso los siguientes llamados: “LPI ANDE – CAF ” Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Caaguazú. “LPI ANDE – CAF ” Fiscalización de Obras, Técnica, Ambiental y Social de la Construcción de la Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera y Caaguazú.


Proyecto	Mejoramiento Rehabilitación y Modernización de la Central Hidroeléctrica Acaray en Alto Paraná			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	794			
Financiamiento	BID, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	145.200.000	GS.	1.162.078.988.273
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
198.612.861.324	963.466.126.949		17,09 %	
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/01/2020	07/01/2026		31/12/2028	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional


Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
8,23 %		14,99 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado	
405.606.386.003	24.900.648.399	6,14 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

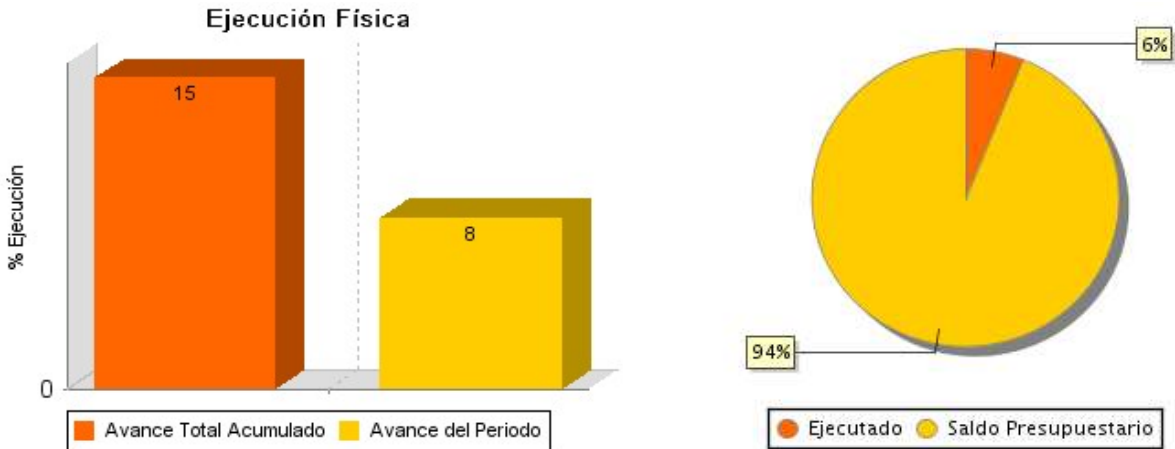

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances, correspondientes al periodo de referencia:
Se cuentan con los informes mensuales correspondiente a los documentos de Licitación de obras Hidroelectromecánicas y de las obras civiles SP 3/2022. Contrato N° 9090/2023. Consorcio Afry y Asociados. Fecha de Firma 04/04/2023, con 60 meses de ejecución, (hasta el 04/04/2028). El señalado Consorcio brinda los servicios de apoyo para el logro de los objetivos establecidos en el Contrato de Préstamo, así como también la supervisión de las obras de Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray- Yguazú.
Por otra parte, se encuentran en ejecución los siguientes: -Recapacitación y Modernización de la SE Acaray (LPI 1815/2024), con avance físico del 4%. -Obras Civiles para construcción de edificio para guardería infantil – Complejo San Miguel con avance físico del 18%. -Diseño, Suministro, e Instalación de una Planta Solar Fotovoltaica en la Comunidad de Puerto Esperanza de la Localidad de Bahía Negra (LPI 1663/2021), con avance físico del 100%. -Obras Preliminares (LPN 1844/2024), ya se encuentra adjudicado, con pago del anticipo del 20% concretado, conforme el contrato. -Diseño y Ejecución, de la Rehabilitación y Modernización Civil del Complejo Hidroeléctrico Acaray-Yguazú (LPI 1904/2025), en proceso de Llamado, Apertura de Ofertas martes prevista para el 7 de octubre de 2025. -Diseño y ejecución de la Rehabilitación y Modernización Hidroelectromecánica del complejo Hidroeléctrico Acaray-Yguazú (LPI 1903/2025), en proceso de llamado, con apertura de ofertas prevista para el 20 de octubre de 2025 -

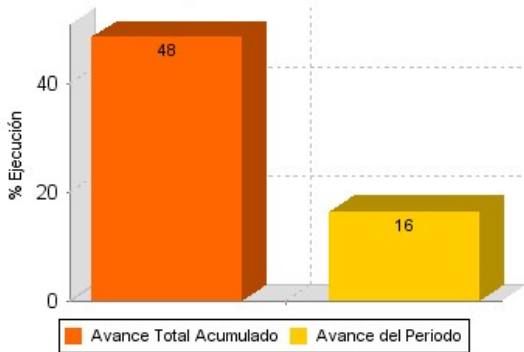
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUAY TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto	Mejoramiento del Sistema de Distribución - FASE III Región Oriental y Presidente Hayes (RO y PH)		
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD		
Código SNIP N°	844		
Financiamiento	CAF		
Costo del Proyecto	USD	126.052.910	GS. 972.384.599.373
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
309.708.805.149		662.675.794.224	31,85 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
01/05/2022		01/05/2025	31/12/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional			
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
16,38 %		48,39 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
148.442.992.412		67.361.015.662	45,38 %
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			
Ejecución Física  48 16  45% 55%			
SITUACIÓN ACTUAL			
Se reportan los siguientes avances correspondientes al periodo de referencia: La Actividad “Mejoramiento del Sistema de Distribución - FASE III, en los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes” (LPI 1749/23), tiene un avance promedio del 16,33 %. COMPOSICIÓN DEL AVANCE GENERAL TOTAL: Montaje de PD 226 (22,60%); Cambio de Línea de MT de desnuda a protegida 249,79 (25,26%); Cambio de Línea de BT desnuda a preensamblada 155,12 (7,54%); Postes ereccionados, 8684 unid. A continuación, se expone el desglose de avance por Lotes: *Lote 1 - Central (Cordillera – Paraguari) y Chaco (Presidente Hayes). AVANCE GLOBAL 20,6%: Montaje de PD (24%); Cambio de Línea de MT desnuda a Protegida (25,80%); Cambio de Línea de BT desnuda a Preensamblada (16%); Postes ereccionados 1.474 un. *Lote 2 - Centro (Guairá, Caaguazú y Caazapá). AVANCE GLOBAL 15,31%: Montaje de PD (25%); Cambio de Línea de MT desnuda a Protegida (27.90%); Cambio de Línea de BT desnuda a Preensamblada (6%); Postes Ereccionados 1.485 un. *Lote 3 - Norte (Concepción, San Pedro y Amambay). AVANCE GLOBAL 16,73%: Montaje de PD (21%); Cambio de Línea de MT desnuda a Protegida (22.70%); Cambio de Línea de BT desnuda a Preensamblada (11%); Postes Ereccionados 2.594 un. *Lote 4 - Este (Alto Paraná). AVANCE GLOBAL 14.41%: Montaje de PD (14%); Cambio de Línea de MT desnuda a Protegida (27.10%); Cambio de Línea de BT desnuda a Preensamblada (5%); Postes Ereccionados 1.830 un. *Lote 5 - Sur (Itapúa, Misiones y Ñeembucú). AVANCE GLOBAL 16.05%. Montaje de PD (30%); Cambio de Línea de MT desnuda a Protegida (23.20%); Cambio de Línea de BT desnuda a Preensamblada (4%); Postes Ereccionados 1.301 un. Cabe destacar que la Actividad “Servicios Profesionales de Supervisión Técnica y Fiscalización de Obras correspondientes a la Ejecución de Trabajos de Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Interior del País - Fase III” (LPI 1776/2023), por Resolución P/CP/N° 8340 ha sido adjudicada en fecha 24/03/2025, para lo cual se tiene previsto la asignación de fiscales de obras, quienes tienen a su cargo el apoyo de los trabajos de fiscalización conjuntamente con la Unidad Administradora de Contratos, actualmente se encuentra en etapa final de formalización del Consorcio INEL Consultores (ESIN Consultora S.A., ELC - Electroconsult del Paraguay S.A., Ingenieros Consultores de estudios y proyectos S.A. - INTEC S.A., Ingeneg S.A.), Contrato N° 9846, firmado el 22/05/2025.			

Proyecto	Equipamiento Adquisición de Subestaciones Móviles de 220/23 y 66/23 kV			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	848			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	20.086.365	GS.	258.963.581.350
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
109.798.679.869		149.164.901.481		42,40 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/05/2022		01/05/2024		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
18,60 %		60,71 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado
2.228.590.141	0		0,00 %

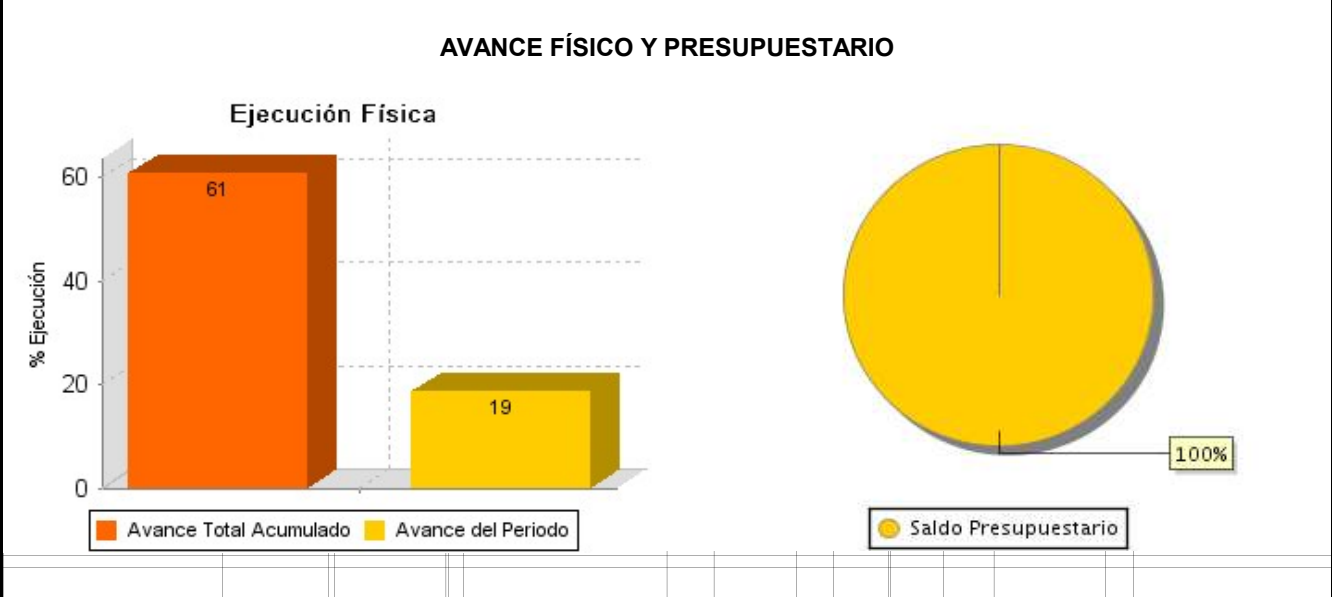

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el periodo de referencia: En cuanto a la Adquisición de Subestaciones móviles (LPI ANDE-CAF 1687/2022): Lote 1- Suministro de Subestación Móvil 220/23 Kv; y, Lote 2- Suministro de Subestación Móvil 66/23 kV, se encuentran formalizadas las correspondientes cartas de crédito y está pendiente la entrega de los equipos, no se registran otros avances en este cuatrimestre.


Proyecto	Mejoramiento de la Gestión del Sistema Eléctrico de Distribución-SGIDE			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	886			
Financiamiento	CAF			
Costo del Proyecto	USD	100.227.735	GS.	840.155.347.946
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
375.360.707.342		464.794.640.604		44,68 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/05/2022		01/05/2027		N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
26,42	%	77,69	%
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado	
203.530.178.624	44.157.720.746	21,70 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

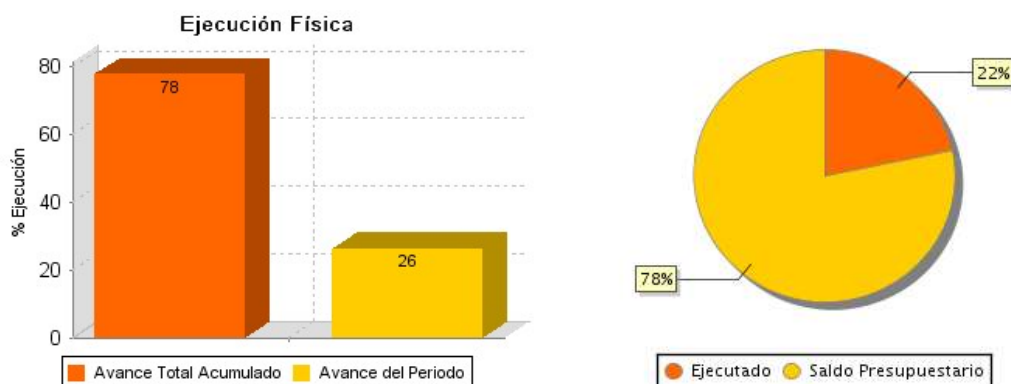

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el periodo de referencia: En el marco de la planificación de la Implementación del Proyecto de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), se han acompañado varias actividades de análisis y workshops con el objetivo de definir la tecnología y hoja de ruta a seguir en la implementación del Proyecto, generándose a partir de dichas actividades, documentos de trabajo como Actas, grillas de Actividades y lo más significativo:

- La Propuesta de Conformación del Equipo Técnico Multisectorial para el Diseño de la Implementación del Proyecto Sistema de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI).
- La Propuesta de Política de Sistema de Infraestructura de Medición Avanzada (AMI).
- La Participación en Project Management para el Desarrollo y Puesta en producción de un Laboratorio de pruebas de las tecnologías, llamada Smart City, en la zona de implementación de Medidores Inteligentes que previamente se había iniciado en la zona Villa Morra de Asunción. En esta Smart City, básicamente se plantea implementar en forma de pruebas piloto, las tecnologías de los Proyectos que se están implementando y que se planean implementar, como por ejemplo, Medidores AMI, Electric Office, Equipos Telecomandados, etc.
- En el marco de la Gestión del Cambio, se han desarrollado varias actividades como acompañamiento a los diferentes frentes que se desarrollan desde la Dirección de Redes Inteligentes.
- La revisión para su aprobación del documento Ingeniería de Detalle de Procesos, en el marco del Proyecto del EO.
- Acompañamiento para la definición del documento Ingeniería de Detalle – Levantamiento de Datos correspondiente a la LPI 1723/2022 Desarrollo y puesta en servicio del sistema de información geográfica (GIS Smallworld Electric Office).
- Acompañamiento al Diseño del Plan Comunicacional con sus componentes de Informes y Boletines, mensuales, Trimestrales y por Evento, en el marco de Implementación del Electric Office.
- Elaboración de Diagramas de Flujos de Procesos de Proyecto / Fiscalización de Obras de Distribución, Mantenimiento del SED, procesos a ser registrados en el del Centro de Edición para la actualización de la Base de Datos del Electric Office.
- Diagnóstico de Infraestructura de las áreas de Gestión de Proyectos de la Dirección de Distribución y Dirección de Gestión Regional, como base para la Implementación del Electric Office.
- Recolección de Datos e informaciones relacionadas con la Operativa e Infraestructura del GRA (Gestión de Reclamos ANDE) en la zona Este, como base para la implementación del OMS / DMS.
- Liderazgo en la actualización de la IE – GE 128 “Denominación y Señalización de Pl, PD y PE”.
- Elaboración del procedimiento “Monitoreo y Mantenimiento de Componentes de Equipos Telecomandados y Sistemas Asociados”, correspondiente al Capítulo 07 – Distribución de Energía Eléctrica, del Manual de Procedimientos – Resolución P/N° 48937-2024.
- Elaboración del Proyecto de Reorganización de la Dirección de Redes Inteligentes, aprobado por Resolución de Presidencia (RP 49442/2024).


Proyecto	Construcción de la Linea de Transmisión de 500 kV Yguazú - Valenzuela			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	897			
Financiamiento	BID, JICA			
Costo del Proyecto	USD	157.780.124	GS.	978.236.768.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
526.883.257.132		451.353.511.668		53,86 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
15/09/2023		15/09/2029		N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
9,86 %		40,93 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado
253.302.474.105	56.610.602.253		22,35 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

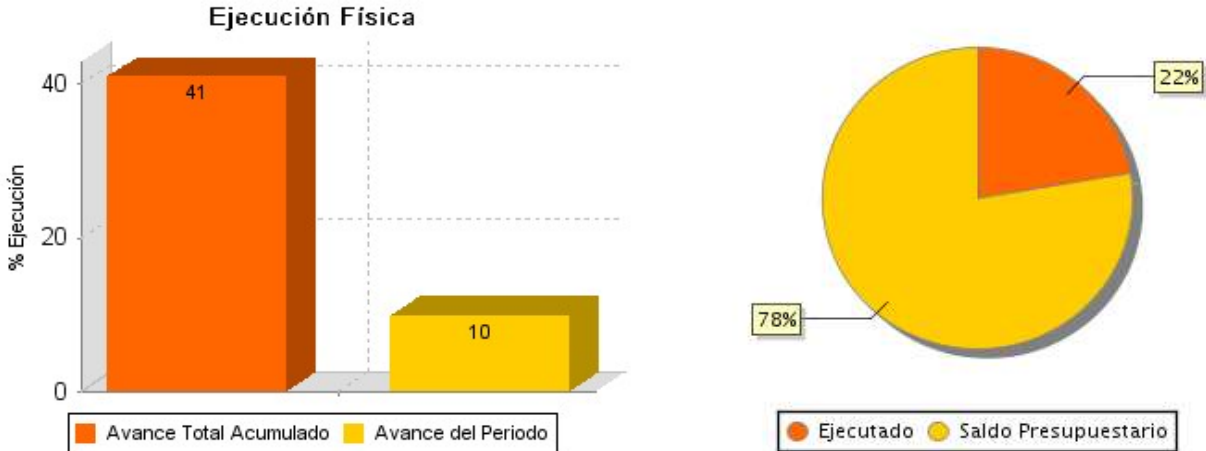


SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia son los siguientes: i) Construcción de la LT 500 kV Yguazu - Valenzuela LPI 1684/2022 Proyecto de Construcción de la LT 500 kV Yguazú - Valenzuela Y Obras Conexas, las obras se encuentran en ejecución con fecha de orden de inicio el 19/03/2025 con un avance físico promedio de 11,50% ii) Ampliación de la SE Yguazú - Lote 1, con un avance físico de 5% iii) Construcción de la Línea de Transmisión Yguazú - Valenzuela - Lote 2 avance físico de 18% iv) Se encuentra en proceso el llamado Ad Referéndum del ejercicio 2026, para la Adquisición e instalación de multimedidores, el cual ya cuenta con la No objeción del ente financiador BID, así como también el llamado de Servicio de consultoría individual para Evaluación intermedia y final de trabajos de gestión de proy., que se encuentra en proceso de llamado, se prevé la adjudicación a finales del mes de noviembre de 2025. Se han remitido los informes de Estados financieros del Proyecto conforme a las Auditorías Financieras de los periodos 2023 y 2024.

Proyecto		Mejoramiento de la Eficiencia Energética de la Red de Alumbrado											
OEE		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD											
Código SNIP N°		900											
Financiamiento		BID, JICA											
Costo del Proyecto		USD		15.232.700				GS.		121.774.011.975			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
0				121.774.011.975				0,00 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
15/09/2023				15/09/2027				15/09/2029					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Municipal		Asunción											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
2,74		%						2,74		%			
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
32.264.569.953				0				0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

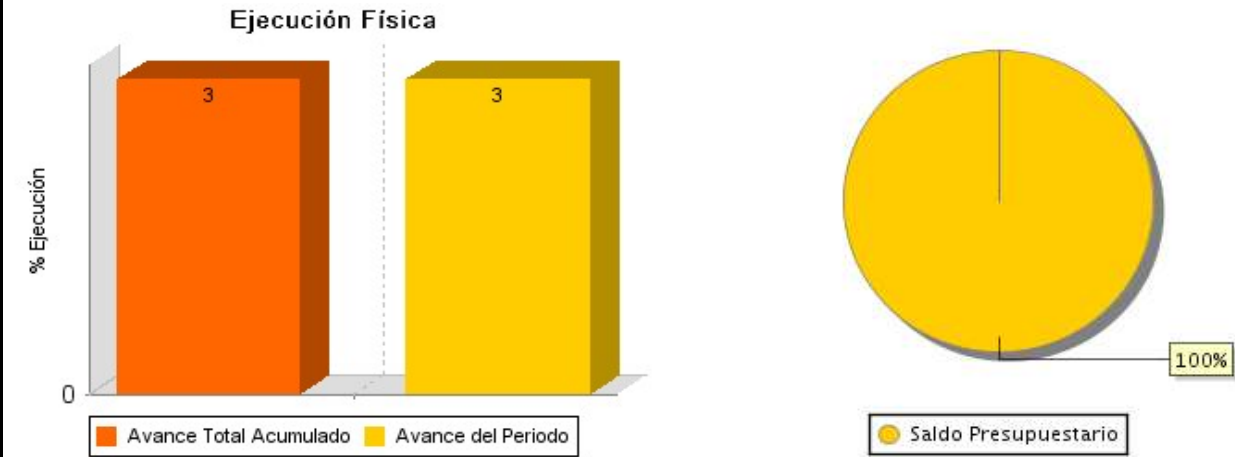

SITUACIÓN ACTUAL

En el cuatrimestre de referencia, se cuentan con los siguientes avances: i) Los pliegos para el llamado a licitación de la obra de Alumbrado Público para mejoramiento de la eficiencia energética, se encuentra en trámite de No objeción del ente financiador (BID), se prevé la Adjudicación a finales del primer semestre 2026. ii) Se encuentra en etapa de ajustes finales del diseño para las obras de mejoras de Mejoramiento de la infraestructura edilicia de la ANDE (Edificio MB4). Se estima su adjudicación a finales del 1er semestre de 2026.


Proyecto	Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Villa Hayes/ Villa Real/ Pozo Col./ Loma Plata y Subestación Pozo Col.			
OEE	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD			
Código SNIP N°	961			
Financiamiento	FONPLATA, KFW, RECURSOS INSTITUCIONALES			
Costo del Proyecto	USD	126.126.140	GS.	999.023.713.496
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
182.606.044.117		816.417.669.379		18,28 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
01/03/2025		31/12/2028		N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Boquerón, Concepción, Presidente Hayes
---------------	--

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
12,53 %		15,49 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado	
544.122.453.988	182.606.044.117	33,56 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

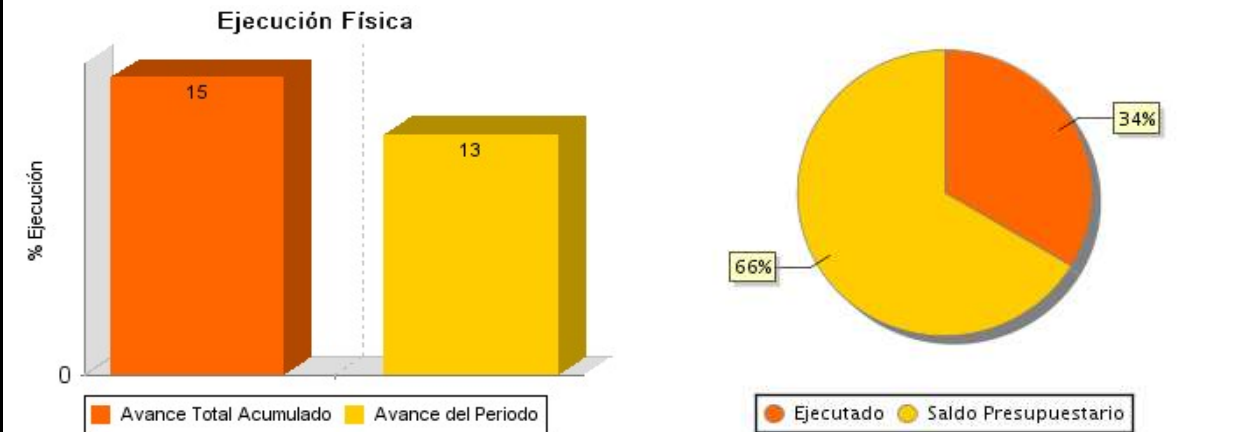


SITUACIÓN ACTUAL

Los avances reportados en el periodo de referencia, son los siguientes: "Construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Villa Hayes - Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado en 220 kV, en la Región Occidental" (LPI N° 1753/2023) , se encuentra con orden de inicio de las obras con un promedio de avance de 11,50%. En cuanto a los Servicios Profesionales De Auditoría Financiera y Contable del Proy. de Constr. de La Línea De Trans. 220 Kv Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y La Sub. Pozo Colorado En 220 Kv, en La Región Occidental, ejercicios 2025, 2026, 2027 Y 2028 (Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 81/2025), encuentran en proceso de publicación del llamado.

Con relación a las acciones realizadas para el tratamiento de propietarios, cuyos inmuebles serían afectadas por servidumbre de electroductos inherentes al trazado de la línea de transmisión incluida en el Programa, los Departamentos de Proyectos Electromecánicos (GT/DPE) y de Topografía (GT/DTO), dependientes de la División de Proyectos de Generación y Transmisión (GT/DP) de la Gerencia Técnica (GT), han realizado estudios e investigaciones en los inmuebles de la zona, de manera a proceder al trazado preliminar de las líneas de transmisión. Dichas actividades arrancan con el inventario inicial de las propiedades que serían afectadas, incluyendo reasentamientos que podrían incluso referir a cultivos u otras actividades económicas, así como también el levantamiento topográfico, el estudio de suelo, mensura e infraestructura de las propiedades que podrían ser afectadas, así como conversaciones preliminares con los propietarios/ocupantes de los inmuebles y, como resultado, se realizarían los pagos. El inventario inicial arroja como resultado una cantidad aproximada de afectados por el trazado de la línea de transmisión, punto a partir del cual empieza el proceso de notificación y de completar la documentación requerida para iniciar el procesamiento interno de los respectivos expedientes para pago de indemnizaciones y, por consiguiente, liberación de la franja de servidumbre.

Proyecto	Capacitación y Evaluación de Educación Superior				
OEE	AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR				
Código SNIP N°	644				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	25.561.255.799.
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
22.517.164.357		3.044.091.442		88,09 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
27/05/2016		27/05/2019		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			84 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
2.007.560.232		144.716.160		7,21 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

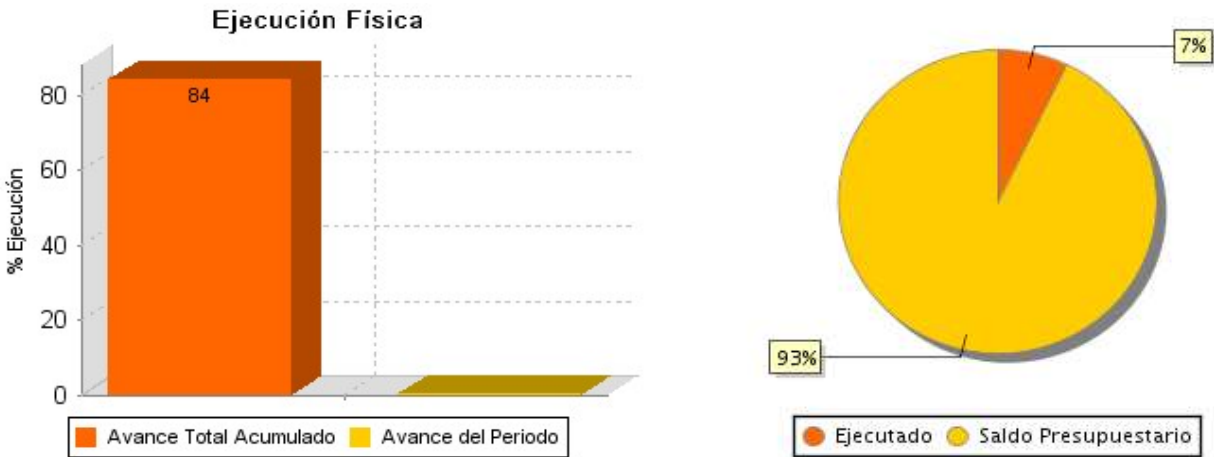

SITUACIÓN ACTUAL


En el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal se contrataron 21 pares evaluadores para evaluaciones de carreras de grado de instituciones de educación superior de gestión oficial.

Se realizó una ampliación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2025, autorizada por Decreto N° 3871/25.

En el marco de la Resolución Nro. 14/2024 del 10 de diciembre de 2024, se aprobó la extensión del plazo hasta el 31 de diciembre del año 2026.

Proyecto	Mejoramiento Construcción de Palacios de Justicia				
OEE	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA				
Código SNIP N°	155				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	122.000.000		GS.	1.064.374.367.589
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
859.979.474.668		204.394.892.921		80,80 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/03/1996		11/03/2016		30/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6 %			31 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
135.166.539.759		30.037.921.381		22,22 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

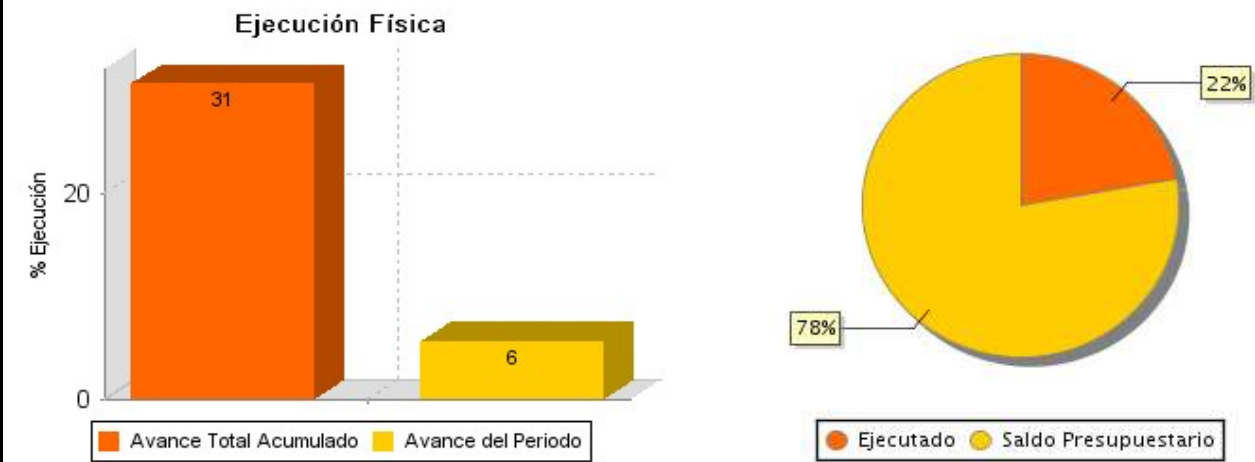


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme al Correo SNIP N° 382/2025,se otorgó la actualización de costos del Proyecto SNIP N.º 155 “Construcción de Palacios de Justicia”, por concepto de reajustes de precios e intereses moratorios, quedando el nuevo costo total del proyecto en Gs. 1.064.374.367.589.

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2025 la Unidad Ejecutora de Proyectos,no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Censo Poblacional de Paraguay				
OEE	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA				
Código SNIP N°	869				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	43.000.000	GS.	315.911.500.033	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
259.399.193.437		56.512.306.596		82,11	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
8/11/2021		8/11/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			98 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
26.449.709.972		10.665.511.370		40,32	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

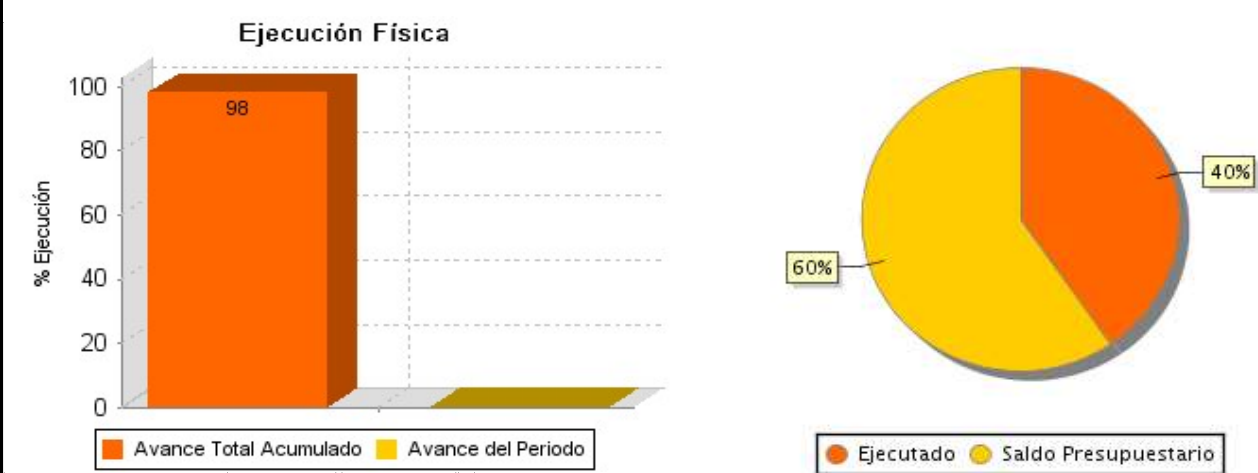


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se elaboró el pliegos de bases y condiciones, términos de referencias y especificaciones técnicas para la adquisición de bienes, obras y/o contratación de servicios de consultoría como: . IP239314- Data Science- Curso de Capacitación, ID 464562- Mantenimiento de Equipos Varios, ID 464570- Tintas y Toner, ID 471497- Adquisición de Vehículos, ID 464565 Activos intangibles, licencias varias para el INE.

Asi también, se realizó la supervisión de la evaluación, selección y contratación de servicios de consultorías necesarios para la ejecución del Proyecto, conforme a las reglamentaciones establecidas del organismo financiador e Institucional.

Proyecto		Mejoramiento de Invest. Innov y Transf. de Tecnol. Agraria			
OEE		INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA			
Código SNIP N°		786			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	20.000.000	GS.	134.303.639.056
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
32.623.316.888		101.680.322.168		24,29 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2022		24/04/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5,95 %			29,36 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
18.906.877.584		4.796.062.839		25,37 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

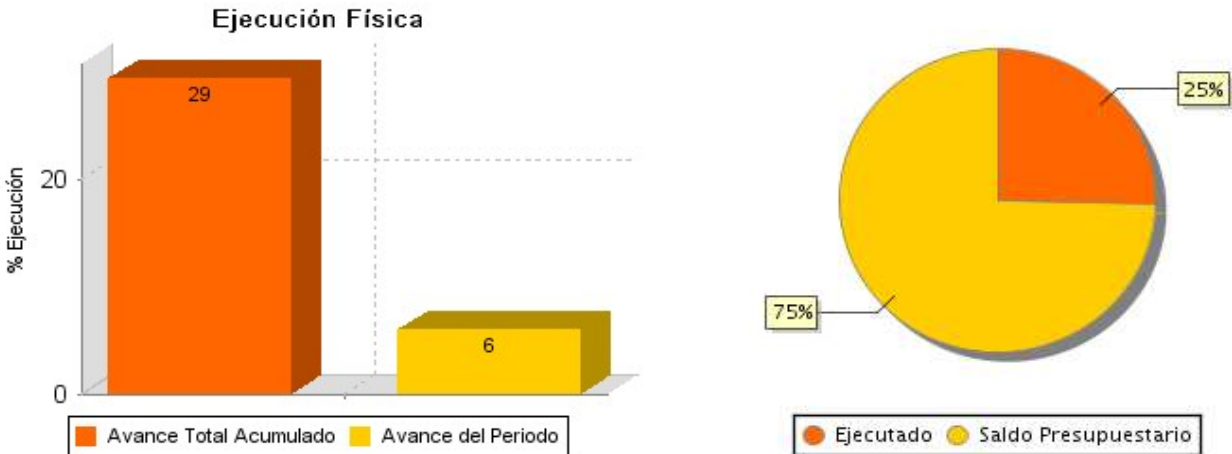

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre la Unidad Ejecutora de Proyecto informó que se encuentra adjudicado el servicio de consultoría para el diseño, gestión y desarrollo organizacional, llamado ID N° 459.389. Así también, se realizó la implementación del Sistema de Recursos Genéticos operativo.

Se encuentra el vigencia el servicio de alquiler de fotocopidora - ID: 420.945, además, se procedió al pago de servicio de internet en el marco del Convenio Marco con Copaco y por servicio para implementación de protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo en ganado bovino de carne - ID: 455.192.


Proyecto	SP FOCEM-LAB. BIOSEGURIDAD FORT. DEL LAB. DE CTROL DE ALIM		
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA		
Código SNIP N°	13		
Financiamiento	FOCEM, LOCAL		
Costo del Proyecto	USD	5.261.440	GS. 36.605.310.707
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
34.660.527.874		1.944.782.833	94,69 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
28/05/2007		28/05/2009	31/12/2025

Ubicación Geográfica del Proyecto	
Nacional	N/A

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total
0 %	99,93 %

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
1.816.367.605	1.606.127.084	88,43 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

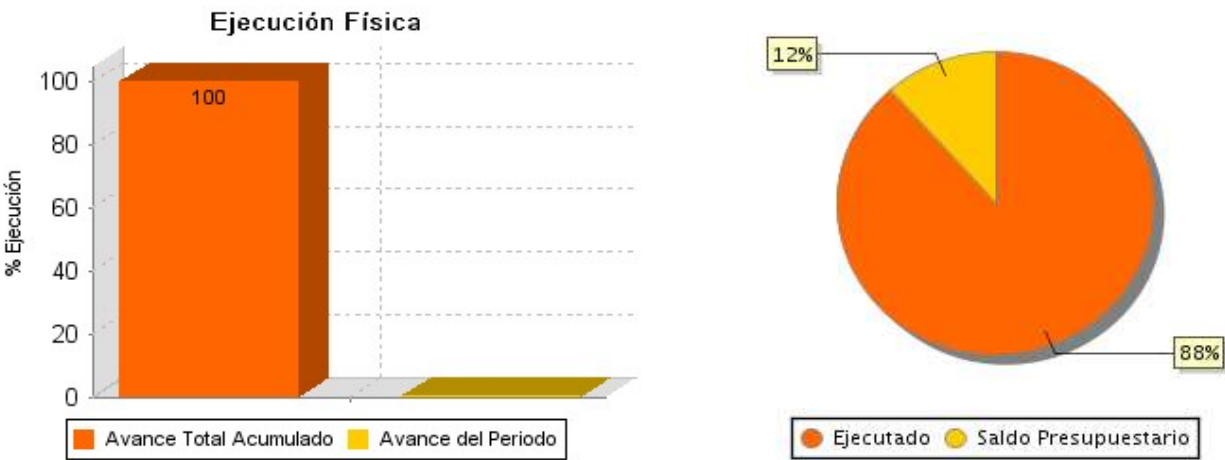

SITUACIÓN ACTUAL


Los productos principales del presente proyecto son:

a) La construcción de un Laboratorio de Bioseguridad NSB2A, que presenta un avance físico acumulado del 100%. Durante el presente período, la empresa contratista culminó las actividades complementarias de la obra, correspondientes a la adecuación y climatización del piso técnico, y se procedió a la firma del Acta de Recepción Definitiva.

b) Se continúa con las actividades de gerenciamiento relacionadas con el pago de los certificados del contrato de obra, el traspaso patrimonial, así como con las acciones vinculadas al cierre del proyecto, incluyendo la carga de información en el Sistema de Rendición de Cuentas FOCEM y la preparación de la documentación para la auditoría externa, entre otras.



Proyecto	Mejoramiento de la AFC e Indígena en la Región Oriental				
OEE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA				
Código SNIP N°	567				
Financiamiento	FIDA				
Costo del Proyecto	USD	22.468.000	GS.	151.493.947.358	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
99.043.305.082		52.450.642.276		65,38 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2018		08/11/2025		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Canindeyú, Concepción, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2 %			83 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
34.828.580.000		15.274.093.584		43,86 %	


AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

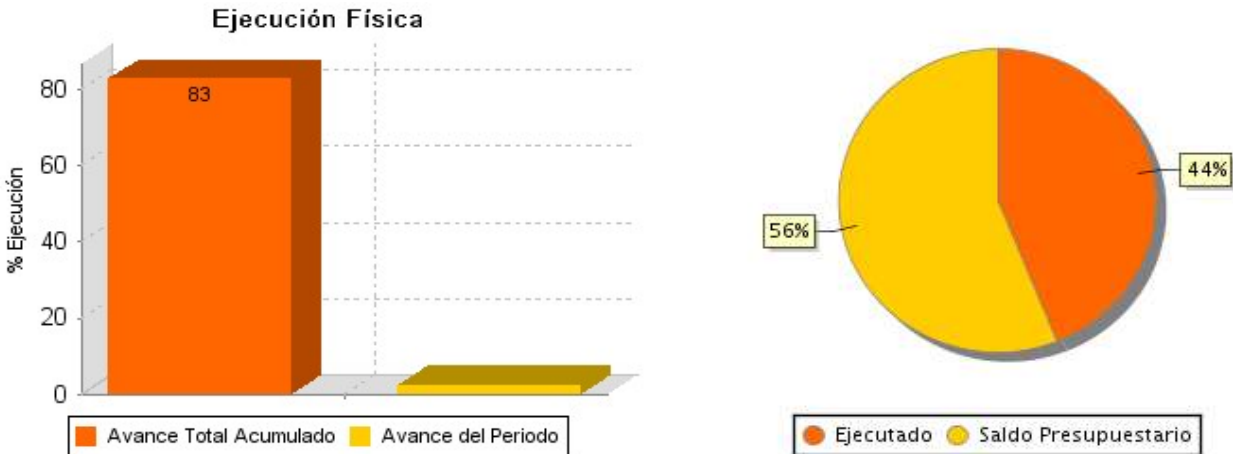


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

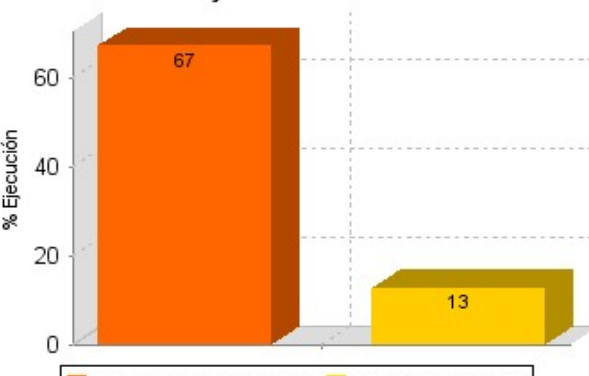
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública			
Proyecto		Restauración y Manejo Sostenible de Recursos Naturales			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		664			
Financiamiento		KFW			
Costo del Proyecto		USD	8.463.250	GS.	52.082.839.992
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
20.366.037.799		31.716.802.193		39,10 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
13/09/2017		13/02/2022		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional		N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
12,82 %			67,10 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
20.423.805.863		5.962.863.001		29,20 %	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO					
Ejecución Física  Avance Total Acumulado Avance del Periodo  Ejecutado Saldo Presupuestario					
SITUACIÓN ACTUAL					
En el segundo cuatrimestre 2025 se realizó la provisión y fiscalización de incentivos financieros para la adquisición de insumos técnicos, equipos e implementos a 2 Organizaciones de la Agricultura Familiar para la implementación de la Agricultura de Conservación Mecanizada de los Departamentos de Caaguazú y San Pedro. Se realizó la promoción y difusión del proyecto a Coperativas Agropecuarias en los siguientes Departamentos: -San Pedro: Cooperativa Friesland, Cooperativa Multiactiva Agro Norte Limitada. -Alto Paraná: Cooperativa Pindo Limitada. -Caaguazú: Cooperativa Sommerfeld. Igualmente, se efectuó la capacitación y giras técnicas sobre agricultura de conservación mecanizada dirigidas a productores y técnicos en los Departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Caaguazú, participando de las misma organizaciones de la agricultura familiar y técnicos extensionistas de la Dirección de Extensión Agraria. Al respecto,las organizaciones beneficiarias fueron:Comité Potrerito Nuevo Poty, Distrito Santa Rosa del Mbutuy, Comité de Productores Jóvenes Rurales, Distrito Santa Rosa del Mbutuy, Comité Santa Magdalena, Distrito Carayao, Comité Ko`e Puahy Distrito de San Joaquin, Coop. de Produccion Hortifruticola Peteichapa, Comité de Productores San Isidro Labrador Distrito Repatriación, Comité de Productores Agrícolas San Juan, Distrito Caaguazú, Asociación de Jóvenes Emprendedores Rurales Distrito Vaquería, Comité de Productores Pai Jha, Distrito Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Comité de Agricultores Agropecuarios Distrito Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Comité de Agricultores San Juan Calabria, Distrito Jose Domingo Ocampos Concepción: Comité de Mujeres Productoras San José, Distrito de Azotey San Pedro: Comité de Productores Tajy poty, Distrito de General Aquino, Comité de Productores Agropecuario Buen Amigo, Distrito de Itacurubi del Rosario, Asociación de Productores la Amistad, Distrito de Gral. Elizardo Aquino.					

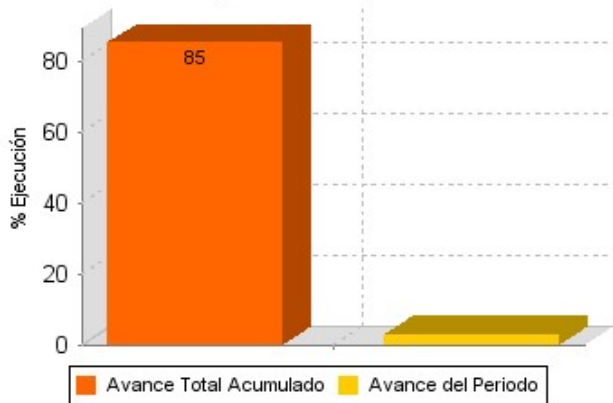 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública			
Proyecto		Censo y Encuestas Agropecuarias			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		714			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	12.315.661	GS.	109.893.595.654
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
84.776.349.483		25.117.246.171		77,14 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
25/05/2019		25/05/2024		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional		N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,79 %			85,20 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
20.578.686.863		8.057.117.122		39,15 %	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO					
Ejecución Física  85 61% 39% Avance Total Acumulado Avance del Periodo Ejecutado Saldo Presupuestario					
SITUACIÓN ACTUAL					
Conforme a la Nota BID N° O-CSC/CPR-327/2025 de fecha 2 de mayo 2025, se otorgó la extensión del plazo de último desembolso del proyecto hasta el 25 de mayo del 2026. Asi mismo a través de la Nota DCEA N° 32/2025,se modificó del costo en guaraníes del Proyecto de Implementación del Sistema de Censo y Encuesta Agropecuaria,con código SNIP 714, en el marco de la Directiva SSEE/SNIP N° 18/2021, quedando el nuevo costo en Gs. 109.893.595.654. La Unidad Ejecutora del proyecto reportó que se encuentran en desarrollo las consultorías encargadas de la elaboración de los estudios temáticos en: Género; Agricultura Familiar y, Perfil de la Producción Agropecuaria. Se gestionó la continuidad de los contratos de los siguientes servicios: servicio de internet; mantenimiento de vehículos, servicio de limpieza integral, servicio de seguridad; seguro de vehículos, alquiler de impresoras. Además, se renovaron licencias de “Field Worker” para captura de datos de encuestas realizadas en el interior del país y se renovó contrato del servicio de Soporte Técnico y tecnología. Se renovaron los contratos de tres consultores que prestan servicios al área de Cartografía desde el mes de abril 2025. Los mismos realizan trabajos en el marco de Sistemas de Información Geográfica. Se renovaron los contratos de las siguientes consultorías que contribuyen al operativo de las Encuestas nacionales: Especialista en Diseño e implementación de Encuestas Agropecuarias; Desarrollador de Aplicaciones; Especialista en Análisis de datos -Tabulador; y Técnico Estadístico. La empresa de Gestión de Recursos Humanos para la Encuesta Nacional presentó los primeros productos conforme a su contrato. Se realizó el operativo de campo para el relevamiento de datos en el marco de la encuesta Nacional Agropecuaria en la región oriental. El documento estadístico es una de las dos metas físicas del proyecto y El informe completo se encuentra disponible en la página web del MAG.: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/INFORME-ENA2025_REGION-ORIENTAL_V03_IMPRESION.pdf					

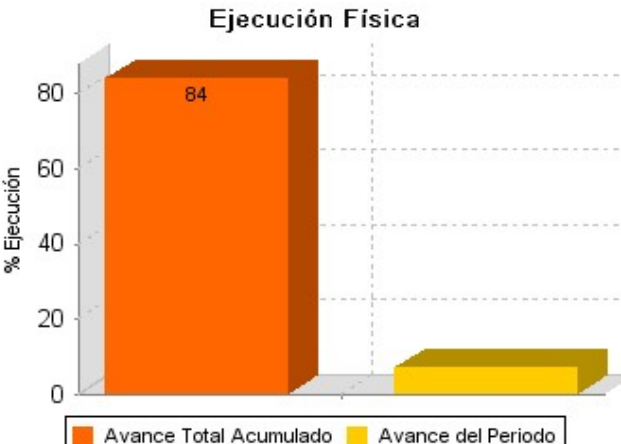							
Proyecto		Mejoramiento de inserción a mercados R Oriental y Occidental					
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA					
Código SNIP N°		904					
Financiamiento		BIRF					
Costo del Proyecto		USD	100.000.000		GS.	733.429.005.918	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución		
409.722.854.924		323.706.150.994			55,86 %		
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga		
26/03/2020		30/06/2026			N/A		
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
7,00 %				83,71 %			
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado		
151.900.150.979		46.883.245.045			30,86 %		
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO							
Ejecución Física  84 Avance Total Acumulado Avance del Periodo  31% 69% Ejecutado Saldo Presupuestario							
SITUACIÓN ACTUAL							
A través del Correo SNIP N° 225/2025 se actualizó el costo en guaraníes del proyecto “Mejoramiento de la inserción a los mercados de los productores agrarios organizados y comunidades indígenas en la Región Oriental (PIMA)” con Código SNIP N° 904, en el marco de la Directiva SSEE/SNIP N° 18/2021. Se realizaron 18.261 servicios de Asistencia Técnica dirigidos por 120 técnicos extensionistas;ampliando la cobertura de asistencia que brinda la Dirección de Extensión Agraria (DEAG) en los Departamentos de la Región Oriental y asistieron a una población aproximada de 9.677 productores de la Agricultura Familiar y miembros de Comunidades Indígenas (5.661 mujeres y 4.016 varones). Asi también, fueron capacitados 2.128 (987 varones y 1.141 mujeres) productores agrarios organizados y miembros de comunidades indígenas de los Departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Central, Amambay y Canindeyú, en temas de cadenas de valor, uso adecuado de plaguicidas, cambio climático, conservación de la biodiversidad, aspectos tributarios, educación financiera, mercadeo/marketing, ferias agropecuarias, competitividad agropecuaria, compras públicas, innovaciones tecnológicas. Por otra parte, se financió 1 subproyecto de inversión por valor de G. 83.7590.000, que beneficiará a 103 (51 mujeres y 52 varones) productores agrarios organizados del Departamento Central, destinados a la producción de harina de batata, haina de mandioca, harina de remolacha y harina de zanahoria.							

Proyecto		Mejoramiento del Rendimiento de la Producción Agraria Familiar			
OEE		MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA			
Código SNIP N°		984			
Financiamiento		COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS MAG - LEY N° 5538/15, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	13.500.000	GS.	94.500.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
74.946.746.898		19.553.253.102			79,31 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
25/10/2022		25/10/2025			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
7,46 %			55,42 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
27.062.406.267		7.509.153.165			27,75 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

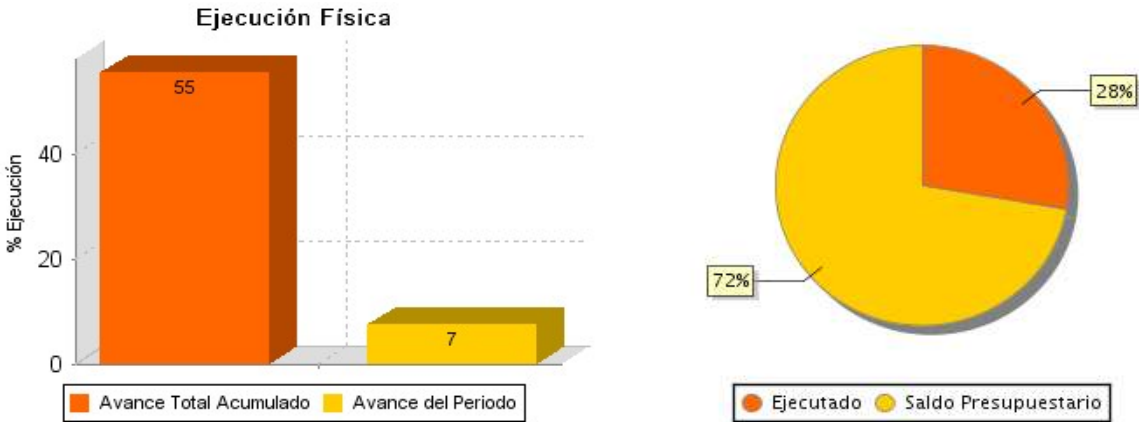

SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025 se elevó a consideración de la máxima autoridad institucional 45 proyectos productivos, que benefician a 3.362 productores de la agricultura familiar que abarcan los Departamentos de Ñeembucú (200 beneficiarios), Itapúa (151 beneficiarios), Alto Paraná (204 beneficiarios), Guairá (151 beneficiarios), Misiones (105 beneficiarios) Paraguari (67 beneficiarios), Caaguazú (816 beneficiarios), San Pedro (824 beneficiarios), Canindeyú (391 beneficiarios), Concepción (287 beneficiarios) y Caazapá (156 beneficiarios).


Estos proyectos productivos tienen enfoque en el fortalecimiento de la producción hortícola. Entre los insumos aprobados y entregados a 3.100 beneficiarios se encuentran tractores agrícolas, rastra aradora, sembradora, motocultivador; kit de producción hortícola (semillas de ajo, pimiento, tomate, maíz, malla media sombra, mulching, fertilizantes, bandeja de germinación). Como también, arado para motocultivador, forrajera, kit de producción avícola – Doble Propósito (pollitos, kit veterinario, comedero, bebedero, tejido de alambre, balanceados, chapas de zinc, ladrillo, cemento, etc.), incubadoras, generador, trilladora de grano y desmalezadoras.

Además se realizaron 17 transferencias en los siguientes Departamentos:

- Alto Paraná: cantidad de beneficiarios: 80, inversión aprobada: tractor agrícola con implementos (sembradora de 4 líneas y fumigadora barra de 600 litros).
- Canindeyú: cantidad de beneficiarios 61, inversión aprobada: kit de producción hortícola y 101 beneficiarios recibieron kit de producción avícola
- Caaguazú: cantidad de beneficiarios 98, inversión aprobada: kit de producción avícola, y 211 beneficiarios recibieron kit de producción hortícola.
- Caazapá: cantidad de beneficiarios 46, inversión aprobada: kit de producción hortícola y 110 beneficiarios recibieron kit de producción avícola.
- Central: cantidad de beneficiarios 46, inversión aprobada: kit de producción hortícola y 60 beneficiarios recibieron kit de producción avícola.
- Concepción: cantidad de beneficiarios 75, inversión aprobada: kit de producción hortícola
- Cordillera: cantidad de beneficiarios 90, inversión aprobada: kit de producción hortícola
- Misiones: cantidad de beneficiarios 105, inversión aprobada: kit de producción hortícola
- San Pedro: cantidad de beneficiarios 46, inversión aprobada: tractor agrícola con rastra niveladora y 65 beneficiarios recibieron kit de producción avícola.

Proyecto		Ampliación REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		325			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 573.369.007.358
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
548.366.296.772		30.201.705.171			94,78 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
11/09/2014		11/09/2017			31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			99 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
30.000.000.000		10.251.319.356			34,17 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

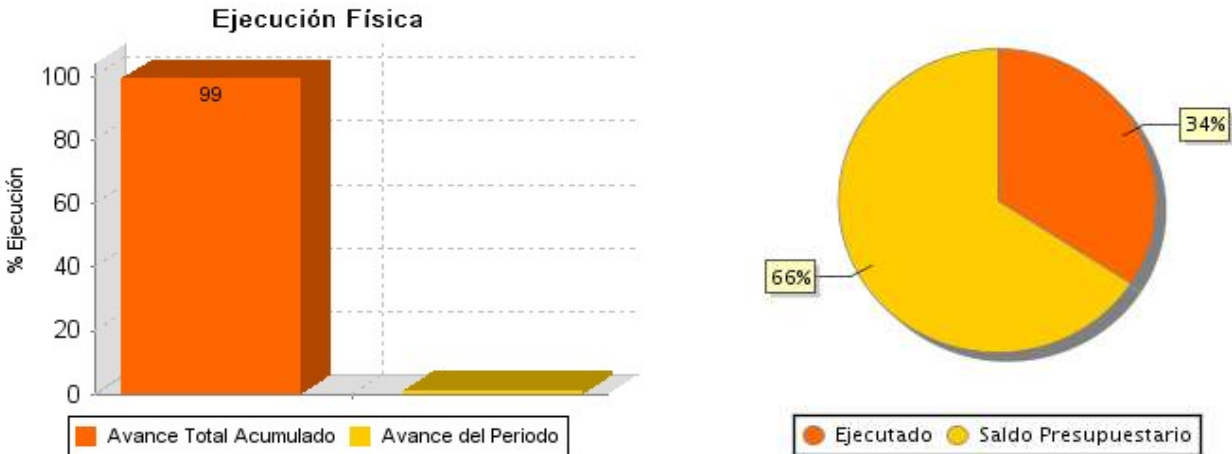

SITUACIÓN ACTUAL


Por Resolución 11 del 29/07/25, se extendió el plazo hasta el 31/12/2026 que incluye el cierre administrativo del proyecto.

Se realizaron Construcciones de Obras en 71 Instituciones Escolares correspondientes a los Departamentos de Central 1 Institución, Cordillera 7 Instituciones, San Pedro 19 Instituciones, Pte. Hayes 23 Instituciones, Amambay 16 Instituciones, Guaira 2 Instituciones, Alto Paraguay 3 Instituciones.

Al respecto, 17 Instituciones Escolares cuentan con actas de recepción provisoria en los Departamentos de San Pedro 19 Instituciones y Pte. Hayes 6 Instituciones.

Proyecto		Ampliación en la atenc. educ. desde la gest. hasta 5 años			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		388			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 586.138.288.812
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
459.890.984.783		131.747.304.029			77,73 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/05/2015		31/12/2018			30/06/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
4,39 %				85,66 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
81.034.225.511		33.336.406.465			41,14 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

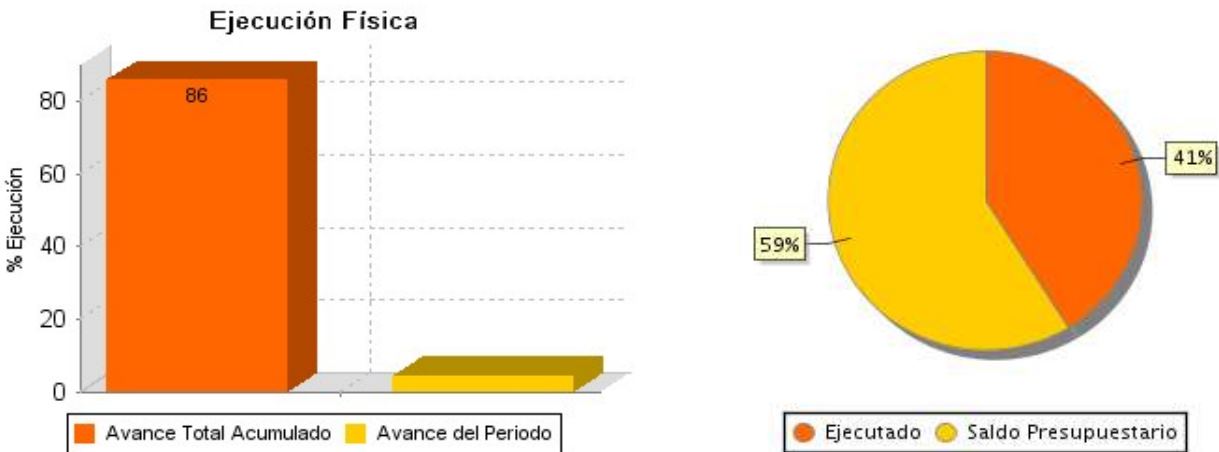

SITUACIÓN ACTUAL

A través de la Resolución CAFEEI N° 04/2025 se redujo el costo del proyecto " Ampliación en la atenc. educ. desde la gest. hasta 5 años" en ₡ 5.500.000.000 para transferir al Proyecto Apoyo Operativo de Programas y Proyectos SNIP 709.Fondo Fiduciario para la Excelencia de la Educación y la Investigación.

En el presente cuatrimestre se reportó que se encuentran 15 obras con recepción provisoria correspondientes al llamado ID N° 444.090. Se adjudicó el lote 5 del citado llamado para la construcción de 11 espacios en instituciones del Departamento Central.

Asi también,se realizaron convocatorias para cubrir las vacancias en los cargos de docentes titulares, auxiliares, sicólogos de educación inicial y maestras mochileras, totalizando a la fecha 1420 contratos asignados de la siguiente manera:


- 580 auxiliares con contratos asignados y 116 renuncias.
- 13 docentes titulares con contratos asignados.
- 52 educadoras comunitarias de instituciones indígenas.
- 229 sicólogos de educación inicial y 4 renuncias. Las 300 renuncias debido a procesos de incorporación al plantel permanente mediante los diferentes procesos realizados por el MEC.

Por otro lado,se realizaron actividades de formación continua a docentes y educadoras comunitarias de instituciones de educación indígena, específicamente en la Esc. Bás. N° 7025 NGALEC QOM y la Esc. Bás. N° 3.970 "Gral. Juan Belaieff", del pueblo Maka -Comunidad Qemkuket, ambas del Departamento de Presidente Hayes.

Además, se realizó la evaluación de ofertas del llamado con ID 469.704 para la contratación de una firma auditora durante este periodo, y se elaboró el Pliego de Bases y Condiciones para dar inicio al llamado para la adquisición de parques infantiles.

Proyecto		Investigación Eval. estandarizadas de desempeño a estud.				
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°		389				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	63.790.750.573
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
63.619.632.582			171.117.991		99,73 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
30/12/2014			30/12/2021		31/7/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional		N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
3,25 %				69,44 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
4.000.000.000			485.038.370		12,13 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre se realizó la Implementación de las evaluaciones de diagnóstica JAIKUAVE, en las áreas de: Lengua Castellana, Lengua Guaraní y Matemática. Fueron aplicadas a los estudiantes del 2° al 9° grado de la EEB y del 1° al 3° curso de la EM, conforme a los siguientes detalles:


- 33 Tablas de especificaciones elaboradas.
- 555 Ítems elaborados para las áreas a ser evaluadas.
- 66 Pruebas diseñadas en formato híbrido y en línea.
- 555 Ítems cargados en la plataforma de Paraguay Aprende.
- 532.783 Estudiantes participaron de las pruebas de Castellano.
- 476.501 Estudiantes participaron de las pruebas de Guaraní.

Por otro lado, los especialistas contratados en las diferentes áreas realizaron la planificación de las actividades con los diferentes actores educativos del INEE, además elaboraron ítem de las diferentes áreas para la construcción de instrumentos de evaluación para su aplicación. Así también, se realizó la gestión para el llamado de licitación para la Auditoria Externa y elaboración del llamado para la contratación de un servicio especializado para la implementación de un Programa de Formación a Actores Educativos a Nivel Territorial, a través de eventos Educativos Multiformato Orientados a promover el uso efectivo de la información de las Evaluaciones Educativas Implementadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa”

Se realizó la revisión de ítems para la aplicación de áreas de Lengua Castellana y Lengua Guaraní por especialistas de Divulgación de la información asociada con procesos y resultados de las evaluaciones implementadas, con los diferentes actores educativos involucrados con el programa.

Proyecto		Mejoramiento de cond. de aprendiz. con incorporación de TIC			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		394			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 639.856.204.101
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
617.872.011.140		21.984.192.961			96,56 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
25/11/2015		25/12/2019			30/6/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,66 %			77,53 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
5.425.000.000		836.790.450			15,42 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


El llamado "EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA", ID 386029, se encuentra en la 4º etapa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipamientos de conectividad en las 512 instituciones educativas.

Por otra parte, el llamado "EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA", ID 417028, se encuentra en la 2º etapa de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipamientos de conectividad en las 300 instituciones educativas y ampliación de cobertura en 760 instituciones educativas.

En lo referente al llamado MCN N° 01/2025" CONSULTORIA PARA AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTIÓN" para el año 2024,se encuentra en proceso de licitación a traves del ID 472631.

Proyecto	Capacitación Apoyo a la ampliación de la jornada escolar.				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	570				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	19.720.000		GS.	141.761.952.800
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
139.841.528.177		1.920.424.623		98,65 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/10/2017		10/5/2024		10/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
14,84 %			96,24 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
32.579.975.079		30.426.340.437		93,39 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

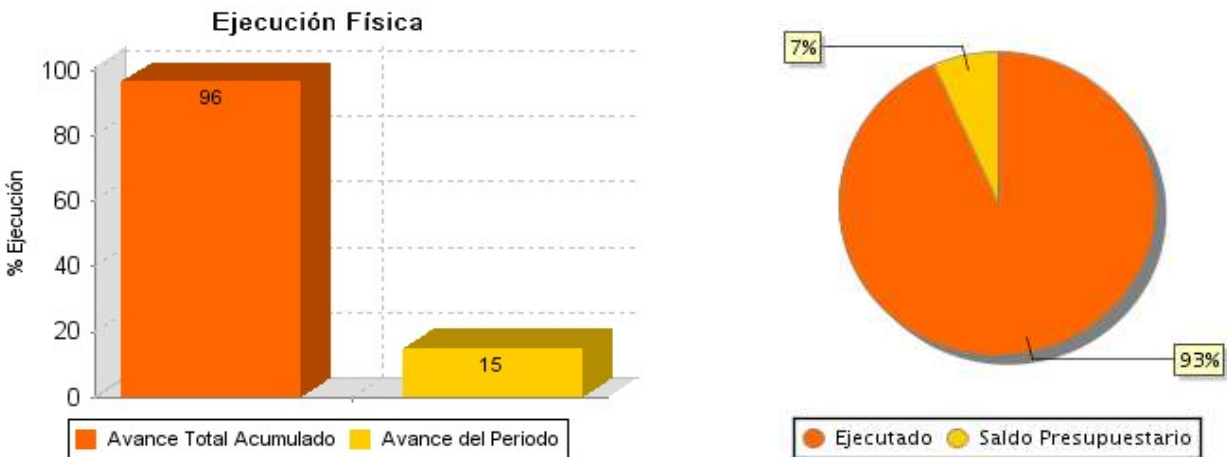

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente cuatrimestre, se desarrollaron las consultorías para la implementación de tutorías remotas en Matemáticas dirigida a estudiantes de entre 9 y 14 años en 200 instituciones educativas, de manera paralela también se llevó a cabo la consultoría para la implementación de tutorías remotas en Lengua Castellana, beneficiando a 57 instituciones educativas del primer y segundo ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB). con alcance nacional.


Se adjudicó el llamado ID N° 460.931 "ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA BIBLIOTECAS DE AULAS", los cuales serán entregados en el marco del programa Ñe'ery, .Los libros ya fueron entregados en depósito, según consta en las actas correspondientes.

Se efectuaron los pagos correspondientes a la consultoría con la Fundación Dequení para tutorías telefónicas en Lengua Castellana, así como los últimos desembolsos del piloto “Cocinando en las Escuelas con JEE” (ID 444.795), que contempló adecuaciones en cocinas escolares.

Finalmente,se realizó la auditoría externa correspondiente al ejercicio fiscal 2025, con miras al cierre del proyecto

Proyecto		Mejoramiento Condiciones de transporte de estudiantes					
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS					
Código SNIP N°		571					
Financiamiento		BID					
Costo del Proyecto		USD	280.000		GS.	2.012.847.200	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
2.028.500.581			-15.653.381			100,78 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
31/10/2017			10/5/2024			10/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
48,00 %				98,79 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
766.561.440			766.561.440			100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

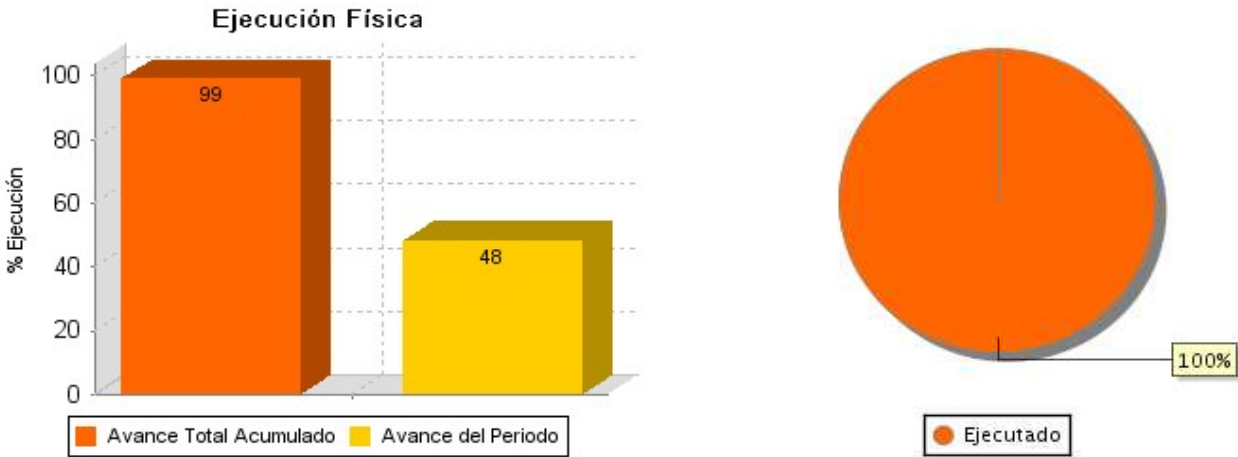


SITUACIÓN ACTUAL

Culminó la entrega de las tarjetas magnéticas para billeteaje electrónico. En total, se entregaron 9.877 tarjetas, distribuidas de la siguiente manera: 2.329 a estudiantes de 158 instituciones educativas en la Capital; 7.425 a estudiantes de 660 instituciones en el Departamento Central; y 123 a estudiantes de 30 instituciones en Presidente Hayes. Además,se realizó el último pago al proveedor de tarjetas magnéticas para billeteaje electrónico perfil estudiantil.

Proyecto		Fomento y apoyo operat. para la ejec. de proy. del MEC			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		709			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS. 80.864.841.017
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
54.914.542.490		4.080.298.527			93,08 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
31/01/2017		30/06/2019			31/12/2028
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
3,68 %			90,64 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
13.281.922.477		4.356.180.137			32,80 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

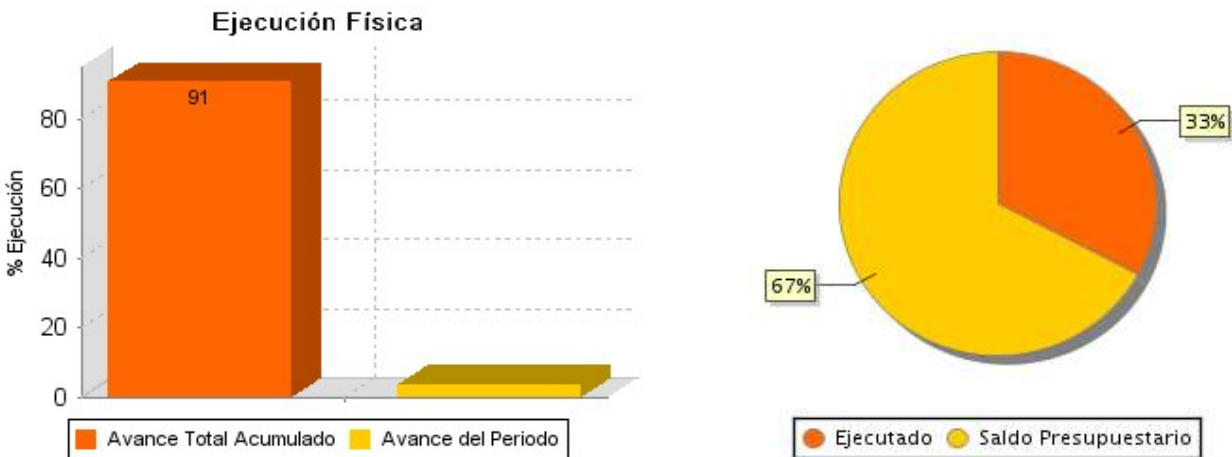


SITUACIÓN ACTUAL

A través de la Resolución CAFEEI N° 01/2025 el proyecto "Fomento y apoyo operat. para la ejec. de proy. del MEC", recibió transferencia de los siguientes proyectos: "Capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los educadores de instituciones educativas del sector oficial de los diferentes niveles/modalidades a nivel país, 2023-2026" - ₡ 8.670.000.000. "Mejoramiento de los entornos de aprendizaje en establecimientos escolares e institutos de formación docente de gestión oficial del Paraguay" - ₡ 7.300.000.000."Expansión de la atención educativa oportuna para el desarrollo integral de niños desde la gestación hasta los 5 años a nivel nacional: alcance ampliado" – ₡ 5.500.000.000."Evaluaciones estandarizadas de desempeño de los estudiantes en áreas curriculares a nivel país y proceso participativo para el diseño del Instituto de Evaluación Educativa del Paraguay (INEEP) – ₡ 400.000.000.

En el presente cuatrimestre se adjudicó el contrato ID 462782, correspondiente a los servicios de mantenimiento y reparación de vehículos,dado que el contrato anterior había concluido en el mes de abril. Asimismo,se adjudicó el llamado MCN N° 03/2025 Adquisición de cubierta y cámaras de aire,(ID 469696).

Proyecto	Mejoramiento de infraest. y equipam. de Colegios Técnicos				
OEE	MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°	972				
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	202.172.259.397
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
30.997.949.434		171.174.309.963		15,33 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
21/01/2022		31/07/2025		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,58 %			5,14 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
129.392.950.007		19.059.027.983		14,73 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

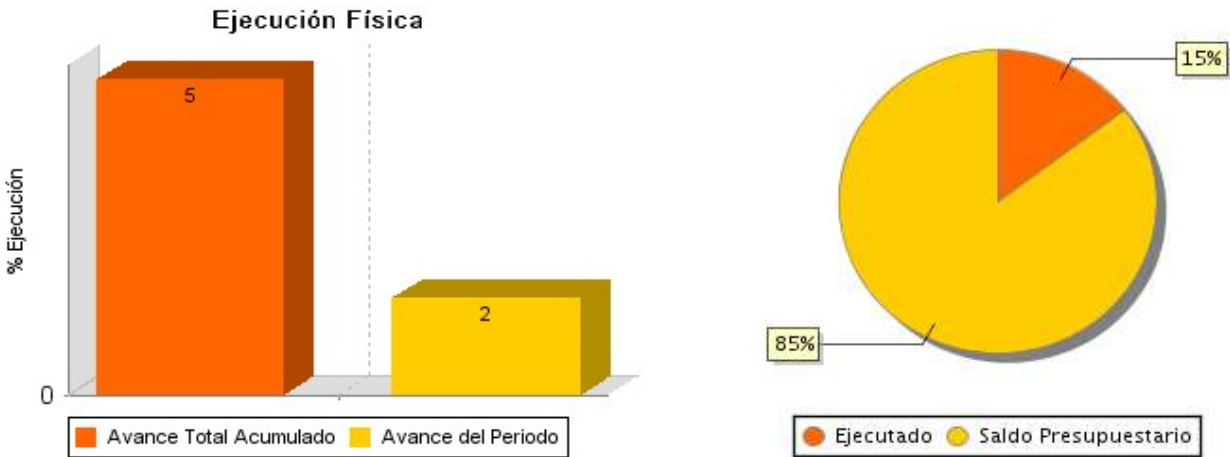


SITUACIÓN ACTUAL

Conforme a la Resolución N° 10 del 29/07/25, se extendió el plazo del proyecto "Mejoramiento de infraestructura y equipamientos de Colegios Técnicos" hasta el 31/12/26.

En el presente cuatrimestre el proyecto realizó dos llamados a licitaciones a citar: ID N° 443470, para la construcción y reparación de 43 Colegios Técnicos, y el ID N° 457401, para la construcción y reparación en 57 Colegios Técnicos, de los cuales fueron adjudicadas 10 empresas constructoras para las realizaciones de las Obras en los Departamentos de Capital, Concepción, San Pedro, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Paraguari, Ñeembucú, Misiones, Central, Cordillera, Itapúa, Pte. Hayes y Alto Paraguay.

Proyecto		Capacitación de las competencias profesionales de educadores				
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS				
Código SNIP N°		1071				
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	166.330.000.000
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
26.161.708.411			140.168.291.589			15,73 %
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
21/04/2023			21/04/2026			30/6/2028
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
11,45 %				41,26 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
52.315.000.000			11.103.669.181			21,22 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

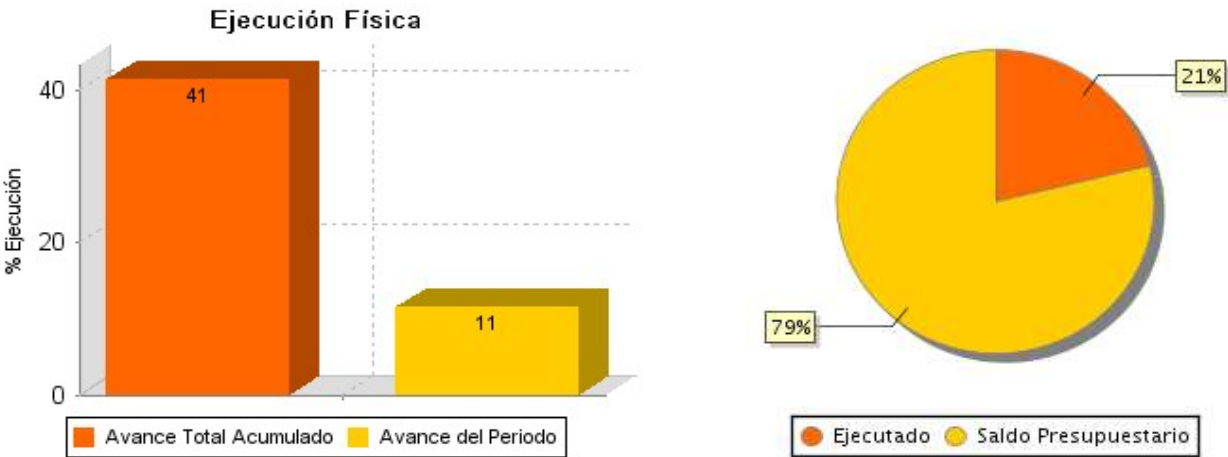

SITUACIÓN ACTUAL

Por Resolución N° 2/2025 del 25 de abril de 2025, el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (CAFEEI) autorizó la contribución de recursos para gastos operativos del proyecto "Capacitación para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los educadores de instituciones educativas del sector oficial de los diferentes niveles/modalidades a nivel nacional", al proyecto "Apoyo Operativo para la ejecución de programas y proyectos del MEC", financiados por el FEEI, por G. 8.670.000.000.


Por otra parte, por Resolución N° 1047 del 11 de julio del presente año, se adjudicó por contratación directa la entidad formadora Center for Applied Special Technology, para el desarrollo del programa de formación a educadores para la implementación del diseño universal de aprendizaje en el sistema educativo nacional, que beneficiará la formación de 4.500 educadores de diversos niveles educativos y modalidades. Igualmente, por Resolución N° 1368 del 25 de agosto de 2025, se autorizó la contratación por selección directa del Consorcio Alma Educativa para el desarrollo del programa de formación a educadores del primer y segundo ciclo de la educación escolar básica en lengua y matemática, en la modalidad de tutorías.

Asi también, se presentaron las documentaciones requeridas para el inicio del proceso de contratación de una consultoría para el desarrollo de un entorno virtual de formación basado en la plataforma de gestión de aprendizaje Moodle para 40 instituciones de formación docente del sector oficial (ID 474041). Además, se adjudicó el llamado ID 469626 de contratación para la realización de auditoria externa financiera y de gestión ejercicios fiscales 2024 y 2025.

Respecto a la Evaluación intermedia del proyecto, los Términos de Referencia se encuentran en la fase final de ajuste y revisión. Se espera iniciar el proceso de contratación en el último cuatrimestre del año.

Proyecto		Mejoramiento de establecimientos escolares e IFD			
OEE		MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS			
Código SNIP N°		1073			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST., BIRF			
Costo del Proyecto		USD	125.300.000	GS.	1.235.488.502.873
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
176.380.718.080		1.059.107.784.793		14,28 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/07/2023		01/07/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
18,84 %			29,58 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
193.312.716.308		104.172.601.131		53,89 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Por Resolución N° 3/2025, el Consejo de Administración del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (CAFEEI) autorizó la contribución de recursos para gastos operativos del proyecto "Mejoramiento de establecimientos escolares e Institutos de Formación Docente", al proyecto "Apoyo Operativo para la ejecución de programas y proyectos del MEC", financiados por el FEEL, por G. 7.300.000.000.

Se aprobaron 60 anteproyectos y proyectos ejecutivos en convenio con la FADA (Ley N.º 7433 y Préstamo 9517-PY), además se realizaron ajustes en los diseños arquitectónicos tras visitas técnicas a los Locales Escolares a Potenciar (LEAP). También se avanzó en los acuerdos relacionados a los diseños arquitectónicos para implementación de los Centros Experimentales de Formación Especializada y Educación Docente (CEFED) y propuestas de intervención en patrimonio histórico-cultural e inclusión educativa.


Asi también, se realizó el acompañamiento de especialistas del Banco Mundial mediante misiones de seguimiento y asistencia técnica. Igualmente se encuentra en trámite la aprobación de la Estrategia de Adquisiciones, el Aviso General de Adquisiciones (AGA) y el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para los primeros lotes de obras.

Se iniciaron los procesos de contratación de consultorías del proyecto; se realizaron 258 transferencias para reparaciones menores en igual número de instituciones de todo el país. Además, se distribuyeron 492.600 libros a 1.327 instituciones escolares a nivel nacional.

Por otra parte, se efectuó la implementación de proyectos estratégicos como la modernización del datacenter institucional, el fortalecimiento del Registro Único del Estudiante (RUE) y la digitalización de procesos administrativos y académicos.

Proyecto		Capacitación Programa Nacional de Becas en el Exterior II											
OEE		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS											
Código SNIP N°		782											
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.											
Costo del Proyecto		USD		60.000.000				GS.		429.540.672.600			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
281.750.874.084				147.789.798.516				65,59 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
23/11/2017				23/11/2023				31/12/2030					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Nacional		N/A											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0 %						97 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
55.809.250.447				23.377.608.625				41,89 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

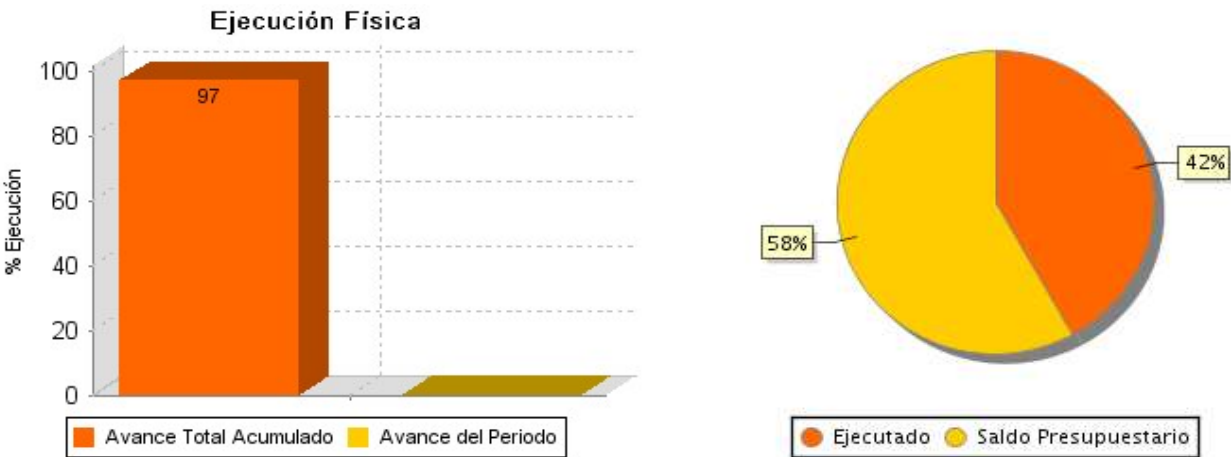

SITUACIÓN ACTUAL


Durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025 se continuó con el pago de beneficios pendientes a becarios de maestrías, doctorados e idiomas, así como con los pagos a las Agencias Especializadas correspondientes a convocatorias anteriores.

Asimismo, se lanzaron nuevas convocatorias tanto en el componente de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) como en el de Educación, totalizando noventa y cuatro (94) nuevos cupos. Los mismos se encuentran en etapa final de firma de contratos, a fin de proceder posteriormente a los primeros desembolsos.

Adicionalmente, se efectuaron pagos a proveedores por la adquisición de pasajes aéreos para becarios. Cabe mencionar que se encuentra en proceso de elaboración final el llamado para la contratación de un proveedor encargado de la auditoría externa del Programa BECAL II.

Proyecto		Mejoramiento de Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible					
OEE		MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS					
Código SNIP N°		795					
Financiamiento		BID , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	26.340.000		GS.	180.032.640.355	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
113.145.747.174			66.886.893.181			62,85 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
14/01/2021			14/01/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional	N/A						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2 %				56 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
42.232.153.901			12.773.148.472			30,25 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

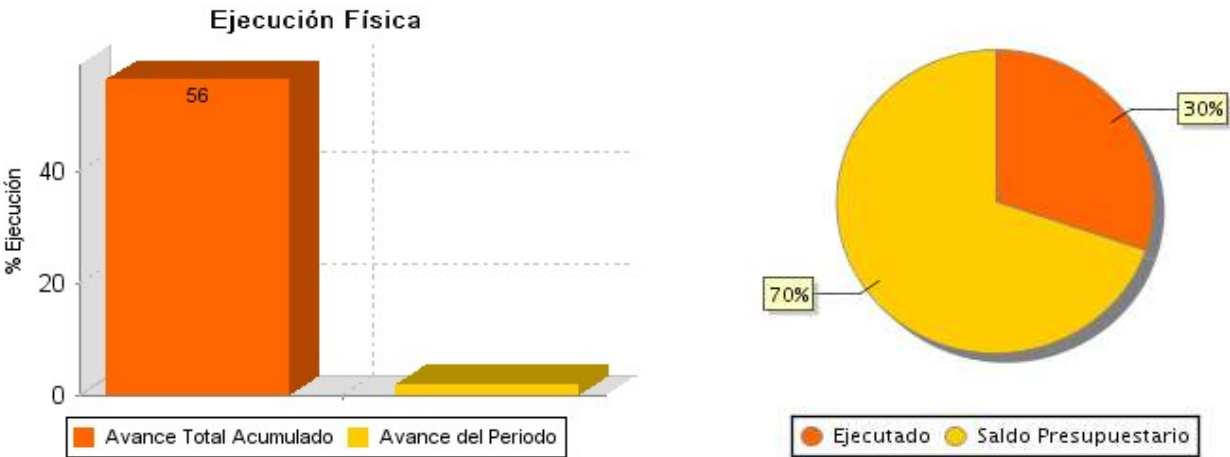


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.

Proyecto	Mejoramiento y desarrollo empresarial a Empresas Exp. en Py				
OEE	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
Código SNIP N°	707				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	10.000.000		GS.	71.885.355.667
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
56.178.322.679		15.707.032.988		78,15	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
03/07/2018		03/07/2023		3/5/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,90 %			80,32 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
18.709.447.732		7.084.973.991		37,87	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

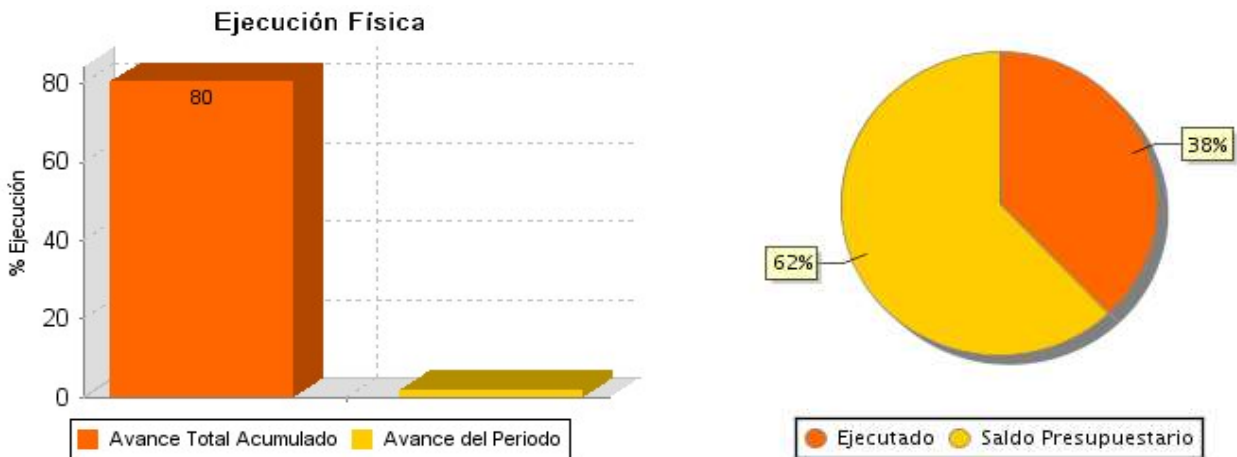

SITUACIÓN ACTUAL

A través del Correo SNIP N° 158/2025, se realizó la actualización del costo en guaraníes, en el marco de la Directiva SSEE/SNIP N° 18/2021, del Proyecto de Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas, con Código SNIP N° 707, quedando el costo del Proyecto en Gs. 71.885.355.667.


Asi también, se autorizó la extensión de plazo del programa, el cual fue aprobado hasta mayo de 2026.

En este periodo se realizaron varios apoyos por asistencias a eventos como "Promoción de productos alimenticios en la feria SIAL Paris", "Promoción de empresas paraguayas del sector alimentos y bebidas en EXPO WEST 2025 I" "Promoción de productos alimenticios den la feria FOODEX JAPAN 2025".

Por otro lado, se llevó a cabo el "Simposio Regional e Internacional de la cadena productiva de la COLZA 2025, con énfasis en sostenibilidad" de cofinanciamiento dirigidos a empresas exportadoras elegibles ubicadas en zona de frontera, en la sede Agroshow Copronar Naranjal de Alto Paraná.

Proyecto	Promoción Atención Integral a niños de 0 a 3 años		
OEE	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA		
Código SNIP N°	909		
Financiamiento	APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.		
Costo del Proyecto	USD	0	GS. 72.505.527.680
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
35.135.283.885		37.370.243.795	48,46 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
24/09/2021		31/12/2026	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Abaí, Ciudad del Este, Concepción, Encarnación, Gral.Francisco Isidoro Resquín, Horqueta, Itakyry, Luque, Pilar, San Antonio, San Estanislao, San Ignacio, San Juan Nepomuceno, San Pedro del Paraná, Santa Rosa		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
26,64 %		69,32 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
28.771.062.515		9.732.985.449	33,83 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

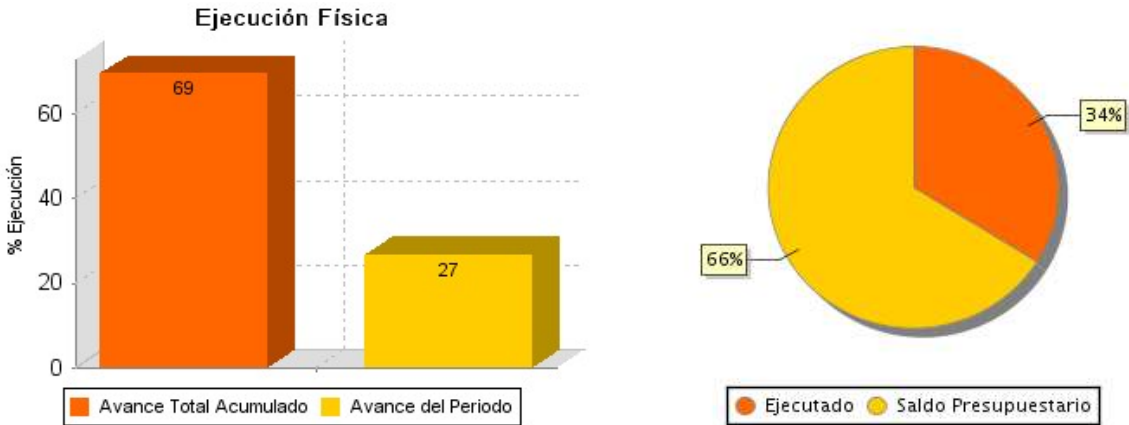

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances registrados corresponden a la puesta en funcionamiento de Espacios de Desarrollo Infantil (EDI), que actualmente se encuentran en operación, pago de salarios de coordinadores locales, educadores de sala, apoyos educativos de sala, educadores itinerantes, cocinera, ayudante de cocina y de limpieza. Provisión de útiles de oficina, artículos de limpieza, pago de servicios básicos e internet requeridos para el funcionamiento y equipamiento de los EDI's. Pago por la provisión de alimentos a los EDIs, conforme al contrato (ID N° 406867). Se ha avanzado con el equipamiento de algunos EDIs, mediante la dotación de muebles (ID N° 387.663).

Provisión de viáticos a funcionarios para el desarrollo de actividades de estudios cualitativos, cuantitativos y monitoreo de la operación de los Espacios de Desarrollo Infantil EDI's. (Visitas a los EDI's de Asunción y Central: Sajonia, Terminal; Lambaré; Villa Elisa. Visitas en el interior del país: Puerto Falcón; Paraguarí; Caazapá; Félix Perez Cardozo; Caaguazú; San Juan Nepomuceno; Mariscal Estigarribia; San Ignacio; Al futuro Centro de Yabebyry).

Se cuenta con servicios de comunicación para la difusión del proyecto, conforme al cronograma. Se realizaron los siguientes: i) Materiales audiovisuales correspondiente al servicio socio-educativo; ii) Audiovisuales sobre los 1.000 primeros días del proyecto; iii) Materiales audiovisuales de al menos 140 segundos para redes sociales de programas definidos por el MINNA.

Mediante el proyecto, se cuenta con los servicios de un especialista en primera infancia contratado para apoyar desde la UEP a los EDI's, en la implementación de la pedagogía enmarcada dentro del proyecto, así como seguimiento de las modalidades de atención (sala e itinerante), capacitaciones de manera presencial y virtual a educadores de sala sobre ambientación, fundamentación y lineamientos generales.


Proyecto	Mejoramiento de la competitividad con las TIC en Paraguay		
OEE	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Código SNIP N°	793		
Financiamiento	BID		
Costo del Proyecto	USD	130.000.000	GS. 990.084.404.620
Avance Financiero en Gs.	Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
255.114.321.494	734.970.083.126		25,77 %
Fecha de Inicio	Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
06/05/2019	06/05/2025		31/12/2028

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
2,68 %		59,70 %	
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado	
118.342.181.564	29.320.380.807	24,78 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

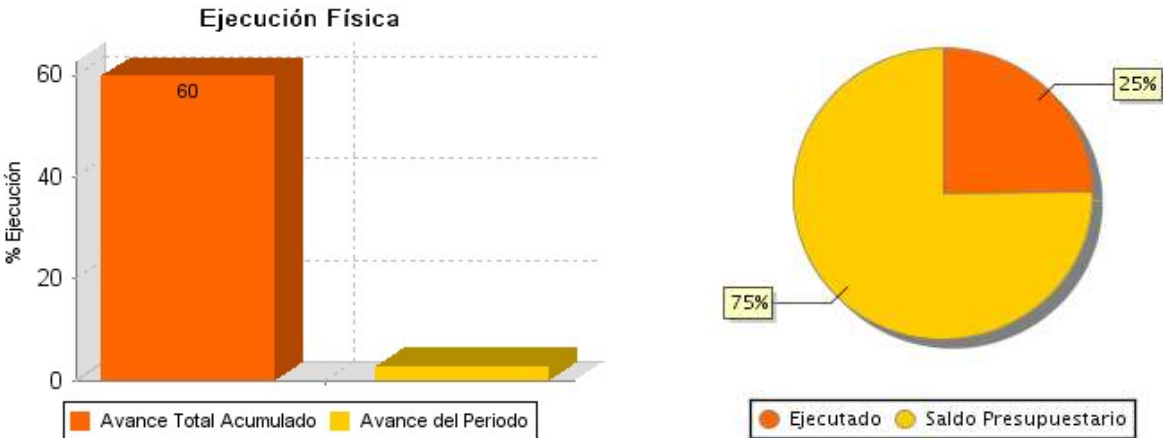

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances del periodo reportado en el marco de la ejecución del Componente “Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios”, fueron los siguientes:


- Se han iniciado procesos de contratación para la Act. 1- Propuestas de normativas en gobierno digital y sectores estratégicos, elaboradas. Consultor Jurídico - Perfil Público N° 3 - Elaboración de textos Normativos y Especialista en textos normativos.
- Se han culminado contratos de Servicios simplificados y digitalizados (PINHEIRO Y PINHEIRO ASOCIADOS S.R.L. y CONSORCIO TRÁMITES PY) (Act. 2).
- El Sistema de Información de Salud (HIS) se encuentra implementado (Act. 3).
- Los Servicios brindados por el Sistema Catastral, se encuentran implementados (Adevcom Ltda.). (Act. 4).
- Los Sistemas de gobierno digital se encuentran desarrollados e implementados (KONECTA S.A (lote 1); EXCELSIS S.A. (lote 2); CONSORCIO CC – GI (lote 3). (Act. 5).
- Se cuentan con contratos en procesos de cierre en la Act. 5- Sistemas de gobierno digital desarrollados e implementados (KONECTA S.A).

En cuanto a los avances en el Componente “Mejora de la inversión en TICS mediante el apoyo a jóvenes, emprendedores y empresas”, se cuenta con los siguientes:

- Se ha concluido la etapa de desembolso de la 8va. edición de InnovandoPy, correspondiente a la Act. 1- Emprendimientos con Base Digital financiados con capital semilla.
- Ha finalizado la 9na. edición de InnovandoPy, con 16 emprendimientos seleccionados de entre 96 presentados y 7 seleccionados para recibir el capital semilla.

Proyecto		Construcción de una red para instituciones educativas			
OEE		MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN			
Código SNIP N°		856			
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.			
Costo del Proyecto		USD	60.377.223	GS.	428.557.528.854
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
234.188.459.008		194.369.069.846			54,65 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
16/04/2020		16/04/2025			31/12/2028
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5,81 %			35,40 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
128.353.265.699		7.735.436.812			6,03 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

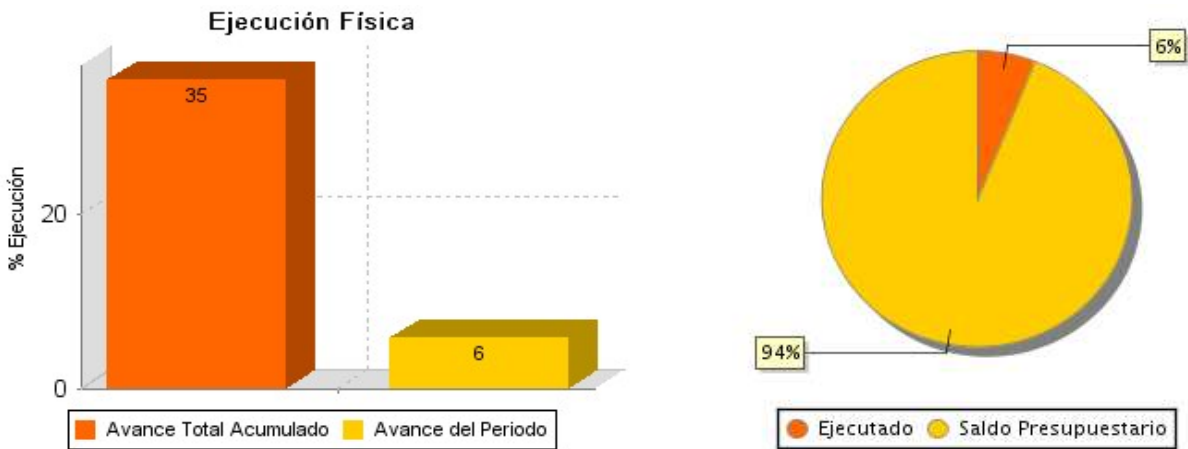

SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre el proyecto continúa con la implementación de los servicios de conectividad en establecimientos educativos. Sigue en ejecución el Convenio MITIC - COPACO para conectividad de establecimientos educativos del MEC, y el Convenio MITIC- CONATEL por medio de compromisos sociales para conectividad en establecimientos educativos.

Las intervenciones de conectividad se realizaron en capital y los departamentos de: Concepción , San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú, Alto Paraná, Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón, Alto Paraguay.

Se realizó el relevamiento en campo del 82% de 197 establecimientos educativos (colegios de la media con bachilleratos no técnicos), que serán beneficiados de la ampliación de puntos de acceso. Las intervenciones se realizaron en los Departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Central y Capital.


Se llevaron a cabo actividades de fiscalización de la reactivación de Enlaces Ópticos (planta externa) y mantenimiento básico (limpieza) y re-etiquetado (identificación de cableado estructurado de equipos. Al respecto, se detalla a continuación un resumen de los trabajos realizados:

- * Reparación de Fibra Óptica enlace COPACO/ANDE, tramo (Cnel.Bogado - ANDE / Encarnación - COPACO).
- * Reparación de Infraestructura de Planta Externa de Fibra Óptica (Estación Cerro Corá – ANDE /Pedro Juan Caballero –COPACO).
- *Trabajos de relevamiento de infraestructura de Planta Externa de Fibra Óptica,region de Ñeembucu.(Pilar/Laureles).

Se realizó el llamado para la contratación del servicio de consultoría:monitoreo de implementación de laboratorios TIC – ID N.º 465708 ,se encuentra en etapa de verificación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para la difusión de la convocatoria. Además, se encuentra en proceso de llamado de auditoria externa 2022 - 2024.

Proyecto	SP Programa Nacional de Caminos Rurales Fase II. 2° Etapa BID 2163/OC-2164/BL-OFID				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	36				
Financiamiento	BID, JICA , LOCAL, OFID				
Costo del Proyecto	USD	170.000.000		GS.	967.862.057.180
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
838.107.221.655		129.754.835.525		86,59%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2011		04/01/2016		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
97.142.475		17.591.507		18,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

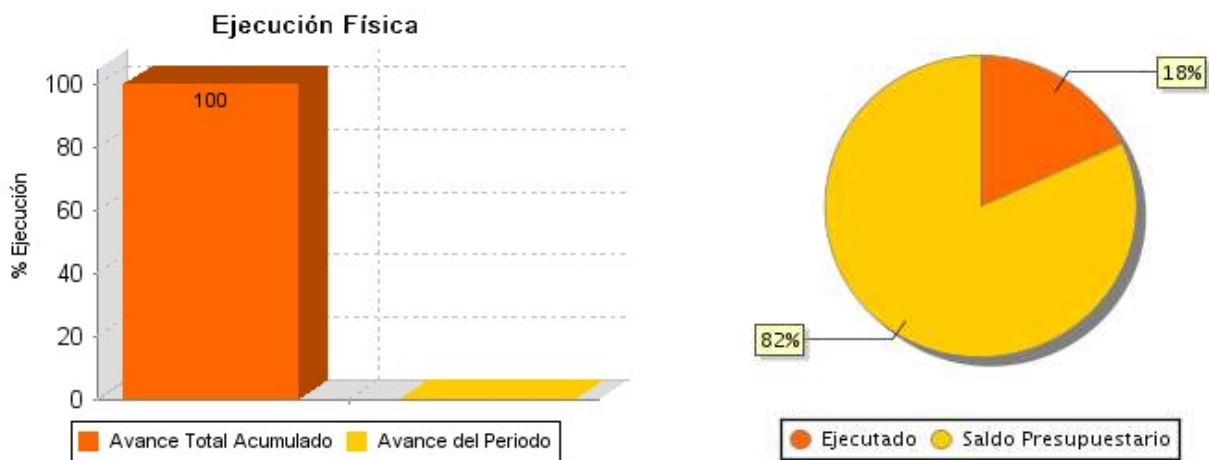


SITUACIÓN ACTUAL

Para este segundo periodo se informa que las obras en su totalidad han culminado, el porcentaje pendiente en ejecución, corresponden a los pagos en concepto de devoluciones de retenciones, reajustes e interés moratorios de de varios contratos de obras y fiscalización.

Proyecto		SP PROYECTO ACUEDUCTO					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		80					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	506.204.353.201	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
435.500.123.970			70.704.229.231			86,03 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
26/10/2012			26/01/2015			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
13.487.527			8.610.160			63,84 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

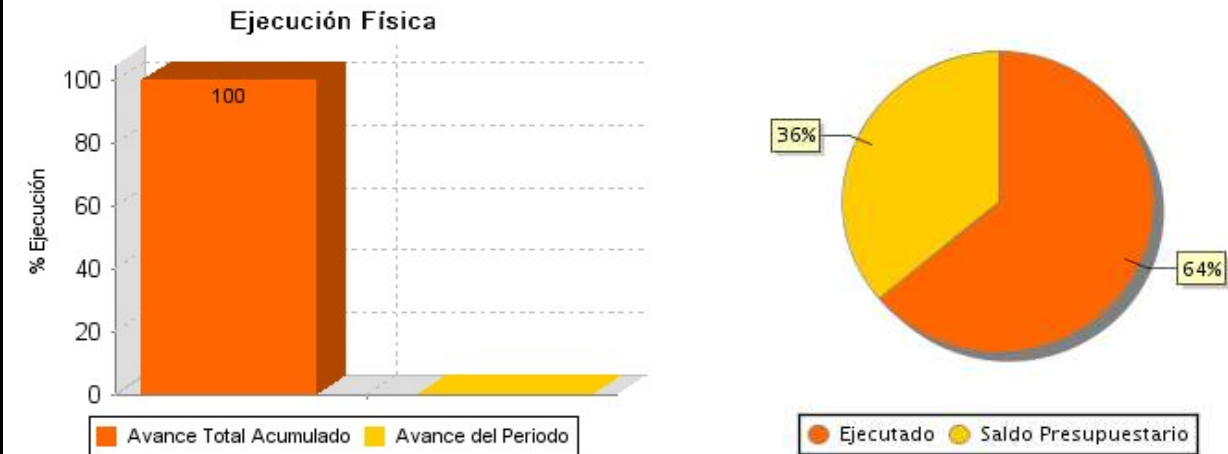


SITUACIÓN ACTUAL

La UEP no ha respondido en el plazo previsto a las consultas realizadas por ésta dirección.

Sin embargo, cabe mencionar que la obra está concluida. La operación, distribución y mantenimiento del acueducto se encuentra actualmente a cargo de la ESSAP S.A. Las liquidaciones de los pagos finales se encuentran pendientes con referencia a los contratos que fueron rescindidos.

Proyecto		SP PROG. SANEAM. Y AGUA POT. P/CHACO Y CIUD. INTERM. RE					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		149					
Financiamiento		AECID, BID , LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	88.000.000		GS.	635.532.769.647	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
592.203.529.686			43.329.239.961			93,18 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
23/11/2012			23/11/2017			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional	N/A						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				99,97 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
31.406.764.427			12.909.892.546			41,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

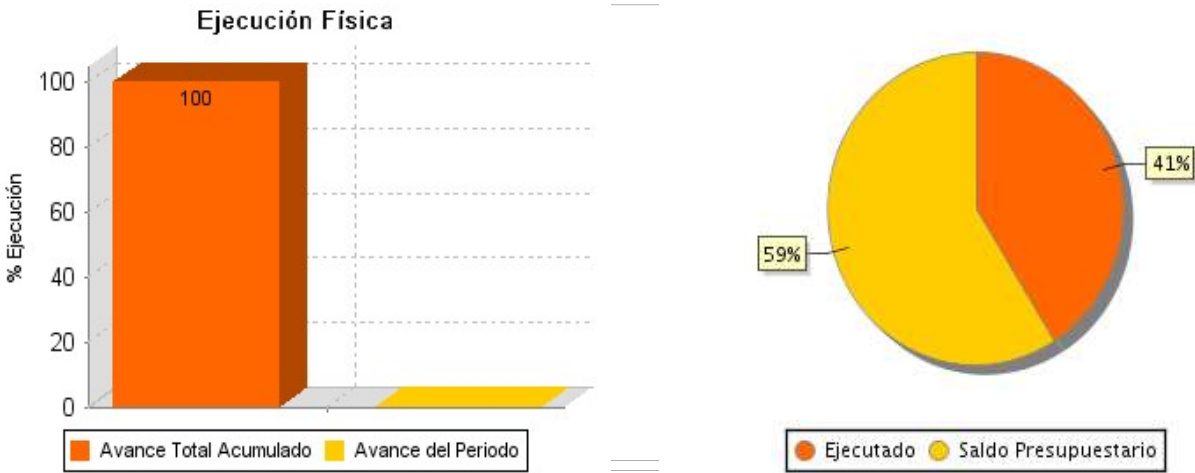

SITUACIÓN ACTUAL

Con respecto a las obras de Construcción de Aductoras, Centro de Distribución y Estaciones de Bombeo en el Chaco Central, las mismas cuentan con recepción definitiva. Asimismo, las obras de Construcción de Redes de Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Indígenas y localidades menores beneficiarias del Proyecto del Acueducto del Chaco Central, se encuentran concluidas.

En cuanto a las obras de Infraestructura para Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable para Ciudades Intermedias, se reporta lo siguiente:


Frente de Obra Ciudad de Tobati: Avances acumulados registrados al cierre del segundo cuatrimestre 2025: Redes Básica: 89%, Redes Condominiales: 86,9%, Estaciones de Bombeo y Línea de impulsión: 20,2%, PTAR: 35,0%.

Frente de Obra Ciudad de Caacupé: PTAR avance general: Tratamiento preliminar 100%, Lagunas artificiales 100%, Obras civiles 100%, Servicio de agua potable 100%, Desagüe pluvial 95%, Humedales artificiales 100%, Empastado 98%, Cercado perimetral 65%, Construcción redes nuevas: 100%, Construcción de Línea de Impulsión: 99 % (cruce con tunelera: 100%), tendido de tuberías 99%, registros construidos 100%, Estaciones de Bombeo: EB1: 85%, EB2: 95%, EB Intermedia: 90%, Conexiones Domiciliarias: 2.460 conexiones en total. Se financiarán con contrapartida local.

En la Cuidad de Horqueta: las obras concluyeron en el primer semestre del año 2024 y fueron inauguradas en noviembre de 2024 que incluye Redes Condominiales 100%, Redes Básicas 100%, PTAR 100%, Mejoramiento de Sistema de Agua 100% (En Proceso de Traspaso a la Junta de Saneamiento San Antonio de la Ciudad de Horqueta, que será la responsable de la Operación y Mantenimiento respectivo)

Proyecto	Mejoramiento Corredor de Exportación en Itapúa y Alto Paraná			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	154			
Financiamiento	BID , JICA , LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	332.984.000	GS.	2.026.829.087.180
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.659.399.682.941		367.429.404.239		81,87 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
02/10/2014		28/10/2021		31/12/2026

Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Itapúa		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,74 %		93,88 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	
102.250.051.965		47.192.250.068	
		Porcentaje Ejecutado	
		46,15 %	

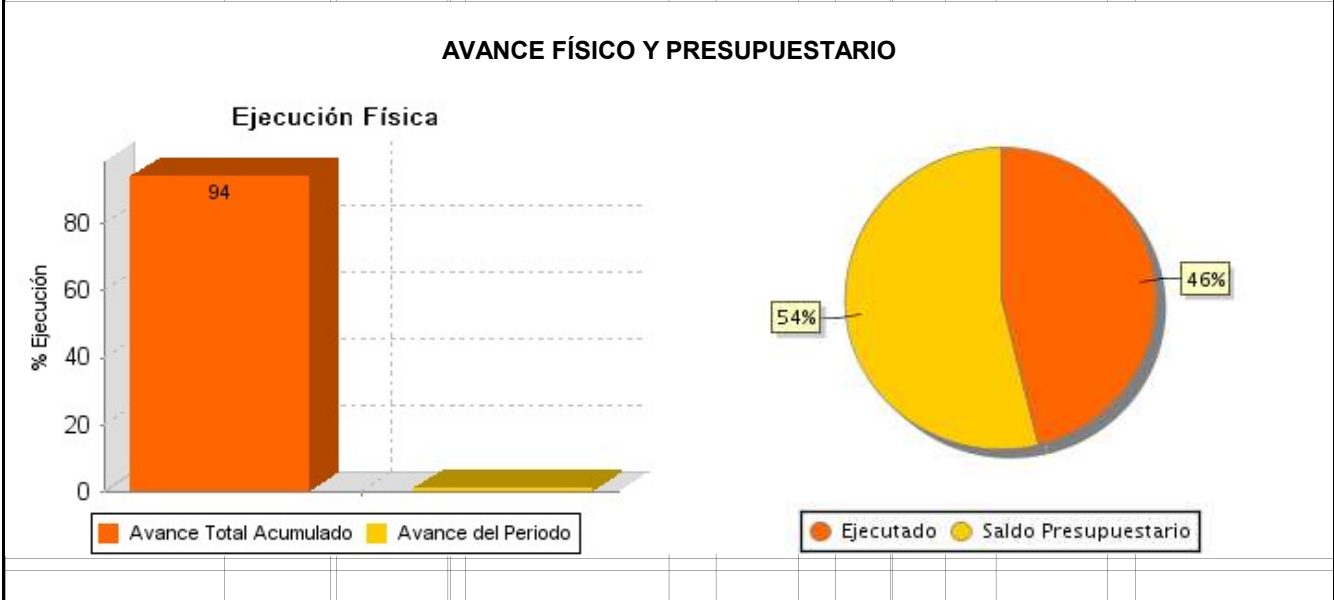


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente informe, la Entidad no ha respondido a las observaciones emitidas por esta Dependencia sobre los avances del Proyecto.

Proyecto		Mejoramiento de Corredores de Integración y Reconstrucción Vial					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		162					
Financiamiento		CAF, LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	285.000.000		GS.	1.643.841.538.888	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
1.510.522.224.651			133.319.314.237			91,89 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
29/10/2014			31/12/2018			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Central, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2,46 %				95,41 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
130.970.057.464			40.452.487.681			30,89 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

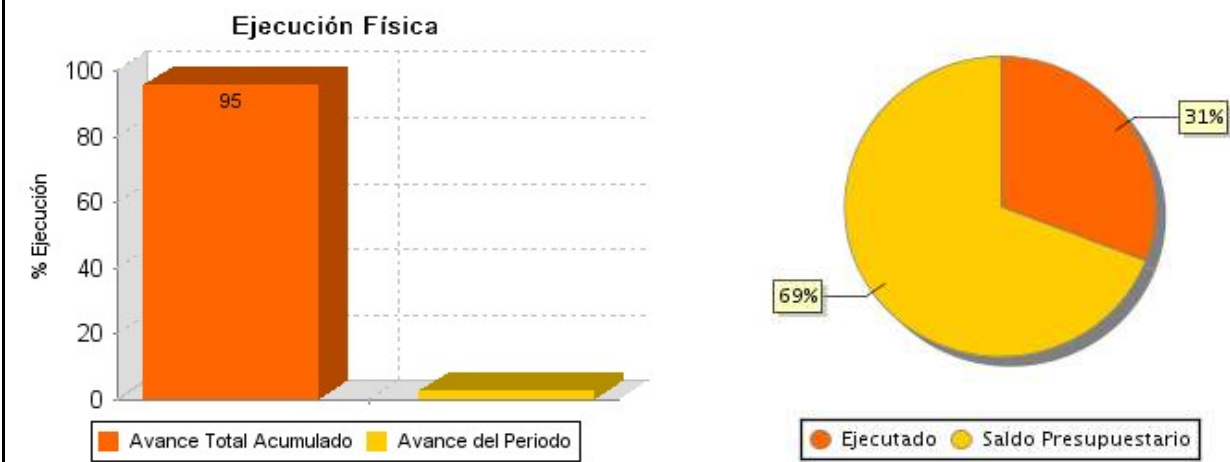

SITUACIÓN ACTUAL


El presente periodo presenta los siguientes avances:

Componente 1: Las actividades 1, 2 y 3 están concluidas. Actividad 4 ha concluido en presente periodo, a la espera de Recepción Provisoria. Actividad 5: La Obra ha concluido en el presente cuatrimestre, presenta una avance de 3,5 kilometros de capa de rodadura, a la espera de la Recepción provisoria, y devolución de retenciones. Las Actividades 6 y 7 se encuentran en etapa de corrección de los Pliegos de Bases y Condiciones. Actividad 8: se encuentra concluida. Actividad 9; la obra se encuentra en etapa inicial, la principal actividad se registra en el Ítem de Instalaciones y Servicios Especializados.

Componente 2: Actividad 1; servicio concluido. Actividades 2 y 3, los servicios se encuentran concluidos, a la espera de los pagos de las últimas carpetas de afectación para liberación de franja de dominio. Actividad 4; el servicio fue rescindido por Resolución Ministerial. Actividad 5: el servicio presentó 4 informes mensuales, el servicio concluyó el 30/04/2025, a la espera de la presentación del informe final. Actividad 6; la fase de diseño, ubicación y traza concluido, el servicio se encuentra en etapa de catastro (liberación de franja de dominio). Actividad 7; el servicio presentó 3 (tres) informes mensuales, servicio concluido, a la espera de presentación de informe final. Actividades 8 y 9, se encuentra a la espera de la adjudicación de las obras, Actividad 10 y 11; Servicios han concluido. Actividad 12; Sin movimiento en el presente periodo, a la espera la presentación del informe correspondiente a la Auditoría al Ejercicio Fiscal 2024. Actividad 13; la adjudicación está con protesta en la DNCP.

Proyecto		Construcción Accesos Viales al Segundo Puento con Brasil			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		191			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	212.355.188	GS.	1.492.480.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
876.652.949.858		615.827.050.142			58,74 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
23/12/2020		23/12/2023			23/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Los Cedrales, Minga Guazú, Presidente Franco				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
22 %			80 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
282.557.111.508		122.386.679.016			43,31 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

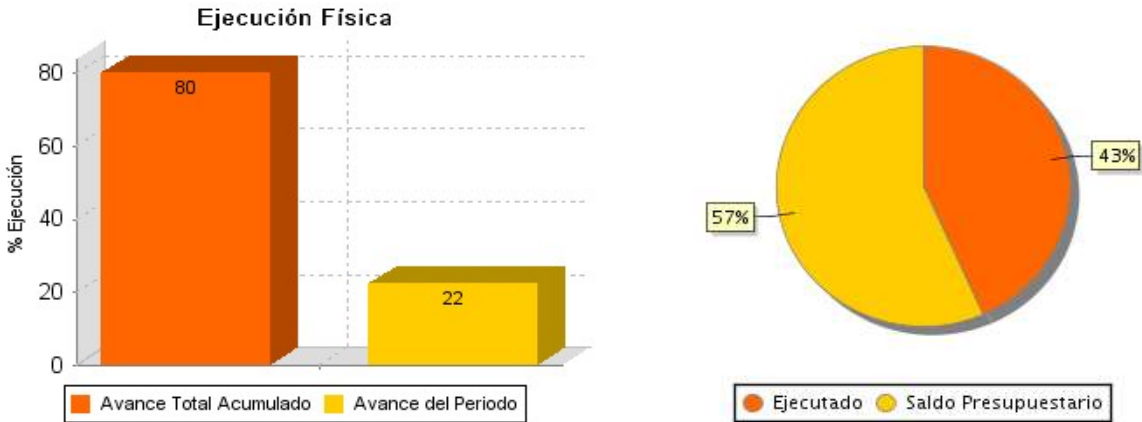

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo el proyecto presenta los siguientes avances:

Dentro Componente 1: Se encuentran concluidas las obras de construcción del Centro Fronterizo Primario de los accesos del lado paraguayo al Segundo Puento y la Terminal de Cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en la Ciudad de Presidente Franco junto con sus respectivas fiscalizaciones.

En cuanto a la actividad de Conexión a la Red Urbana existente, se presentan avances en limpieza de cunetas, bacheo superficial. En el Acceso Rural Lote 1 y 2, presenta avances en terraplén ybase granular.

En lo referente al Componente 2 la actividad de construcción del Puento sobre el Río Monday, se concluyó 0'¿el hormigonado del Estribo 01, en proceso de impermeabilización de superficie interna para proceder con el relleno.

Pilar 1 – Se hormigonó la 1era Tropa del Lado Izquierdo y Lado Derecho, en proceso el encofrado de la 2da Tropa del Lado Derecho.

Pilar 2 – Se hormigonó la 1era Tropa del Lado Izquierdo y Lado Derecho, en proceso de tratamiento de junta para la 2da Tropa del Lado Derecho.

Pilar 3 – Se hormigonó la 1era Tropa del Lado Izquierdo y Lado Derecho.

Pilar 4 – Se hormigonó la 1era Tropa del Lado Izquierdo y Lado Derecho.

Pilar 5 – Continúan los trabajos de perforación para la cimentación.

Pilar 6 – iniciaron los trabajos de conformación de plataforma de trabajo y transporte de aceros para los pilotes.

Pilar 7 – Se hormigonó la 1era Tropa del Lado Derecho y Lado Izquierdo.

Pilar 8- Se hormigonó la 4ta Tropa del Lado Izquierdo y Lado Derecho, en proceso de encofrado de la 5ta Tropa del Lado Izquierdo.


Pilar 9 – Se hormigonó la 3era Tropa del Lado Derecho y Lado Izquierdo, en proceso de la armadura de la 4ta Tropa del Lado Derecho.

Pilar 10 - Se hormigonó la 2da Tropa del Lado Derecho e Izquierdo, en proceso de encofrado del Dintel.

Se concluyó con el hormigonado del Estribo 02, incluidos los pedestales.

Proyecto		Mejoramiento Pavimentación Corredores de Integración Rehabilitación, Mantenimiento Red Vial(Fase II)											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		195											
Financiamiento		BID , LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		200.800.000				GS.		1.564.413.353.712			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
1.492.790.324.760				71.623.028.952				95,42%					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/11/2013				16/09/2021				31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Itapúa, San Pedro											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00 %						100,00 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
70.858.587.497				27.240.298.307				38,44		%			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

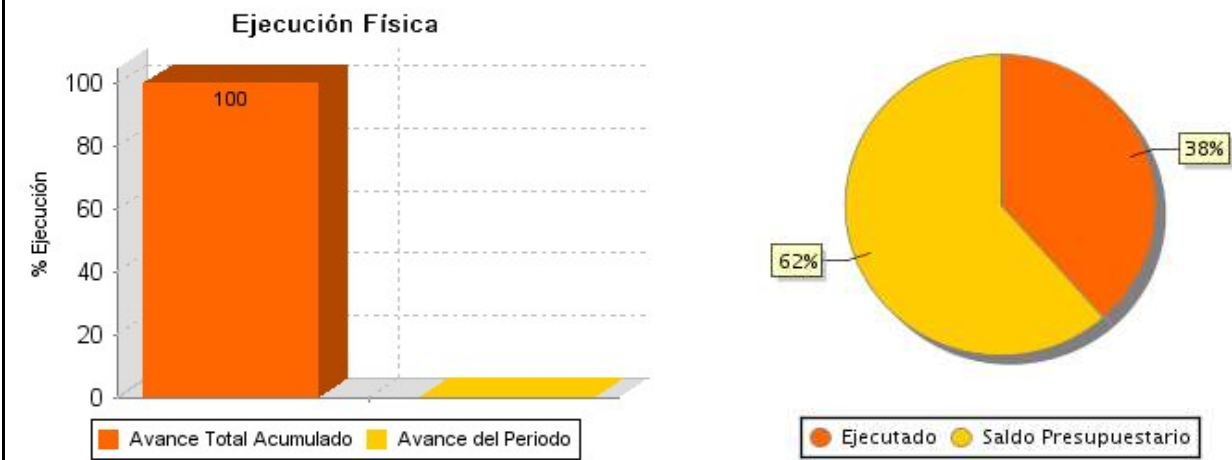

SITUACIÓN ACTUAL

La obra de Rehabilitación y Pavimentación del Tramo Vaquería - Empalme Ruta N° 10, total de 57,31 km; Culminado con Recepción Final.

Las obras de puesta a punto ya culminaron en un 100%,


Las obras se encuentran en etapa de mantenimiento a la espera de la recepcion final: 1) Ruta Nacional N° 5 “Gral. Bernardino Caballero” Tramo Concepción – Yby Yauú (109 km).

Las obras culminadas son 1) Rehabilitación y Mantenimiento por Niveles de Servicio GMANS; Rutas PY05 y PY03, 142 km. Tramos: a) PY05: YBY YAU – P.J. Caballero, 103 km., y b) PY03: AZOTÉY – YBY YAU, 39 km. Culminado 2) Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY03 Tramo: Rotonda Calle 6.000-Ruta 3-Azotey, 151 km. Culminado 3) Rehabilitación y Mantenimiento GMANS Ruta PY06 Tramo: Minga Guazú - Acceso a Capitán Meza/Natalio, 172 km. Culminado 4) Ruta Nacional N° 10 “Las Residentas” Tramos Rotonda Calle 6000 – Yasy Kañy (55 km); Yasy Kañy – Curuguaty (22 km) y Acceso a Curuguaty (2 km). Culminado 5) Ruta Nacional N° 10 "Las Residentes" Tramos Puerto Rosario - Rotonda Arroyo Tapiracuay y los accesos a Villa del Rosario, Gral. Aquino e Itacurubi del Rosario. Culminado. Supercarretera Itaipú Tramo Ciudad del Este - Hernandarias - Cruce Carolina - Ruta Nacional N° 10 Tramo: "Curuguaty - Salto del Guairá". Total - 164 km. culminado.

En el 2do cuatrimestre fue insuficiente el Presupuesto que se dispone para cumplir con la totalidad de la Deudas de los contratos de obras.

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		219					
Financiamiento		CAF, LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	71.706.681		GS.	311.671.052.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
294.585.355.321			17.085.696.679			94,52 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
20/10/2014			20/10/2014			22/07/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
464.813.676			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

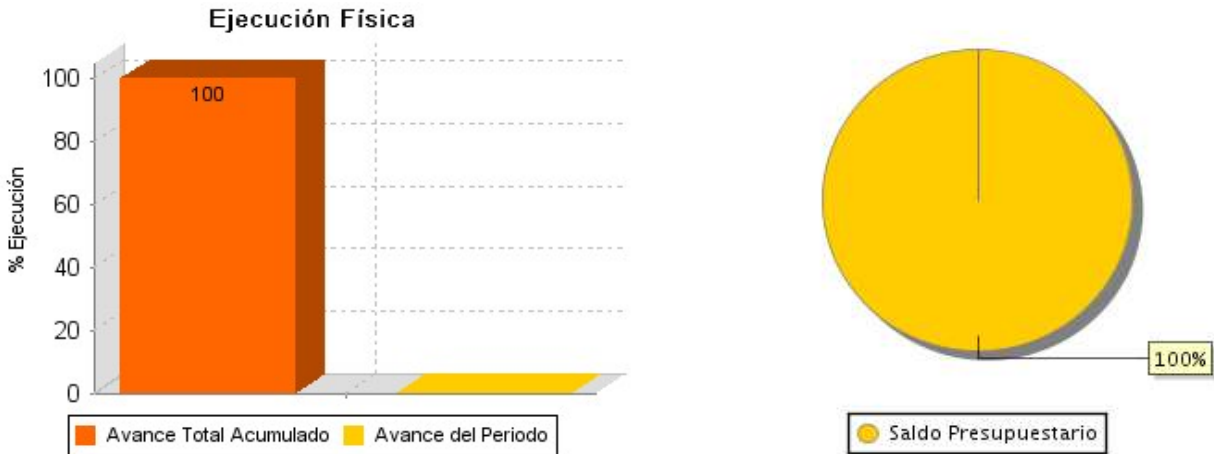


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras en su totalidad han concluido. Existen deuda pendientes en concepto de reajuste, devoluciones de retenciones y devolución de pagos de IVA.

Proyecto		Construcción Av. Costanera Norte, 2ª Etapa											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		235											
Financiamiento		FOCEM, LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		116.598.275				GS.		602.391.588.859			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
569.873.013.783				32.518.575.076				94,60 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
17/12/2014				17/12/2019				31/12/2025					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Asunción											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0 %						96 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
2.418.493.004				1.435.988.440				59,38 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

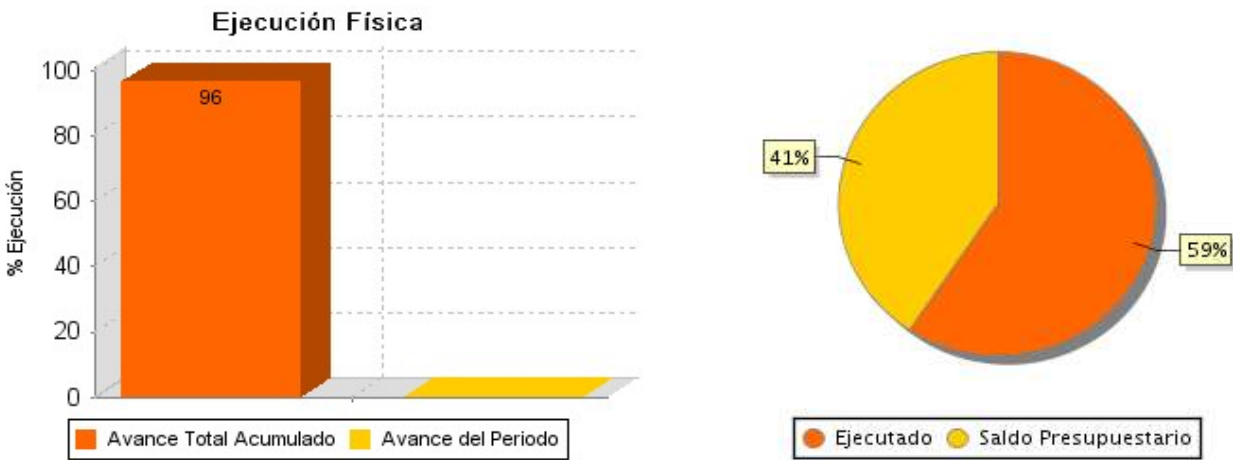


SITUACIÓN ACTUAL

La obra del proyecto se encuentra finalizada. La Unidad Ejecutora informó que se encuentran realizando gestiones dentro de la institución para la concreción de pagos correspondientes al componente de construcción consistente en devolución de retenciones, intereses moratorios y saldos de deducciones pendientes.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Alberdi - Pilar			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		259			
Financiamiento		FONPLATA, LOCAL, OFID			
Costo del Proyecto		USD	125.250.000	GS.	1.129.367.243.085
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
1.071.296.392.963		58.070.850.122		94,86 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/05/2016		22/06/2021		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Alberdi, Guazú Cuá, Pilar, San Juan B. de Ñeembucú, Villa Franca				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,86 %			95,89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
35.760.042.099		3.645.490.900		10,19 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

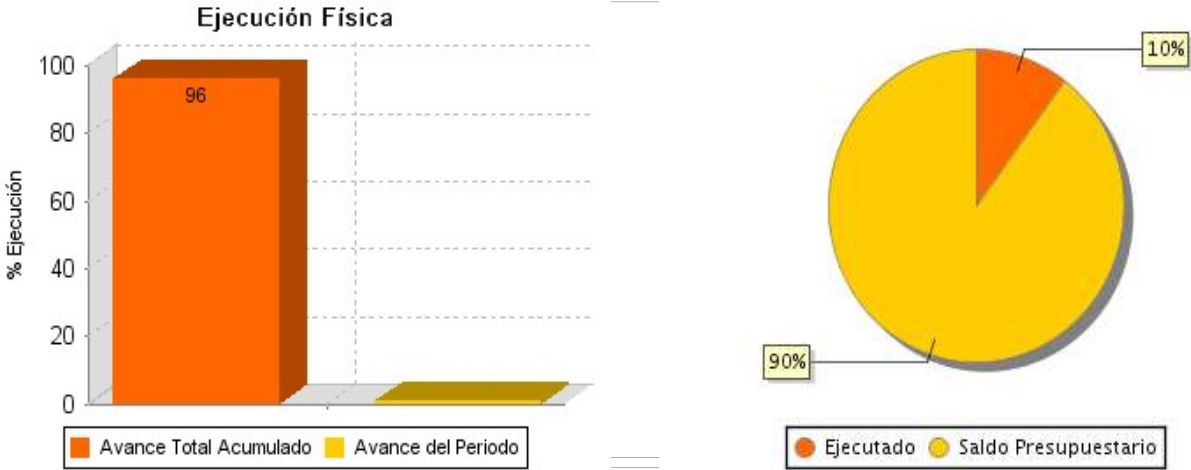


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo se reporta que se ha gestionado la solicitud de recursos presupuestarios de fondos locales para honrar pagos pendientes presentados por la empresa contratista de la Obra 1, que abarca desde el desvío de Alberdi hasta el Río Tebicuary y la travesía urbana de Villa Franca. Cabe mencionar que las obras se encuentran culminadas y cuentan con recepción provisoria. La recepción final está prevista para octubre de 2025. La Obra 2, que se extiende desde el Río Tebicuary hasta Pilar y Acceso a la Ciudad de Pilar, la misma cuenta con Recepción Final.

Proyecto		Mejoramiento Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta VI			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		260			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	68.385.986	GS.	758.974.498.622
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
700.002.308.386		58.972.190.236			92,23 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
09/06/2015		26/11/2020			26/11/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caazapá, Itapúa				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
27.294.963.139		18.616.896.283			68,21 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

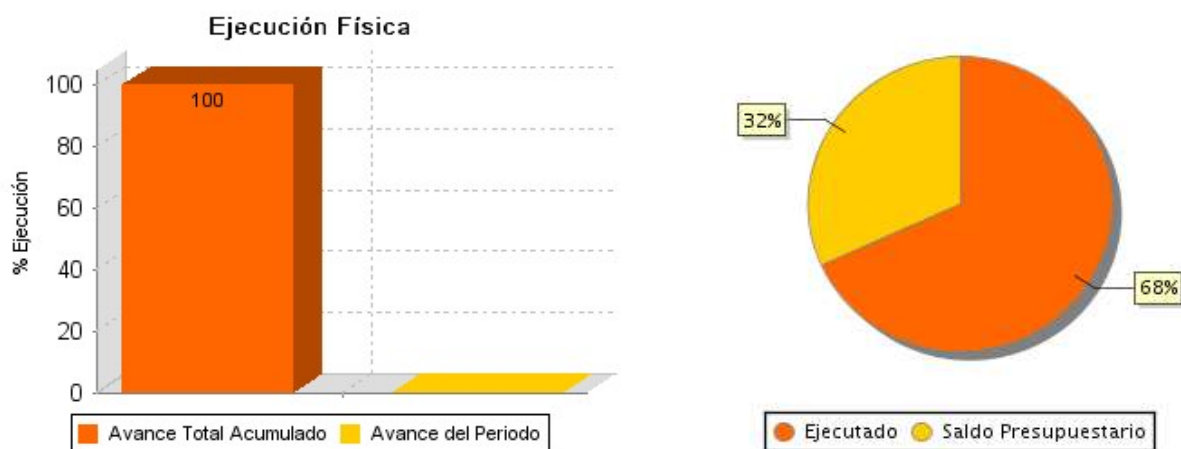

SITUACIÓN ACTUAL


Las obras de habilitación inicia en la localidad de San Juan Nepomuceno y que culmina en la intersección con la Ruta 6 en el Km 155 y 2,3 km al norte del Cruce Kimex, de 84,66 Km y de; 4,83 Km de accesos, ha culminado y cuenta con Recepción Definitiva – El monto del contrato aumento un 38.85% entre reajustes, adendas e intereses moratorios.

Estado de los llamados ambientales: 1. Llamado N° 06/19 - Contratación de servicios de consultoría para la ejecución del programa de monitoreo de salud y calidad ambiental en el área de influencia del Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N°6. Plan de Gestión Ambiental, se ha cancelado. 2. ID - 414853 - Fortalecimiento de áreas Silvestres del área de influencia del tramo san juan Nepomuceno- Empalme ruta N° 6, ha culminado. 3. ID - 414582 Servicios de Consultoría para la Evaluación Final del Programa PR L 1007- PR L 1075 PR L 1080 – cancelado, será realizado a través de la ECATEF.

Los avances al 2do cuatrimestre de las Consultorías en Ejecución son: 1. Llamado N° 15/18. Contrato firmado los servicios de consultoría para la ejecución del programa de apoyo productivo a comunidades campesinas vulnerables del área de influencia del tramo san juan Nepomuceno - empalme ruta N° 6 – Aprobado el Informe Final con No Objeción del BID 2. Llamado N° 16/18. Servicios de consultoría para el programa de recuperación y restauración de corredores biológicos y bosques protectores - Plan de Gestión Ambiental – Aprobado el Informe Final. 3. Llamado N° 21/18. Servicios de consultoría para la ejecución del programa de reforestación sostenible plan de gestión ambiental, Aprobado Informe Final. 4. Llamado N° 23/18. Servicios de consultoría para la ejecución del plan de pueblos indígenas del área de influencia del tramo san juan Nepomuceno - empalme ruta N° 6. Aprobado el informe final ya cuenta con No Objeción del BID.

Proyecto		Construcción del CIRS de Emboscada					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		273					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	49.800.000		GS.	224.100.000.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
172.884.330.756			51.215.669.244			77,15 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
16/02/2016			16/02/2018			31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Asunción, Central						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00		%		89,75		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
1.561.983.016			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

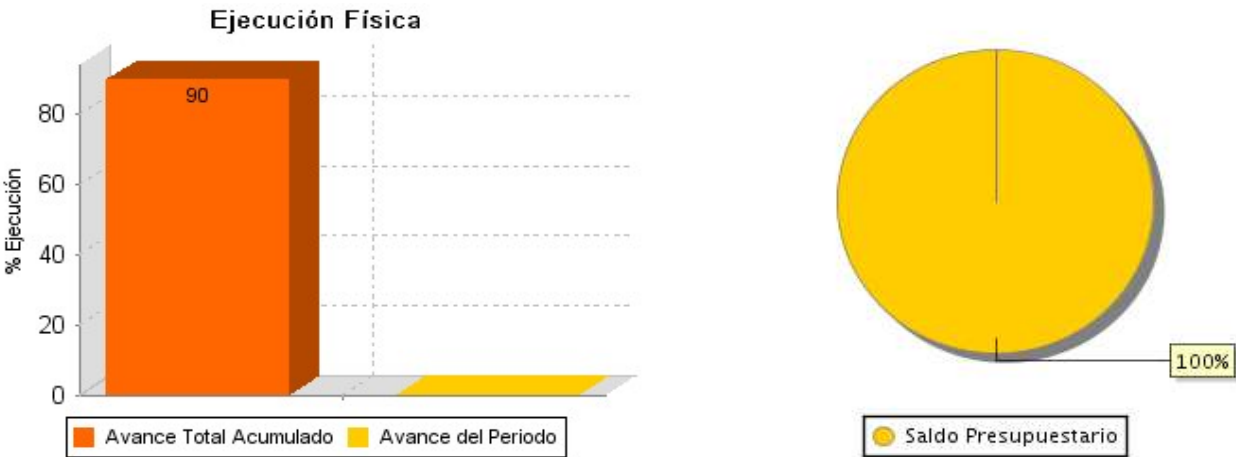


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras cuentan con recepción definitiva y ya culminaron en el ejercicio fiscal 2024. El proyecto tiene pendiente pagos finales.

Proyecto		Mejoramiento del Serv. de Alcant. de la Bahía de Asunción											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		310											
Financiamiento		BID											
Costo del Proyecto		USD		62.317.000				GS.		491.585.661.429			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
451.927.986.123				39.657.675.306				91,93 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
16/06/2016				23/06/2021				31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Asunción											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0 %						96 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
32.784.751.271				6.716.393.062				20,49 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

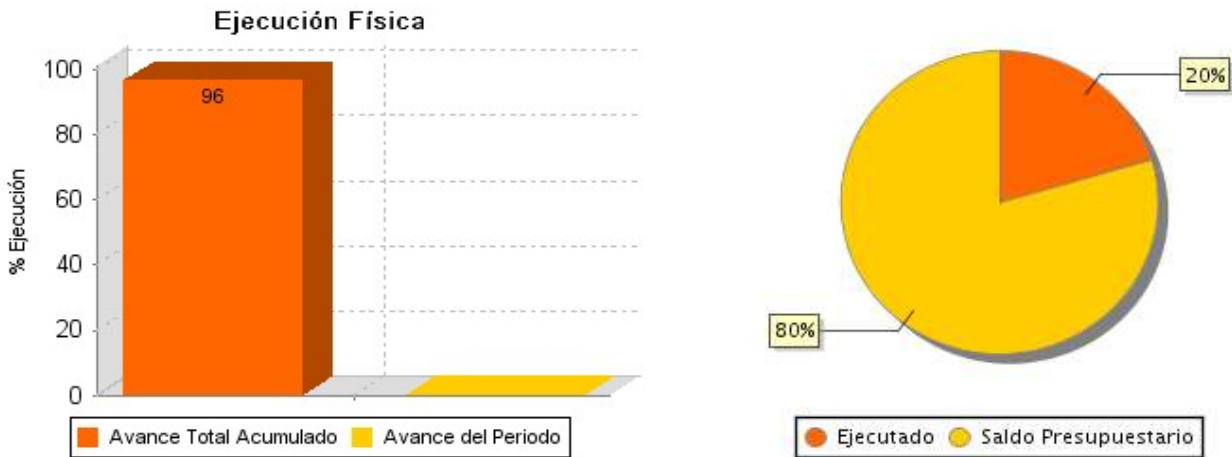


SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre el MOPC reporta que no ha podido realizar pagos de las deudas debido a la falta de disponibilidad presupuestaria. Estas deudas consisten en devolución de retención caucional y pagos de reajustes pendientes. Las obras de construcción de redes de Asunción, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Varadero y la Planta de Tratamiento de Aguas residuales de Bella vista ya se encuentran concluidas y operando por el Prestador (ESSAP).

Proyecto		Mejoramiento Alcantarillado de la ciudad de San Lorenzo											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		311											
Financiamiento		BID											
Costo del Proyecto		USD		48.120.000				GS.		312.293.363.651			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
292.193.438.812				20.099.924.839				93,56 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
16/06/2016				23/06/2021				31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Municipal		San Lorenzo											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0 %						99 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
19.674.921.234				5.250.054.165				26,68 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

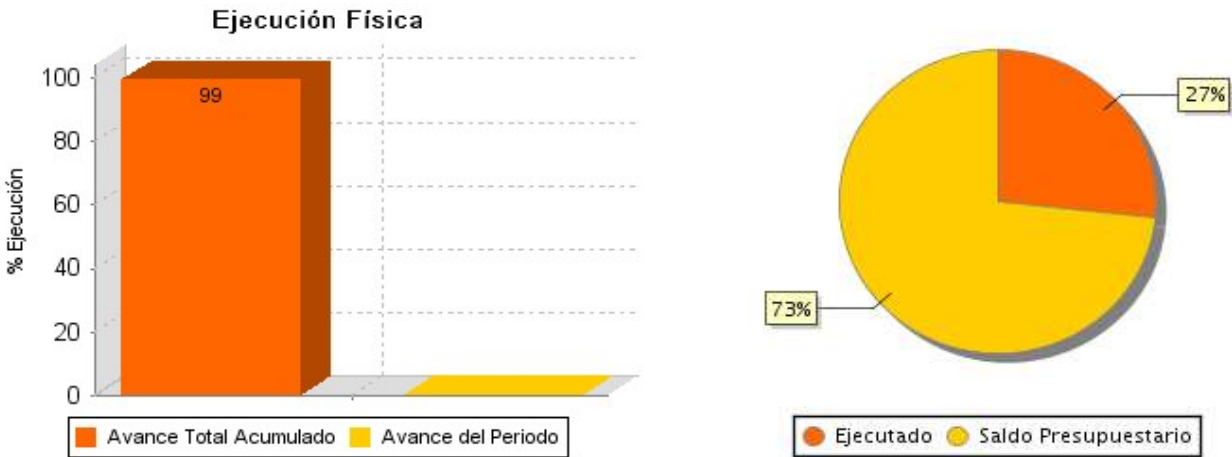


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que no se ha realizado pagos de las deudas debido a la falta de disponibilidad presupuestaria. Las deudas son en concepto de devolución de retención caucional y pagos de reajustes pendientes. Cabe mencionar que las redes de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Lorenzo ya se encuentran concluidas y actualmente operadas por el prestador (ESSAP).

Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales en la Región Oriental											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		329											
Financiamiento		BID , ICO											
Costo del Proyecto		USD		125.000.000				GS.		928.306.523.296			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
794.824.460.859				133.482.062.437				85,62 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
25/11/2015				25/11/2020				31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,07 %						91 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
3.544.362.494				2.392.175.638				67,49 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

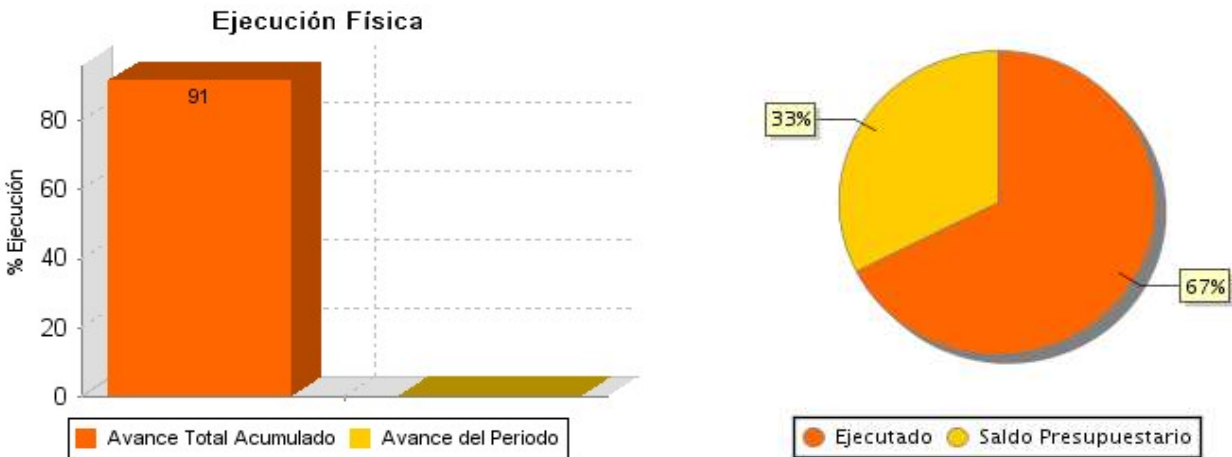


SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del segundo cuatrimestre se informa que las actividades previstas dentro del proyecto, tanto para caminos rehabilitados, puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y consultorías, se encuentran finalizadas y en proceso de pagos finales. En ese sentido se ha registrado el pago de la devolución de la retención del 50% en el marco del Llamado N° 9/2018, Lote 3, Tanda 2 referente a reemplazo de puentes de madera por puentes de hormigón armado en tramos mejorados

Proyecto		Habilitación y Mant. Ruta Nacional N° 9 y Acc. Col. Menonita					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		383					
Financiamiento		BID , CAF, LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	670.386.143		GS.	4.688.049.304.307	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
4.392.691.182.205			295.358.122.102			93,70 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
18/09/2018			20/9/2025			20/9/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Boquerón, Presidente Hayes					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
3,11 %				96 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
341.170.639.028			178.080.916.951			52,20 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

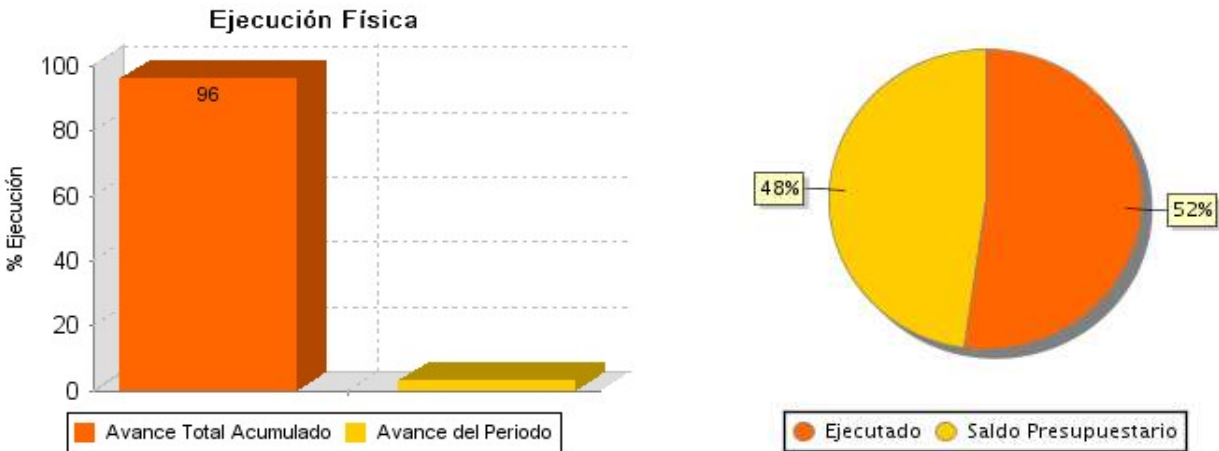

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta el siguiente estado de las obras:

Tramo 1, Lote 1 (PROG. 50+000 a PROG. 112+000), tiene un avance físico de 100%, con una pavimentación asfáltica de 60 kilómetros, se encuentra en etapa de mantenimiento;

Lote 2 (PROG. 112+000 a PROG. 173+000), tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 61 kilómetros, se encuentra en la etapa de mantenimiento.

Tramo 2, Lote 3 (PROG. 173+000 a PROG. 250+000). tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 74 kilómetros se encuentra en etapa de mantenimiento;

Lote 4 (PROG. 250+000 a PROG. 326+000), tiene un avance físico de 100% con una pavimentación asfáltica de 73 kilómetros se encuentra en etapa de mantenimiento.



Tramo 3, Lote 5 (PROG. 326+000 a PROG. 390+000). tiene un avance físico de 100%, se encuentra en Etapa de Mantenimiento;

Lote 6 (PROG. 390+000 a PROG 450+000), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en etapa de mantenimiento.

Tramo 4, Lote 7 (PROG. 450+000 a PROG. 525+000), tiene un avance físico de 100% se encuentra en etapa de mantenimiento;


Lote 8 (Accesos), tiene un avance físico de 100%, se encuentra en etapa de mantenimiento. Los trabajos en esta etapa consisten en limpieza de la franja de dominio y de los drenajes, bacheo en las calzadas habilitadas y las operaciones de bascula móvil.

Cabe mencionar que al momento del cierre del presente informe el MOPC no ha remitido el reporte de avance físico cuatrimestral con la totalidad de los ajustes solicitados.

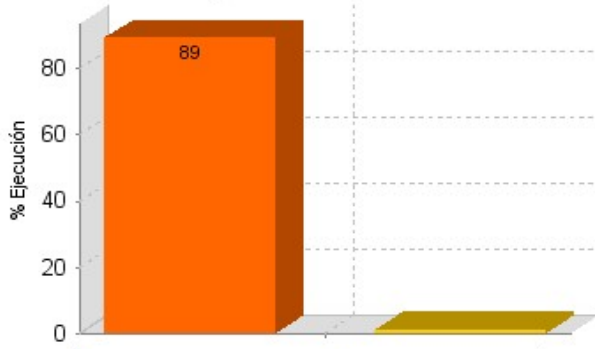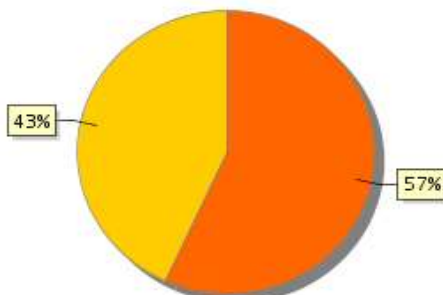 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública			
Proyecto		Mejoramiento Caminos Vecinales y Puentes en la RO			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		384			
Financiamiento		CAF, FONPLATA			
Costo del Proyecto		USD	142.911.000	GS.	1.068.447.150.635
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
928.804.256.878		139.642.893.757		86,93 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/12/2018		31/12/2022		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Amambay, Caazapá, Guairá, Misiones, Paraguari, San Pedro, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,10 %			89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
87.964.010.469		49.944.043.379		56,78 %	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO					
Ejecución Física  89 Avance Total Acumulado Avance del Periodo  43% 57% Ejecutado Saldo Presupuestario					
SITUACIÓN ACTUAL					
El proyecto comprende la rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales y rurales, como así también la construcción de puentes de Hormigón Armado (HºAº) en varios puntos de la Región Oriental, actualmente en plena etapa de ejecución. En cuanto al primer contrato de rehabilitación y mantenimiento de caminos vecinales, las obras se encuentran con recepción definitiva quedando 2 contratos con recepción provisoria. Estas obras pertenecen al Grupo 1 en los departamentos de Amambay, Concepción, Caazapá, Guairá y Misiones. El segundo contrato cuenta con obras finalizadas y pertenece al Grupo 2 en el Departamento de San Pedro. El tercer contrato que se ejecuta en los Departamentos de Caazapá y Guairá tuvo un avance de 2.15 Km de caminos rehabilitados, estas obras pertenecen al Grupo 3. El cuarto contrato tuvo un avance de 0,42 km. de caminos rehabilitados, pertenecientes al Grupo 4, en el Departamento de San Pedro. En cuanto a la construcción de puentes de hormigón armado se encuentra en ejecución un contrato que abarca los Departamentos de Canindeyú, Caazapá y Paraguari, esta actividad tiene 5 lotes de los cuales tres lotes cuentan con recepción provisoria y 2 lotes en ejecución. El segundo contrato de construcción de puentes se encuentra con un avance de 11,81 ml de puentes construidos, esta actividad tiene 7 lotes, el llamado se encuentra en ejecución. El tercer contrato de construcción de puentes de hormigón armado FONPLATA en el Departamento de San Pedro corresponde a una Licitación adjudicada. En cuanto a la fiscalización de las obras de caminos Grupo 1 CAF, se encuentra con servicio finalizado. La Fiscalización de las obras de caminos Grupo 3 CAF, presenta servicio finalizado. Mientras que la fiscalización de las obras de caminos FONPLATA cuenta con ampliación y regularización de plazos. Con respecto a la fiscalización de las Obras de Puentes 1ra tanda CAF cuenta con servicio finalizado al igual que la fiscalización de las Obras de Puentes 2da tanda. La fiscalizacion de Construcción de Puentes de hormigón armado FONPLATA en el Departamento de San Pedro se encuentra en etapa de evaluación. En cuanto al servicio de Consultoría de Apoyo Técnico y fiduciario al Proyecto de Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Región Oriental (Financiación CAF-FONPLATA) tuvo tres informes presentados y aprobados.					

Proyecto	Construcción y protección de márgenes del Arroyo Rosedal				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	443				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	27.184.631.727
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
2.219.799.925		24.964.831.802			8,17 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
31/12/2025		31/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Villa Elisa				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			1 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
10.005.000.000		2.219.799.925		22,19 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

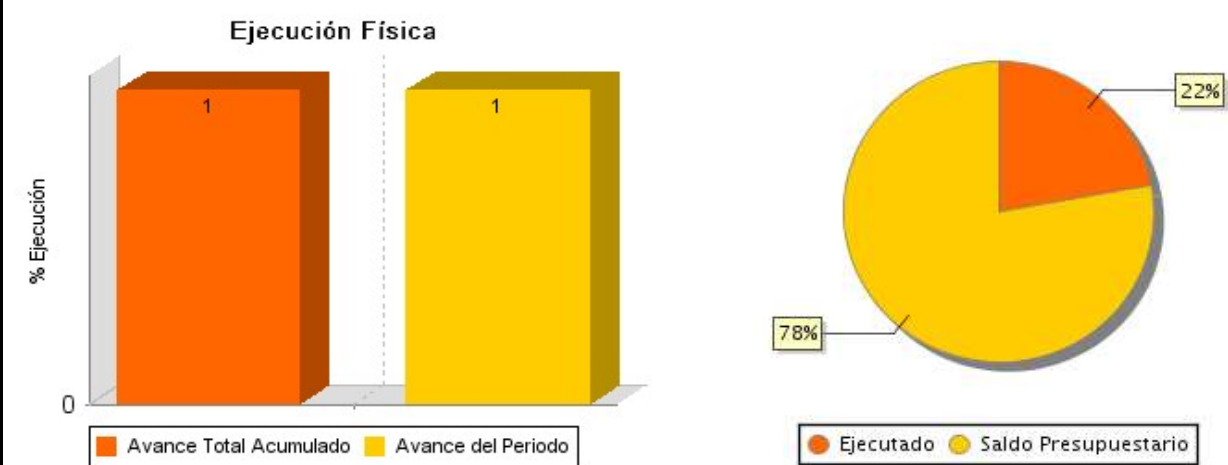


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre, se ha concretado el pago del anticipo financiero al Consorcio Emprendimientos del Sur adjudicado para la Obra “Construcción y protección de márgenes del Arroyo Rosedal” Llamado MOPC N° 62/2024

Proyecto	Habilitación de la Red Vial Pavimentada en Cordillera, Paraguairí, Caaguazú, Caaguazú, Guairá y Caazapá.				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	451				
Financiamiento	CAF, FONPLATA				
Costo del Proyecto	USD	201.878.982.976		GS.	593.091.656.828
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
544.476.058.350		48.615.598.478		91,80 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018		04/01/2025		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Caazapá, Cordillera, Guairá, Paraguairí				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
3,26 %			90,69 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
54.786.750.963		12.275.439.027		22,41 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

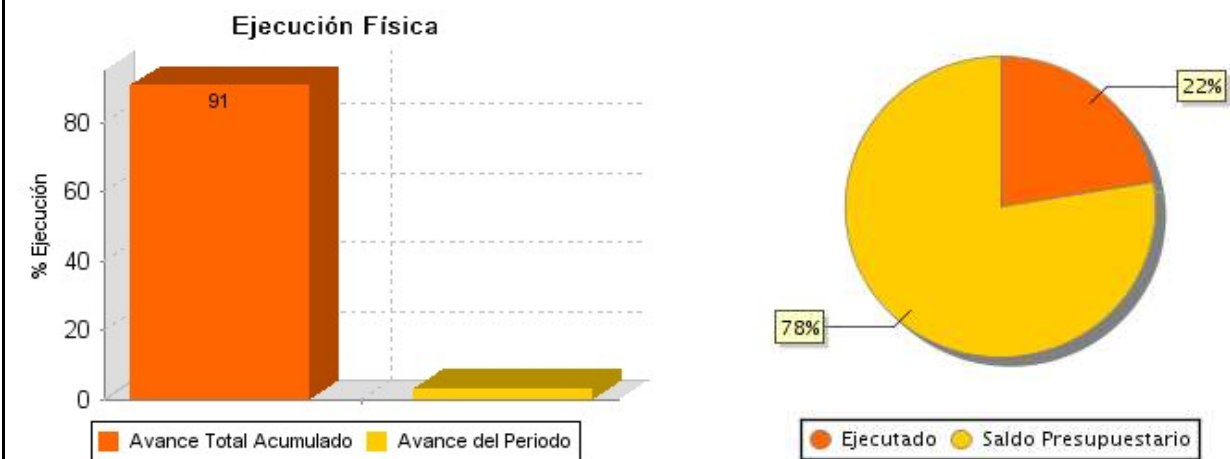


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido al cierre de la elaboración del presente informe, a las consultas realizadas por la DGIP.

Proyecto		Habilitación de la Red Vial Pavimentada Villeta - Alberdi					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		455					
Financiamiento		CAF, FONPLATA					
Costo del Proyecto		USD	31.889.950		GS.	189.562.926.102	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
153.691.261.512			35.871.664.590			81,08 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
04/01/2018			04/01/2025			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Central					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2,55 %				98,79 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
22.005.711.371			1.417.632.505			6,44 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

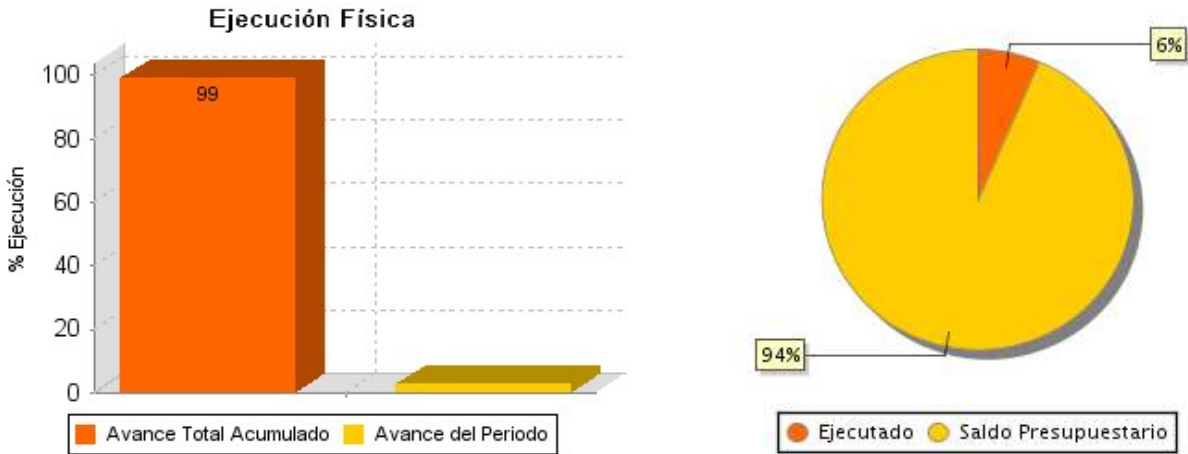


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido al cierre de la elaboración del presente informe, a las consultas realizadas por la DGIP.


Proyecto		Mejoramiento de 160km de caminos vecinales en la R Oriental					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		564					
Financiamiento		BID					
Costo del Proyecto		USD	62.000.000		GS.	537.761.224.043	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
400.141.904.373			137.619.319.670			74,41	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
05/01/2018			05/01/2023			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2,39 %				95 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
47.655.939.261			26.549.310.924			55,71	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

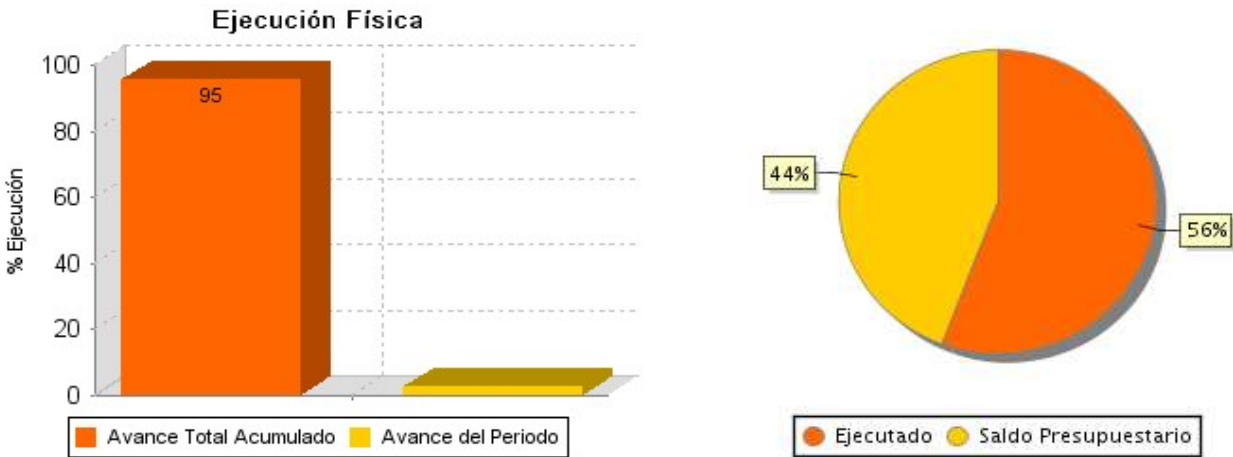

SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del segundo periodo el MOPC informa que el avance de las actividades previstas dentro del proyecto tanto como para caminos rehabilitados y puentes construidos ambas con sus fiscalizaciones y consultorías, es el siguiente: Para los caminos Rehabilitados dentro del Proyecto, se registran un total de 2,97 km de caminos rehabilitados dentro de la Región Oriental de 745,37 km a rehabilitar, así también se informa que no hubo avance físico en puentes construidos debido a que los mismo se encuentran en etapa de recepción provisoria. Se informa además que las empresas fiscalizadoras acompañan todo lo concerniente a las aprobaciones de las obras construidas. Los certificados correspondientes a las consultorías de apoyo técnico y fiduciario a los proyectos de mejoramiento de caminos vecinales y de evaluación intermedia se procesan con normalidad honrando el pago de acuerdo al visto bueno de la Dirección de Caminos Vecinales. Se informa que el proceso de contratación de firma consultora para la Evaluación Final del programa no será realizado, considerando que se encuentra en gestión un convenio modificatorio, en el contrato de Evaluación Intermedia (A.3), en la cual será incluida el producto.

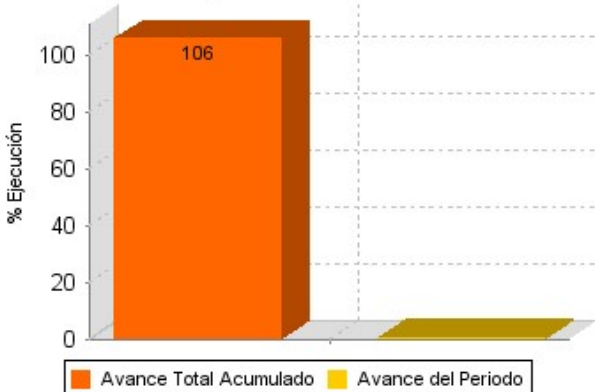 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA <td colspan="2">  Sistema Nacional de Inversión Pública </td>		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto	Ampliación y Duplicación de las Rutas 2 y 7		
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES		
Código SNIP N°	566		
Financiamiento	APORT. DE FOND. PARA GASTOS INHE. A LA OBRA (LEY N° 5102/13)		
Costo del Proyecto	USD	1.579.315.226	GS. 9.213.725.027.121
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
4.022.525.426.954		5.191.199.600.167	43,66 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
01/09/2019		14/03/2047	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Central, Cordillera		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0,50 %		53,81 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
955.344.736.776		748.685.878.683	78,37 %
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			
Ejecución Física  106 22%  78% Avance Total Acumulado Avance del Periodo Ejecutado Saldo Presupuestario			
SITUACIÓN ACTUAL			
/Los avances del cuatrimestre al término del periodo de mayo - agosto 2025: el Contrato PPP 01/2017 se encuentra en la Fase de Operación, tal como lo indica la Resolución MOPC N° 188 del 26 de febrero de 2024, está establece que la Fase de Construcción concluyó el 30 de junio de 2023, con la Puesta en Servicio Provisoria Final de todos los tramos funcionales del Contrato. Es así que, la Fase de Operación se centra en el mantenimiento y la operación de la Ruta PY02, asegurando que se brinde el nivel de servicio esperado para los usuarios de la misma, en esta etapa se realizan las siguientes actividades relacionadas al mantenimiento como ser la limpieza de la franja de dominio, las cunetas y drenajes, al corte de la vegetación, la reposición y limpieza de la señalización vertical y de las barreras metálicas, reparaciones de cunetas, reposición de firme, demarcación horizontal, recogida y limpieza de basuras y reparaciones de baches, entre las principales. Cabe mencionar que también se realizan las actividades relacionadas a la operación como ser el control y manejo de los Puestos de Peajes, del Puesto de Pesaje, el control de las ocupaciones en franja de dominio y asistencia a los usuarios en la vía. Lo que respecta a la Supervisión se vienen realizando acciones tendientes a velar por el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la fase de operación del proyecto. Estas tareas corresponden principalmente a verificar el cumplimiento de los estándares técnicos vinculados a dichos niveles, debiendo aplicar las deducciones que correspondan, en caso de incumplimiento de los mismos, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato, a través de inspecciones periódicas. Es importante mencionar que la Adenda N° 5, se encuentra en ejecución, esto se realiza a través de las Resoluciones MOPC N° 1783/2024 y Resolución MOPC N° 2092/2024, como También mencionar que se firmó la Adenda N° 6, en fecha 26 de febrero de 2025 y se encuentra para la puesta en servicio provisoria. La Adenda N° 7, se encuentra para aprobación del proceso competitivo.			

Proyecto	Mejoramiento TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	574			
Financiamiento	APORT. DE FOND (LEY N° 5074/13)			
Costo del Proyecto	USD	443.473.727	GS.	1.482.806.180.214
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
1.477.929.047.833		4.877.132.381		99,67 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
11/05/2018		30/04/2022		31/12/2024


Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental	Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes
---------------	---

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total
0 %	100 %

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
7.053.969.600	2.176.837.219	30,86 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

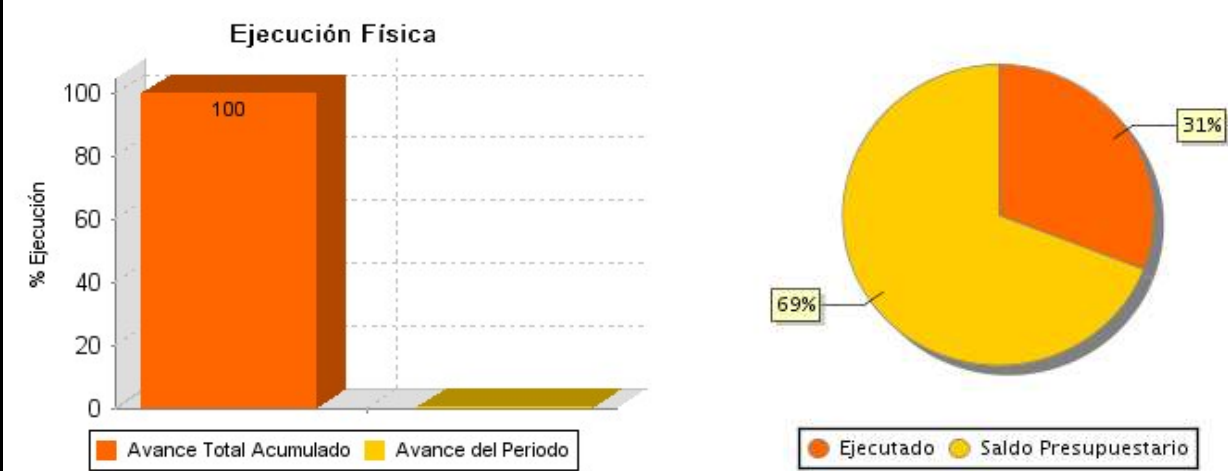


SITUACIÓN ACTUAL

En general, ambos frentes de trabajo se encuentran culminados en su totalidad; de un total de 277,728 km de pavimentación; teniéndose así un total 100% de trabajos realizados. En el presente cuatrimestre se realizaron el pago a los afectados al Proyecto, totalizando 2.176.837.219 Gs.

Proyecto	Habilitación de la Red Pav. Dptos. San Pedro, Caaguazú y Canindeyu				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	594				
Financiamiento	BIRF				
Costo del Proyecto	USD	53.057.700		GS.	411.614.354.995
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
254.235.158.209		157.379.196.786		61,77 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018		31/12/2025		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caazapá, Canindeyú, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6,26 %			57 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
103.455.146.971		43.883.083.616		42,42 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

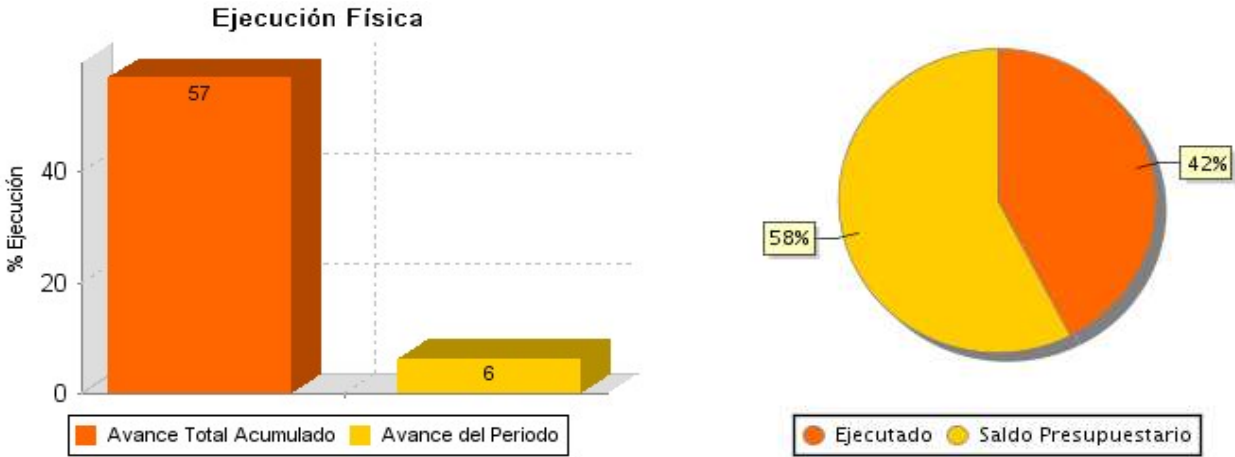

SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del segundo cuatrimestre en el marco de ejecución del proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) por Índice de Servicio, el MOPC reporta los siguientes avances: Se presentaron certificados del periodo de obras de puesta a punto y de la etapa de mantenimiento, por lo que los avances en km se consideran en la longitud total del tramo, ya que se verifica mensualmente el estado general del mismo.


Las obras realizadas en el contrato CREMA de Malla Norte fueron: Concreto asfáltico convencional, concreto asfáltico tipo F10, señalizaciones horizontales y verticales, mejoramiento del acceso a la UNA de San Estanislao, construcción del puesto de la patrulla caminera del Cruce Tacuara como parte de las obras de la Rotonda, obras de la Rotonda del Cruce Tacuara, mejoramiento de accesos a comunidades indígenas Tekojoja, Pakuri. Además, se procesaron sin inconvenientes los Informes presentados en la institución por parte del consorcio encargado de la fiscalización de rutas rehabilitadas y mantenidas.

En ese mismo sentido, en las obras en ejecución de Planes Urbanos Malla Norte se procesaron sin inconvenientes los certificados presentados a la institución.

Con respecto a la Licitación 451737 - Llamado MOPC N.º 64/2023 referente a la adquisición de equipos educativos para campañas de seguridad vial, se realizó la provisión total de los equipos licitados y se procesó sin inconvenientes el certificado presentado a la institución.

Proyecto	Habilitación de la Red Pav., Dptos de Misiones e Itapúa				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	595				
Financiamiento	BIRF				
Costo del Proyecto	USD	46.540.241	GS.	480.928.554.027	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
256.288.533.020		224.640.021.007		53,29	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
05/01/2018		31/12/2025		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Itapúa, Misiones				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6,15 %			41 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
91.532.637.240		51.456.799.756		56,22	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

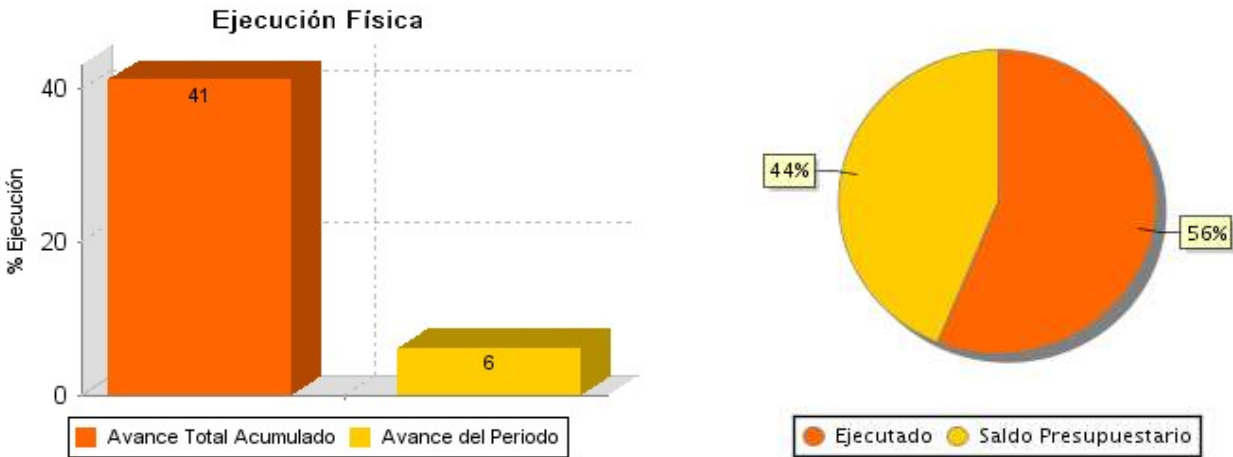

SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del Segundo Cuatrimestre el MOPC informa que los avances de obras en la etapa de mantenimiento se consideran en la longitud total del tramo, ya que se verifica mensualmente el estado general del mismo. En ese sentido, las intervenciones en obras según datos de los especialistas técnicos de la UEP son las siguientes: Se han reparado y solucionado desnivel entre banquina y talud, remoción de obstáculos en calzada, reducción de espesor de pavimento, materiales sueltos, obstrucciones al escurrimiento de la vía, exceso de vegetación, pozos, entre otros.

El Llamado para Servicio de Consultoría para la elaboración de Material educativo para escolares y plataforma web de escuela virtual se encuentra en etapa de publicación por parte de la DNCP, mientras que el Llamado de Servicio de Selección de Consultores para Auditoría Financiera y Contable Externa del Proyecto de Préstamo UEP 8638 para los siguientes ejercicios 2024 al 2025, se encuentra en etapa de evaluación cerrada. Se estima completar todos los procesos en el siguiente cuatrimestre para lograr su ejecución efectiva.

Proyecto	Construcción Pavmentacion NARANJAL SAN CRISTOBAL RUTA 6			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	596			
Financiamiento	APORT. DE FOND (LEY N° 5074/13)			
Costo del Proyecto	USD	45.774.773	GS.	256.338.727.450
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
254.666.848.598		1.671.878.852		99,35 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
31/10/2017		16/07/2019		31/12/2024


Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional	N/A
----------	-----

Avance Físico Reportado del Periodo	Avance Físico Acumulado Total
0 %	100 %

PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
1.876.945.322	205.066.470	10,93 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

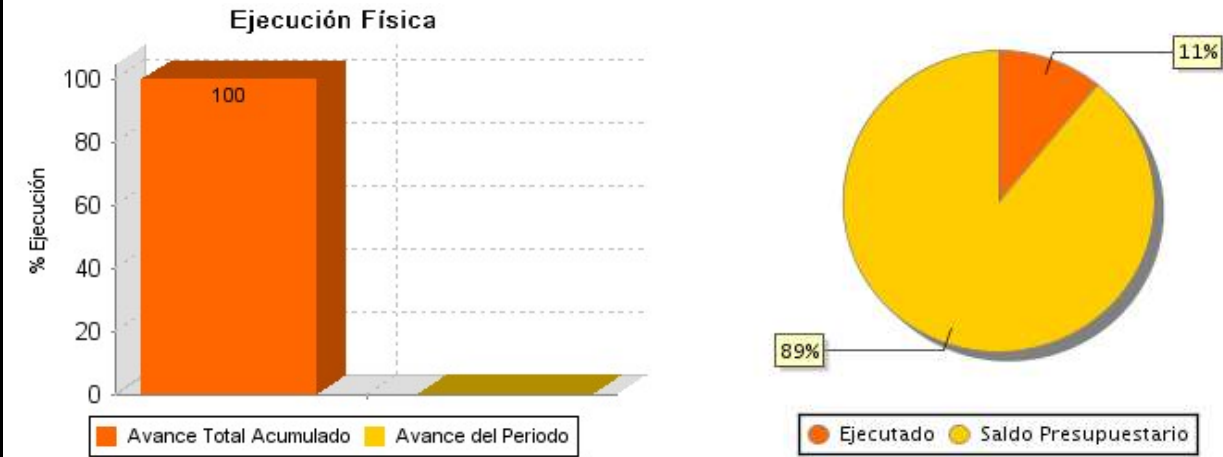


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto "Construcción de Pavimentación San Cristóbal-Naranjal-Ruta 6" consta de 5 tramos con un total de 47,5km, de los cuales dichos tramos se encuentran con recepción definitiva. El proyecto en general presenta un avance físico del 100% en cuanto a obras. En el presente cuatrimestre se realizaron las revisiones de carpetas y pago de un total de 3 expedientes, totalizando 205.066.470 Gs.

Proyecto		Mejoramiento y Conserv. tramo Ñumi - San Juan N. - Emp. RN6													
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES													
Código SNIP N°		646													
Financiamiento		BID													
Costo del Proyecto		USD		48.747.500				GS.		342.424.871.123					
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.						Porcentaje de Ejecución					
331.780.546.272				10.644.324.851						96,89 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin						Fecha de Prórroga					
23/11/2018				23/11/2025						31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto															
Departamental		Caazapá, Guairá													
Avance Físico Reportado del Periodo								Avance Físico Acumulado Total							
5,73 %								96 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025						Porcentaje Ejecutado					
18.529.889.009				16.848.226.792						90,92 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

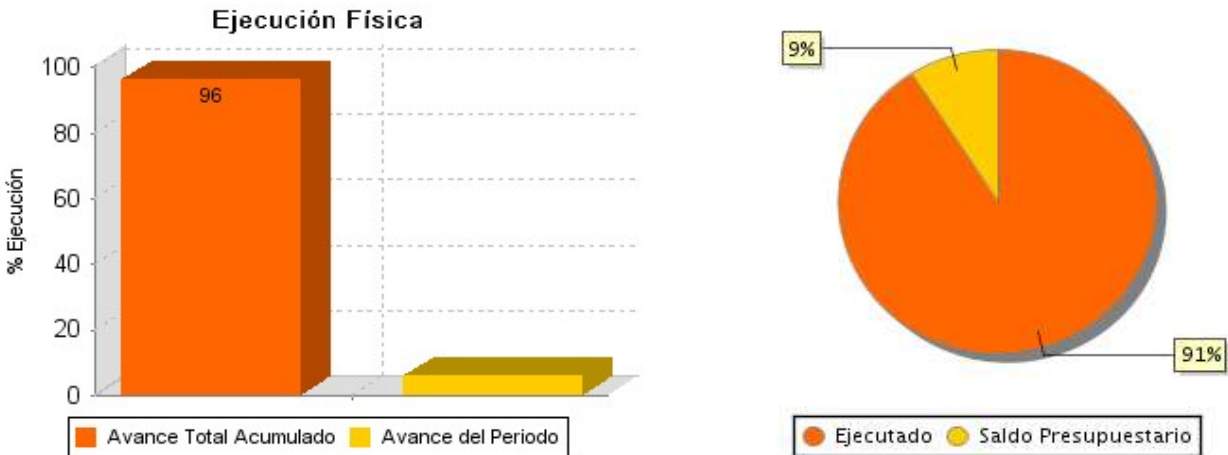


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta en el periodo de referencia que las Obras de Mejoramiento, Rehabilitación y posterior Mantenimiento del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno - Empalme con la Ruta N° 6. se encuentran en etapa de mantenimiento. Con respecto a las actividades realizadas en el periodo prosiguen los trabajos de limpieza de la franja de dominio y de los drenajes, bacheo en las calzadas rehabilitadas y las operaciones de báscula móvil. El objetivo de estos trabajos es mantener los niveles de servicio óptimos en todo el tramo. Asimismo, se continúa trabajando en los TDRs de los Servicios de Consultoría para el Plan de Gestión Ambiental. El Contrato de Pago de Adquisición de Certificados de Servicios Ambientales del Tramo Ñumi - San Juan Nepomuceno Programa, se encuentran culminados. La Consultoría de la ECATEF se encuentra culminado y con respecto a la Auditoría Externa, se presentó el Informe Correspondiente al año 2024.

Cabe mencionar que al momento del cierre del presente informe el MOPC no ha remitido el reporte de avance cuatrimestral con la totalidad de los ajustes solicitados.

Proyecto	Mejoramiento y Conserv. tramo Caaguazú - Yhu. - Emp. RN 10				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	647				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	6.994.000		GS.	52.153.436.228
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
36.799.074.843		15.354.361.385		70,56 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/11/2018		30/11/2025		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
3,76 %			99 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
2.134.834.062		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

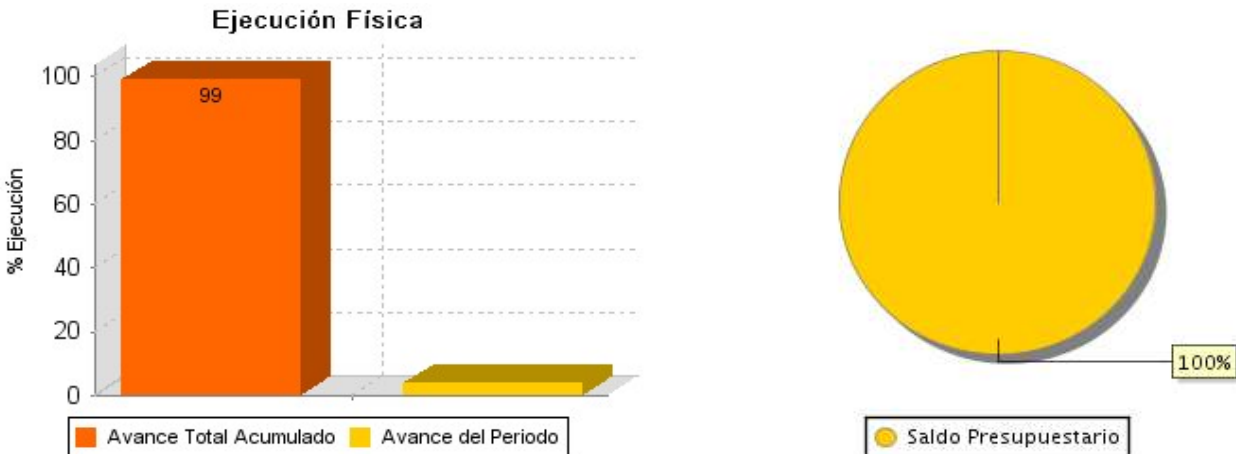


SITUACIÓN ACTUAL

La obra de mejoramiento y conservación por niveles de servicio de la Ruta N° 13, desde Caaguazú hasta el empalme con la Ruta N° 10, continua en etapa de mantenimiento y los trabajos realizados en el periodo fueron: limpieza de la franja de dominio y de los drenajes, bacheo en las calzadas rehabilitada, calzada existente y las operaciones de bascula móvil. las obras de mantenimiento son los mismos en todo el tramo en donde el objetivo principal es mantener los niveles de servicios óptimos.

Cabe mencionar que al momento del cierre del presente informe el MOPC no ha remitido el reporte de avance cuatrimestral con la totalidad de los ajustes solicitados.

Proyecto		Construcción del Hospital Nacional de Coronel Oviedo			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		649			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	60.000.000	GS.	336.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
205.866.449.922		130.133.550.078		61,27 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			59 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
20.801.221.661		16.003.636.063		76,94 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

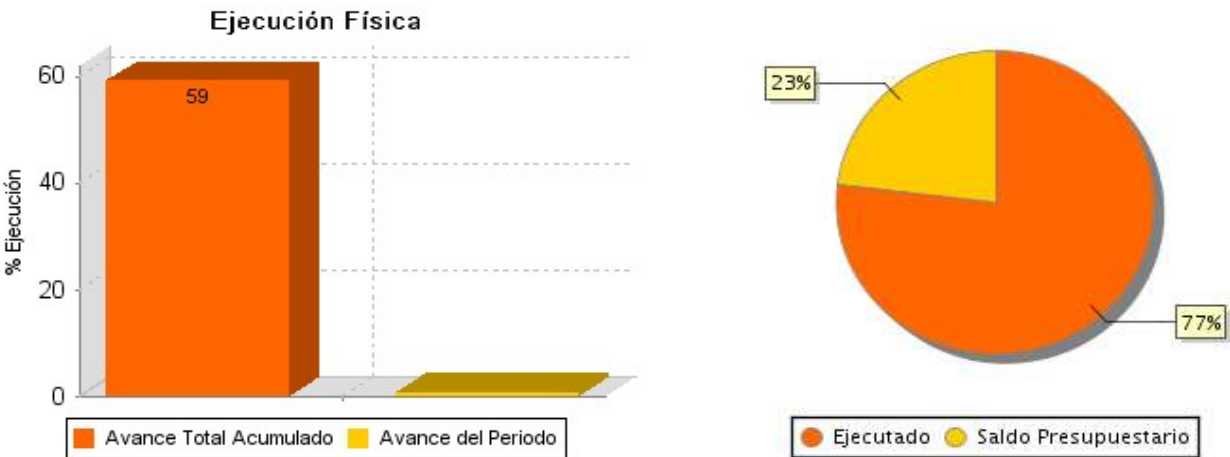

SITUACIÓN ACTUAL


El proyecto tenía pendiente trabajos correspondientes al Sistema de Impulsión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Hospital hacia el río Tebicuarymí, los cuales fueron modificados a solicitud de la comunidad, que requirió el cambio de trayecto para derivar la impulsión desde la PTAR del Hospital hacia la PTAR de la ESSAP.

Esta modificación se encuentra incluida en el Convenio Modificatorio N.º 7, el cual fue aprobado en mayo de 2025. Con la mencionada aprobación, la suspensión de la obra fue levantada en junio de 2025, permitiendo el inicio de los trabajos del Sistema de impulsión en el segundo cuatrimestre del año.

A la fecha, se han ejecutado más de 10km de colocación de cañería, y se iniciaron los trabajos de colocación del sistema del bombeo, ubicado dentro del predio del Hospital.

Proyecto		Construcción de la Franja Costera Sur											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		665											
Financiamiento		APORT. DE FOND (LEY N° 5074/13)											
Costo del Proyecto		USD		129.960.310				GS.		727.778.333.790			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
718.737.213.937				9.041.119.853				98,76 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
09/07/2021				09/07/2024				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Municipal		Asunción											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1 %						99 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
11.159.586.220				2.118.466.367				18,98 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

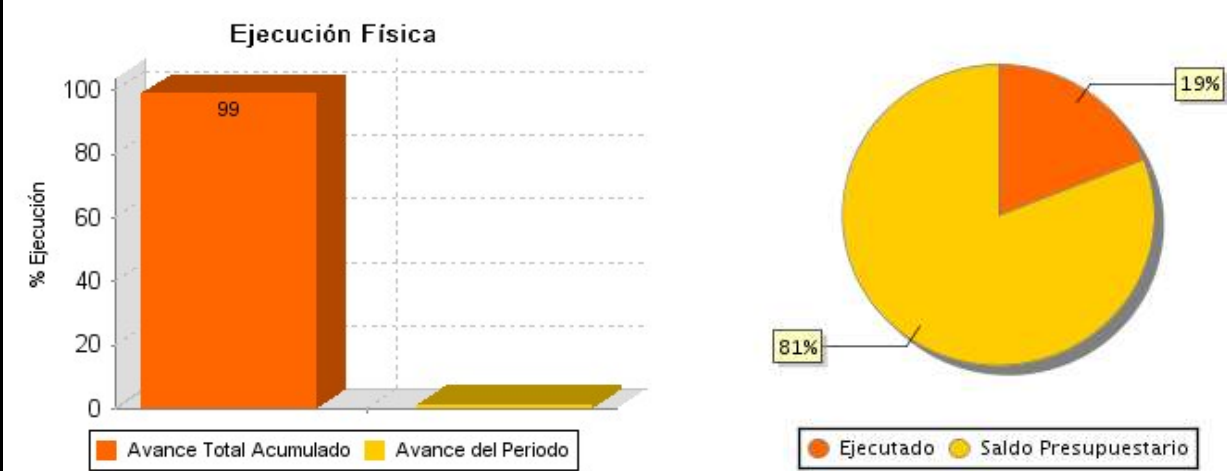


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, se realizaron pagos correspondientes al Plan de Gestión Ambiental afectado al Proyecto Costanera Sur. Actualmente, todos los hitos se encuentran culminados en su totalidad.

Proyecto		Restauración de Edificios Patrimoniales					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		719					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	42.509.174.802	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
42.462.436.475			46.738.327			99,89 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
21.738.327			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

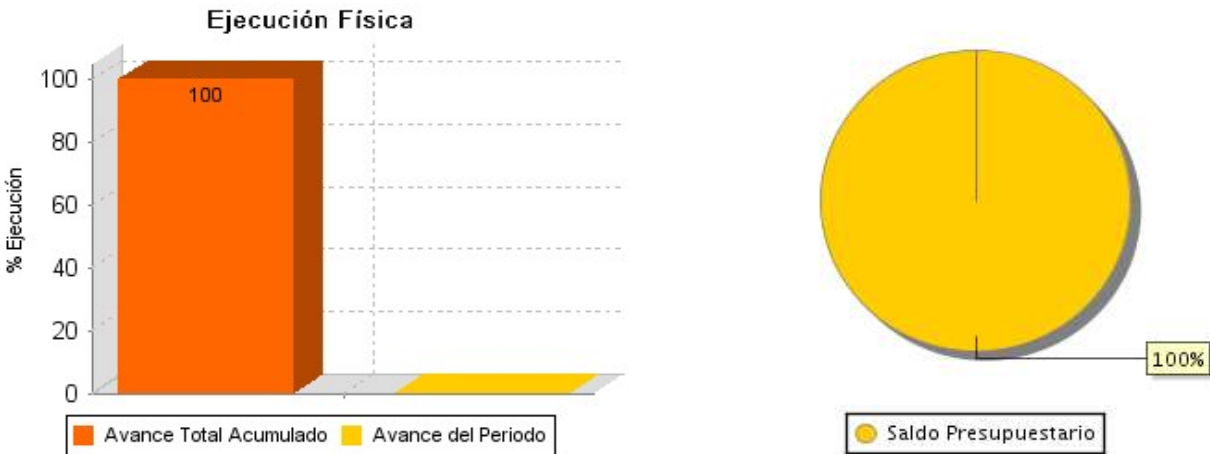


SITUACIÓN ACTUAL

La única actividad pendiente de cierre del proyecto son las Obras Complementarias de Restauración de la Fachada del Palacio Alegre sede del Ministerio de Hacienda: La Obra cuenta con Recepción Definitiva, la obra cuenta con procesos de pagos en concepto de reajustes de contrato.-

Cabe mencionar que el proyecto se ha reestructurado por el Decreto N° 4.416/2020 que limita su alcance de ejecución.

Proyecto	Construcción Asfalto sobre Empedrados - Región Sur				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	724				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	68.356.947.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
21.364.292.276		46.992.654.724		31,25%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Itapúa, Misiones, Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,50 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
3.680.609		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

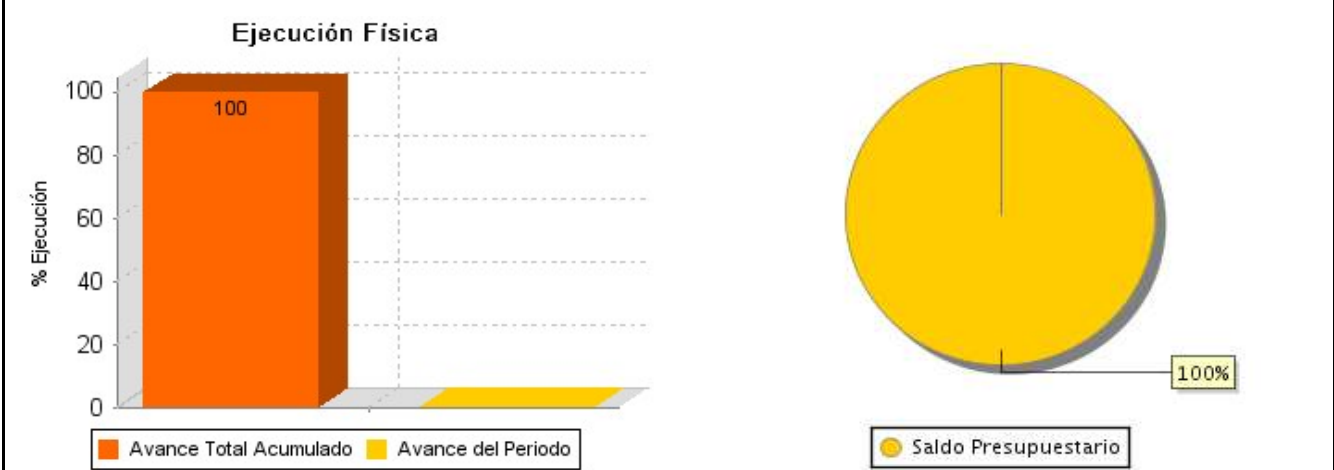


SITUACIÓN ACTUAL

La obra está enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en proceso administrativo para honrar deudas pendientes.

Proyecto		Construcción de Pavimentación Empedrados en Región Este					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		725					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	37.686.822.499	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
20.552.368.499			17.134.454.000			54,53	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2024	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				98,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
730.919.821			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

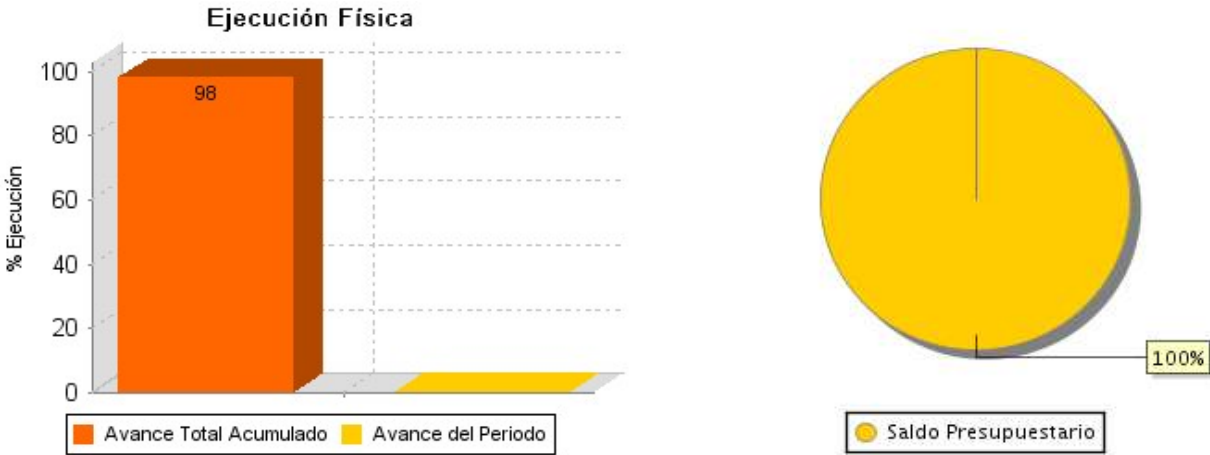


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras estan enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20, han culminado. Actualmente, en procesos administrativos para honrar deudas.

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Centro				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	729				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	530.310.336.320
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
407.539.688.686		122.770.647.634		76,85%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Guairá, Paraguari				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			99,44 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
723.381.383		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

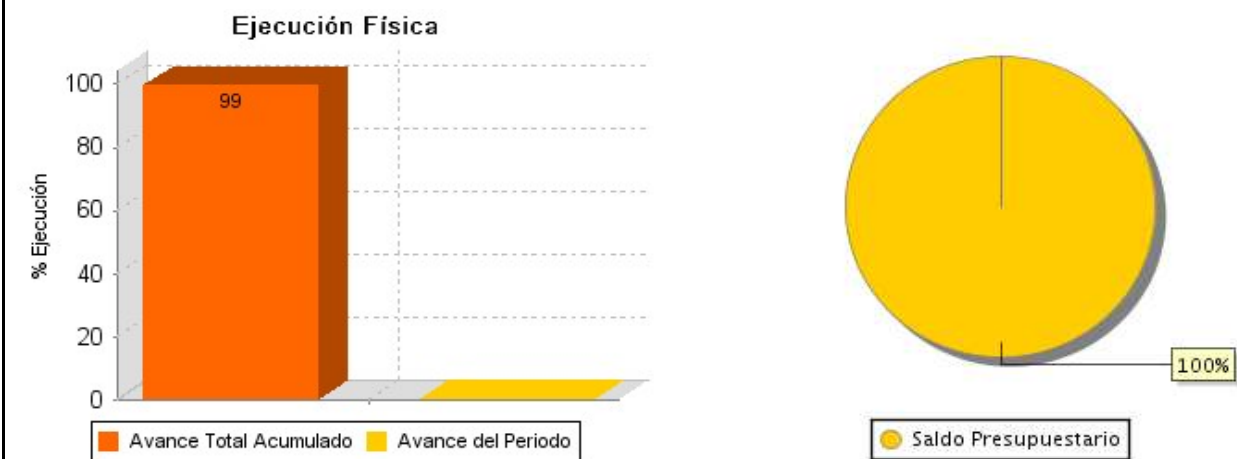


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas

Proyecto	Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Este				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	730				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	162.187.188.373
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
160.887.188.373		1.300.000.000		99,20%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná, Caaguazú, Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			98,80 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
2.601.292.249		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

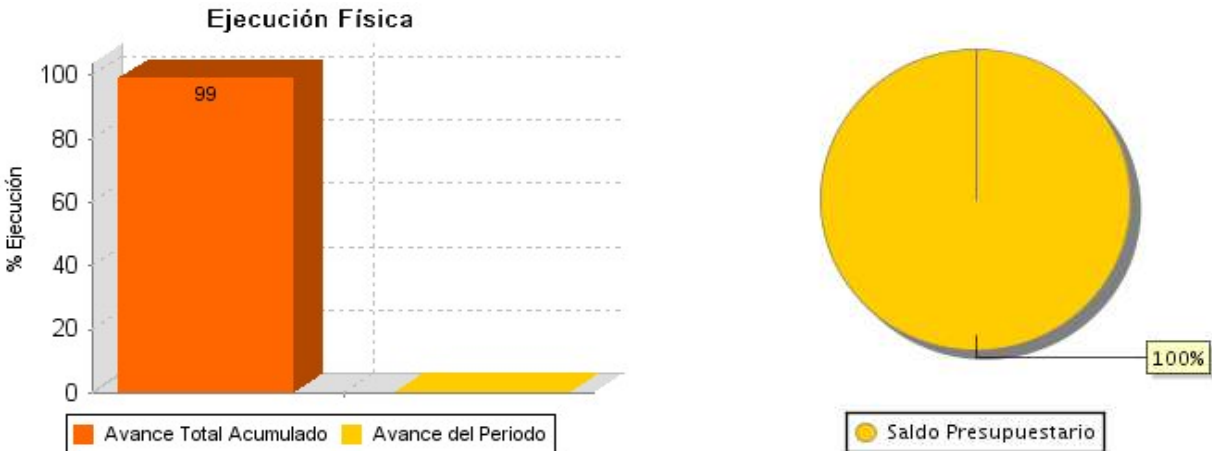


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendientes para honrar deudas.

Proyecto		Construcción y Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros en Región Noreste							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		732							
Financiamiento		LOCAL							
Costo del Proyecto		USD		N/A		GS.		272.415.685.907	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
271.112.097.479			1.303.588.428			99,52%			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2025			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Amambay, Caaguazú, Caazapá, Concepción, Guairá							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
0,00 %					99,83 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
587.795.632			0			0,00 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

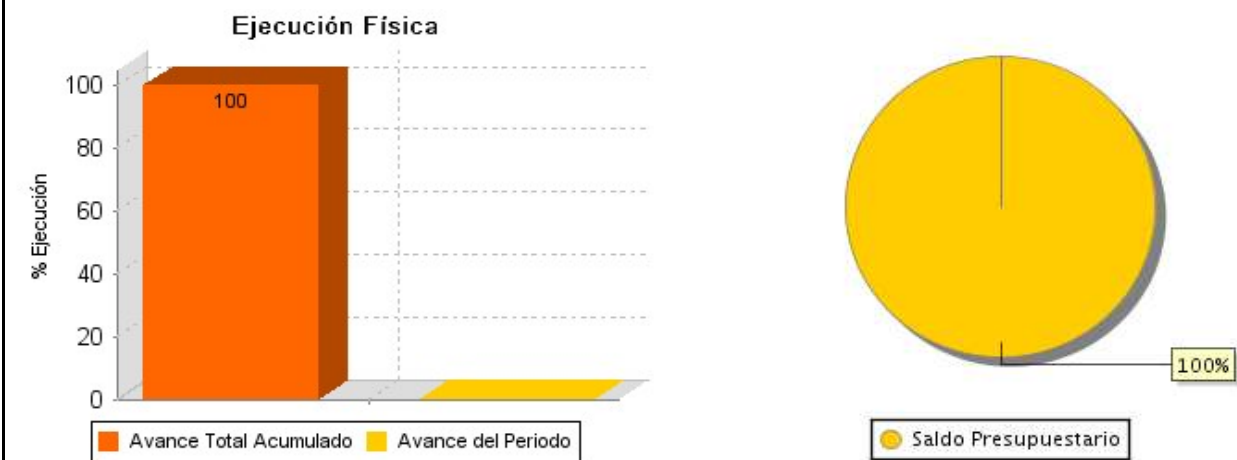


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Construcción Pavimentación Tipo Empedrados y Puentes - Región Centro							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		736							
Financiamiento		LOCAL							
Costo del Proyecto		USD		N/A		GS.		28.060.365.090	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
26.214.560.425			1.845.804.665			93,42 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2026			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Central, Cordillera, Guairá, Paraguari							
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total					
0,00 %				99,36 %					
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
1.016.469.604			0			0,00 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

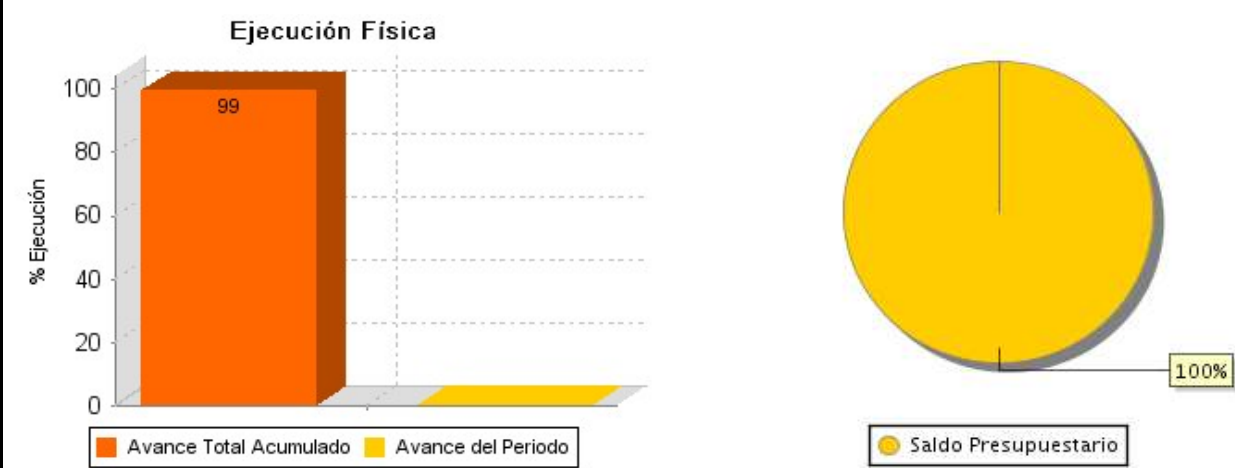


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Construcción Pavimentación Tipo Empedrados y Puentes - Región Sur					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		737					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	40.661.545.106	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
35.334.543.924			5.327.001.182			86,90%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Caazapá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				98,80 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
0			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

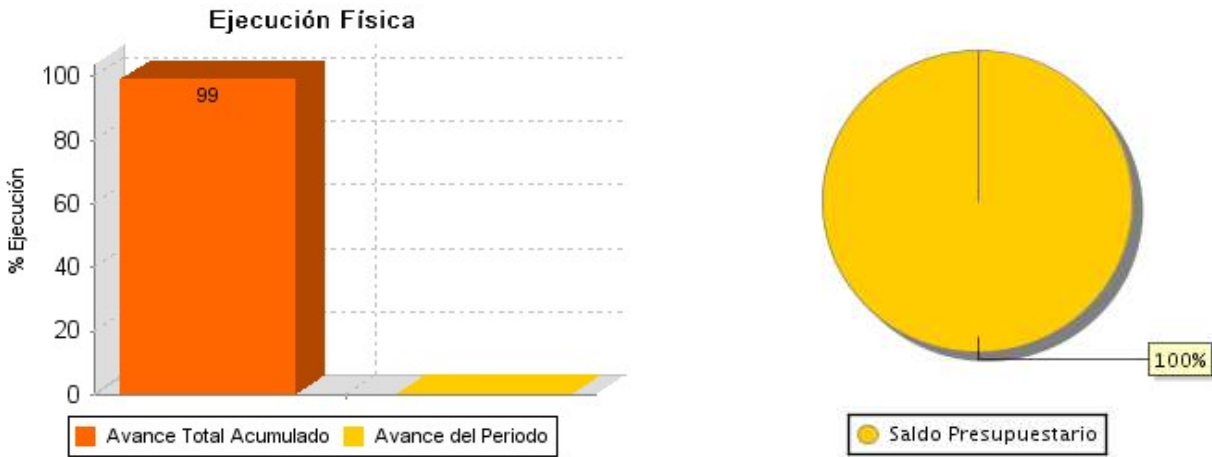


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativo pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Conservación de rutas pavimentadas por administración				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	746				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	185.928.766.059
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
182.684.078.472		3.244.687.587		98,25%	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			76,59 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
12.744.005.486		1.883.587.809		14,78 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

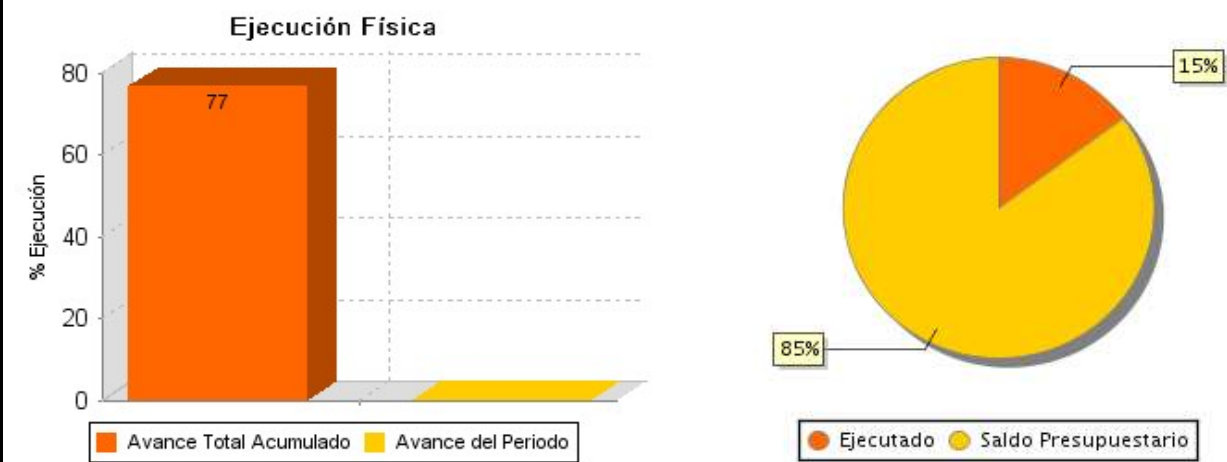


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto han culminado. Quedan pendientes deudas en concepto de reajuste de precios e intereses moratorias en algunas actividades. Con respecto a las actividades canceladas por el Decreto N° 4614/20, actualmente se está trabajando en un borrador de decreto para honrar los compromisos que siguen pendientes de ejercicios fiscales anteriores.-

Proyecto		Habilitación y Mant. de la Ruta 1 tramo Carapeguá - SJB				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		760				
Financiamiento		CAF, FONPLATA, LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	53.501.521		GS.	280.884.636.738
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
208.402.642.356			72.481.994.382		74,20 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
04/01/2018			15/12/2025		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Misiones, Paraguarí					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
1,99 %				88 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
26.884.117.148			6.256.930.942		23,27 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

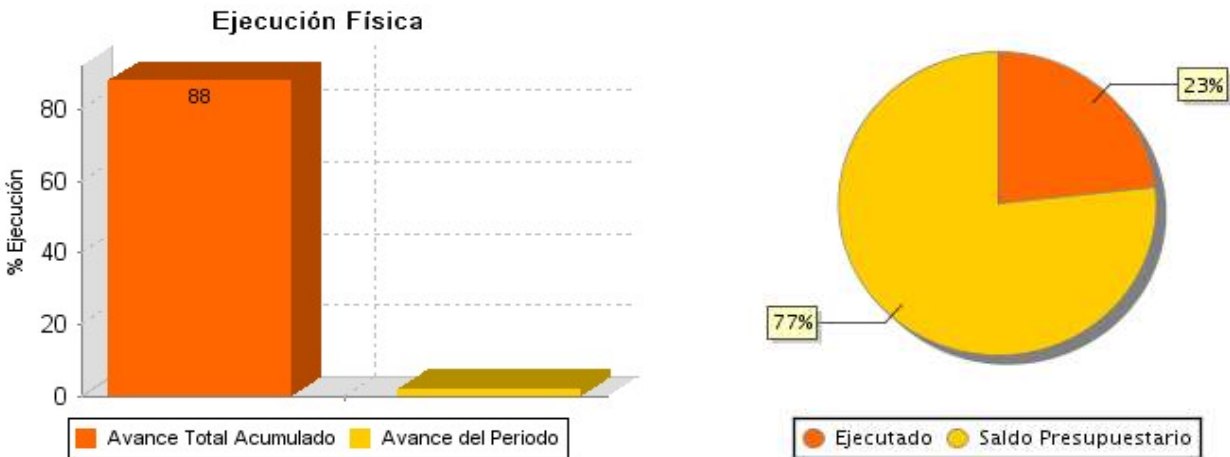


SITUACIÓN ACTUAL

Los trabajos realizados por la contratista en este periodo de mantenimiento fueron los siguientes: Limpieza de franja de dominio con tractores con rotativa y personal con desmalezadora. Además, se realizaron bacheos en calzada, mantenimiento en banquetas y drenajes. Se realizaron inspecciones de vegetación en franja de dominio para conservar la altura requerida en el estándar correspondiente.

En cuanto a la seguridad vial, se observaron cubiertas y ramas sueltas dentro de la franja, que fueron avisados y atendidos dentro del plazo establecido de las especificaciones particulares.

Proyecto	Construcción y mantenimiento Ruta N° 3 tramo km 21.8-170.3				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	761				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	378.545.281.810
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
126.105.048.760		252.440.233.050		33,31	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/01/2018		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central, Cordillera, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
19.411.917.717		17.519.633.220		90,25	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

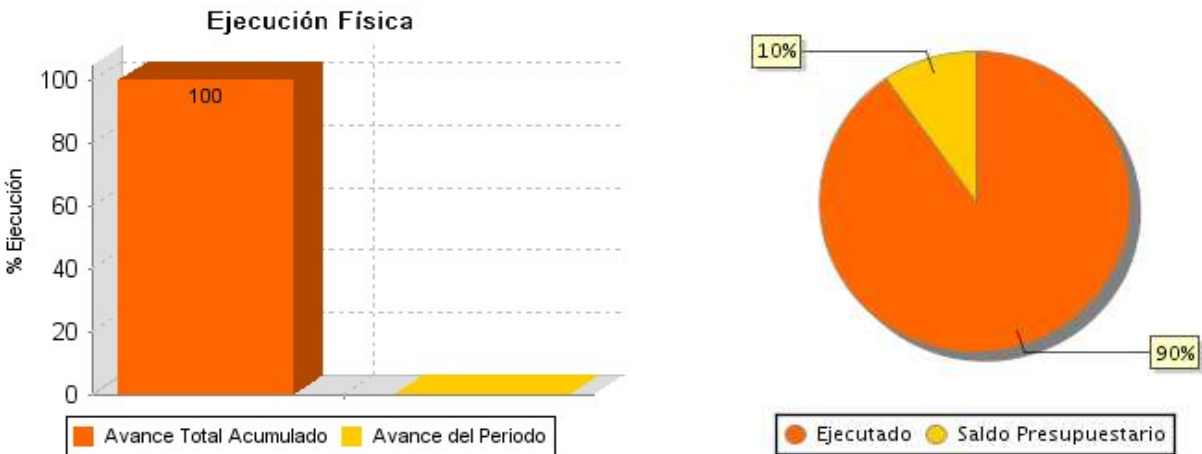

SITUACIÓN ACTUAL

Al cabo del segundo cuatrimestre no se procesaron certificados de parte de la Contratista (cuenta con Recepción Definitiva), pero si de parte de la Fiscalizadora, hubo avance financiero de los saldos que quedaron pendientes en este cuatrimestre, sin embargo quedaron pendientes varios certificados de obras a la espera de recursos financieros.


Ya no se realizó ningún trabajo de mantenimiento debido a la finalización del contrato y periodo de garantía, se presentaron todos los certificados de obras a la espera de recursos financieros para honrar las deudas pendientes.

Queda pendiente los certificados del Convenio 4 de la Empresa Fiscalizadora.

Cabe mencionar que el proyecto se encuentra restringido por el Decreto N° 4614/2020.

Proyecto		Construcción y Mantenimiento Ruta N° 4 tramo km 225 - 358.4					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		762					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	403.343.600.758	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
145.230.600.731			258.113.000.027			36,01 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Misiones, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
2.831.045.312			2.831.045.312			100,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

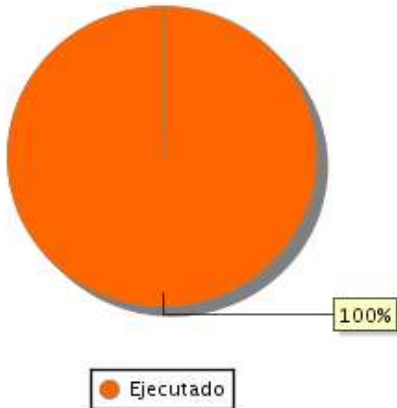


SITUACIÓN ACTUAL

Ya no se presentan certificados de obras debido a la finalización del contrato. Debido a la falta de recursos financieros se ha generado el retraso en el pago de los certificados mensuales, generando el compromiso de pagos de intereses moratorios.

El proyecto se halla restringido por el Decreto N° 4614/20.

Proyecto		Construcción Puentes y Alcantarillas en la Región Oriental					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		764					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	209.651.672.270	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
195.289.847.766			14.361.824.504			93,15%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, San Pedro, Ñeembucú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
1.546.133.008			1.329.006.190			85,96 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

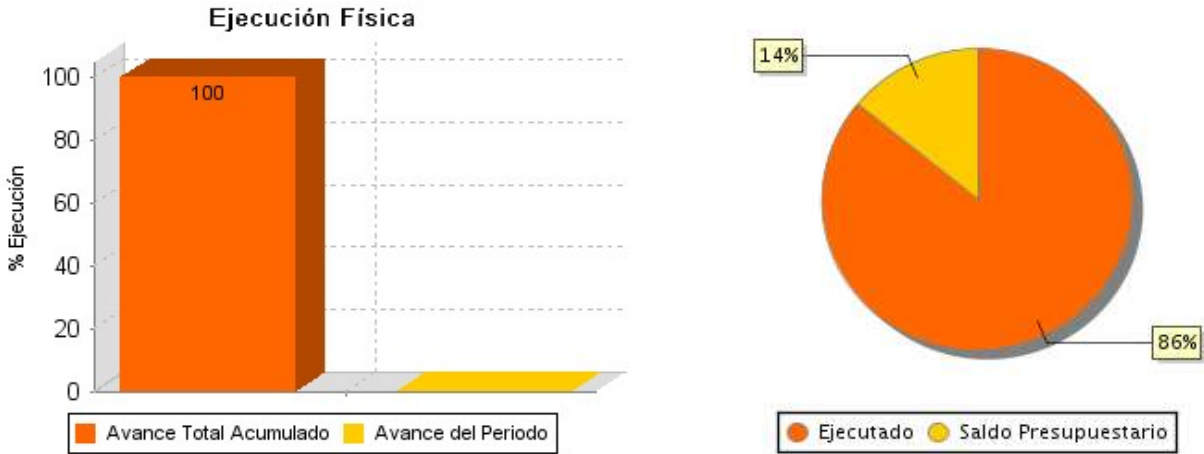


SITUACIÓN ACTUAL

Todas las obras del proyecto han concluido. Se realizaron pagos en concepto de viáticos a funcionarios del Departamento de Puentes y Obras de Arte por trabajos de Administración. Cuenta con deudas en concepto de interés moratorio.
El proyecto se halla restringido por el Decreto N° 46914/2020

Proyecto		Construcción Gran Hospital General					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		765					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	63.095.722		GS.	484.979.786.995	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0			484.979.786.995			0,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/01/2018			31/12/2020			31/12/2030	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción, Central					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
2 %				2 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
4.900.000.000			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

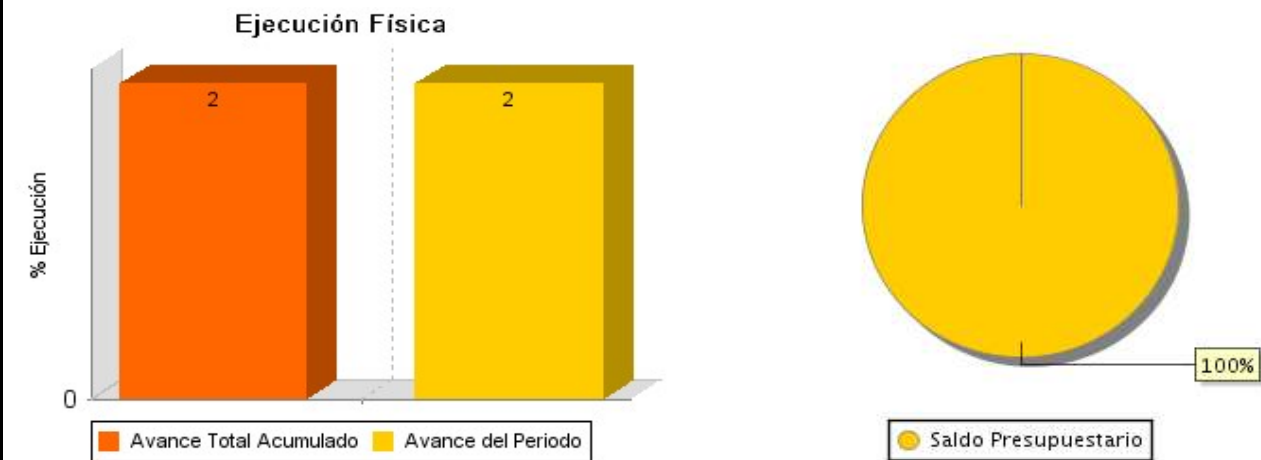

SITUACIÓN ACTUAL


Durante el segundo cuatrimestre 2025 en la Unidad Ejecutora informó los siguientes avances:

Participación activa en lo concerniente al proceso de contratación para las Obras del LLAMADO MOPC N° 24/2025 DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ASUNCIÓN (ID 465025) ha registrado avances administrativos: el 25/06/2025 se realizó la apertura de sobres, habiéndose recibido 4 ofertas de potenciales oferentes. Posteriormente, vía Resolución MOPC N° 1198/25 de fecha 24/07/2025 el llamado fue adjudicado. Actualmente, en etapa de revisión administrativa por la DNCP, considerando los plazos establecidos por Ley N° 7021/22.

En cuanto al Llamado MOPC 63/2025 CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL "DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ASUNCIÓN" - ID 468126, se ha trabajado en las observaciones a los documentos del Pliego de Bases y Condiciones remitidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y se han remitido en tiempo y forma los ajustes sugeridos y solicitados por la misma, dichos ajustes se encuentran en proceso de verificación para su posterior debida publicación.

Proyecto		Habilitación y Mant. tramo Pozo Colorado - Concepción											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		770											
Financiamiento		CAF, FONPLATA, LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		74.934.028				GS.		1.202.076.857.474			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
609.249.114.859				592.827.742.615				50,68 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
23/11/2018				23/11/2025				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Concepción, Presidente Hayes											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
5 %						72 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
170.738.560.872				89.304.988.644				52,31 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

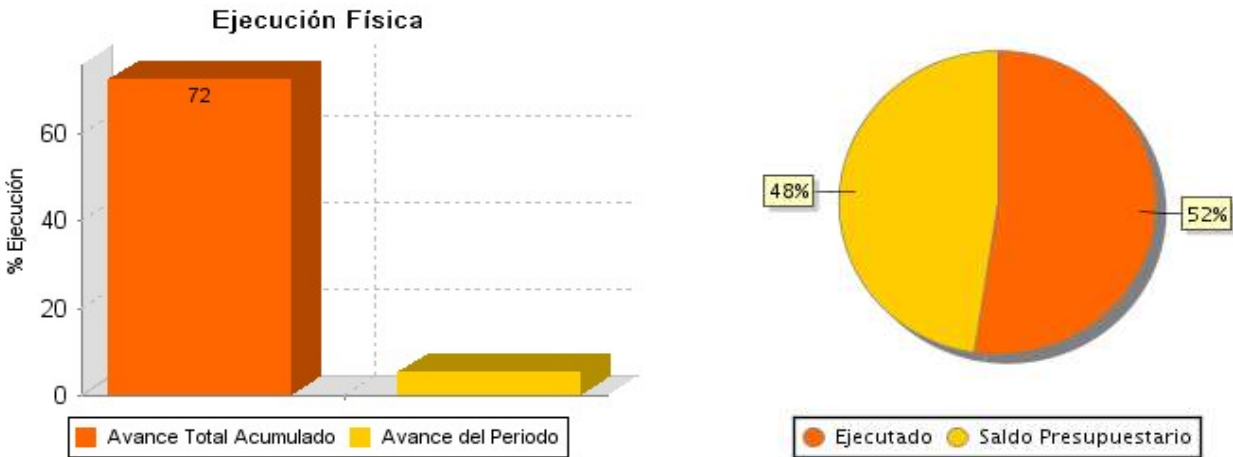


SITUACIÓN ACTUAL

La obra fue adjudicada inicialmente en tres (3) lotes, de los cuales dos (2) fueron rescindidos por incumplimiento contractual, procediéndose a la ejecución de la póliza de seguro correspondiente. El Lote 1 alcanzó una ejecución del 100% y, en el presente periodo, se encuentra en etapa de mantenimiento pleno, abarcando 40 kilómetros de pavimento asfáltico. Las principales actividades realizadas comprenden la limpieza de la franja de dominio debido al exceso de vegetación.

Para complementar la obra, el proyecto fue nuevamente licitado y adjudicado en el mes de diciembre de 2024, en dos (2) lotes correspondientes a los tramos aún no intervenidos (aproximadamente 100 kilómetros). Durante el presente cuatrimestre se dio inicio a las obras, con las primeras actividades de movimiento de suelos y excavaciones varias. Los nuevos contratos contemplan la construcción con pavimento de hormigón armado.

Proyecto		Construcción de la Ruta San Pedro - Belén - Concepción			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		787			
Financiamiento		FOCEM, LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	155.708.655	GS.	1.231.967.589.299
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
597.791.645.370		634.175.943.929			48,52 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
18/12/2018		18/12/2022			31/12/2025
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Concepción, San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total	
14 %				81 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
214.855.387.433		135.794.854.292			63,20 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

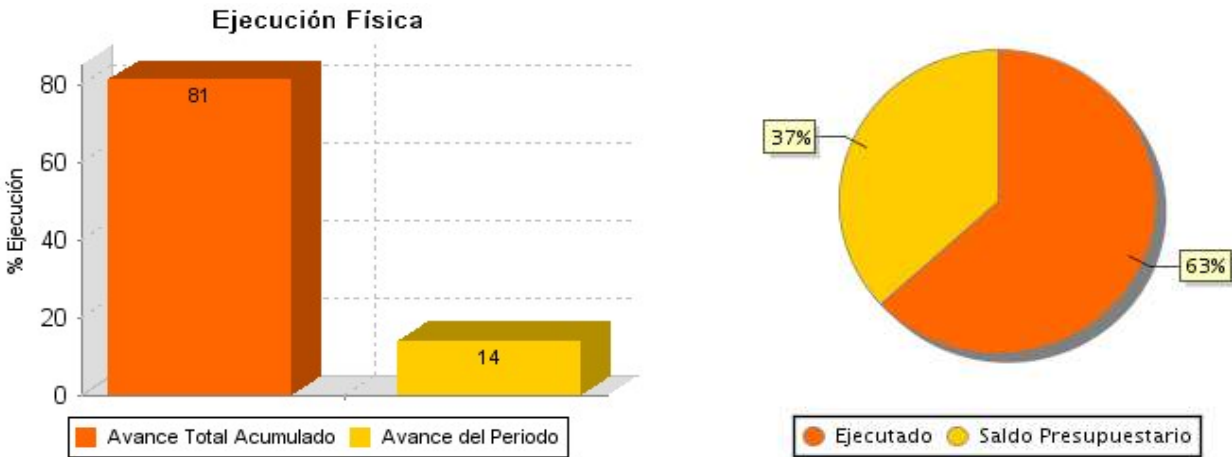

SITUACIÓN ACTUAL

Los avances registrados durante el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal fueron los siguientes:

Componente 1: ejecución de obras con un promedio de avance del 99% en los tres (3) lotes.

Componente 2: avance de las actividades de fiscalización conforme a los cronogramas establecidos.


Componente 3: el Plan Comunicacional se encuentra en proceso de obtención de recursos presupuestarios para su posterior llamado.

Componente 4: el Plan de Gestión Ambiental (PGA) y los Servicios Ambientales se encuentran igualmente en proceso de obtención de recursos presupuestarios para el respectivo llamado.

Componente 5: la actividad de Almacenamiento se encuentra en proceso de obtención de recursos presupuestarios para su posterior llamado.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Pedro Juan Caballero - Capitán Bado - Ypejhu					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		796					
Financiamiento		FONPLATA					
Costo del Proyecto		USD	220.000.000		GS.	1.638.315.800.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
206.697.616.825			1.431.618.183.175			12,62 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
6/7/2023			14/7/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Amambay, Canindeyú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
3 %				10 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
249.075.266.053			144.033.650.364			57,83 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

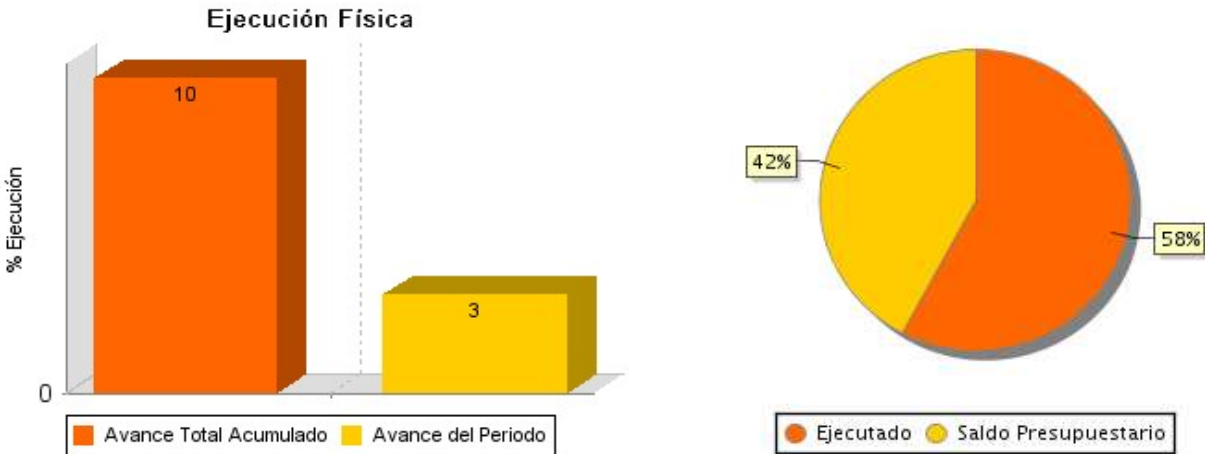


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo del segundo cuatrimestre, las 4 (Cuatro) empresas Contratista realizaron trabajos de Movilizacion y Movimiento de Suelo en los tamos de la Obra de la Ruta Nacional PY-17, Tramo Pedro Juan Caballero-Zanja Pyta-Capitan Bado-Itanara-Ypejhu, del departamento.de Amambay y Canindeyu

Proyecto		Construcción de 1500 viviendas en el Bañado Sur			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		797			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	100.000.000	GS.	750.676.701.105
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
58.481.805.187		692.194.895.918			7,79 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
11/11/2019		11/11/2025			31/12/2027
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,15 %			10,89 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
115.855.876.518		22.279.199.194			19,23 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

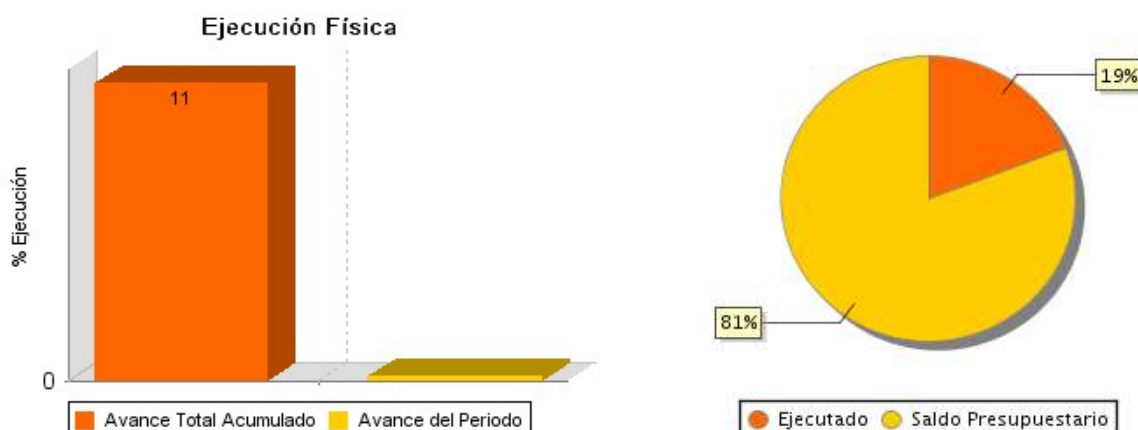

SITUACIÓN ACTUAL

Se reportan los siguientes avances en el periodo de referencia, en el marco de las diversas contrataciones tales como:
Se ha efectuado el anticipo financiero a la empresa contratista de Obras de Infraestructura adjudicada al Consorcio T&C – CIVSA (ID 449366).

Se ha otorgado la orden de inicio a la firma Fiscalizadora de las Obras de Infraestructura, llamado ID 445073, a la consultora HYTSA en fecha 03/06/2025.

En el marco de la consultoría de diseño de viviendas sociales sostenibles se encuentra en proceso de culminación el Producto 4 - Proyecto Ejecutivo, realizada por el consorcio SPI, el cual deberá ser remitido al Banco para la No objeción.


Se ha obtenido la no objeción al Producto N° 4 – Anteproyecto - Estudios de saneamiento de la Laguna Yrupe, ejecutado por el Consorcio IATASA-CIA, en fecha 10/07/2025.

Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicación del Programa de Rehabilitación y Vivienda (Barrio Tacumbú) coberturas de prensa, supervisión y acompañamiento del Bloque del PRVBT en radio. Se ha firmado el Convenio Modificadorio N° 2, de ampliación de plazo, con la firma COEFICIENTE SRL.

Se ejecutan los contratos de consultorías de apoyo técnico a los Componentes del Proyecto, así como, el contrato de Auditoría Externa del Programa con la firma AUDICON, la cual cuenta con la correspondiente no objeción al Informe del ejercicio 2024.

Proyecto		Mejoramiento de la capacidad de Formulación y Ejecución del Proyectos de Inversión en Estructura de la Dirección de Proyectos Estratégicos DIPE			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		798			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	138.000.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
43.476.383.704		94.523.616.296			31,50 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
22/11/2018		22/11/2023			22/11/2028
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1 %			96 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
1.778.468.740		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

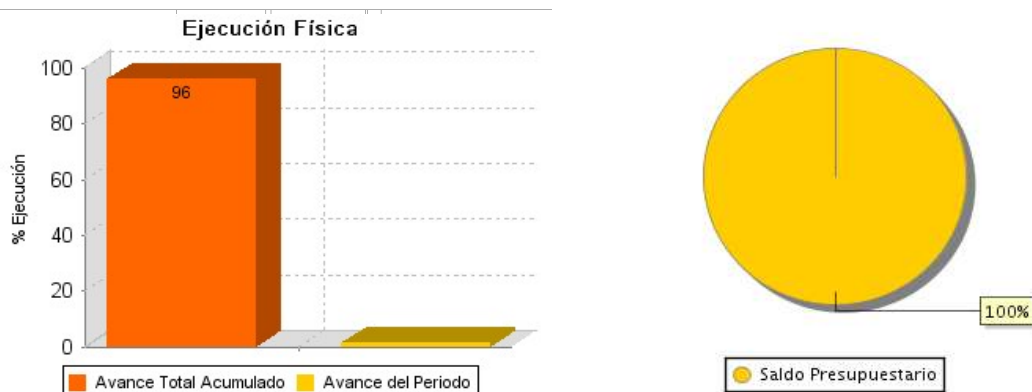

SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo del segundo Cuatrimestre las Capacidades técnicas y operativas de la DIPE/ MOPC fortalecidas. Profesionales especializados en las distintas áreas contratados, conforme a requerimientos de los procesos de Estructuración de Proyectos estratégicos a cargo de la DIPE. Asistencia profesional especializada para los Proyectos (diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la Ruta PY 01 en el tramo Cuatro Mojones-Quindy (108 km) y Proyecto de rehabilitación y Pavimentación de la Ruta PY10 Tramo San Cristobal - Paso Yobai. Proyecto de Equipamiento y Puesta en marcha de las Oficinas de Gobierno y mejoramiento del Puerto de Asunción, Mejoramiento de la Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción, Modernización del Aeropuerto Internacional de Silvio Pettirossi, Proyecto de Construcción e implementación del Tren de Cercanía entre Asunción e Ypacaraí, Proyecto vial para el Mejoramiento de la Avenida Artigas, Teleférico Paraguairí Cerro Hu, Proyecto de APP Ruta PY09, Plan Maestro, Plan de sostenibilidad y mejoramiento de Parques Urbanos. Etapa 1 y Futura sede Universidad Politécnica Taiwan Paraguay (UPTP)

Proyecto Ampliación y Mejoramiento Ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones-Quiindy 108 Km. Evaluación de la oferta técnica de las ofertas presentadas.

Proyecto Modernización y Ampliación del Aeropuerto Silvio Pettirossi. conclusión del informe técnico elaborado por expertos internacionales en aspectos aeroportuarios.

Proyecto Tren de Cercanía Asunción - Ypacaraí: Entrega del Anteproyecto Conceptual, incluyó definiciones de trazado, secciones transversales del modelo, ubicación estimada de estaciones e infraestructura complementaria, planificación del sistema de potencia, revisión a la demanda estimada, funcionalidad del sistema ferroviario para satisfacer la demanda, requerimientos del sistema, entre otros. Acompañamiento en la elaboración de los PBC de precalificación.

Mejoramiento de la Resiliencia Urbana de la Franja Costera de Asunción

2.130 metros lineales de excavaciones y tendido de ductos subterráneos completados. Esto servirán para el posterior cableado de la línea de doble terna (2 x 220 kV).

Proyecto vial para el Mejoramiento de la Avenida Artigas.


Definición del diseño urbano y espacial del tramo de aproximadamente 6 km de longitud, considerando aspectos de movilidad peatonal, vehicular, transporte público, accesibilidad universal, arborización, drenaje urbano sostenible y mobiliario urbano.

Proyecto Oficinas de Gobierno. Supervisión y asistencia técnica de las obras físicas y Equipamiento para la Puesta en marcha de las oficinas de Gobierno.

Asistencia técnica/administrativa y Jurídica para el Proyecto de Plan de Transformación del Transporte.

Proyecto		Mejoramiento de la Gestión de los Distritos Departamentales											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		806											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		N/A				GS.		798.710.000.000			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
696.630.502.218				102.079.497.782				87,22 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
24/05/2019				24/05/2023				31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Alto Paraguay, Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Caaguazú, Caazapá, Canindeyú, Central, Concepción, Cordillera, Guairá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Presidente Hayes, San Pedro, Ñeembucú											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
3 %						81 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
122.574.035.629				36.771.760.605				30,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

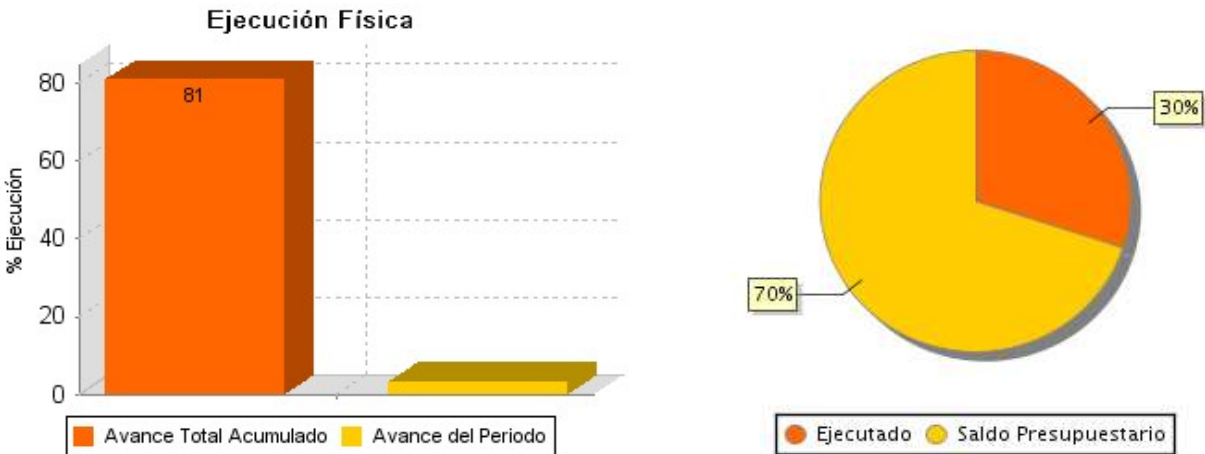


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo del segundo cuatrimestre se llevo a un total de 38,84 ml de puentes metálicos construidos en varios departamentos del pais ademas de los pagos de viáticos a funcionarios asignados a la supervisión

Proyecto		Mejoramiento Intersección Tres Bocas							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		807							
Financiamiento		REPÚBLICA DE CHINA							
Costo del Proyecto		USD		24.096.276		GS.		181.858.228.583	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
175.394.943.420			6.463.285.163			96,45 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
26/12/2018			26/12/2021			31/12/2025			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Municipal		Fernando de la Mora, San Lorenzo, Villa Elisa							
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total				
0,00 %					99,43 %				
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
1.246.703.526			0			0,00 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

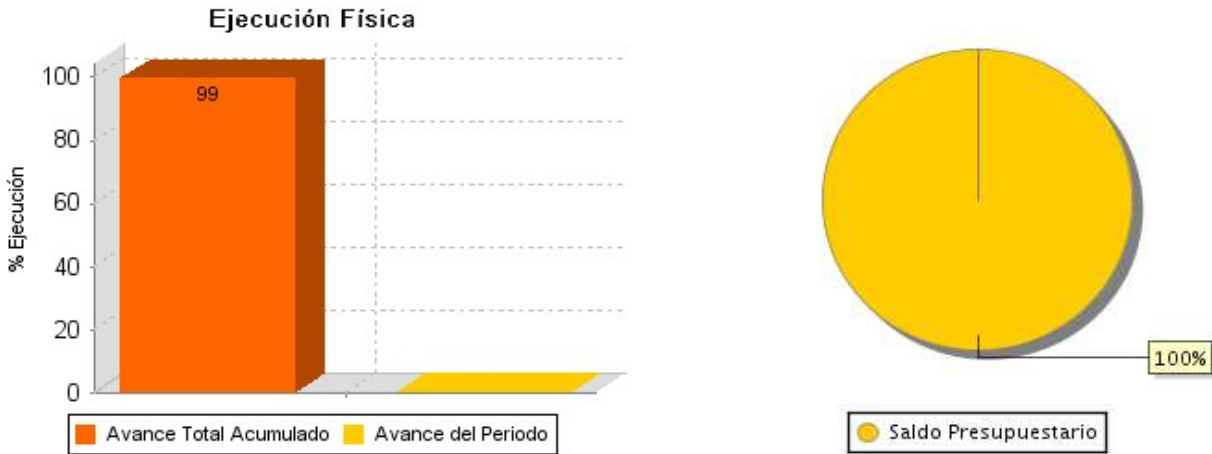


SITUACIÓN ACTUAL

Todas las actividades del proyecto han concluido. En el transcurso del periodo, se procedió a la actualización de la documentación correspondiente para los pagos de indemnizaciones pendientes, destinados a los beneficiarios afectados por el Proyecto.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento San Pedro			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		815			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	169.799.522.159
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
142.176.428.105		27.623.094.054			83,73%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020			31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			89,88 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
1.461.600.180		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

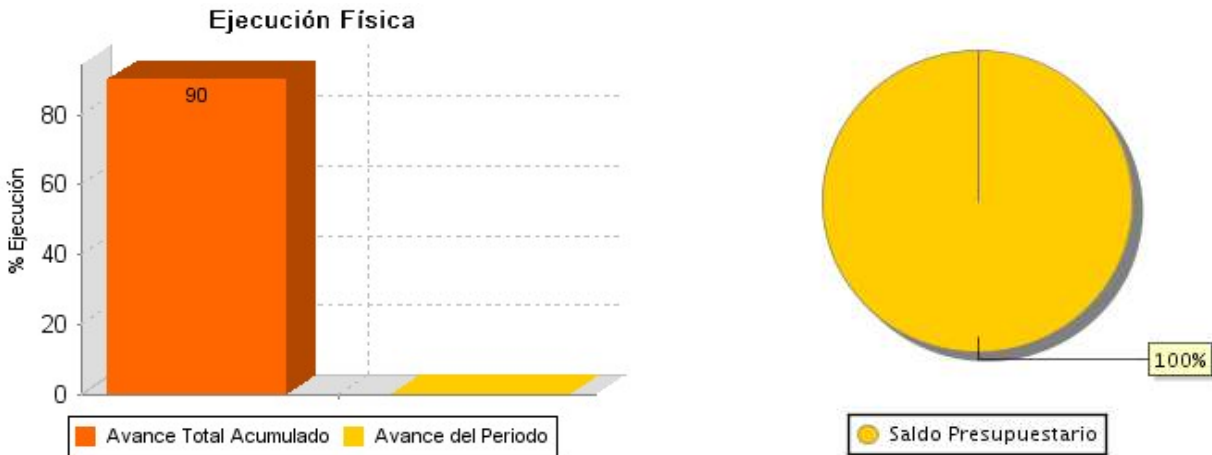


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Alto Paraná						
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES						
Código SNIP N°		817						
Financiamiento		LOCAL						
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	146.006.682.452		
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución		
145.194.761.116			811.921.336			99,44	%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga		
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2026		
Ubicación Geográfica del Proyecto								
Departamental		Alto Paraná						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total				
0,00				%		85,72		%
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado		
1.461.065.770			0			0,00		%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

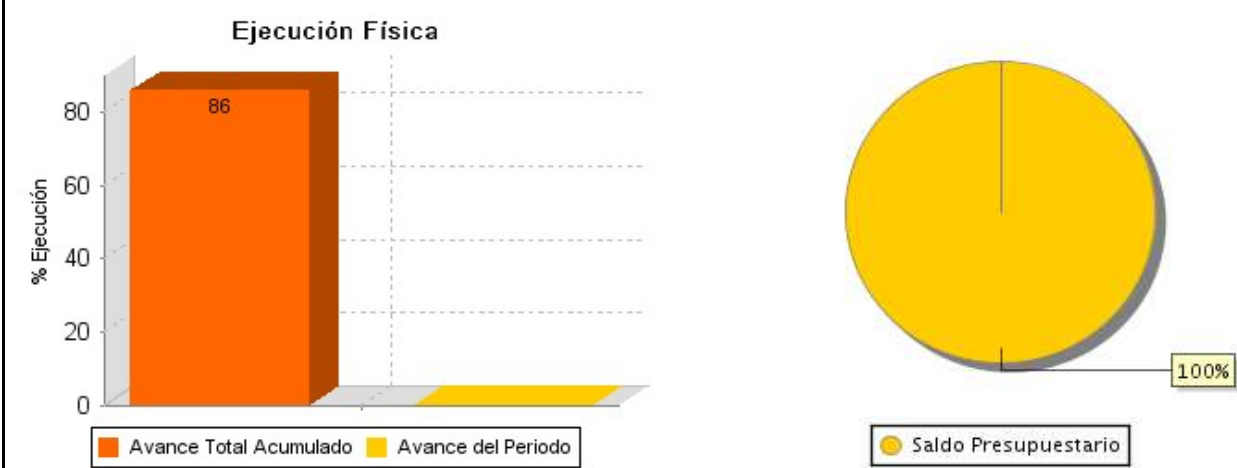


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Misiones				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		818				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	120.199.268.503
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
116.439.555.126			3.759.713.377		96,87	%
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental	Misiones					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %				79,20 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
1.248.000.000			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

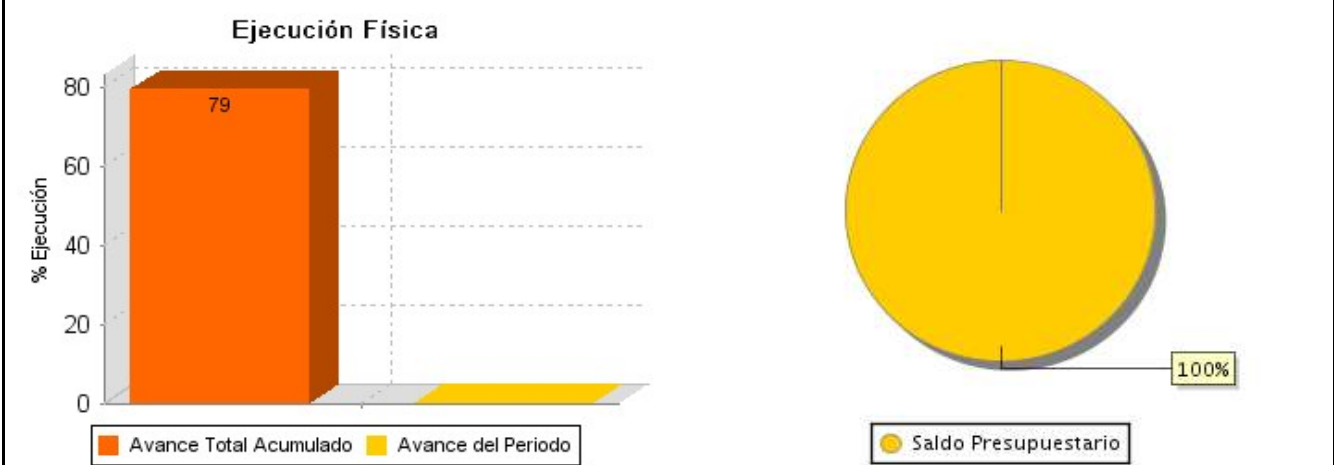


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en proceso administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Cordillera				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	820				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	154.593.491.989
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
137.131.402.572		17.462.089.417		88,70	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Cordillera				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			77,40 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
1.227.405.990		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

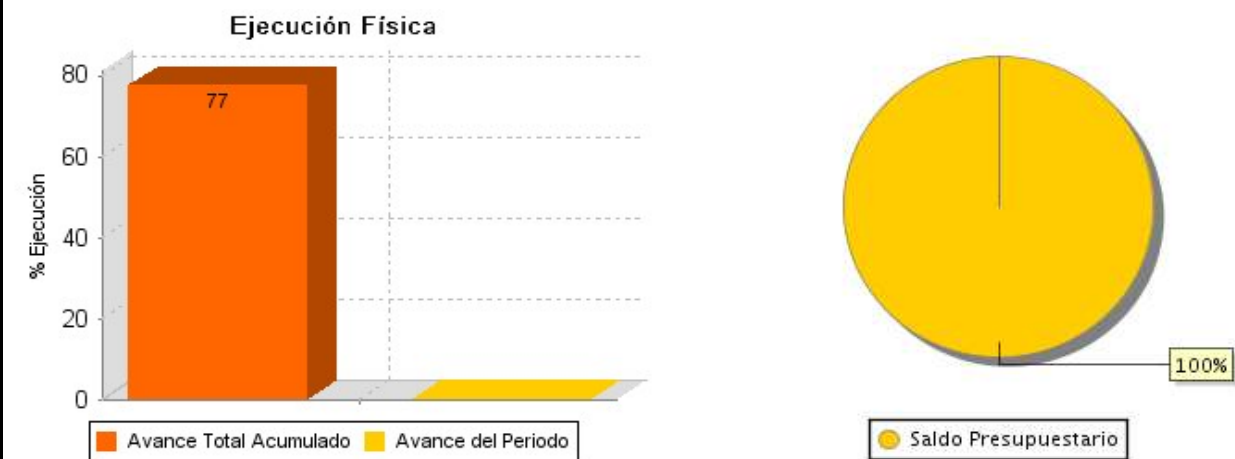


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras del proyecto se encuentran culminadas, se encuentra en proceso administrativos para los pagos pendientes.

El proyecto se halla restringido por el Decreto N° 4614/2020

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Ñeembucu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		821			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	181.981.991.824
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
143.236.675.362		38.745.316.462			78,71 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
02/07/2019		31/12/2020			31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			97,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
2.112.646.004		0			0,00 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

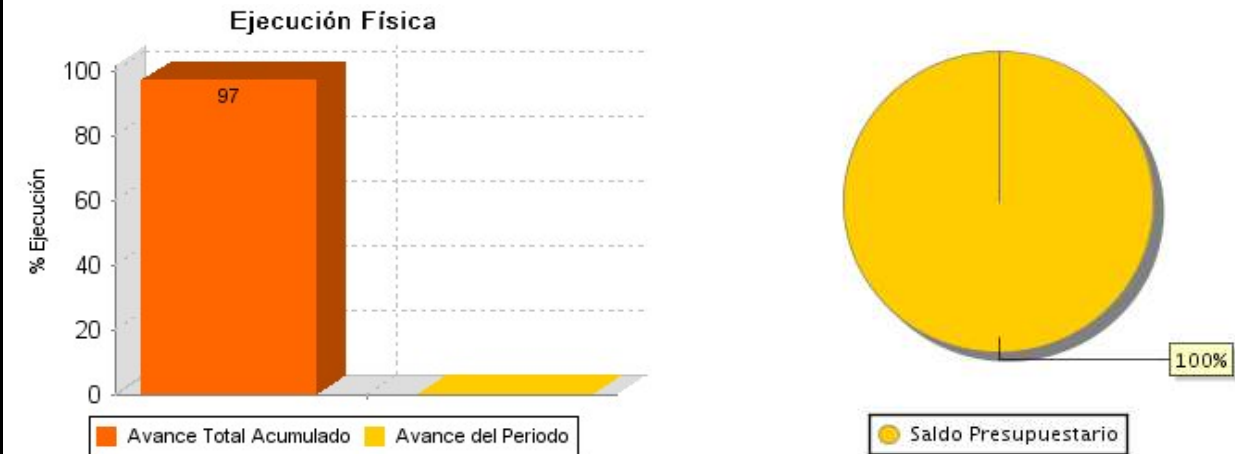


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendientes, para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Canindeyu			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		822			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	N/A	GS.	110.267.520.130
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
74.012.502.654		36.255.017.476			67,12 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
05/07/2019		31/12/2020			31/12/2026
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Canindeyú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			100,00 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
25.775.574.890		4.479.367.591			17,38 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

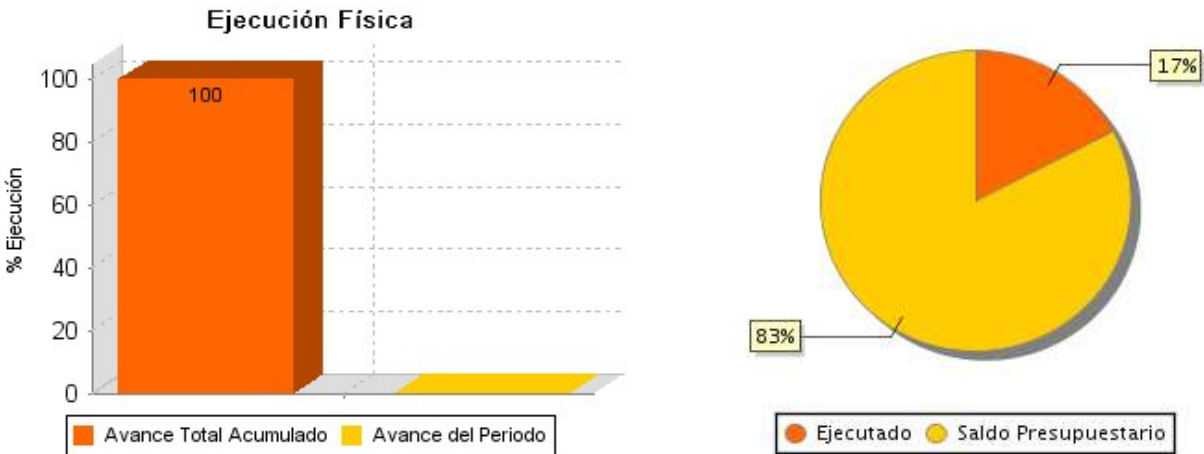


SITUACIÓN ACTUAL

La obra enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 ha culminado. Actualmente, en procesos administrativo pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Guairá					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		824					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	152.973.670.253	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
122.138.216.323			30.835.453.930			79,84 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
05/07/2019			31/12/2020			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Guairá						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				86,76 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
316.427.504			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

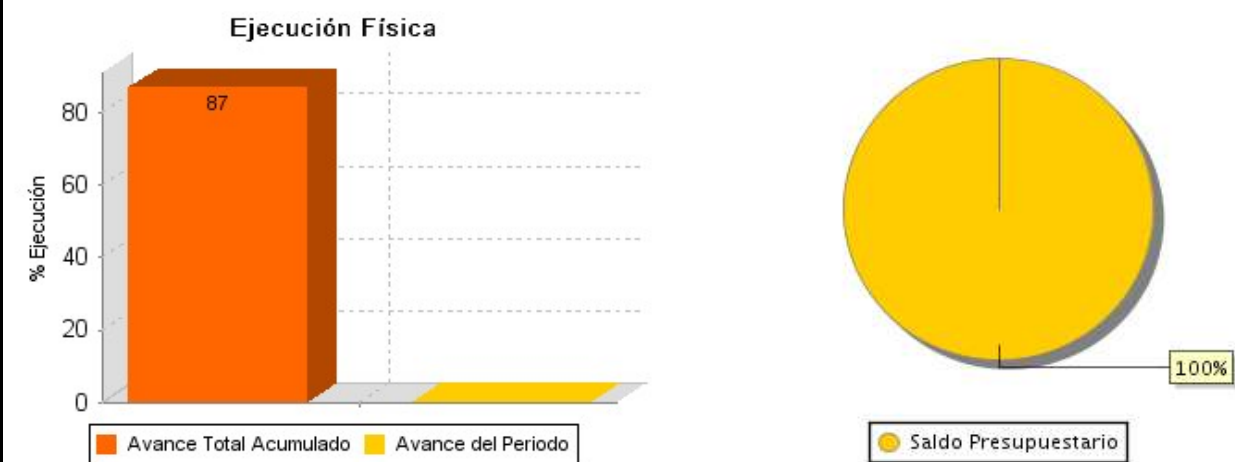


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcadas en el Anexo I del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Caaguazú					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		825					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	252.459.631.991	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
237.230.302.361			15.229.329.630			93,97%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
05/07/2019			31/12/2020			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Caaguazú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				71,05 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
4.773.398.644			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

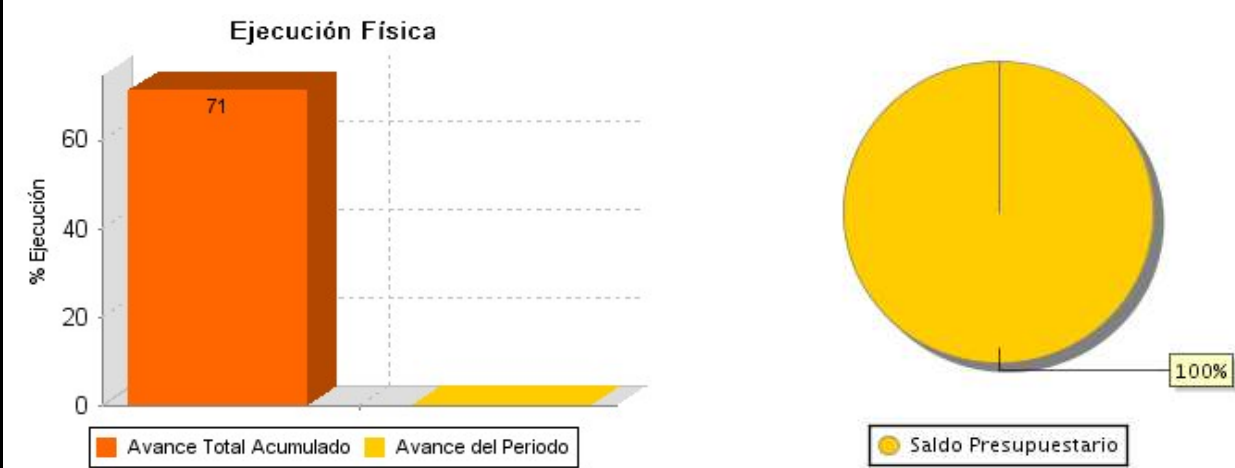


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento Caminos Departamento Concepción					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		826					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	78.375.843.000	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
54.070.681.439			24.305.161.561			68,99%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
02/07/2019			31/12/2020			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Concepción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00		%		92,50		%	
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
973.610.590			0			0,00%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

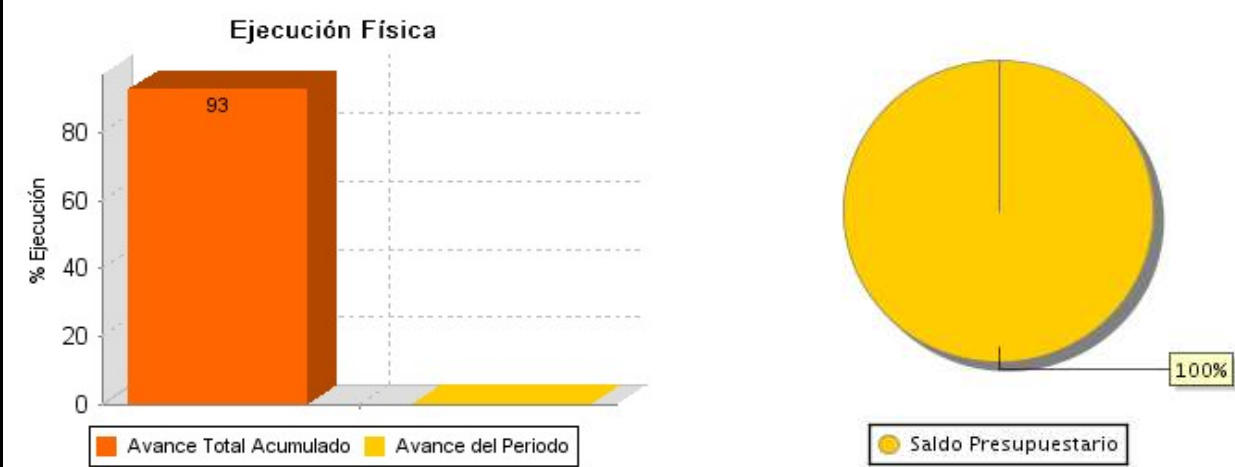


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Itapúa				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	827				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	283.005.776.870
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
277.061.759.806		5.944.017.064		101,03 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Itapúa				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			97,25 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
664.580.709		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

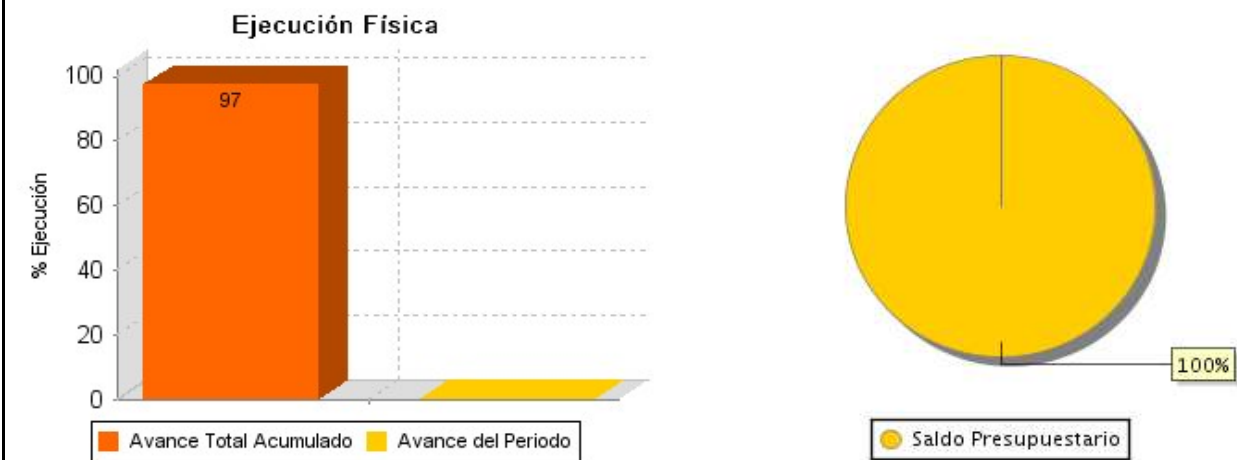


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto	Mejoramiento Caminos Departamento Central				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	828				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	133.062.949.138
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
124.104.925.046		8.958.024.092		93,27	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
02/07/2019		31/12/2020		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00			94,90		
%			%		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
998.394.677		0		0,00	
				%	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

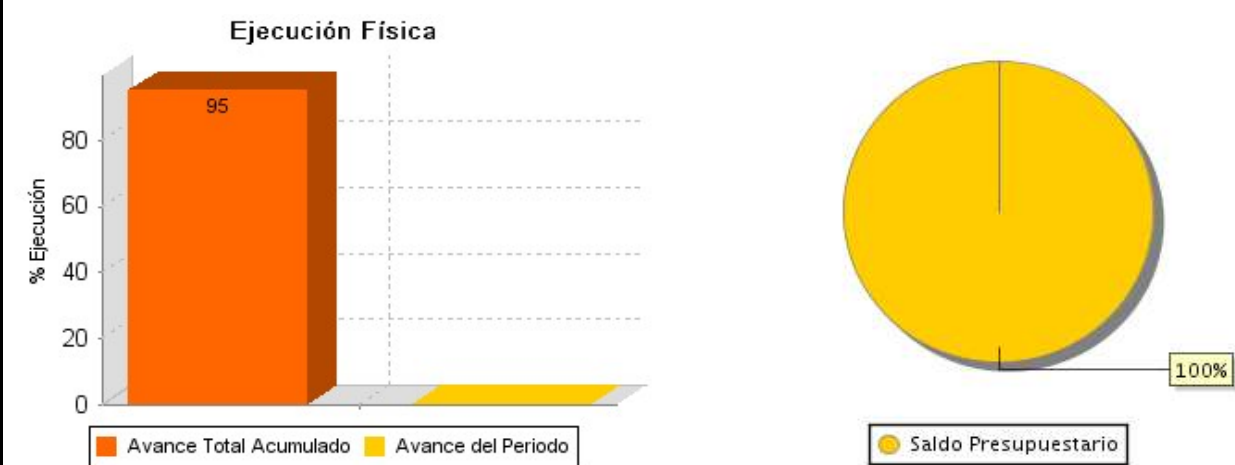


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras enmarcada en el Anexo II del Decreto 4614/20 han culminado. Actualmente, en procesos administrativos pendiente para honrar deudas.

Proyecto		Mejoramiento tramo San Juan Bautista - Ybyraty					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		830					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	51.543.483		GS.	241.524.055.598	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
121.077.172.736			120.446.882.862			50,13 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
04/01/2020			04/01/2024			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental	Misiones						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,50 %				54,50 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
68.223.044.095			53.632.489.623			78,61 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

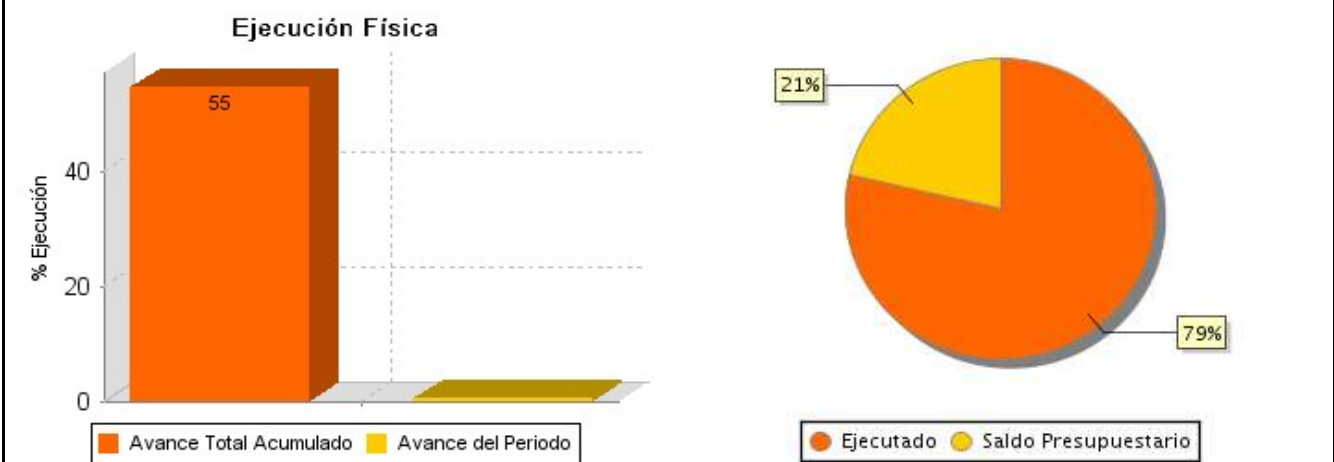


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido al cierre de la elaboración del presente informe, a las consultas realizadas por la DGIP.

Proyecto		Ampliación tramo Remanso Ruta N° 9 - Puerto Falcón											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		832											
Financiamiento		FONDO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO PAR											
Costo del Proyecto		USD		38.000.670				GS.		281.357.148.552			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
216.985.569.913				64.371.578.639				77,12 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
16/05/2016				16/05/2018				31/12/2025					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Presidente Hayes											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
5 %						80 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
25.317.411.970				9.541.013.536				37,69 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

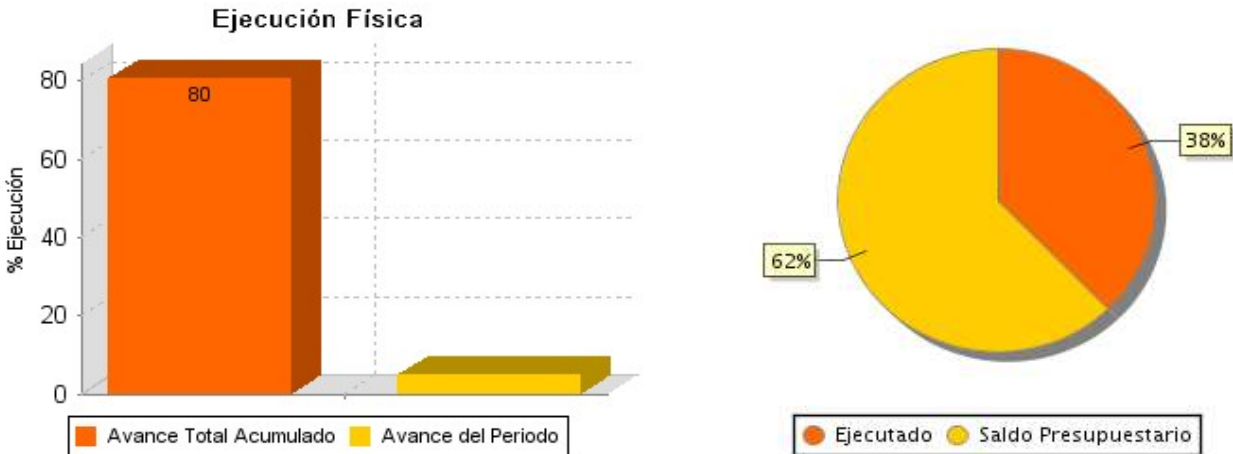

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente periodo, la empresa contratista ejecutó trabajos de reparación en los tramos ya concluidos, así como la finalización de diversas obras complementarias, entre las que se destacan: instalación de barandas metálicas de contención vehicular, construcción de cordones de hormigón, colocación de revestimiento vegetal con tepes, ejecución de accesos a fincas, instalación de iluminación en intersecciones, reposición de cañerías de la red de agua potable, movimiento de suelo (pedraplén y excavación no clasificada), conformación del paquete estructural y colocación de carpeta de concreto asfáltico, además del riego de liga.


En el marco de las obras de duplicación y variante, se ejecutó un paso peatonal en la franja medianera, mientras que en las obras de rehabilitación y acceso a Puerto Falcón se avanzó con la construcción de una alcantarilla celular simple.

Durante este mismo periodo se llevaron a cabo procesos administrativos correspondientes a la licitación para la implementación del Programa de Monitoreo Hidrológico del tramo Remanso–Falcón.

Asimismo, se regularizaron las carpetas de indemnización por mejoras e inmuebles afectadas por las expropiaciones, a fin de viabilizar los respectivos procesos de pago a los beneficiarios.

Proyecto	Construcción Caminos Vecinales Pavimentados y no Pavimentados Departamento Ñeembucú				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	841				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	108.459.128.663
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
91.217.783.094		17.241.345.569		84,10 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
07/11/2019		31/12/2020		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Ñeembucú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,00 %			40,30 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
48		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

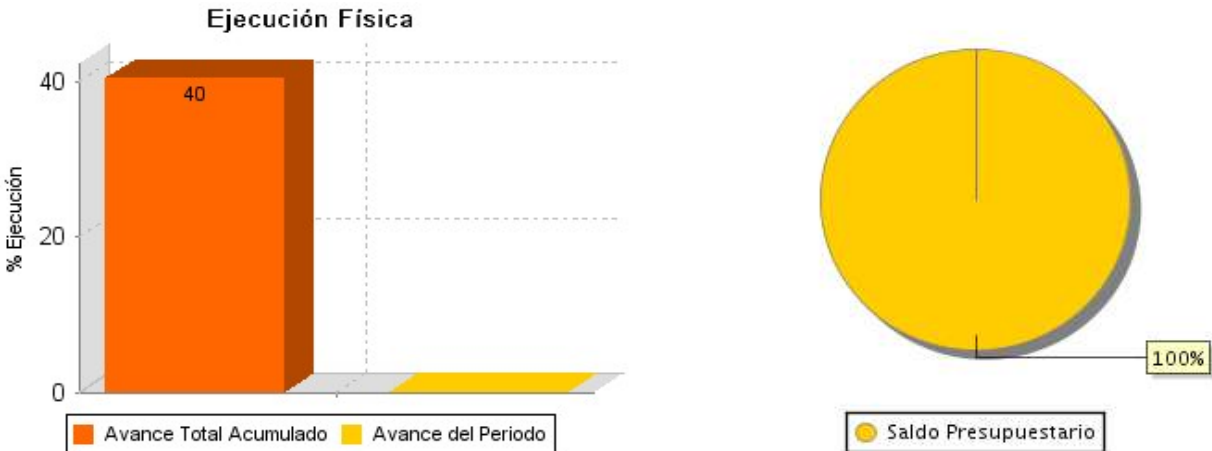


SITUACIÓN ACTUAL

El lote 7 Tramo Emp.Alberdi-Pilar - San Juan de Ñeembucu, tiene las obras concluidas con recepción definitiva, cuenta con deudas pendientes de pago en concepto de intereses moratorios.

El proyecto se encuentra restringido por el Decreto N° 4614/2020

Proyecto		Construcción Caminos Vecinales Pavimentados y no Pavimentados. Departamento de Paraguari							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		842							
Financiamiento		LOCAL							
Costo del Proyecto		USD		N/A		GS.		54.987.954.652	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
52.144.888.780			2.843.065.872			94,83 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
04/10/2019			31/12/2020			31/12/2025			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Paraguari							
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total					
1,58 %				35,80 %					
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
236.793.677			0			0,00 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

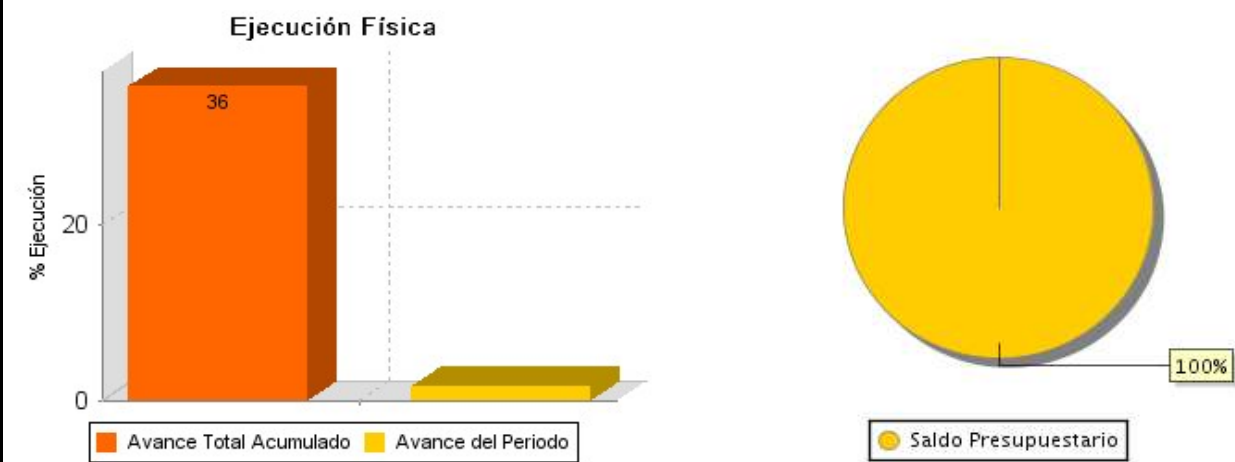


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras en su totalidad están concluidas, cuenta con deudas pendientes en concepto de interés moratorio.

El proyecto se halla restringido por el Decreto N° 4614/2020.

Proyecto		Construcción Puente sobre el Río Paraguay Asunción - Chacoi											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		845											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		176.349.988				GS.		1.307.724.499.029			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
1.153.838.699.049				153.885.799.980				88,23 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/01/2020				31/12/2023				31/12/2024					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Asunción, Presidente Hayes											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
1 %						96 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
513.565.401				0				0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

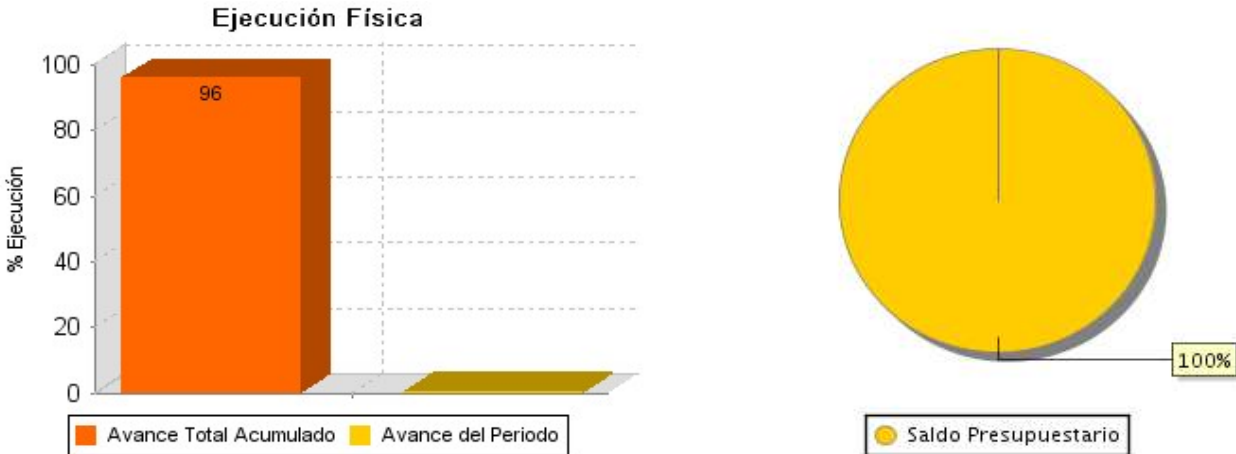


SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto obtuvo asignación presupuestaria en el presente periodo con el fin de efectuar los pagos pendientes correspondientes a intereses moratorios e indemnizaciones, cuyo proceso administrativo se encuentra concluido, contando con Resolución del MOPC y el Decreto respectivo. No obstante, los pagos a los afectados se encuentran pendientes de la disponibilidad presupuestaria para su ejecución.

Asimismo, el proyecto se encuentra en etapa de culminación de los procesos licitatorios para la contratación de los servicios ambientales, previéndose posteriormente la realización de los procesos de pago correspondientes.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Cruce Centinela, Pozo Hondo 320 km										
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES										
Código SNIP N°		854										
Financiamiento		FONPLATA										
Costo del Proyecto		USD	418.266.335				GS.	2.918.033.081.600				
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.					Porcentaje de Ejecución				
450.802.767.399			2.467.230.314.201					15,45 %				
Fecha de Inicio			Fecha de Fin					Fecha de Prórroga				
01/04/2022			1/4/2029					N/A				
Ubicación Geográfica del Proyecto												
Departamental	Boquerón											
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total							
1,64 %					7 %							
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025					Porcentaje Ejecutado				
314.270.195.294			89.626.105.364					28,52 %				

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

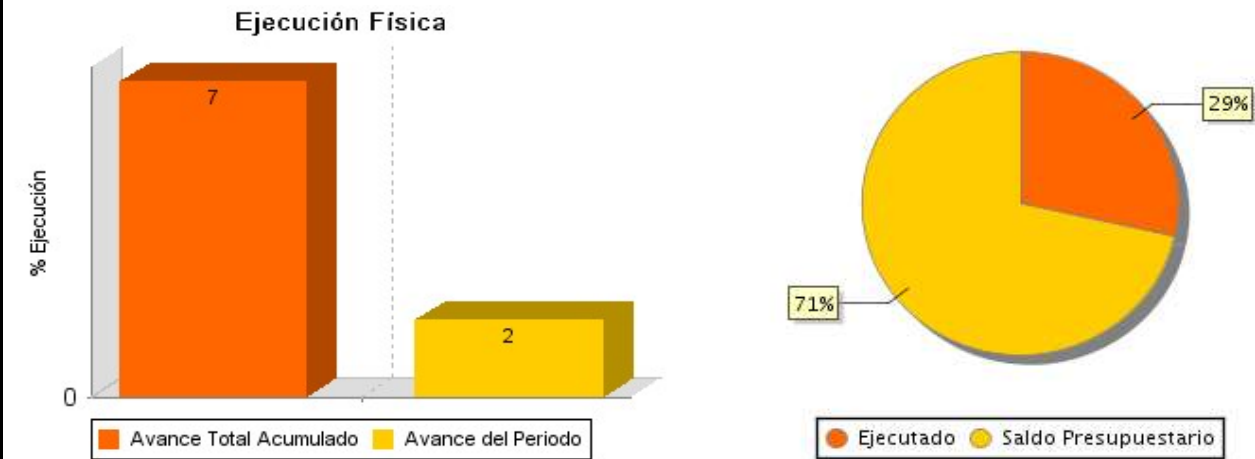


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo, las empresas Contratistas encargadas de la ejecución de los cuatro tramos de la Ruta - PY 15 Tramo Mariscal Estigarribia - Pozo Hondo y Acceso a Mariscal Estigarribia en el Departamento de Boquerón realizaron los siguientes trabajos: Conservación del camino de servicio en la traza principal, trabajos de movimientos de suelo en distintos sectores, en cuanto a capas estructurales, se ejecutaron subrasantes de suelo mejorado con cemento en la traza principal, se extendió y compactó la base de concreto asfáltico con polímero tanto en calzada como en banquetas y controles de calidad en laboratorios. Cabe mencionar que al momento del cierre del presente informe el MOPC no ha remitido el reporte de avance cuatrimestral con la totalidad de los ajustes solicitados.

Proyecto		Construcción Pavimentación de la Ruta Puerto Indio (60 km)							
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES							
Código SNIP N°		857							
Financiamiento		CAF							
Costo del Proyecto		USD		99.100.000		GS.		783.220.609.178	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución			
190.025.828.015			593.194.781.163			24,26 %			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga			
01/04/2022			5/4/2030			N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental		Alto Paraná							
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total					
20 %				48 %					
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado			
133.728.073.297			57.687.504.058			43,14 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

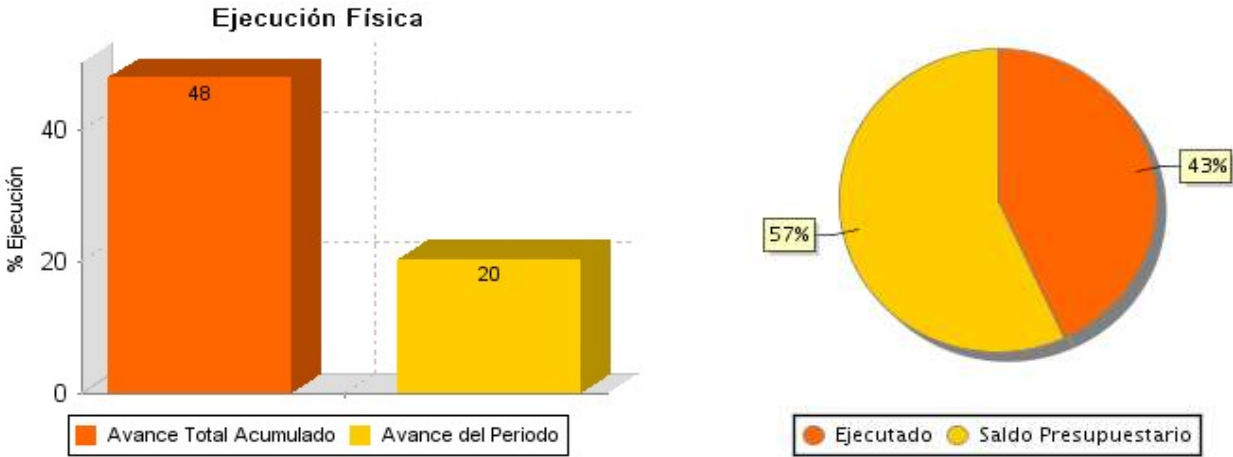


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo la Unidad Ejecutora del Proyecto reporta lo siguiente: La obra presenta 15 kilómetros de avance en la capa asfáltica. Con respecto al Plan de Gestión Ambiental, se encuentra pendiente el pago de anticipo financiero (relacionado a la disponibilidad de Plan de Caja). Asimismo, se ha procedido al pago de indemnizaciones por mejora, como así también indemnizaciones por inmuebles a afectados por las obras. Con respecto a la fiscalización de las obras en el periodo, los informes mensuales N° 30, 31 y 32 fueron aprobados.

Proyecto		Ampliación Def. Costera Ciudad de Pilar				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		860				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	759.815.980.019
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
731.407.238.717			28.408.741.302		96,26 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
08/08/2019			08/08/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Municipal	Pilar					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0 %				96 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
7.932.975.911			2.449.153.608		30,87 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

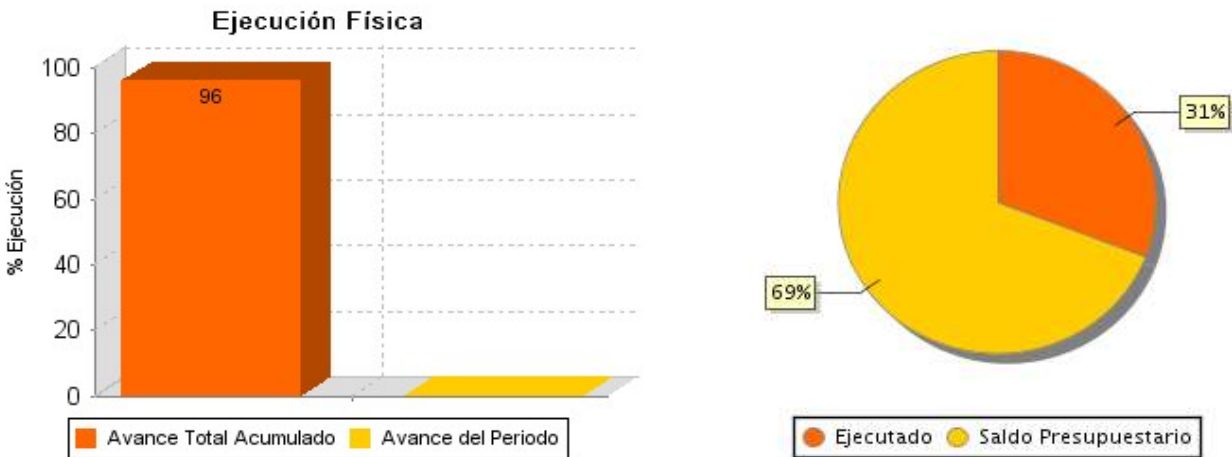


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo de referencia el MOPC reporta que prosiguen los trabajos de Mantenimiento de reservorios, Canales de derivación y Cauce del Arroyo San Lorenzo - Limpieza de cauces y canales, corte de pasto y control de vegetación. - Reposición de empastado mediante hidrosiembra - Reacondicionamiento de suelos en taludes. - Perfilado de caminos auxiliares y coronamiento del muro. Mantenimiento y operación de sistemas de compuertas y electro bombas - Mantenimiento electromecánico de bombas, sistemas de alimentación, grupos electrógenos, mecanismos de compuertas y sistemas de iluminación (solar y eléctrica).

Proyecto		Mejoramiento CORREDOR AGROINDUSTRIAL - REGIÓN OCCIDENTAL											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		863											
Financiamiento		BID											
Costo del Proyecto		USD		134.342.866				GS.		1.288.128.933.825			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
1.038.516.400.358				249.612.533.467				80,62 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
23/12/2020				24/12/2027				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Boquerón, Presidente Hayes											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
4,88 %						79 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
75.325.634.558				37.220.770.482				49,41 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

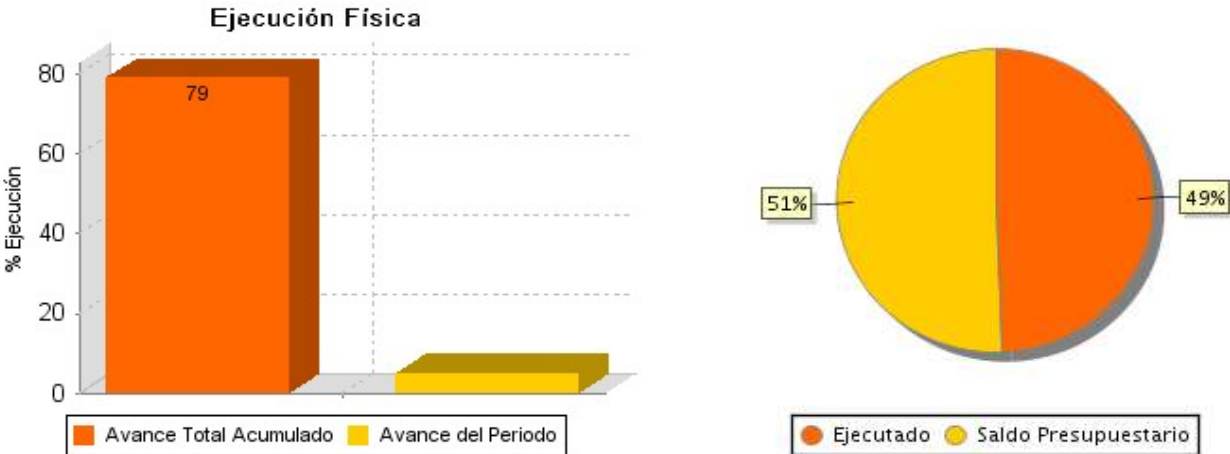

SITUACIÓN ACTUAL


Se detalla el avance del periodo: Componente 1: Obras de Mantenimiento y Pavimentación Asfáltica: 1) Lote 1 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 0+000 hasta progresiva 48+400 incluidos los accesos a Santa Cecilia y Lolita (64,76Km) y 2) Lote 2 – Cruce Pioneros – Paratodo desde progresiva 48+400 incluido el tramo Paratodo – Cruce Douglas desde progresiva 0+000 hasta progresiva 5+100, el acceso a Campo Aceval y el tramo Campo Aceval - Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 0+000 hasta progresiva 29+500 (71,47 Km), en ambos lotes ha culminado la etapa de puesta a punto y se encuentran en proceso de recepción definitiva, se reporta además que se encuentran en etapa de mantenimiento.

En referencia al Componente 2: Construcciones y Mantenimiento de Obras Básicas; Tramo Paratodo – Cruce Douglas desde Progresiva 5+100, y Tramo Campo Aceval – Cruce Infante Avalos Sánchez desde progresiva 29+500, se ha culminado la etapa de puesta a punto y se encuentra también en proceso de recepción definitiva, se reporta asimismo que se encuentra en etapa de mantenimiento.

Con respecto a los contratos de las fiscalizaciones de obras, las mismas se encuentran en ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto	Mejoramiento y Mant. del Corredor Agroind. Region Oriental				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	864				
Financiamiento	BID				
Costo del Proyecto	USD	100.657.134	GS.	685.804.896.001	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
365.766.533.334		320.038.362.667		53,33 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
23/12/2020		23/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,18 %			93 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
86.018.420.703		48.021.571.071		55,83 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

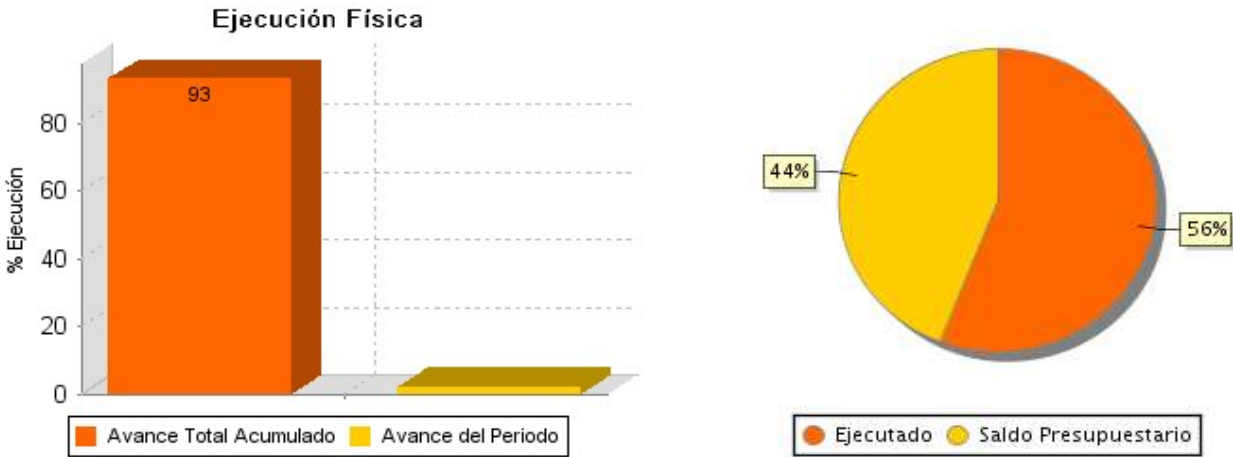


SITUACIÓN ACTUAL

Proyecto de Mejoramiento y Mantenimiento del Corredor Agroindustrial de la Región Oriental a continuación se detalla el avance: 1) Lote 1: Villa del Rosario - Volendam - San Pablo (Incluye Accesos a Volendam (4 Km Zona Urbana) y Puerto Mbopicua (6 Km) y Volendam San Pablo (hasta la cabecera sur del puente sobre el Rio Jejui e incluye mejoramiento acceso a San Pablo) (77,9 Km). cuenta con un avance físico real del 89,74%- 2) Lote 2: San Pablo - Empalme PY 11 (Cruce Yacaré Ñe'e). tiene un avance físico real 83,6 % y. 3) Los contratos de las Fiscalizaciones de obras se encuentran ejecución, todos los Informes mensuales presentados fueron aprobados por el Área técnica y Ambiental.

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SAN IGNACIO			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		871			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	16.234.735	GS.	125.748.738.514
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
11.919.815.626		113.828.922.888			9,48 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
07/07/2023		10/7/2028			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Misiones				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			9 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
26.288.560.003		11.919.815.626			45,34 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

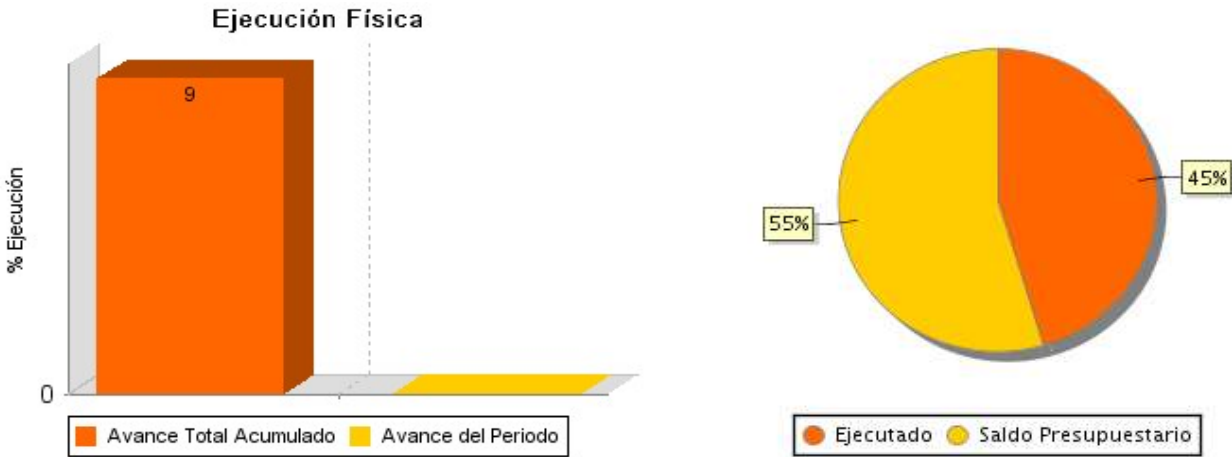

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre en el Componente de Obras el MOPC reporta que se ha honrado el pago del anticipo financiero con fecha de acreditación el 13/05/2025 por importe de Gs.11.442.329.322 al Consorcio Rovella Toca s/Contrato SG N°45/2025 y se procedió a la emisión de Orden de Inicio en fecha 25/08/2025.


Con respecto al Componente de Fiscalización, Supervisión y Administración del Programa se ha reportado lo siguiente: Se realizó la suscripción del Contrato SG N° 101/2025 con el Consorcio ELC- CYD en fecha 07/05/2025, dandose la orden de proceder el 12/05/2025, ademas se realizó el pago de anticipo financiero por Gs.477.486.304 en fecha 12/06/2025, también se ha realizado la presentación del primer informe de la fiscalización en fecha 14/07/2025, conforme al Componente A del contrato: Revisión y Ajuste de Diseños Existentes.

En relación Gerenciamiento de apoyo en la ejecución del programa se presentó el informe inicial y los informes mensuales correspondiente a los meses de abril, mayo junio y julio en el marco del Contrato SG N° 47/2025 con el Consorcio Grupo TYPASA

En referencia a la Auditoría Externa del Programa, el Llamado MOPC N° 121/2024 con nro de ID 454517, cuenta con adjudicación según Resolución N° 76/2025 de fecha 04/06/2025 con la firma CYCA - Contadores y Consultores Asociados por Gs.290.000.000.

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA SANTA RITA					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		874					
Financiamiento		CAF					
Costo del Proyecto		USD	12.108.048		GS.	93.784.825.347	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
8.723.424.309			85.061.401.038			9,30 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/07/2023			10/7/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Alto Paraná					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0 %				9 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
19.895.777.370			8.723.424.309			43,85 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

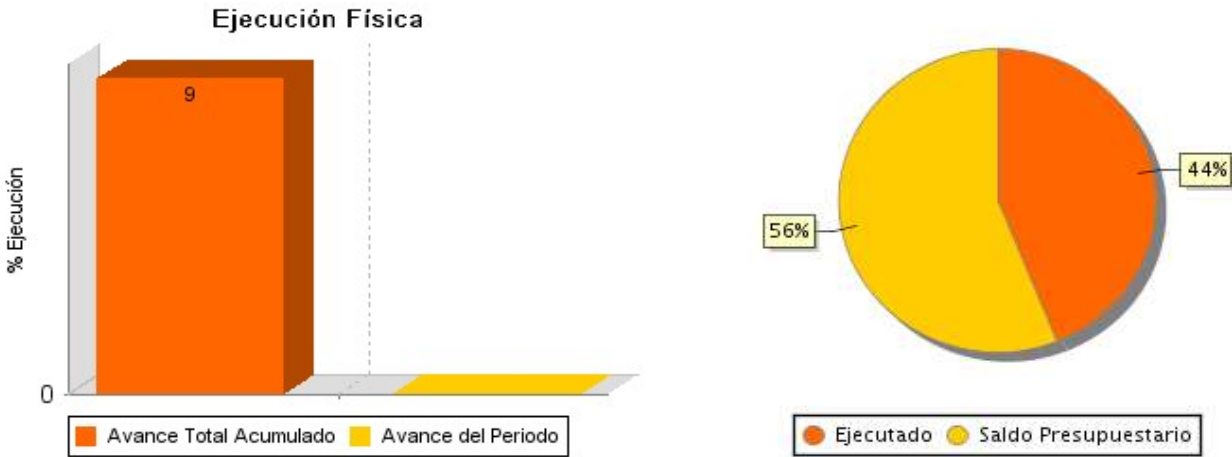

SITUACIÓN ACTUAL


En el presente cuatrimestre en el componente de Obras se ha honrado el pago del anticipo financiero en fecha 27/03/2025 por importe de Gs.8.245.938.005, a la empresa Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A s/ Contrato SG N°352/2024, y se procedió a la emisión de orden de inicio en fecha 25/08/2025.

Con respecto al Componente de Fiscalización, Supervisión y Administración del Programa se realizó la suscripción del Contrato SG N°101/2025 con el Consorcio ELC- CYD en fecha 07/05/2025, con orden de proceder el 12/05/2025, además se ha realizado pago de anticipo financiero por Gs.477.486.304 en fecha 12/06/2025. Asimismo se realizó la presentación del primer Informe de la Fiscalización en fecha 14/07/2025, conforme al Componente A del contrato: Revisión y Ajuste de Diseños Existentes. En el marco del Contrato SG N° 47/2025 el Consorcio Grupo TYP SA - Gerenciamiento de Ciudades, presentó el Informe Inicial y los informes mensuales correspondientes a abril, mayo, junio y julio.

En relación a la Auditoría Externa del Programa ID N° 454517 Llamado MOPC N° 121/2024, cuenta con adjudicación según Resolución N° 876/2025 de fecha 04/06/2025 con la firma CYCA - Contadores y Consultores Asociados por Gs.290.000.000.

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR / SISTEMA DE AGUA CARAPEGUA					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		875					
Financiamiento		CAF					
Costo del Proyecto		USD	12.694.902		GS.	98.330.393.066	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
9.177.981.081			89.152.411.985			9,33 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
07/07/2023			10/7/2028			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Paraguarí					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,12 %				9 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
20.804.890.914			9.177.981.081			44,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

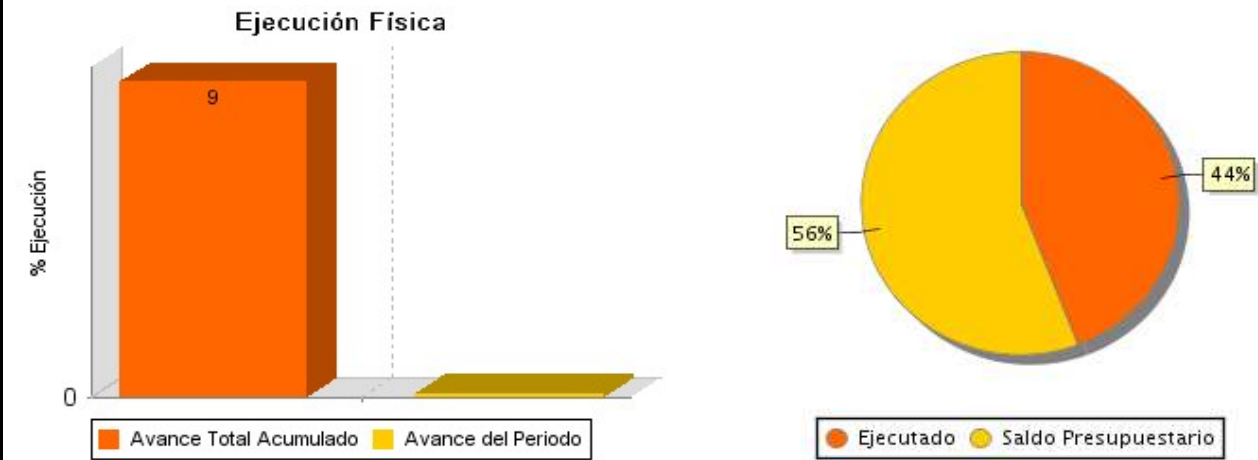

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente cuatrimestre, en el Componente de Obras el MOPC reporta los siguientes avances: Posterior al pago de anticipo financiero el 03/04/2025, por un monto de Gs. 8.700.494.777, al Consorcio Sanitario Carapeguá, conforme al Contrato SG N°341/2024, se ha emitido la orden de Inicio el 25/08/2025.

En cuanto a la Fiscalización, Supervisión y Administración del Programa, se procedió a la suscripción del Contrato SG N°101/2025 con el Consorcio ELC–CYD el 07/05/2025, otorgándose la orden de proceder el 12/05/2025. Asimismo, se efectuó el pago del anticipo financiero, por un total de Gs. 477.486.304, el 12/06/2025.


Se reporta además que el primer informe de fiscalización fue presentado el 14/07/2025, en cumplimiento del Componente A del contrato: Revisión y Ajuste de Diseños Existentes.

En lo referente al Contrato SG N° 47/2025 con el Consorcio Grupo TYPESA relativo al Gerenciamiento de Ciudades Intermedias, se presentó el Informe Inicial, así como los informes mensuales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio.

En lo que respecta a la Auditoría Externa del Programa (ID N° 454517, Llamado MOPC N°121/2024), la misma fue adjudicada mediante Resolución N°876/2025, de fecha 04/06/2025, a la firma CYCA – Contadores y Consultores Asociados, por un monto de Gs. 290.000.000.

Proyecto		Construcción de la Ruta PY012 Tramo Chaco'i - General Bruguez			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		882			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	215.000.000	GS.	1.660.864.646.912
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
606.397.996.921		1.054.466.649.991			36,51 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
09/09/2022		09/09/2025			31/12/2029
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Presidente Hayes				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
19 %			57 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
370.944.617.230		219.251.438.011			59,11 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

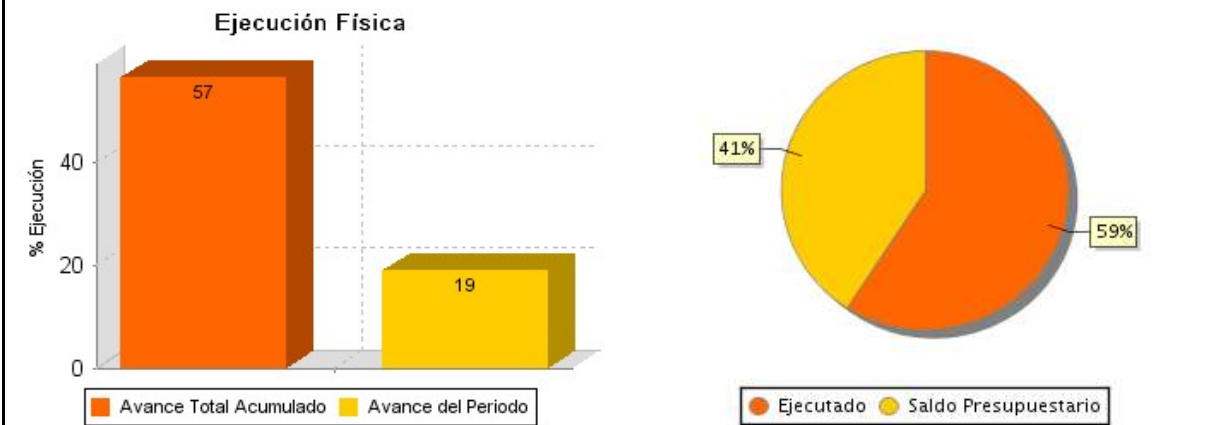


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre el proyecto de construcción de la ruta py 12 tramo Chaco'i General Bruguez, se realizó el llamado de obra id n° 418.689/2023, llamado mopc n° 83/2022 licitación publica internacional para la contratación de empresas constructoras para la ejecución de obras viales de habilitación y mantenimiento de la ruta nacional 12 (PY12). tramo cruce Nanawa - General Bruguez y accesos región occidental, fueron adjudicados los 4 lotes, la orden de inicio se emitió para el lote 3 en el mes de febrero, los otros lotes fueron emitidos orden de inicio en el mes de junio. avance físico real de las obras son: lote 1 – 28,92 %, Lote 2 – 63,54%, Lote 3 – 63,79% y Lote 4 – 41,49 %.

En el 2do cuatrimestre los llamados de fiscalizaciones se firmaron contratos y en junio le dieron orden de proceder, 1. ID N° 430.352 llamado mopc LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 1 de obras del tramo cruce Nanawa- General Bruguez y accesos (PY12), 2. id 430.356 llamado mopc LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 2 de obras del tramo cruce Nanawa- General Bruguez y accesos (PY12) 3. el llamado mopc id n° 430.358 para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 3 de obras del tramo cruce Nanawa- General Bruguez y accesos (PY12) fue adjudicado y firmaron contrato. ya se emitió orden de proceder. 4. id n° 430.360 llamado mopc LPI para la contratación de firma consultora para el servicio de fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento del lote 4 de obras del tramo cruce Nanawa- General Bruguez y accesos (PY12), se canceló el llamado, se está realizando vía administrativa.

Proyecto	Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de CDE y PTE FRANCO				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	883				
Financiamiento	BID , JICA				
Costo del Proyecto	USD	200.000.000	GS.	1.246.000.000.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
-		1.246.000.000.000		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
11/05/2023		11/05/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,78 %			7 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
76.412.638.835		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

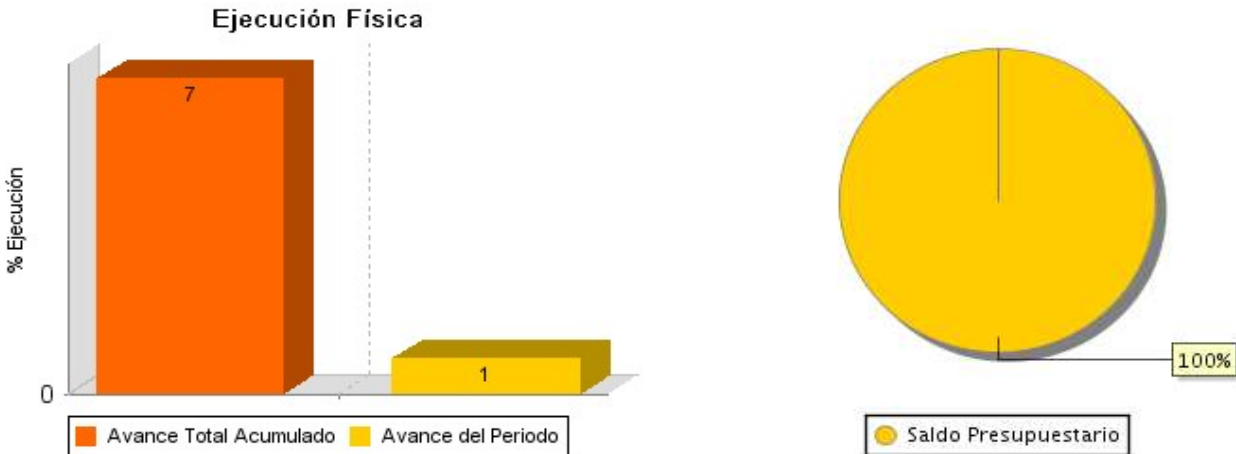

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del segundo cuatrimestre se tubo los siguientes avances:

a) Llamado N°143-2024 "Diseño y Construcción de las Obras de Captación, Tratamiento y Almacenamiento de Agua Potable para el Área Metropolitana de Ciudad del Este" ID 459.800, su apertura de sobres fue realizada el 07/08/25, actualmente se encuentra en etapa de evaluación técnica, se prevé su adjudicación en el tercer cuatrimestre 2025.

b) También se ha realizado la apertura económica del Llamado MOPC N° 55/2024 LPI "Diseño y Construcción para el Sistema de Tratamiento y Disposición Final de Aguas Residuales, Ciudad del Este", ID 451167. Actualmente se encuentra en etapa de evaluación y se prevé adjudicar en el tercer cuatrimestre 2025.


c) Llamado MOPC N°88/2024 "Contratación de Ingeniero FIDIC", ID N°449328 se encuentra adjudicado y se prevé firma e inicio del contrato dentro del tercer cuatrimestre.

d) Llamado MOPC N° 30/25 "Contratación de los Servicios de ING. FIDIC", se encuentra publicado en la DNCP y está prevista su apertura y adjudicación dentro del tercer cuatrimestre 2025.

e) Llamado MOPC N° 33/25 "Contratación de Asistencia Técnica y Operativa Especializada (ATOE)". Se encuentra con observación de reparo por DNCP. Se estima su adjudicación en el tercer Cuatrimestre.

Proyecto		Construcción ALCANT Y PTAR / SIST DE AGUA STA ROSA AGUARAY			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		889			
Financiamiento		CAF			
Costo del Proyecto		USD	11.254.316	GS.	87.175.104.572
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
7.982.452.231		79.192.652.341		9,16 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
7/7/2023		10/7/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	San Pedro				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
1,69 %			3 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
18.413.833.217		7.982.452.231		43,35 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

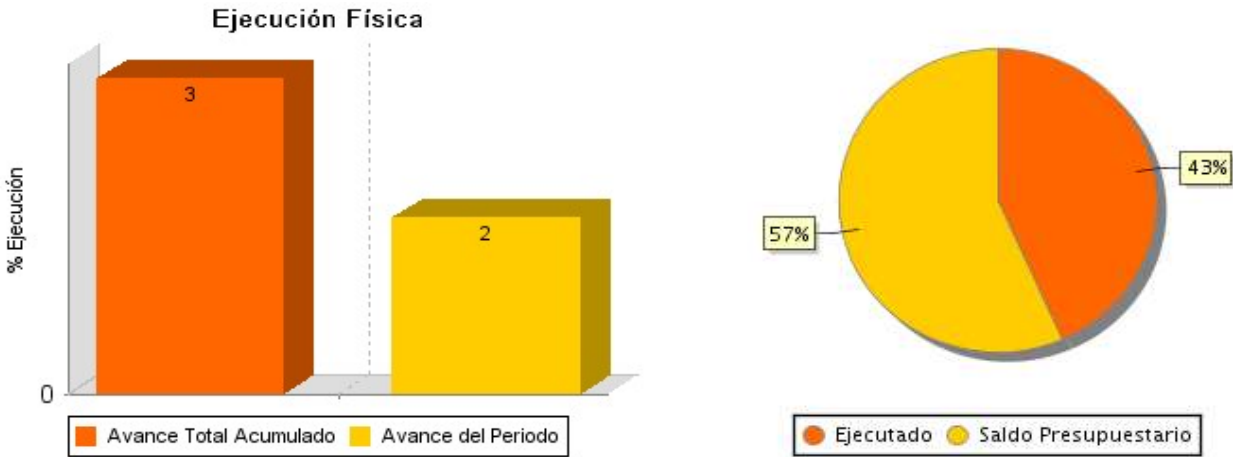

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente cuatrimestre, en el Componente de Obras, se ha procedido al pago del anticipo financiero el 10/06/2025, por un monto de Gs. 7.504.965.928, a la empresa Sociedad Constructora Chaco S.A., conforme al Contrato SG N°46/2025. Asimismo, se prevé la emisión de la Orden de Inicio para el mes de septiembre, una vez obtenida la aprobación del PASA.

En lo que respecta a la Fiscalización, Supervisión y Administración del Programa, se procedió a la suscripción del Contrato SG N°101/2025 con el Consorcio ELC–CYD el 07/05/2025, otorgándose la orden de proceder el 12/05/2025, efectuándose el pago del anticipo financiero, por un total de Gs. 477.486.303, el 12/06/2025.


Se reporta además que el primer informe de fiscalización fue presentado el 14/07/2025, conforme al Componente A del contrato, correspondiente a la Revisión y Ajuste de Diseños Existentes.

En cuanto al Contrato SG N°47/2025, de Servicio de Gerenciamiento de apoyo en la ejecución del Programa de Saneamiento de Ciudades Intermedias a cargo del Consorcio Consorcio Grupo TYPSA , se ha presentado el informe inicial, así como los informes mensuales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio.

Finalmente, en relación con la Auditoría Externa del Programa (ID N°454517, Llamado MOPC N° 121/2024), la misma fue adjudicada mediante Resolución N°876/2025, de fecha 04/06/2025, a la firma CYCA – Contadores y Consultores Asociados, por un monto de Gs. 290.000.000.

Proyecto		Restauración y Puesta en Valor del Palacio de Gobierno					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		892					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	54.987.954.652	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
53.053.385.657			1.934.568.995			96,48%	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
25/11/2019			25/11/2022			25/11/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Asunción					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
0,00 %				100,00 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
0			0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

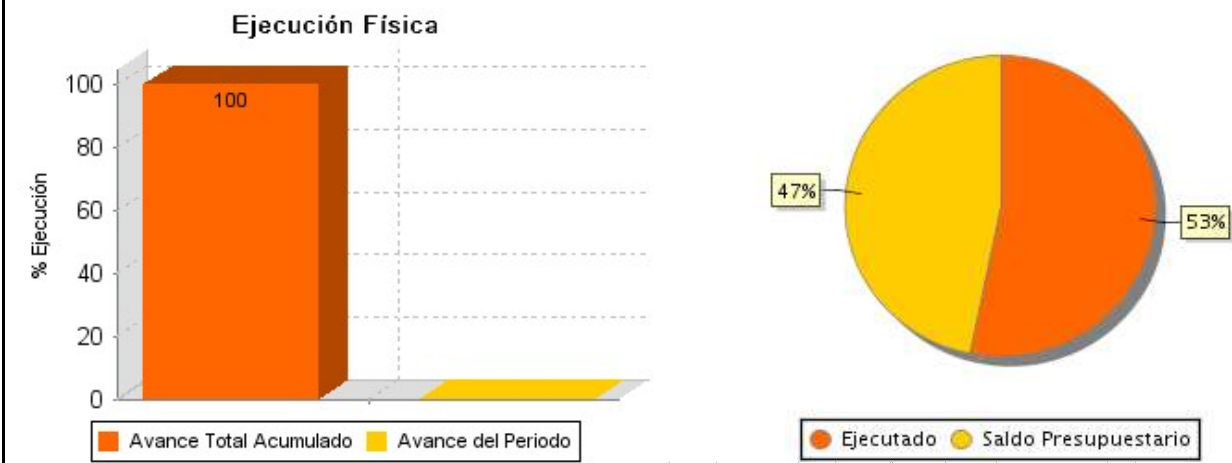


SITUACIÓN ACTUAL

La obra cuenta con Recepción Definitiva que fue firmada el 27 de enero del 2025, actualmente en proceso el pago de los intereses moratorios del contrato.-

Proyecto		Mejoramiento Sist. de Agua y Alc. Sanit de Cuenca Lambaré			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		906			
Financiamiento		BID , ICO			
Costo del Proyecto		USD	165.000.000	GS.	1.005.013.350.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
2.439.250.000		1.002.574.100.000			0,24 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/04/2024		24/04/2029			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,70 %			7 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
64.069.027.651		1.531.800.000			2,39 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

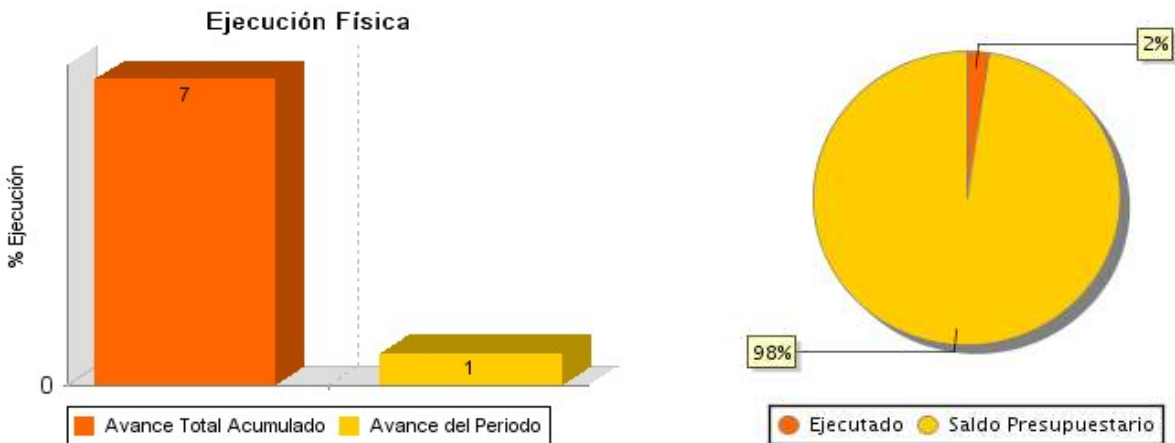

SITUACIÓN ACTUAL

Dentro del segundo cuatrimestre los avances en los llamados son los siguientes:

a) Llamado MOPC N° 132 Contratación de Diseño y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial ID 459.555, se encuentra en etapa de evaluación técnica, se prevé realizar su apertura económica y adjudicar llamado dentro del tercer cuatrimestre 2025.


b) Llamado MOPC N° 90/2024 Contratación de Servicios del Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de las Obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Emisario Subfluvial Cuenca Lambaré, se encuentra en etapa de evaluación económica y se prevé adjudicar en el tercer cuatrimestre. ID 449344.

c) Llamado MOPC N° 21-2025 Contratación de Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de Colectores de Cuencas menores y principal de Lambaré, se encuentra publicado en el portal de la DNCP y se prevé realizar la apertura de oferta técnica dentro del tercer cuatrimestre 2025, así también la económica y adjudicar. ID 464253.

d) Llamado MOPC N° 130/2024 Contratación del Ingeniero FIDIC para el Diseño y Construcción de las Redes Secundarias y Terciarias de Alcantarillado Sanitario, Estaciones de Bombeo y Líneas de Impulsión de la Zona 1 (Norte), Zona 2 (Intermedia) y la Zona 3 (Sur) de la Cuenca de Lambaré, actualmente se ha conformado la lista corta y se está trabajando en la SPD para el envío al BID, para su no objeción y publicar en el portal de la DNCP. ID 811.

Proyecto		Mejoramiento Mbocayaty del Yhaguy-San José de los Arroyos											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		921											
Financiamiento		LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		8.644.569				GS.		56.345.300.061			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
15.715.279.893				40.630.020.168				27,89 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
01/10/2022				01/10/2024				31/12/2026					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Departamental		Caaguazú, Cordillera											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
2 %						13 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
17.000.000.000				0				0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

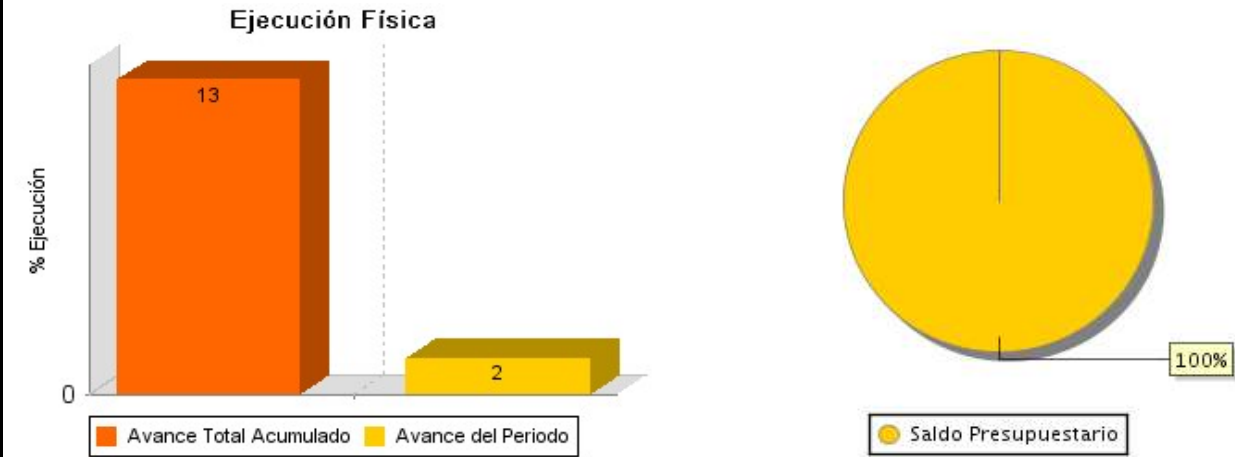


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre se realizaron los trabajos en zona de la obra: Pavimentación Asfáltica del Tramo Mbocayaty del Yhaguy – San José de los Arroyos, y la presentación de certificados mensuales,

Proyecto	Mejoramiento Tramo Naranjito - Nueva Aurora-Santa Inés				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	925				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	139.543.694.577
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
7.876.333.202		131.667.361.375		5,64 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
1/4/2025		31/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Itapua				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
7 %			8 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
29.384.670.602		7.876.333.202		26,80 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

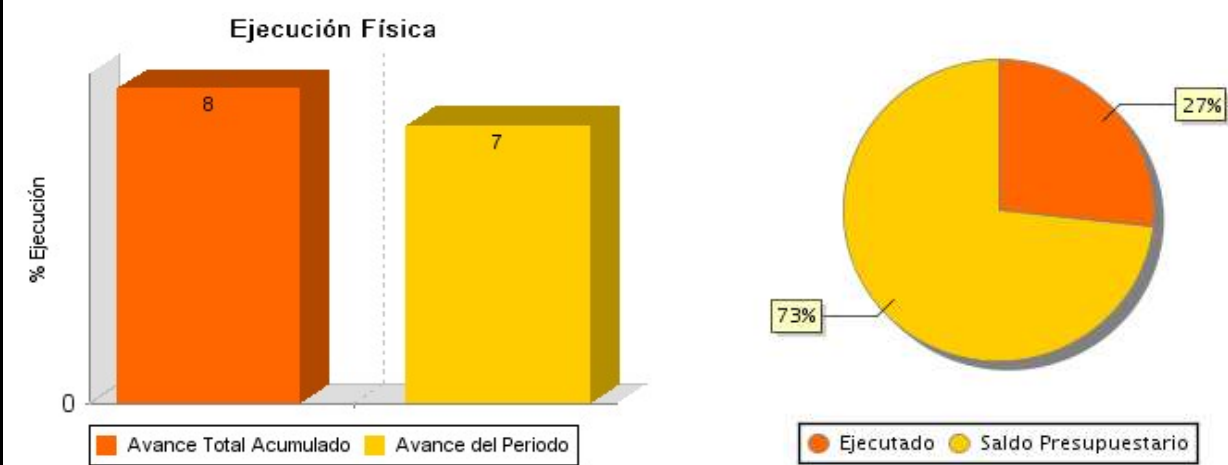


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo del segundo cuatrimestres se realizaron los trabajos de 1,43 km de caminos mejorados en el tramo Naranjito - Maria Aurora, además de la fiscalización adjudicada

Proyecto	Construcción ALCANT Y PTAR PARA LA CUENCA M Roque Alonso				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	933				
Financiamiento	CAF				
Costo del Proyecto	USD	160.000.000		GS.	1.211.528.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
-		1.211.528.000.000		0 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
18/10/2023		24/10/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Central				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
42.642.167.399		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

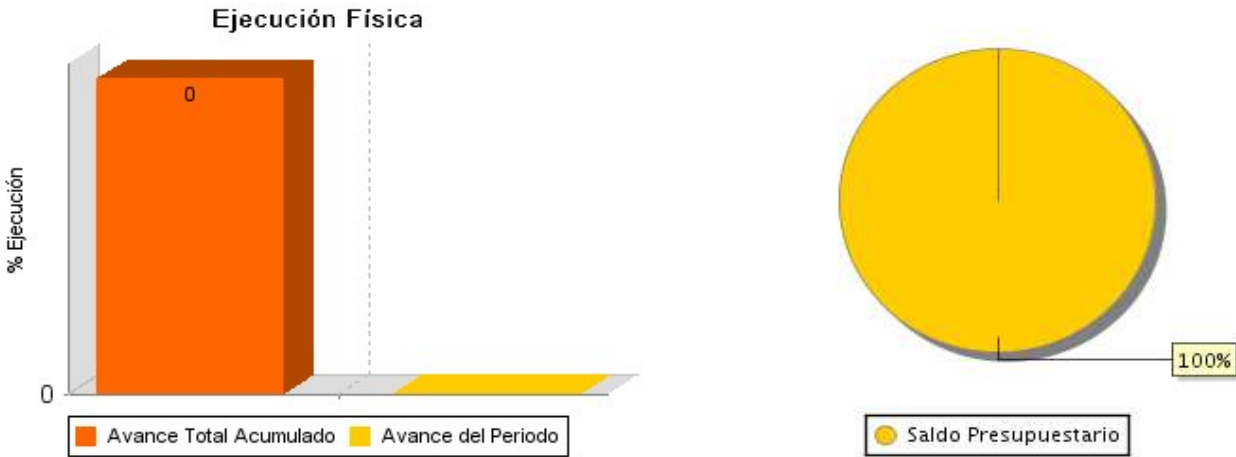

SITUACIÓN ACTUAL

Con relación a las obras de infraestructura, se encuentra en proceso de licitación el Llamado MOPC N° 137/2024 (ID N°459961), en etapa de entrega de ofertas, cuyo plazo se extiende hasta el 24 de octubre de 2025.
En lo que respecta a la Administración y Gestión del Programa:


1- Se halla en curso el proceso de licitación para la contratación de la Consultoría de Fiscalización del Diseño y Construcción, Llamado MOPC N°104/2024 (ID N°459964), en etapa de entrega de ofertas, con fecha límite est

2- Contrato SG N°47/2025, adjudicado al Consorcio Grupo TYPsa en el marco del servicio de apoyo al Gerenciamiento del Programa, cuenta con orden de proceder emitida el 26 de marzo del presente año. En cumplimiento del cronograma establecido, el Consorcio ha presentado su Informe Inicial, así como los informes mensuales correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio.

3- Auditoría Interna se encuentra igualmente en proceso de licitación, a cargo de la Dirección de Crédito Público del MOPC, bajo el Llamado MOPC N°32/2025 (ID N°469746).

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Capiatá			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		935			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	8.533.170	GS.	59.732.188.277
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
13.725.740.078		46.006.448.199			22,98 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
1/4/2025		31/12/2027			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Capiatá				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6 %			10 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
38.945.740.078		13.725.740.078			35,24 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

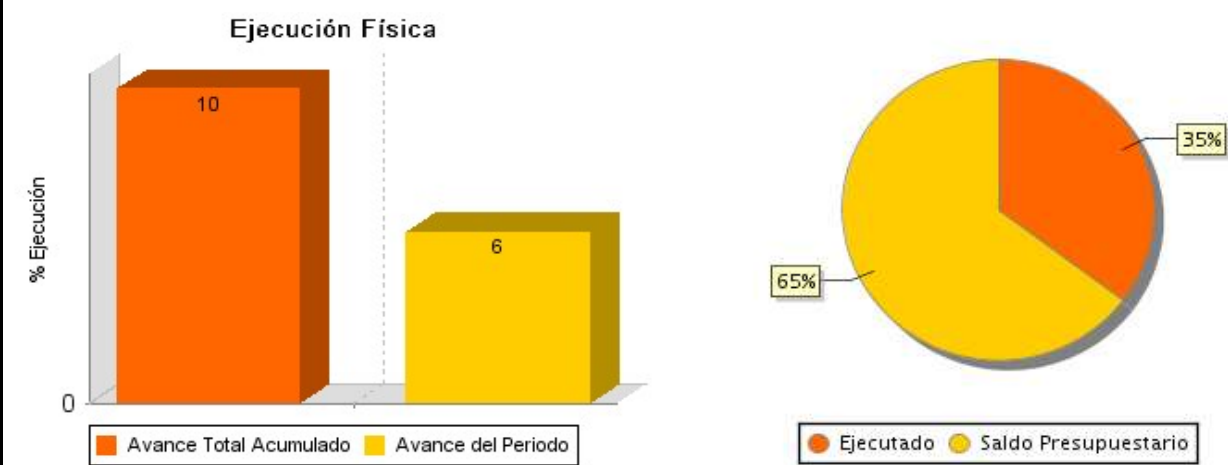


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo del segundo cuatrimestre se realizaron los trabajos de 4,67 kilometros de caminos rehabilitados en el Distrito de Capiatá, se registra un total de 20,84% de avance total de la obra

Proyecto		Mejoramiento Caminos Distritales San Lorenzo			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		936			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	9.744.865	GS.	79.967.763.760
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
15.802.468.358		64.165.295.402			19,76 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
16/12/2024		16/12/2027			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	San Lorenzo				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6 %			10 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
38.662.468.358		15.802.468.358			40,87 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

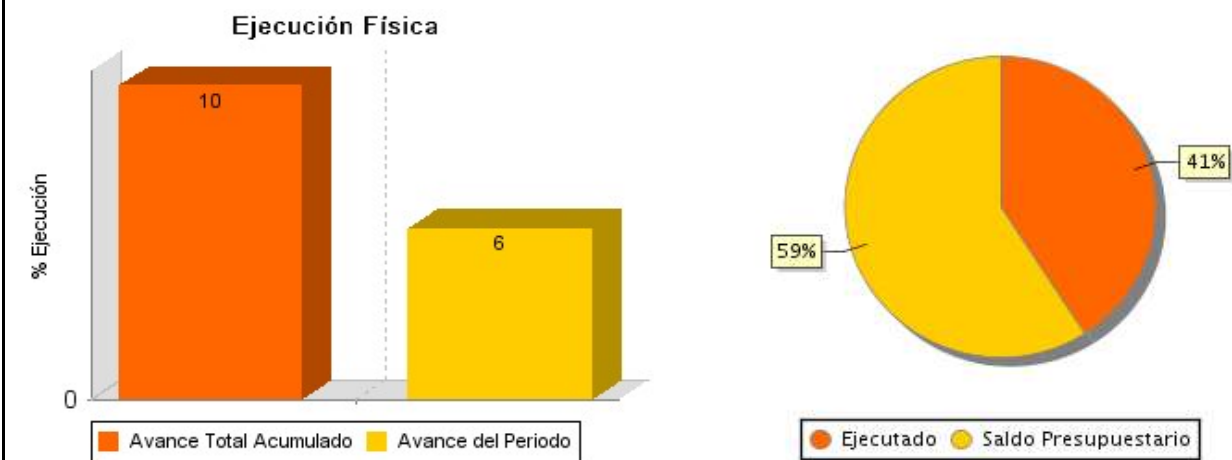


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre se realizaron trabajos en obras de 6,02 kilometros de caminos mejorados en el Distrito de San Lorenzo con un 23,18 % de avance acumulado del total de la obra

Proyecto	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar - Humaitá - Paso Patria				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	1145				
Financiamiento	JICA				
Costo del Proyecto	USD	47.863.687	GS.	375.729.924.906	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		375.729.924.906		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
17/2/2025		31/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal		Humaitá, Isla Umbú, Paso de Patria, Pilar			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
44.643.760.981		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre no se registran avances de obras, ya que la licitación se encuentra en proceso de evaluación, la Licitación 461867 - llamado MOPC N° 10/2025 LPN mejoramiento de la Ruta Nacional PY04: tramo Pilar – Humaitá – Paso de Patria, Departamento de Ñeembucú (58.6 km).

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Areguá					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		939					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	6.190.230		GS.	56.818.770.246	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
7.738.804.724			49.079.965.522			13,62 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
10/2/2025			31/12/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Municipal	Areguá						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
3 %				7 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
15.757.084.249			7.738.804.724			49,11 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

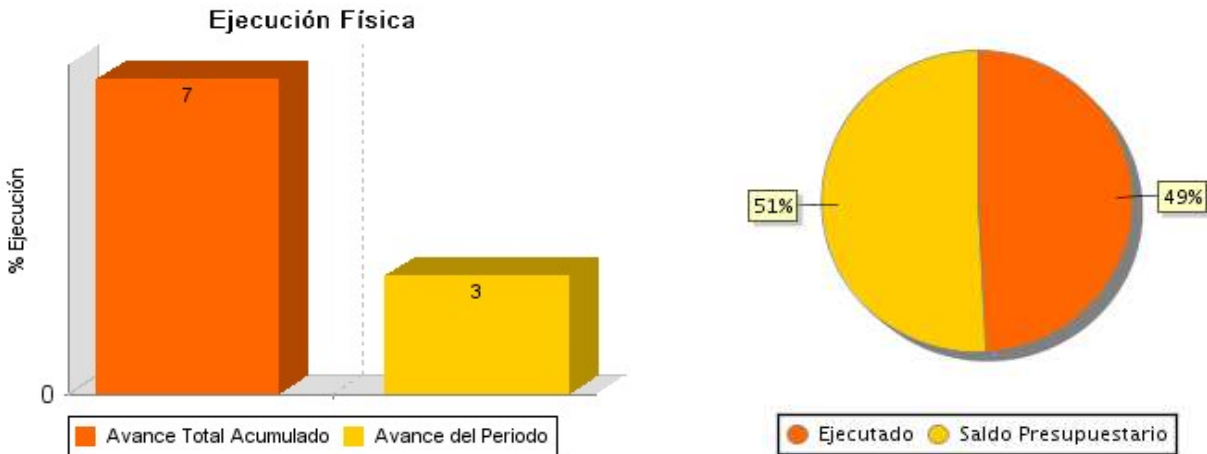


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo se realizaron los trabajos de 0,63 km de caminos mejorados en el Distrito de Areguá en el segundo cuatrimestre

Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Itá			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		941			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	6.562.546	GS.	51.581.512.029
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
10.641.955.951		40.939.556.078		20,63	%
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
14/3/2025		31/12/2027		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Itá				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
20 %			32 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
31.758.955.951		10.641.955.951		33,51	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

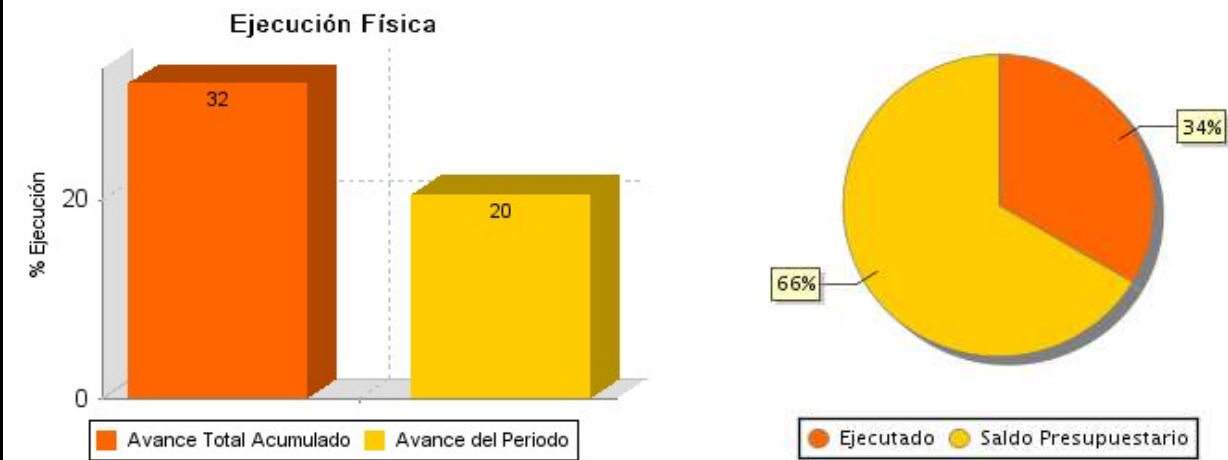


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre se realizaron los trabajos de 8,31 kilometros de caminos mejorados en el Distrito de Itá

2025/2025											
Proyecto		Mejoramiento de Caminos Distritales de Guaramaré									
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES									
Código SNIP N°		946									
Financiamiento		LOCAL									
Costo del Proyecto		USD		N/A			GS.		11.648.603.554		
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución			
1.791.425.365				9.857.178.189				15,38 %			
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga			
16/12/2024				16/12/2026				N/A			
Ubicación Geográfica del Proyecto											
Municipal		Guaramaré									
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total						
6 %					10 %						
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado			
4.900.691.266				1.791.425.365				36,55 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

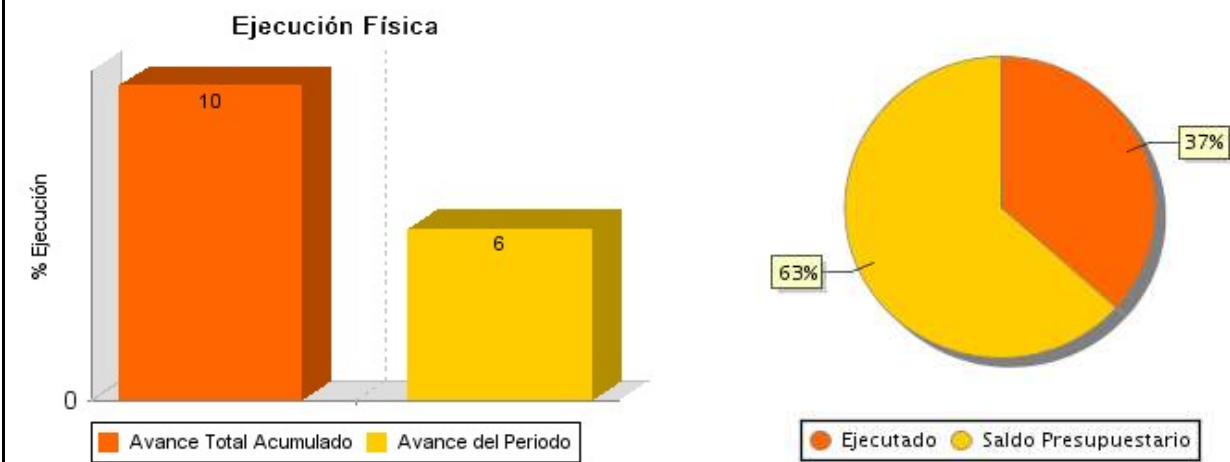


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre se realizaron los trabajos de 0,6 km de caminos mejorados en el Distrito de Guarambaré

Proyecto		Mejoramiento de gestión de infraestructura vial pavimentada					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		956					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	342.333.286.666	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
234.643.511.981			107.689.774.685			68,54 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
01/10/2022			01/10/2024			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional	N/A						
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
4 %				56 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
133.525.678.082			68.130.103.885			51,02 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

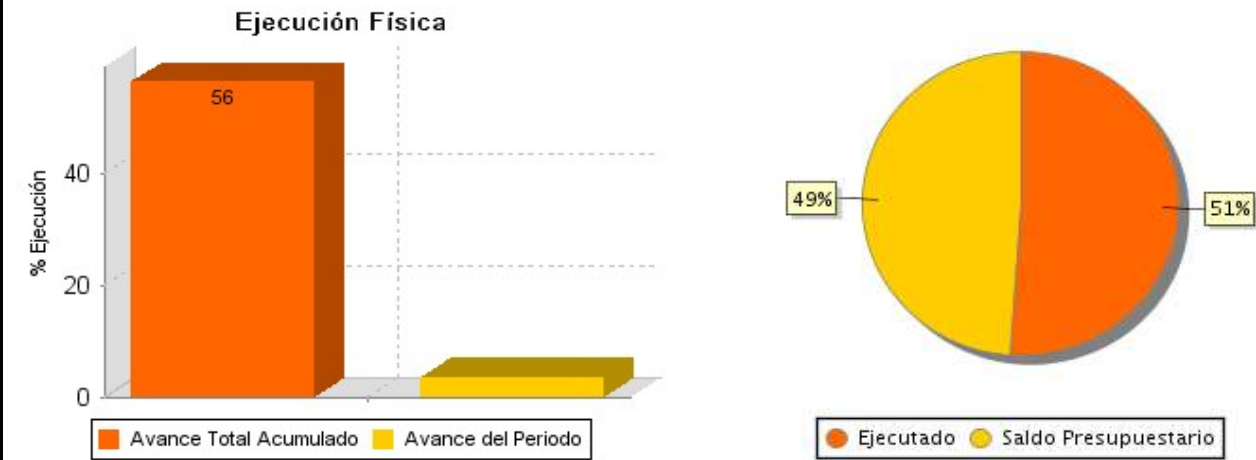


SITUACIÓN ACTUAL

En este segundo periodo el MOPC reporta los siguientes avances: Se realizaron pagos a la empresa TECO S.R.L, por trabajos de mantenimiento de túneles y viaductos. – Con respecto al Llamado MOPC 20/2024 de limpieza de franja de dominio, se han reportado limpiezas en los lotes adjudicados y se han regularizado los pagos que estaban pendientes, como así también los pagos por provisión de combustible del convenio con PETROPAR.

Proyecto		Mejoramiento del edificio central del MINNA				
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°		957				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	10.905.509.073
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
8.841.605.059			2.063.904.014		81,07 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/06/2022			01/06/2023		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Departamental		Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0 %				52 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
0			0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

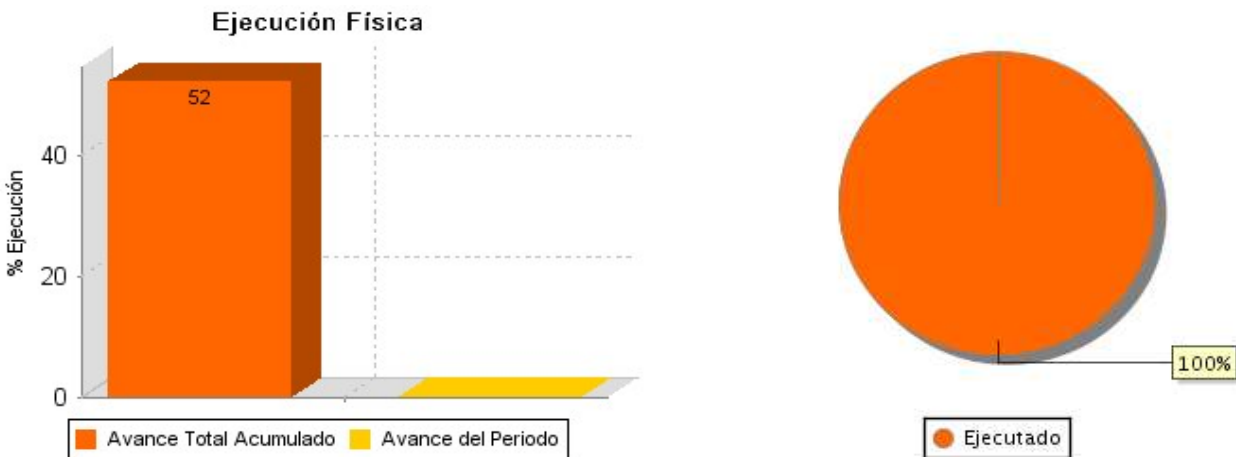


SITUACIÓN ACTUAL

Las obras se encuentra con recepción definitiva, y tiene pendientes pagos e intereses moratorios.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Empalme D006-D008 y Ramal 1a Línea, 33Km			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		962			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	13.972.812.086	GS.	135.972.812.086
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
81.472.425.714		54.500.386.372		59,92 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2022		01/04/2024		31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Capiibary, Yhú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
12,77 %			83,76 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
41.643.305.955		17.721.250.630		42,55 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

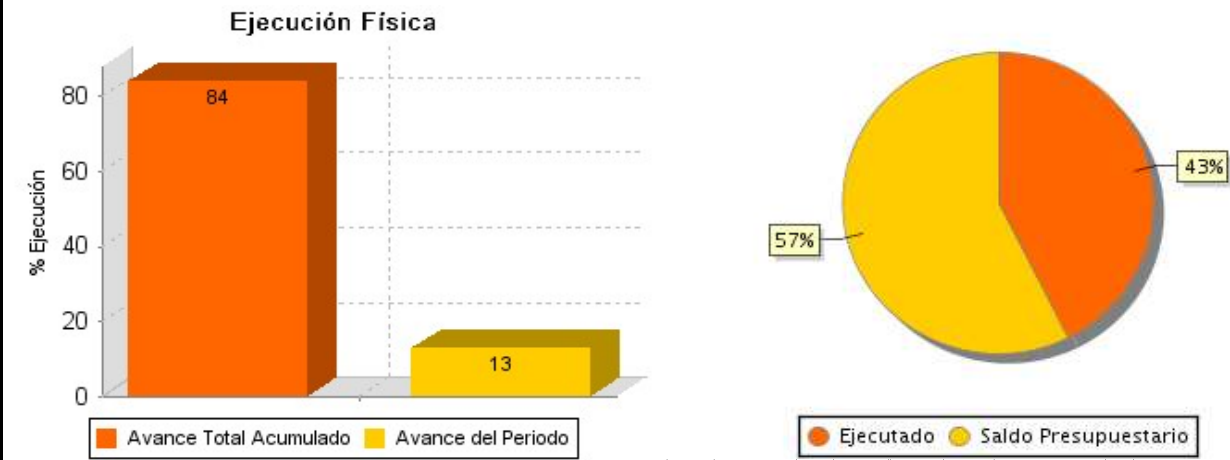


SITUACIÓN ACTUAL

Se registra un avance general de 31,65 km, con acompañamiento de fiscalización.

Proyecto		Construcción Sistema Pluvial, Cloacal y Av. Costanera Pilar			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		974			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	97.215.346	GS.	682.909.119.634
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
55.051.384.618		627.857.735.016		8,06 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
4/7/2023		4/7/2025		31/12/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Pilar				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
3 %			3 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
103.617.653.934		55.051.384.618		53,13 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

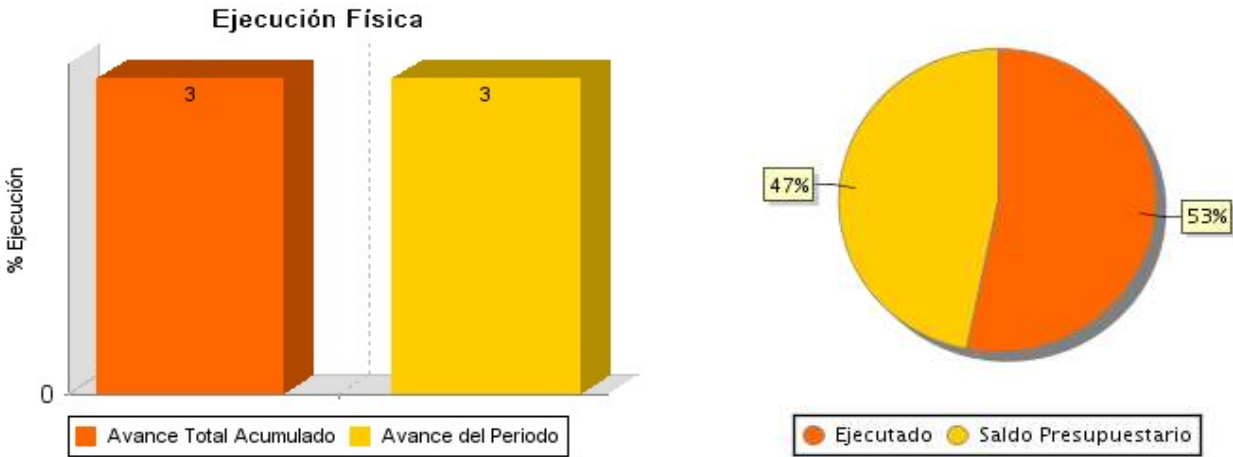

SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que el avance ejecutado de la obra hasta el presente periodo es de 3,11% .En el periodo de referencia se culminaron los trabajos de revisión del proyecto ejecutivo licitado, relevamiento topográfico y estudio de suelos terminados, relevamiento de actas de pre construcción culminados en los barrios San Quintin, la Eliza y tramo vial Yataity - Paso Mendes, finalización de poda de árboles en la zona a ser pavimentada, campamento de supervisión terminado con el equipamiento correspondiente, campamento del contratista terminado con el equipamiento y en uso por el personal. Además, reuniones periódicas de información y socialización con la Gobernación, Municipalidad de Pilar, concejales y organizaciones civiles como la Asociación Rural del Paraguay.

Proyecto		Construcción Instalaciones Reserva Banco San Miguel, Asunción											
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES											
Código SNIP N°		982											
Financiamiento		BIRF											
Costo del Proyecto		USD		11.137.827				GS.		77.964.786.690			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución					
0				77.964.786.690				0,00 %					
Fecha de Inicio				Fecha de Fin				Fecha de Prórroga					
24/11/2023				29/12/2028				N/A					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Municipal		Asunción											
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0,00 %						1,88 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado					
142.560.000				0				0,00 %					

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO




SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, se reporta que la actividad no tuvo avance físico; no obstante, en el mes de Agosto se llevó a cabo una Misión Técnica entre autoridades del MOPC, del BM y el equipo de la Unidad Ejecutora de Proyecto a fin de examinar alternativas técnicas y ambientales para la reestructuración del subcomponente del Banco San Miguel. Es importante mencionar, que, estas alternativas incluyen la contratación de un servicio de consultoría para elaboración del Estudio de Factibilidad y fueron enmarcadas en lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental y Social del Proyecto.

Respecto a la Administración del Proyecto, se menciona por un lado que en el mes de julio se ha publicado y evaluado las ofertas de Expresión de Interés para la Contratación de Servicios de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N° 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 Al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025.

Proyecto		Construcción del Distrito Eco-inclusivo de Asunción			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		983			
Financiamiento		BIRF			
Costo del Proyecto		USD	105.000.000	GS.	467.331.485.250
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
17.467.731.863		449.863.753.387			3,74 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
24/11/2023		29/12/2028			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
2,35 %			5,30 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
43.561.352.768		15.374.121.280			35,29 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

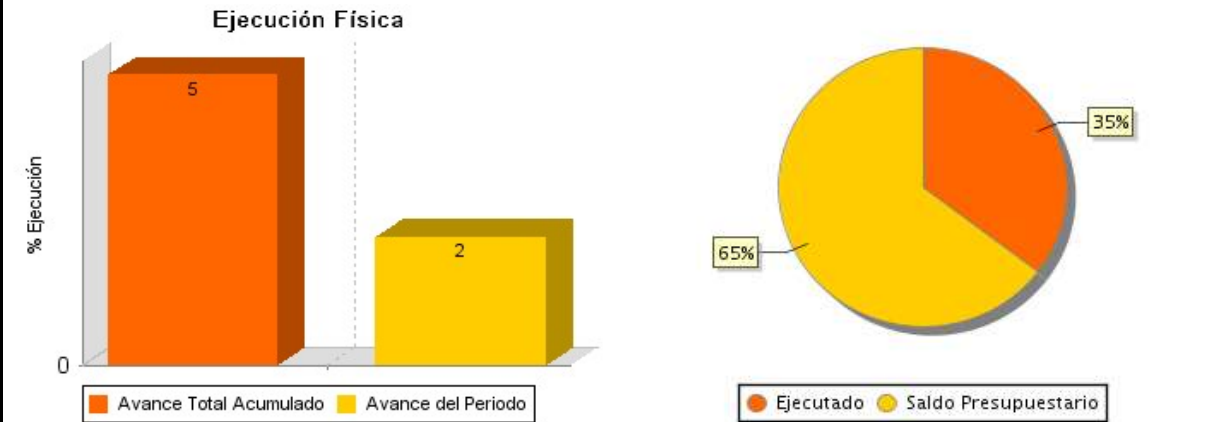

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, respecto a la ejecución de obras, los técnicos de la UEP BIRF 9451-PY han avanzado en los estudios preliminares y Máster plan del proyecto, insumos necesarios para el proceso de Llamado de Diseño e Obra Fase 1 del Distrito Eco-inclusivo, cuya publicación está prevista para el último cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

Así también, el llamado de Obra de Soterramiento de la Línea de Transmisión de 2 x 220kV, ejecutado por el Consorcio TOCSA-TECNOEDIL cuenta con una ejecución de contrato del 18%, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el presente ejercicio fiscal.


Respecto a la Fiscalización, según datos proveídos por los técnicos de la UEP BIRF 9451-PY se reporta que la actividad no tuvo avance físico; no obstante, se encuentran elaborando los Términos de Referencia para la Fiscalización de obras.

Respecto a las consultorías previstas, se ha procedido a la firma de contrato del servicio de consultoría para la elaboración del estudio de Factibilidad, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el presente ejercicio fiscal.

Con relación a la administración del proyecto, se menciona por un lado que en el mes de julio se ha publicado y evaluado las ofertas de Expresión de Interés para la Contratación de Servicios de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N° 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025. Finalmente, lo que respecta al área social y ambiental, se confirman que el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) fue considerado para las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del Llamado MOPC N°: 102/2024. Soterramiento de LAT, como así también para próximo Llamado de Diseño e Infraestructura del Distrito Ecoinclusivo. Por su parte, el área social reporta que se han llevado a cabo 06 (seis) talleres participativos con la población beneficiaria del Distrito Ecoinclusivo.

Proyecto	Mejoramiento y revitalización urbanística del Centro Histórico de Asunción (CHA)				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	985				
Financiamiento	BIRF				
Costo del Proyecto	USD	20.958.011		GS.	146.706.073.500
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
15.000.000		146.691.073.500		0,01 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/11/2023		29/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,08 %			2,46 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
9.473.302.997		15.000.000		0,16 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

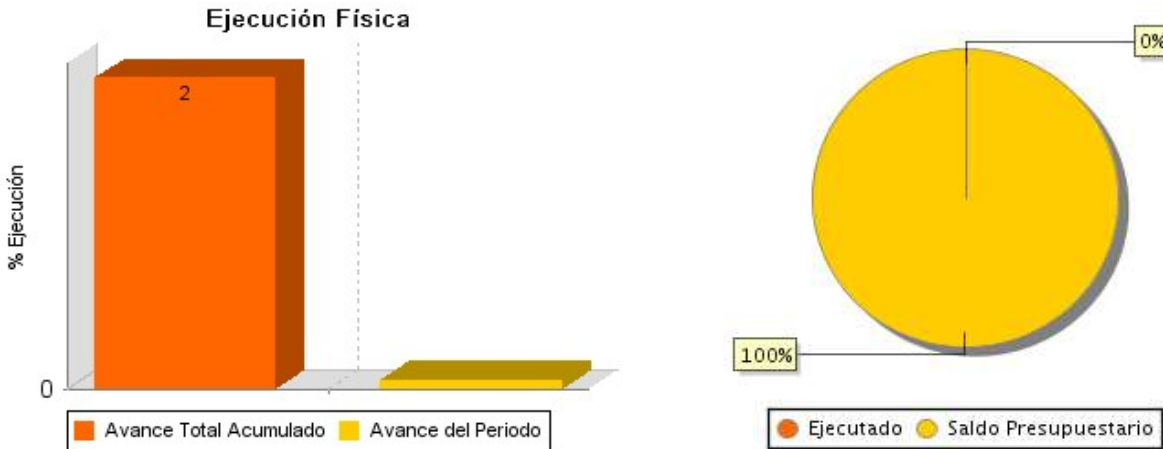

SITUACIÓN ACTUAL

En el presente cuatrimestre, se ha finalizado el desarrollo y aprobación de las Especificaciones Técnicas y demás anexos del Pliego de Bases y Condiciones de Llamado de Diseño e Infraestructura Fase 1 del Centro Histórico de Asunción, el cual se prevé publicar en el mes de Setiembre.

Respecto a la Fiscalización, la elaboración de los Términos de Referencia se encuentra en etapa final para su posterior remisión al Banco para la No Objeción correspondiente.

En lo referente a consultorías, se informa que durante los meses de Julio y Agosto se ha publicado y evaluado las ofertas de Expresión de Interés para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social ambiental de los Proyectos “Mejoramiento del Parque Caballero” y “Revitalización del Centro Histórico”, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025.

Con relación a la administración del proyecto, se menciona que en el mes de julio se han publicado y evaluado las ofertas de Expresión de Interés para la Contratación de Servicios de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N° 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 Al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025. Finalmente, en lo correspondiente a temas sociales y ambientales, se han elaborado las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), instrumento que define los programas para el PGAS y del Plan de afectación de activos, ambos documentos forman parte de los anexos del Pliego de Bases y Condiciones de Llamado de Diseño e Infraestructura Fase 1 del Centro Histórico de Asunción, el cual se prevé publicar en el mes de Setiembre.

Proyecto	Mejoramiento del Parque Caballero, Asunción				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	987				
Financiamiento	BIRF				
Costo del Proyecto	USD	13.726.991		GS.	96.088.938.750
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
15.000.000		96.073.938.750		0,02 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/11/2023		28/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	Asunción				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,14 %			2,53 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
21.172.663.862		15.000.000		0,07 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Al cierre del presente cuatrimestre, se informa con respecto a las obras de Parque Caballero, que durante el mes Agosto se ha publicado el Llamado N° 50/2025 Licitación Pública Nacional para la contratación de Diseño Ejecutivo Fases 1 y 2, Construcción de la Obra Fase I, incluye la Gestión de Operación y Mantenimiento del Parque Bernardino Caballero, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025.


Respecto a la fiscalización, los Términos de Referencia se encuentran en ajustes finales para su remisión para la No Objeción del Banco y posterior publicación del Llamado.

En lo referente a consultorías, se informa que durante los meses de Julio y Agosto se han publicado y evaluado las ofertas de Expresión de Interés para la Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social ambiental de los Proyectos “Mejoramiento del Parque Caballero” y “Revitalización del Centro Histórico”, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025.

Con relación a la administración del proyecto, se menciona por un lado que en el mes de Julio se ha publicado y evaluado las ofertas de Expresión de Interés para la Contratación de Servicios de Auditoría Financiera, Contable y Concurrente Externa del Préstamo BIRF N° 9451 – PY Periodos Fiscales 2024 al 2026, por lo que se da por cumplida parcialmente la meta prevista para el 2025. Por otro lado, se han firmado 5 contratos de consultores especialistas y en paralelo, se han revisado y aprobado los Términos de Referencia e iniciado el proceso de contratación de otros consultores, por lo que también se da por cumplida la meta prevista.

Proyecto		Mejoramiento del tramo: “Casilla 2 – Tembiapora”					
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°		988					
Financiamiento		LOCAL					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	158.420.952.975	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
26.642.632.601			131.778.320.374			16,82 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
1/1/2025			30/9/2026			31/12/2026	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Departamental		Caaguazú					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
4,89 %				9,64 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
47.941.807.501			26.642.632.601			55,57 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

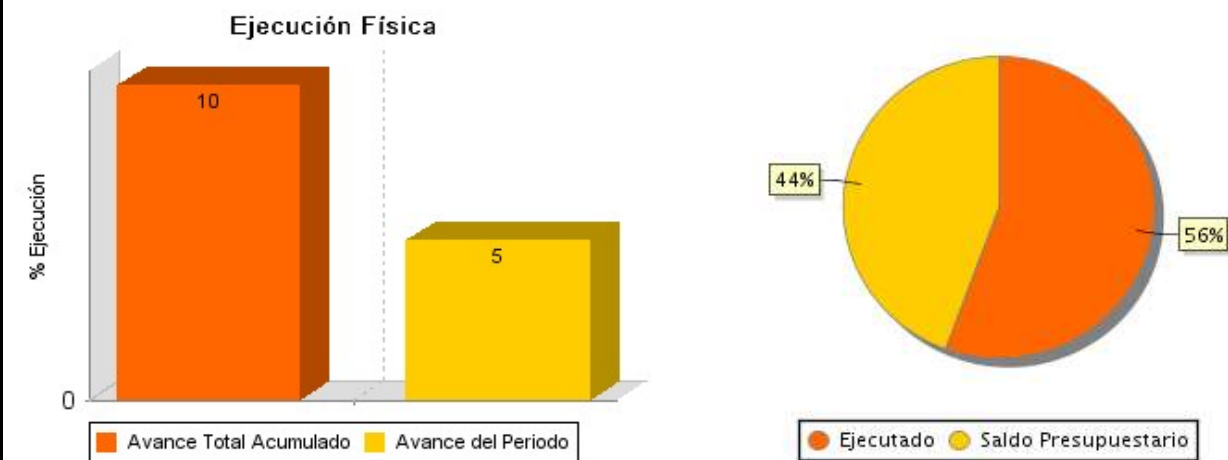


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora del Proyecto no ha respondido al cierre de la elaboración del presente informe, a las consultas realizadas por la DGIP.

Proyecto	Construcción y protección de márgenes del Arroyo San Lorenzo				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	1007				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	45.752.075.133
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
6.174.002.170		39.578.072.963		13,49 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
15/4/2024		15/4/2026		N/A	

Ubicación Geográfica del Proyecto					
Municipal	San Lorenzo				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4 %			4 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
18.844.278.260		6.174.002.170		32,76 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

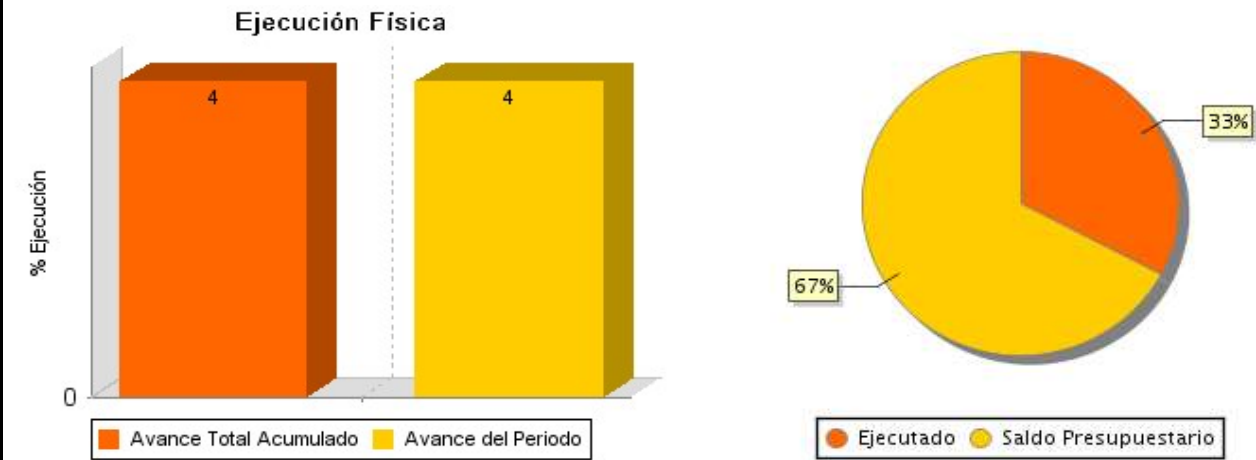


SITUACIÓN ACTUAL

El MOPC reporta que en el segundo cuatrimestre se ha realizado obras conforme a los ítems de replanteo y marcación general, desbroce y destronque, limpieza y mantenimiento en zona de obras, remoción de estructuras existentes, obrador y oficina para fiscalización, letreros de obras, calculo estructural, servicios especializados, comunicación y difusión, restitución o reposición de bienes afectados, compensación forestal, plan de monitoreo ambiental, ejecutándose un monto acumulado de Gs. 1.710.316.629, a la fecha cuenta con un avance acumulado de 4.54%. Se reporta además que se ha procedido al pago de los Certificados de Obras N° 1 al 3.

Proyecto		Mejoramiento Tramo Juan Emiliano Oleary – San Cristóbal			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		1008			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	32.690.011	GS.	265.781.249.805
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
15.550.955.229		250.230.294.576			5,85 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
17/3/2025		17/3/2027			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Alto Paraná				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6 %			11 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
57.763.556.288		15.550.955.229			26,92 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

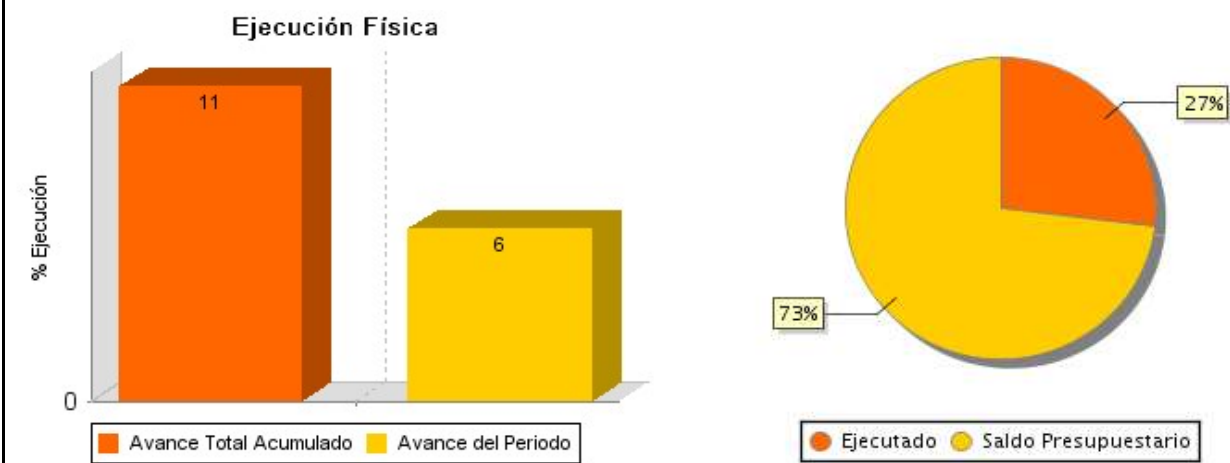


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo se realizaron los trabajos de 2,80 kilometros de caminos mejorados en el tramo Juan Emiliano Oleary - San Cristóbal, ademas de la Fiscalización adjudicada



Proyecto	Mejoramiento Quayquyho-María Antonia-Ñandu Rugua-Mbuyapey									
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES									
Código SNIP N°	1129									
Financiamiento	LOCAL									
Costo del Proyecto	USD	N/A			GS.	196.583.923.796				
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución				
11.211.089.942		185.372.833.854				5,70 %				
Fecha de Inicio		Fecha de Fin				Fecha de Prórroga				
31/06/2024		31/12/2026				N/A				
Ubicación Geográfica del Proyecto										
Departamental		Paraguarí								
Avance Físico Reportado del Periodo					Avance Físico Acumulado Total					
5 %					9 %					
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025				Porcentaje Ejecutado			
18.937.402.576			11.211.089.942				59,20 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

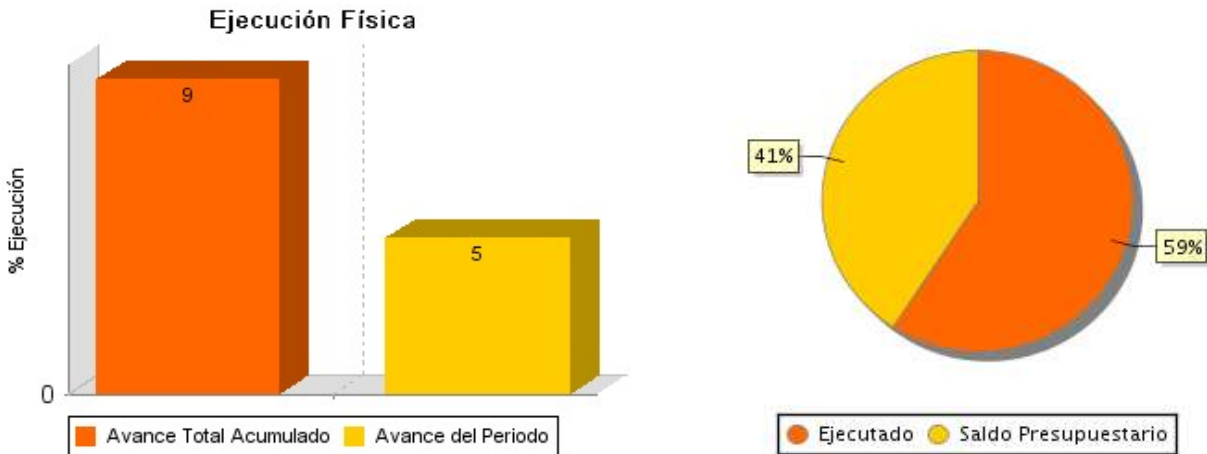


SITUACIÓN ACTUAL

En este periodo del segundo cuatrimestre se realizaron los trabajos de 1,30 km de caminos pavimentados, además de la fiscalización adjudicada

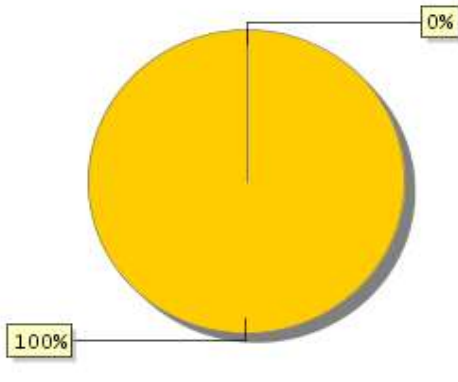 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto		Ampliación de establecimientos educativos e IFD	
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	
Código SNIP N°		1075	
Financiamiento		BIRF	
Costo del Proyecto		USD	104.190.000
		GS.	760.587.000.000
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
16.962.013		760.570.037.987	0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
7/1/2025		7/1/2030	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Nacional	N/A		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
0 %		0 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
14.991.293.407		16.962.013	0,11 %
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			
Ejecución Física  Avance Total Acumulado Avance del Periodo  Ejecutado Saldo Presupuestario			
SITUACIÓN ACTUAL			
construcción, reparación y mantenimiento de los Locales Escolares a Potenciar (LEAP) y remitido al Banco Mundial y a las áreas involucradas dentro del MOPC.			
La Unidad Ejecutora de Proyectos incorporó las correcciones del Banco Mundial para la actualización de la Estrategia de Adquisiciones para el Desarrollo (EAPD), de manera conjunta con el MEC. Así también se avanzó en la modalidad de fiscalización mediante Convenio Marco, con elaboración de TDR para la firma fiscalizadora.			
Se iniciaron los llamados previstos en el Plan de Adquisiciones (PA), avanzando en la revisión de Términos de Referencias para especialistas en áreas técnica, fiduciaria, socioambiental y apoyo operativo.			
El MOPC y el MEC lideran la elaboración de TDR para el llamado de auditoría, ya aprobados, con No Objeción del Banco Mundial.			

Proyecto		Mejoramiento Tramo General Higinio Morínigo - Caazapá			
OEE		MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°		1111			
Financiamiento		LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	17.458.784	GS.	161.106.223.110
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución
9.393.800.324		151.712.422.786			5,83 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga
17/3/2025		17/9/2026			N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caazapá				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
5 %			6 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado
36.735.427.725		9.393.800.324			25,57 %

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

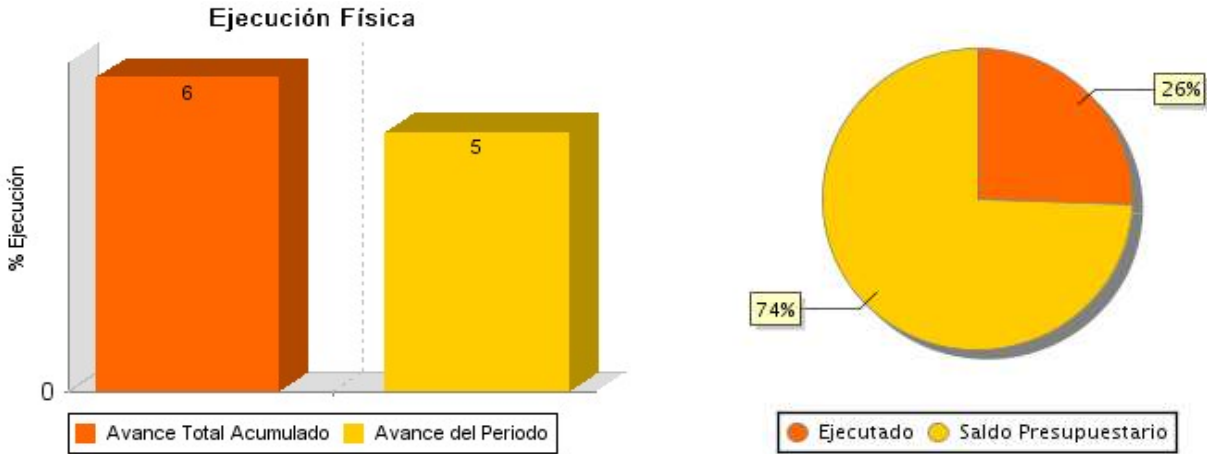


SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre se realizaron los trabajos de 2,66 km de caminos mejorados, además de la fiscalización adjudicada

Proyecto	Mejoramiento Travesía urbana de Coronel Oviedo				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	1131				
Financiamiento	LOCAL				
Costo del Proyecto	USD	N/A		GS.	110.771.956.864
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
14.879.098.588		95.892.858.276		13,43 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
16/10/2024		16/10/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental	Caaguazú				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0,81 %			0,81 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
19.318.072.000		7.000.000.000		36,24 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

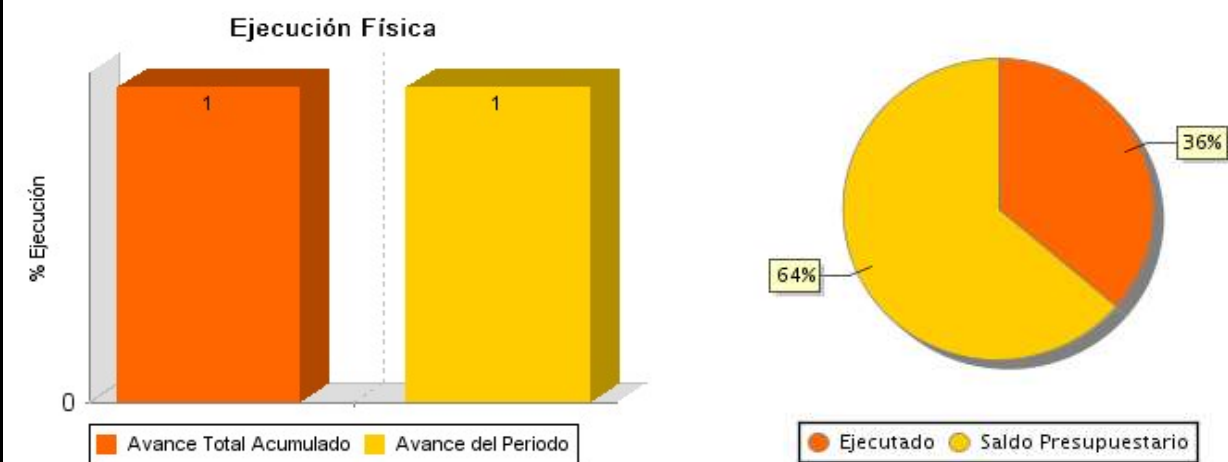


SITUACIÓN ACTUAL

En el presente periodo del segundo cuatrimestre se ejecutan trabajos de movimiento de suelo, conformación del paquete estructural y obras de drenaje.
Se realiza el procesamiento mensual de los certificados de obra, de acuerdo con el avance físico registrado, en el marco del cumplimiento del contrato vigente.

Proyecto	Reconstrucción de la Academia Militar-Capiatá					
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES					
Código SNIP N°	1135					
Financiamiento	LOCAL					
Costo del Proyecto	USD	46.788.000		GS.	352.126.488.000	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
0		0			0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
3/6/2024		1/7/2027			N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional		N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
0 %				0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
35.264.000.000		0			0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

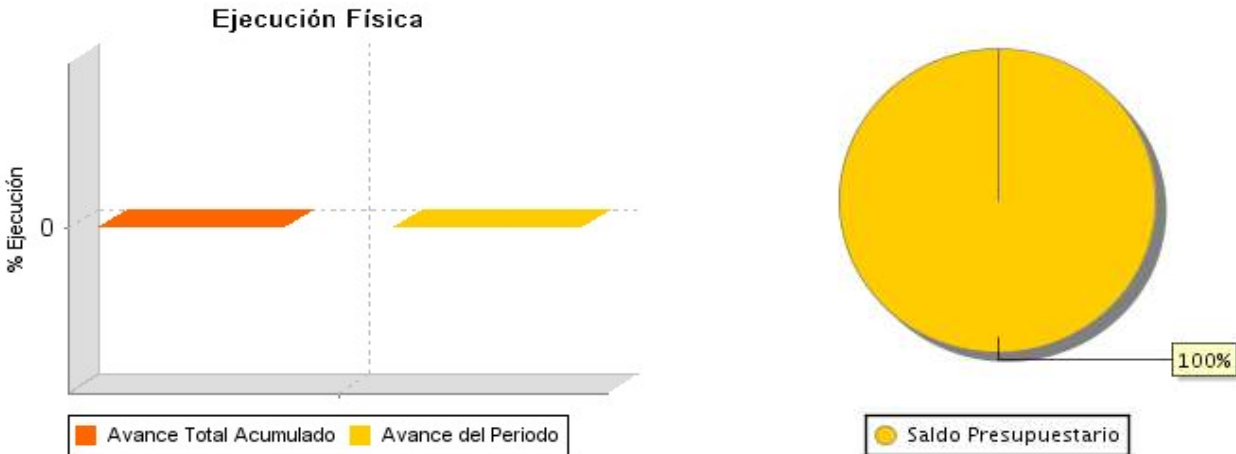


SITUACIÓN ACTUAL

En el marco de la ejecución del segundo cuatrimestre del periodo fiscal 2025 la Unidad Ejecutora de Proyectos no reportó las observaciones remitidas por esta dependencia.

Proyecto	Mejoramiento Ruta PY04 Tramo: Pilar - Humaitá - Paso Patria				
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES				
Código SNIP N°	1145				
Financiamiento	JICA				
Costo del Proyecto	USD	47.863.687	GS.	375.729.924.906	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
0		375.729.924.906		0,00 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
N/A		31/12/2028		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Departamental		Itapúa			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
44.643.760.981		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL


En el periodo del segundo cuatrimestre no se registran avances, ya que la licitación se encuentra en proceso de evaluación convocatoria de la Licitación 461867 - llamado MOPC N° 10/2025 LPN mejoramiento de la ruta nacional PY04: tramo Pilar – Humaitá – Paso de Patria, Departamento de Ñeembucú (58.6 km).

Proyecto	Construcción de la sede del INDI, Distrito de Yhú, Caaguazú			
OEE	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
Código SNIP N°	1147			
Financiamiento	LOCAL			
Costo del Proyecto	USD	1.069.362	GS.	8.510.635.107
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución
0		8510635107		0,00 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga
N/A		31/12/2027		N/A

Ubicación Geográfica del Proyecto

Departamental		Caaguazu			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
0 %			0 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
800.000.000		0		0,00 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

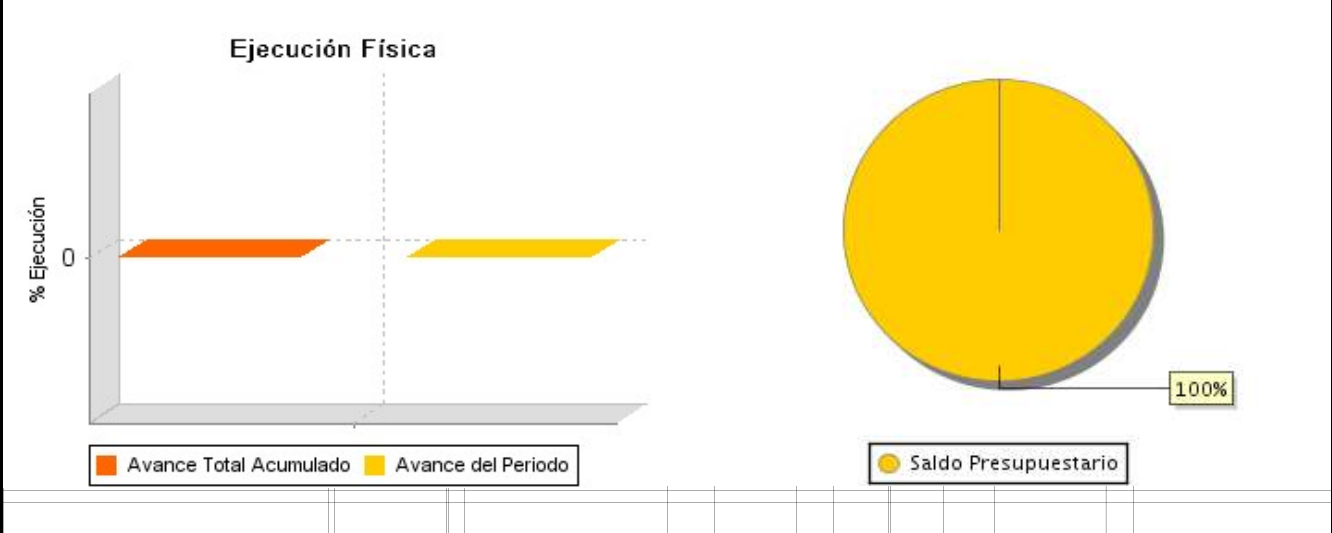

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del segundo cuatrimestre se encuentran tanto el Componente 2: Actividad 1: En espera del llamado a Licitacion Publica Nacional.


Proyecto	Mejoramiento y Ampliacion de Viviendas del Area Metropolitana de Asunción (AMA)													
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT													
Código SNIP N°	446													
Financiamiento	BID													
Costo del Proyecto	USD		16.000.000				GS.		127.547.641.790					
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.					Porcentaje de Ejecución						
103.233.720.886			24.313.920.904					80,94 %						
Fecha de Inicio			Fecha de Fin					Fecha de Prórroga						
14/10/2016			20/10/2022					31/12/2025						
Ubicación Geográfica del Proyecto														
Departamental		Asunción, Central												
Avance Físico Reportado del Periodo							Avance Físico Acumulado Total							
3,91 %							99,66 %							
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025					Porcentaje Ejecutado					
6.003.746.378				2.342.121.104					39,01 %					


AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

En el segundo cuatrimestre del año en curso se verifican los siguientes avances: -Se emitieron 8 subsidios, acumulando un total acumulado de 2401 de subsidios entregados. -Se ejecutaron y culminaron 39 obras de mejoramiento y ampliación de viviendas, subsidiadas por el Proyecto en el Área Metropolitana de Asunción, acumulando en total 2401 obras realizadas llegando a la meta del Programa, estas obras se realizaron en los siguientes distritos: Asunción, Capiatá, Fernando de la Mora, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa. -Se realizó como mínimo 117 supervisiones a las 39 obras que estuvieron en ejecución y fueron culminadas. -Se adjudicó el llamado de la Auditoría Externa financiera y de gestión del Programa de Mejoramiento de Vivienda y el Hábitat 3538/OC-PR, Año 2024 y 2025 y la Evaluación final del Programa. -Se realizaron las gestiones de pagos en concepto de sueldos a los contratados por la UEP, Asimismo los trámites ante el Banco para la No objeción de los procesos realizados por la Unidad Ejecutora. -Se encuentra en proceso de evaluación el llamado de adquisición de equipos informáticos para el software para el MUVH.

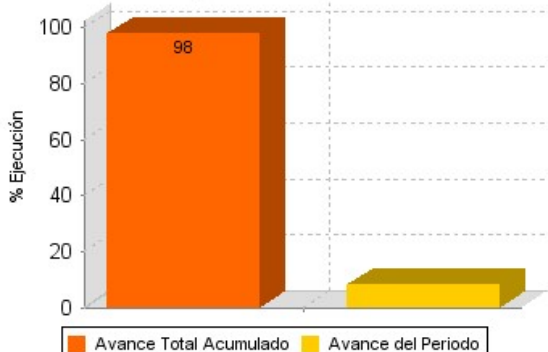 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública															
Proyecto		Mejoramiento de las Condiciones de Habitabilidad de Chacarita Alta															
OEE		MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT															
Código SNIP N°		447															
Financiamiento		BID															
Costo del Proyecto		USD	14.000.000	GS.	130.075.424.519												
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución													
110.028.745.294		20.046.679.225		84,59 %													
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga													
14/10/2016		20/10/2022		31/12/2025													
Ubicación Geográfica del Proyecto																	
Departamental		Asunción															
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total														
8,12 %			97,73 %														
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado													
32.450.203.621		19.692.951.435		60,69 %													
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO																	
Ejecución Física <table><tr><th>Categoría</th><th>% Ejecución</th></tr><tr><td>Avance Total Acumulado</td><td>98</td></tr><tr><td>Avance del Periodo</td><td>12</td></tr></table> <table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Ejecutado</td><td>61%</td></tr><tr><td>Saldo Presupuestario</td><td>39%</td></tr></table>						Categoría	% Ejecución	Avance Total Acumulado	98	Avance del Periodo	12	Categoría	Porcentaje	Ejecutado	61%	Saldo Presupuestario	39%
Categoría	% Ejecución																
Avance Total Acumulado	98																
Avance del Periodo	12																
Categoría	Porcentaje																
Ejecutado	61%																
Saldo Presupuestario	39%																
SITUACIÓN ACTUAL																	
Se mencionan los siguientes avances en el segundo cuatrimestre en el Barrio Chacarita Alta: -Se entregaron 23 viviendas sostenibles acumulando en total 35 viviendas entregas hasta la fecha. -Continúan los trabajos ampliación y habilitación de calles y pasillos, se realizaron intervenciones sobre la Calle Monday, desde la calle Gondra hasta la Calle Florencio Villamayor, asimismo intervenciones sobre la Calle Comuneros desde la Calle Caballero hasta la Calle Mompox, estas obras son realizadas por la Empresa Puntal Construcciones. -Se realizaron trabajos de instalación de tuberías de agua potable en la calle Monday, Calle Comunero y culminación de las instalaciones sobre la Calle Florencio Villamayor, y parte de los trabajos sobre la calle Mompox, estos trabajos son realizados por la Empresa Puntal Construcciones. -Se realizó la conexión de la impulsión a red de alcantarillado de la ESSAP en las Calles Comuneros, Florencio Villamayor, Mompox y Pasillo Huracán. A la fecha se iniciaron los trabajos en la estación de bombeo de la red de alcantarillado. -Culminación de los trabajos de drenaje de Punta Carapá a Cauce México y la canalización de desagüe pluvial de Campanero y su derivación al Cauce Antequera, y la Calle Comunero. -Se adecuaron las líneas de tendido eléctrico en los Pasillos Huracán, Antequera, Natividad ,Punta Carapá y Minisanto, y las conexiones a las nuevas viviendas ubicadas entre los Cauces Antequera y Tacuari -Culminación de la construcción de los puentes peatonales, que permitirá la conectividad de las Calles Comuneros a la Calle Mompox, y se encuentra en plena ejecución la construcción del puente vehicular. -Culminación de intervenciones de equipamiento urbano en el Centro de Atención Goretti, y culminación de la conexión del Cauce Antequera con la Calle Antequera en ambos márgenes del cauce. -Continúan los trabajos de fiscalización de la construcción de las Viviendas Sostenible y de los trabajos de Infraestructura y Urbanismo Sostenible. Construcción de Obras de Viviendas Sostenible, realizada por la Empresa CIASA. -Se realizaron las gestiones para la extensión de contratos de profesionales que se encuentran trabajando para la UEP y contratos de obras. Se adjudicaron las consultorías para el Diseño del Plan de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos en Chacarita Alta, Consultoría para Informe de Evaluación Ambiental de la Chacarita Alta, y Evaluación de reasentamiento de familias de la Chacarita Alta.																	

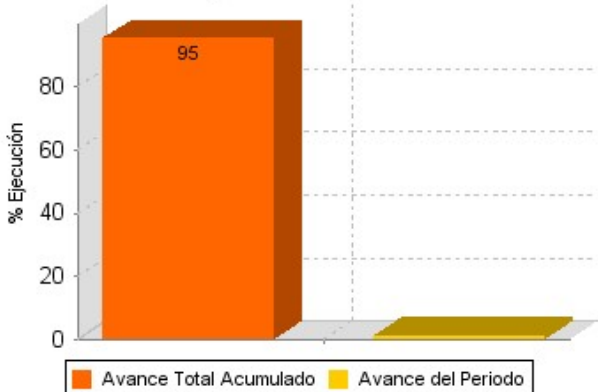 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto		Construcción de 600 Soluciones Habitacionales en el Barrio San Blás - Mariano Roque Alonso	
OEE		MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT	
Código SNIP N°		885	
Financiamiento		REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN	
Costo del Proyecto		USD	18.639.560
		GS.	130.566.951.878
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	
105.300.065.374		25.266.886.504	
Porcentaje de Ejecución		80,65 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	
15/11/2019		15/11/2021	
Fecha de Prórroga		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Municipal	Mariano Roque Alonso		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,08 %		95,20 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	
1.896.016.666		817.344.445	
Porcentaje Ejecutado		43,11 %	
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			
Ejecución Física  			
SITUACIÓN ACTUAL			
En el periodo de referencia, se cuentan con avances de Actividades correspondientes al Componente del Plan de Desarrollo social, ambiental y económico (Componente 2), conforme al siguiente detalle: - Seguimiento a la solicitud de conformación de comisiones vecinales con la Intendente y el Director de Comisiones Vecinales de la ciudad de Mariano Roque Alonso con el fin de organizar la Asamblea para concretar dicha actividad. - Seguimiento a la Resolución N° 37/2024 de la Comandancia de la Policía Nacional en el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional y funcionarios de la UNE Che Tapyi – MUVH, con el fin de que se instale la Sub-Comisaria en el proyecto San Blas de Mariano R. Alonso. - Reunión entre el representante de la “Empresa Eco Total”, empresa encargada de la recolección de residuos en el barrio San Blas y funcionarios de la Coordinación Social de la UNE Che Tapyi – MUVH, con el objetivo de conocer el mecanismo de trabajo y solicitar mejor servicio para la comunidad. - Revisión y corrección de los informes N° 4, 5, 6 y 7 presentadas por la empresa Hidrocontrol, de los servicios sociales ejecutados en el barrio San Blas, según establecido en el TDR. - Elaboración de notas remitidas a la Empresa Consultora Hidrocontrol. - Aprobación de informe N° 4, 5, 6 y 7 presentadas por la empresa Hidrocontrol, de los servicios sociales ejecutados en el barrio San Blas, según establecido en el TDR. - Procesamiento de solicitudes de pago N° 4, 5, 6, y 7 de la empresa Consultora Hidrocontrol correspondiente a los trabajos sociales realizados en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. - Notificaciones y seguimientos de casos puntuales a beneficiarios del proyecto San Blas, ante los incumplimientos del reglamento establecido en la Resolución 1220/21.			

Proyecto	Construcción de 1000 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios				
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT				
Código SNIP N°	916				
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN				
Costo del Proyecto	USD	18.199.042	GS.	144.602.368.545	
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
107.105.332.257		37.497.036.288		74,07 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
30/06/2020		30/06/2022		31/12/2026	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Nacional

Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
4,32	%	89,70	%
PGN Vigente en Gs.	Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado	
10.235.608.707	5.738.333.599	56,06	%

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO



SITUACIÓN ACTUAL

Los avances correspondientes segundo cuatrimestre de 2025 son los siguientes:

Componente 1- Obras de construcción de nuevas viviendas e infraestructura de servicios básicos y equipamiento comunitario:

CONSTRUCCIÓN DE 123 VIVIENDAS CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES. ID N° 1275 - LPN N° 01/2023. COMUNIDADES INDÍGENAS SARIA Y ANACONDA. Contratista: Ritter Construcciones S.R.L. Avance Físico de Obras Global: 100 %. - Construcción de 123 viviendas; Centro Comunitario: Consultorio ambulatorio.



CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS CON EQUIPAMIENTO COMUNITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN. ID N° 1862 - LPN N° 06/2023. COMUNIDAD INDÍGENA WONTA MANJUI MISIÓN SANTA ROSA. Contratista Ritter Construcciones S.R.L.: Avance Físico de Obras: 63,95 %. - Construcción de 100 viviendas; Centro Comunitario: Consultorio ambulatorio.

Componente 2- Plan de Desarrollo social, ambiental y económico implementado:

Firma y entrega de certificados subsidios y acuerdos a familias beneficiarias de las comunidades indígenas San Agustín (Nivacle, Manijú y Guaraní). Puerto Ma. Elena.


Definición de lista 90 postulantes a ser beneficiados de la comunidad indígena Kelyenmagategma, conjuntamente con representantes del Ministerio de la Defensoría Pública.

Monitoreo de los ministerios sociales realizados por la consultora Clara Benítez en comunidades Saria, Anaconda, Kelvenmagategma, Yakve Axa y Pto. Ma. Elena - Revisión y corrección de informes de Consultora Clara Benítez.

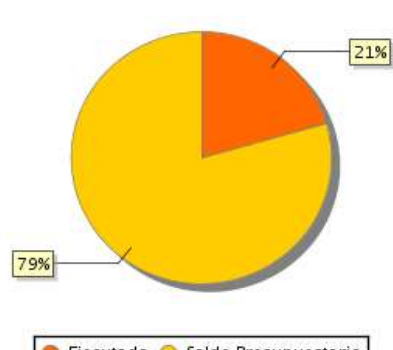 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA <td colspan="2">  Sistema Nacional de Inversión Pública </td>		 Sistema Nacional de Inversión Pública	
Proyecto	Construcción de 660 Soluciones Habitacionales en Pueblos Originarios		
OEE	MINISTERIO DE URBANISMO VIVIENDA Y HABITAT		
Código SNIP N°	1138		
Financiamiento	REPÚBLICA DE CHINA TAIWÁN		
Costo del Proyecto	USD	9.633.559	GS. 73.642.528.643
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.	Porcentaje de Ejecución
8.631.965.771		65.010.562.872	11,72 %
Fecha de Inicio		Fecha de Fin	Fecha de Prórroga
1/1/2025		31/12/2027	N/A
Ubicación Geográfica del Proyecto			
Departamental	San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná; Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón Alto Paraguay		
Avance Físico Reportado del Periodo		Avance Físico Acumulado Total	
1,61 %		1,61 %	
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025	Porcentaje Ejecutado
41.884.355.802		8.631.965.771	20,61 %
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			
Ejecución Física  Avance Total Acumulado Avance del Periodo  Ejecutado Saldo Presupuestario			
SITUACIÓN ACTUAL			
Los avances correspondientes al periodo, son los siguientes: Componente 1- Construcción de Nuevas Viviendas, cuenta con contratos de obras para la construcción de viviendas que fueron adjudicados en Agosto de 2025: Act. 1: i) Construcción de 24 viviendas. Dpto. de San Pedro. Llamado LPN N° 05/2025. ID 4239 - Adjudicado a la firma COIN. Contrato N° 10/25. ii) Construcción de 23 viviendas. Distrito de Lima. Dpto. de San Pedro. LPN N° 04/2025. ID 4238 - Adjudicado a la firma ASCENT S.A. Contrato N° 09/25. Act. 2: Construcción de 64 viviendas. Distrito de J. Eulogio Estigarribia - Dpto. de Caaguazú. LPN N° 06/2025. ID 4240 - Adjudicado a la firma Spazio Construcciones SRL. Contrato N° 11/25. Act. 3: Construcción de 80 viviendas. Distrito de Hernandarias. Dpto. de Alto Paraná. LPN N° 07/2025. ID 4241 - Adjudicado a la firma Spazio Construcciones SRL. Contrato N° 12/25. Act. 4: i) Construcción de 73 viviendas. Distrito de Capitán Bado. Dpto. de Amambay. LPN N° 04/2025.ID 4238 - Adjudicado a la firma ASCENT S.A. Contrato N° 09/25. ii)Construcción de 81 viviendas. Distrito de Capitán Bado. Dpto. de Amambay. LPN N° 03/2025. ID 4237 - Adjudicado a la firma GSA Consultora y Constructora de Alan Eduardo Irigoitia Penayo. Contrato N° 08/25. Act. 5: Construcción de 75 viviendas. Distritos de Jasy Kañy y Maracanã. Dpto. de Canindeyú. LPN N° 05/2025. ID 4239 - Adjudicado a la firma COIN. Contrato N° 10/25. Act. 6: Construcción de 50 viviendas. Distrito de Puerto Pinasco. Dpto. de Presidente Hayes. LPN N° 08/2025. ID 4242 - Adjudicado a la firma Almega CIA. Contrato N° 13/25. Act. 7: Construcción de 90 viviendas. Distrito de Mcal. Estigarribia/ Pozo Hondo. Dpto. de Boquerón. LPN N° 09/2025. ID 4243 - Adjudicado a la firma Consorcio V&P SRL y Asociados. Contrato N° 14/25. Act.8: Construcción de 100 viviendas. Distrito de Fuerte Olimpo - Dpto. de Alto Paraguay. LPN N° 08/2025. ID 4242 - Adjudicado a la firma Almega CIA. Contrato N° 13/25. Act. 9: Fiscalización de obras. Cabe señalar que los servicios para fiscalización de obras fueron adjudicados en Julio de 2025. i) Servicio de Fiscalización de obras de 420 Viviendas de Pueblos Originarios en la Región Oriental. LPN N° 01/2025 - ID 470.132 - Adjudicada a la firma Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A. – CIALPA. Contrato 07/2025. ii) Servicio de Fiscalización de obras de 240 Viviendas de Pueblos Originarios en la Región Occidental. LPN N° 02/2025. ID 470.133 - Adjudicada a la firma TRSA Ingenieros y Consultores, de Tomas Roberto Sosa Aguilera. Contrato 06/2025. En el Componente 2- Plan de Desarrollo Social, se han desarrollado las sgtes. Actividades: 1. Identificación de los cambios sociales existentes en la lista de familias preseleccionadas correspondiente a las comunidades indígenas del proyecto. 2. Verificación y actualización de listas de familias postulantes a una Solución Habitacional en el marco del proyecto. 3. Reunión con pobladores de la Comunidad Mbokaja Yguazú y la empresa Constructora.			

Proyecto		Innovación en Empresas del Paraguay				
OEE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				
Código SNIP N°		568				
Financiamiento		BID				
Costo del Proyecto		USD	10.000.000		GS.	74.701.408.760
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
69.473.853.708			5.227.555.052		93,00 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
21/09/2017			21/09/2022		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
3 %				97 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
6.975.643.999			4.556.764.907		65,32 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

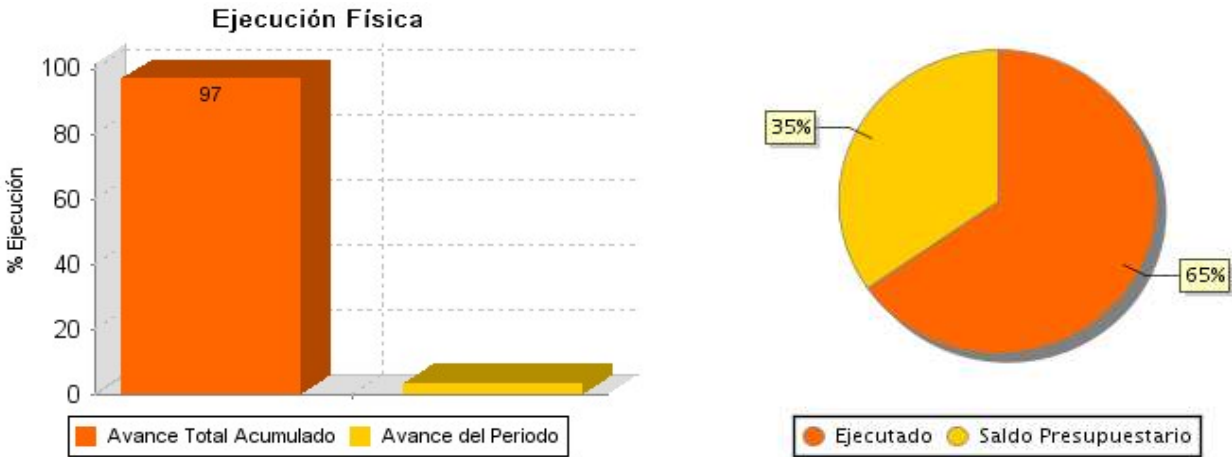

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente cuatrimestre se consolidó el cierre de los proyectos de innovación adjudicados en sus distintas modalidades (individuales, asociativos, empresas de base tecnológica, servicios tecnológicos, incubadoras y estudios prospectivos). Todos los instrumentos alcanzaron o superaron sus metas iniciales, logrando un avance físico acumulado superior al 90%.


Las actividades se centraron en la firma de actas de cierre de los proyectos finalizados y en la sistematización de los resultados. Entre los logros más relevantes se destacan los informes finales de los estudios prospectivos sobre agua y energía para el futuro, alimentos de alto valor, bioeconomía y ciencia paraguaya competitiva, así como la culminación de la Encuesta de Innovación 2024 y un primer informe preliminar de impacto. Las metas en formación avanzada y fortalecimiento de capacidades empresariales fueron superadas.

Por otro lado, concluyeron los procesos de cierre de los posgrados adjudicados y de los proyectos de incorporación de gestores de innovación, alcanzando un avance físico superior al 90%. Asimismo, se avanzó en la consolidación de las misiones tecnológicas, con 14 proyectos finalizados y en proceso de firma de actas de cierre. El apoyo brindado permitió instalar capacidades en gestión tecnológica e innovación en diversas MIPYMES y fomentar experiencias de innovación pública. El cumplimiento de estas metas ha reforzado el capital humano nacional para la innovación y la vinculación internacional.

En el área de auditoría y evaluación, se concretó la contratación de Consultoría para la evaluación final y de impacto en etapa de la entrega del informe final preliminar para su revisión y No objeción del BID. Dicho proceso de contratación se encuentra identificado en el Plan de Adquisiciones del BID con N° PR-L1070-P000077 (Selección basada en el menor costo - SBC) y publicado en el portal nacional de la Dirección Nacional de Contrataciones bajo la modalidad de Licitación No Regulada por la Ley de Contrataciones bajo el ID N° 3477 y 4081. Proceso de Adenda del contrato de Auditoría para la revisión del periodo 2025. ID 427855.

Proyecto		Transferencia PROCENCIA II					
OEE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA					
Código SNIP N°		958					
Financiamiento		APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST.					
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	600.084.151.091	
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.			Porcentaje de Ejecución	
227.380.051.172			372.704.099.919			37,89 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin			Fecha de Prórroga	
23/06/2021			22/06/2027			22/6/2030	
Ubicación Geográfica del Proyecto							
Nacional		N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total			
11,96 %				57,28 %			
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado	
148.363.069.401			37.386.226.504			25,20 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

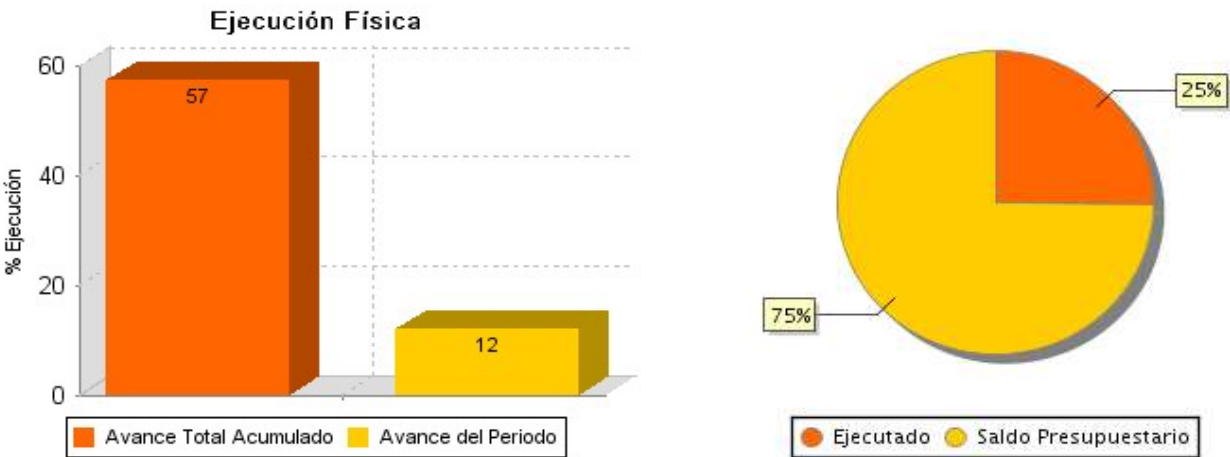

SITUACIÓN ACTUAL

En el periodo del reporte se registraron 23 propuestas para eventos científicos y se realizaron 4 adjudicaciones de proyectos estratégicos y 5 de proyectos multicéntricos. De igual manera, se lanzó la convocatoria de acceso o reincorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SISNI) 2025, y se registraron las primeras evaluaciones finales del instrumento de Inserción, junto con la habilitación de una nueva ventanilla.


En el área de capital humano se adjudicaron más de 60 becas, se firmaron contratos y se realizaron desembolsos en posgrados e incentivos. Asimismo, fueron adjudicadas 23 nuevas propuestas de estancias correspondientes a la cuarta convocatoria de estancias de investigación.

Se avanzó en la implementación de la Estrategia Nacional; se lanzó el Premio MERCOSUR y el concurso de fotografía, también se avanzó en el cierre de proyectos de comunicación. Además, se aprobó el informe final de diseño de espacio interactivo, se adecuó la infraestructura y se realizaron los pagos correspondientes. Se adjudicaron 12 instituciones en ferias y olimpiadas.

Por otro lado, la auditoría externa 2025-2026 fue elaborada, aprobada, compartida con el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) y remitida por Auditoría Interna a la Auditoria General Del Poder Ejecutivo (AGPE) para iniciar los trámites del llamado. Respecto a la Evaluación de Impacto, se presentó y aprobó el producto final; mientras que los términos de referencia de la evaluación intermedia fueron elaborados y se encuentran en proceso de verificación por la Coordinación General del Programa.

Proyecto		Mejoramiento Escenarios Deportivos p/Eventos Internacionales				
OEE		PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA				
Código SNIP N°		1105				
Financiamiento		LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	N/A		GS.	573.198.487.500
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
484.634.334.501			88.564.152.999		84,55 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
01/10/2023			01/10/2026		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Nacional	N/A					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
33,15 %				65,57 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
428.201.946.209			281.823.896.255		65,82 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

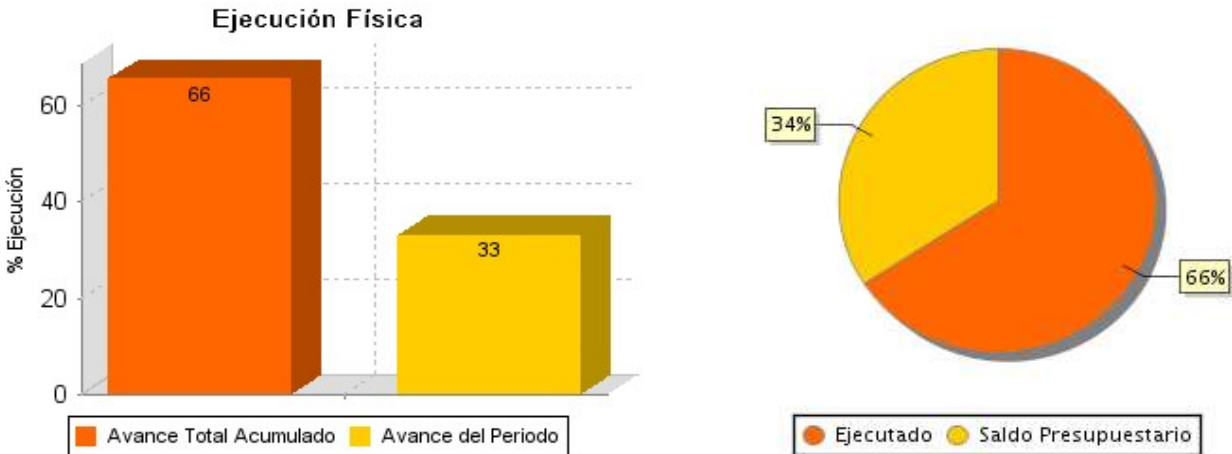

SITUACIÓN ACTUAL


Durante el segundo cuatrimestre, se registraron avances significativos en la organización de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, destacándose el mejoramiento de sedes deportivas, la adquisición de implementos y equipamientos especializados, la consolidación operativa y logística del evento, y la preparación integral de atletas y equipos técnicos.

Así también, se avanzó en obras de infraestructura y mantenimiento en el Parque Olímpico y sedes complementarias, así como en procesos licitatorios para equipamientos y servicios esenciales. Paralelamente, se fortaleció la logística mediante la planificación operativa, la contratación de servicios y la realización de eventos de prueba, asegurando la funcionalidad y coordinación entre áreas clave.

Se impulsaron acciones de preparación deportiva, incluyendo planes de apoyo a atletas, entrenadores y equipos interdisciplinarios, garantizando un acompañamiento técnico y médico adecuado para el desempeño competitivo de la delegación nacional.

Proyecto		SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)											
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL											
Código SNIP N°		50											
Financiamiento		FOCEM, LOCAL											
Costo del Proyecto		USD		39.470.702				GS.		104.732.692.220			
Avance Financiero en Gs.				Saldo Financiero en Gs.						Porcentaje de Ejecución			
80.200.999.195				24.531.693.025						76,58 %			
Fecha de Inicio				Fecha de Fin						Fecha de Prórroga			
16/05/2008				16/05/2013						31/12/2026			
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Nacional		N/A											
Avance Físico Reportado del Periodo							Avance Físico Acumulado Total						
0 %							95 %						
PGN Vigente en Gs.				Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025						Porcentaje Ejecutado			
8.723.460.055				3.508.389.305						40,22 %			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

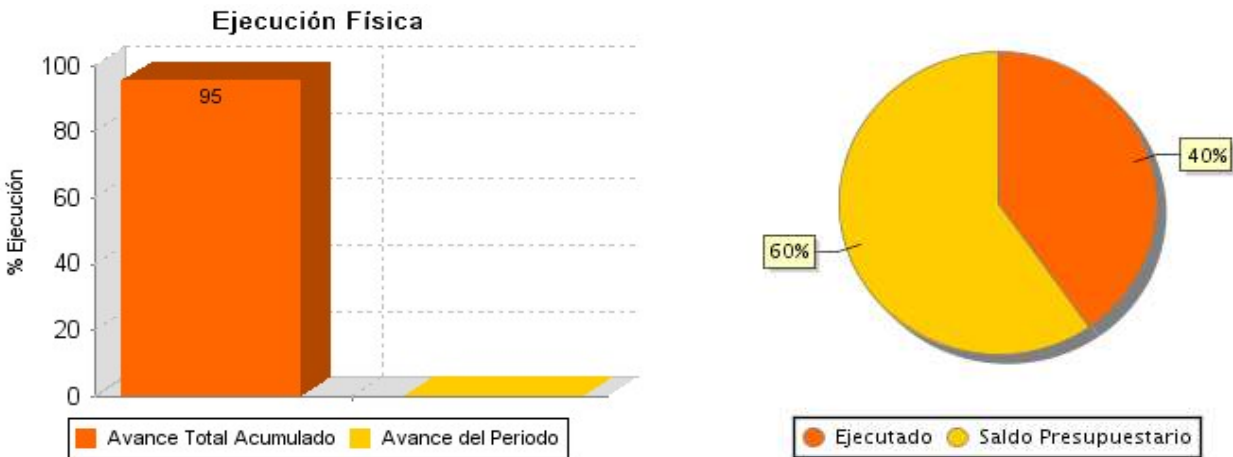


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.

Proyecto		Investigación ,Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud				
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
Código SNIP N°		153				
Financiamiento		FOCEM, LOCAL				
Costo del Proyecto		USD	3.011.806		GS.	27.787.981.272
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
18.847.401.648			8.940.579.624		67,83 %	
Fecha de Inicio			Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
20/12/2011			20/12/2014		31/12/2025	
Ubicación Geográfica del Proyecto						
Internacional	Argentina, Brasil, Paraguay					
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total		
2 %				94 %		
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
7.113.815.514			469.591.800		6,60 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

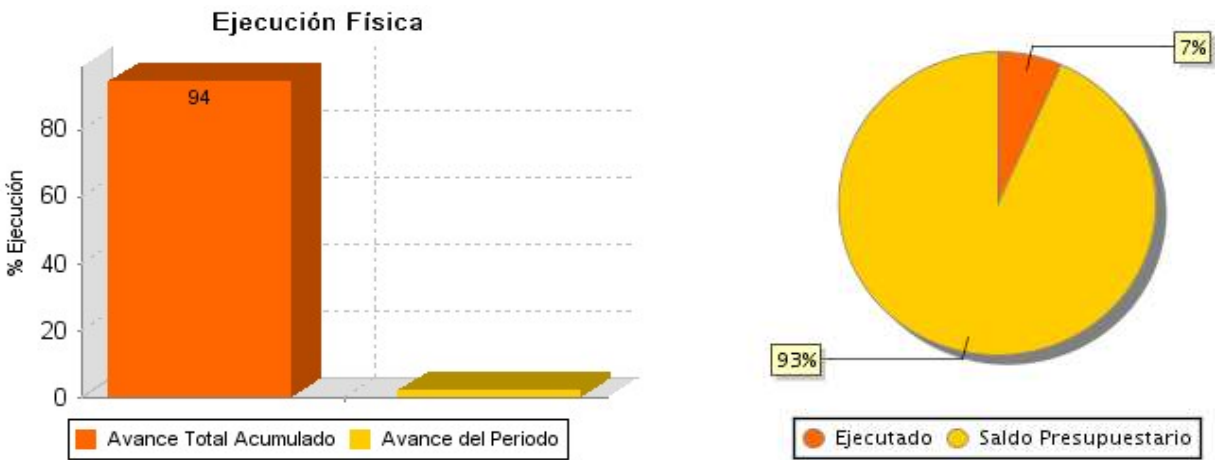

SITUACIÓN ACTUAL

El laboratorio se encuentra concluido; sin embargo, la auditoría contratada por la Unidad Técnica FOCEM ha realizado observaciones que deben ser subsanadas para proceder a la recepción provisoria de la obra. La constructora Alfa y Omega S.A. se encuentra realizando reparos a algunas observaciones recibidas con el fin de avanzar con la mencionada recepción.


Así también se está procediendo al pago a los proveedores adjudicados correspondiente a reactivos adquiridos.

El proceso de adquisición de equipos de laboratorio se encuentra adjudicado correspondiente al llamado de Licitación Pública Internacional 01/24. Se presentaron para su visto bueno dos llamados en modalidad Licitación Pública Nacional de Equipos, uno de ellos habia sido declarado desierto en la LPI 01/24.

En cuanto al componente academico, se realizó una defensa de tesis del Doctorado en Salud. Quedando pendientes pagos a proveedores de reactivos y de los equipos adjudicados.


Proyecto		Construcción Sist.AguaPot.y.San.Peq.Ciud.Com.Rural.e.Indig.											
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL											
Código SNIP N°		555											
Financiamiento		BID , GOBIERNO ESPAÑOL											
Costo del Proyecto		USD	60.000.000				GS.	467.760.332.466					
Avance Financiero en Gs.			Saldo Financiero en Gs.					Porcentaje de Ejecución					
370.153.628.186			97.606.704.280					79,13		%			
Fecha de Inicio			Fecha de Fin					Fecha de Prórroga					
28/08/2018			28/8/2024					28/8/2025					
Ubicación Geográfica del Proyecto													
Nacional	N/A												
Avance Físico Reportado del Periodo						Avance Físico Acumulado Total							
0						%	85						%
PGN Vigente en Gs.			Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025					Porcentaje Ejecutado					
77.197.522.503			27.582.158.594					35,73		%			

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

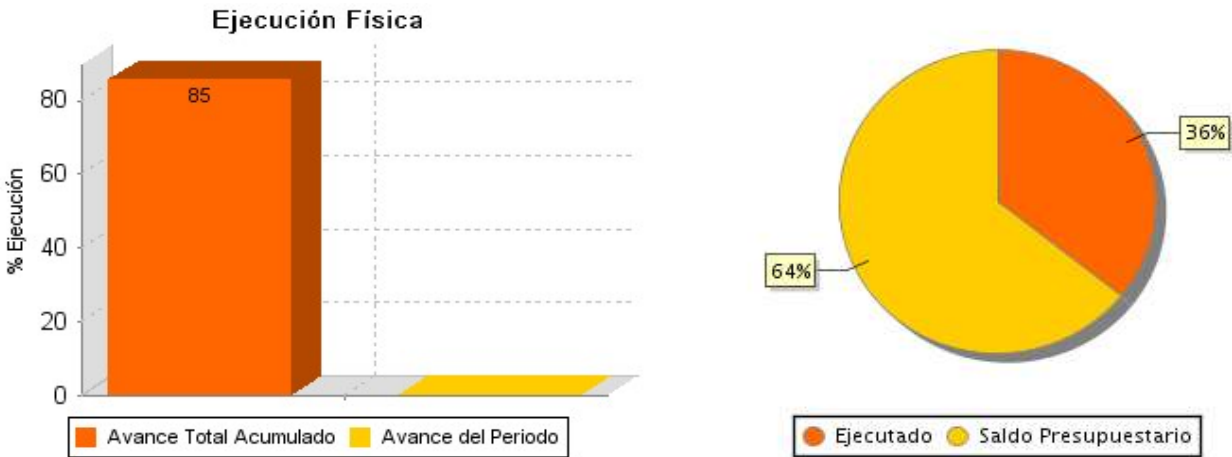


SITUACIÓN ACTUAL

La Unidad Ejecutora no ha reportado el avance en el plazo previsto.

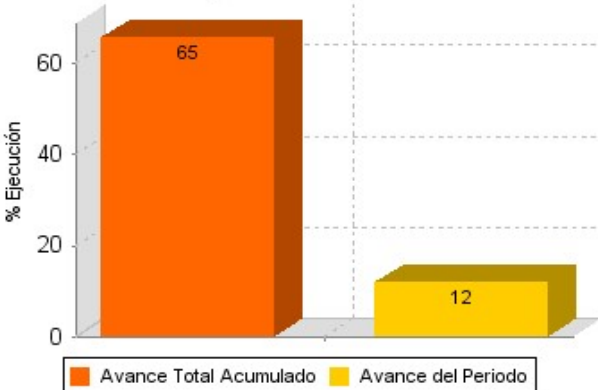 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA <td colspan="2">  Sistema Nacional de Inversión Pública </td>		 Sistema Nacional de Inversión Pública							
Proyecto		Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud							
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL							
Código SNIP N°		805							
Financiamiento		BIRF							
Costo del Proyecto		USD	115.000.000			GS.	875.598.712.272		
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.				Porcentaje de Ejecución			
521.141.821.661		354.456.890.611				59,52 %			
Fecha de Inicio		Fecha de Fin				Fecha de Prórroga			
26/03/2020		26/03/2024				30/06/2026			
Ubicación Geográfica del Proyecto									
Departamental	Amambay, Central, Cordillera, Paraguarí								
Avance Físico Reportado del Periodo				Avance Físico Acumulado Total					
12 %				65 %					
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025			Porcentaje Ejecutado				
203.443.084.114		53.232.053.896			26,17 %				
AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO									
Ejecución Física  65 12 Avance Total Acumulado Avance del Periodo  26% 74% Ejecutado Saldo Presupuestario									
SITUACIÓN ACTUAL									
Componente 1: Avances significativos en los % de obras de Unidades de Salud Familiar (USF) por cada lote, del total, 83 se encuentran terminadas de las cuales 32 están operativas. La falta de Recursos Humanos impide la habilitación operativa de las USF concluidas. Se informa que se encuentra en evaluación y diseño una nueva reestructuración del proyecto. Se ajustarán metas globales de USF, de 193 quedarían 137 USF (obras con procesos constructivos en desarrollo). Este ajuste en las metas también lleva a replantear la cantidad de equipos adquirir por cada USF. En cuanto a las obras de salud mental consistentes en adecuaciones de 4 hospitales distritales y construcción de 2 centros comunitarios, las mismas se encuentra en etapa de evaluación de ofertas. Componente 2: En este periodo se han transferido G. 1.599.109.002 (USD 200.752,30) a 137 Consejos Locales de Salud, en función del cumplimiento de metas sanitarias del tercer cuatrimestre 2024. Se cuenta con la rendición de esta transferencia y la medición de los resultados de salud del primer cuatrimestre 2025. Componente 3: Las actividades operativas siguen su flujo normal. Auditoría externa periodo 2024, aprobada por el organismo financiador. Con relación a los eventos de PPI (Pueblos Indígenas) hasta la fecha se han realizado 4 eventos de monitoreo y seguimiento por parte del CONASAPI (Consejo Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas). Componente 4: Planta generadora de oxígeno en etapa final para su plena ejecución, equipos de terapia intensiva en procesos de cancelación de los ítems adjudicados. En proceso una contratación directa para ampliar la adquisición de equipos de terapia. Ventiladores Pulmonares en etapa de adendas a los plazos de presentación de ofertas.									

Proyecto		Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Salud			
OEE		MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL			
Código SNIP N°		855			
Financiamiento		BID			
Costo del Proyecto		USD	45.000.000	GS.	279.000.000.620
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
3.200.087.015		275.799.913.605		1,15 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
24/04/2023		24/04/2029		N/A	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional	N/A				
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
4 %			7 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
111.573.131.410		2.370.115.658		2,12 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

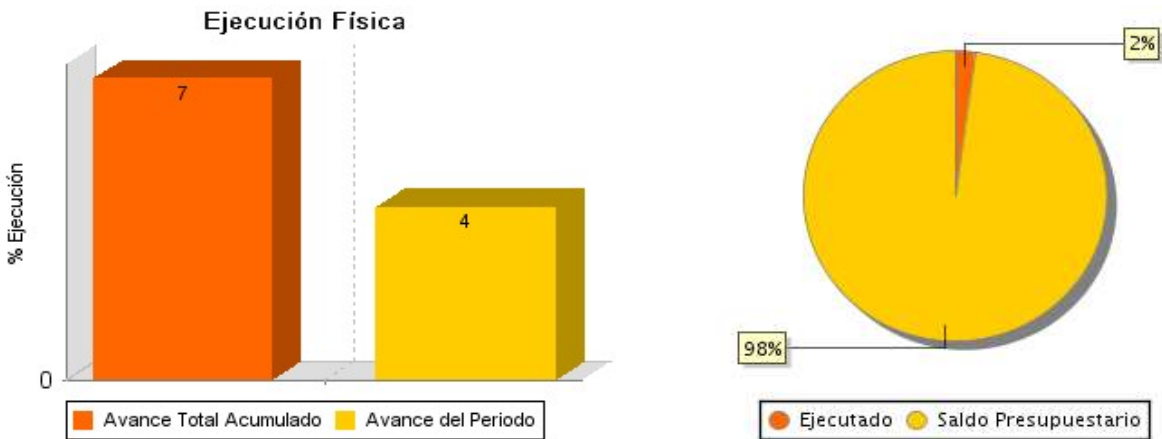

SITUACIÓN ACTUAL

Durante el presente periodo, el Proyecto registró avances significativos en los procesos de contratación de empresas constructoras para la construcción de 48 Unidades de Salud de la Familia (USF), las cuales se encuentran actualmente en proceso de adjudicación. Asimismo, se cuenta con la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) para el llamado a licitación de la construcción de siete (7) USF adicionales, totalizando cincuenta y cinco (55) USF, ubicadas en los departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá y Alto Paraná. De igual manera, se avanzó en el proceso de contratación de una firma consultora para la fiscalización de las USF, actualmente en etapa de adjudicación, a la espera de la No Objeción del Banco para su formalización.

En materia de infraestructura de salud, orientada al fortalecimiento del primer nivel de atención (USF) y del segundo nivel correspondiente a los hospitales Regional de Caazapá, Distrital de San Estanislao, General Aquino y Horqueta, se destacan los siguientes avances:(i) Llamado para la contratación de una firma consultora para la preparación de los Proyectos Ejecutivos de las 45 USF que integran la segunda etapa de intervención (ii) Elaboración de los Términos de Referencia (TDR) para el llamado a contratación de una firma consultora encargada del diseño ejecutivo de los cuatro hospitales mencionados.


En relación con el Componente 2 del Proyecto, se registraron los siguientes progresos: Contratación de una firma consultora para el Fortalecimiento de los Agentes Comunitarios de las USF y las Unidades Regionales de Promoción de la Salud, actualmente en etapa de evaluación, Contratación de una firma consultora para el Desarrollo del Plan de Redes y Microredes desde un enfoque comunitario en las cuatro regiones sanitarias, también en etapa de evaluación, Contratación de una firma consultora para la actualización de la Guía de Planificación de la Comunicación Comunitaria, en etapa de evaluación.

Finalmente, el proceso correspondiente a la contratación de la firma auditora bajo la modalidad de contratación plurianual, se encuentra en etapa de adjudicación, a la espera de la Resolución ministerial que autorice la adjudicación y posterior firma del contrato.

 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PARAGUAY PARAGUÁI TEMBIGUEREKOITA HA VIRUÑANGAREKO MOTENONDEHA		 Sistema Nacional de Inversión Pública			
Proyecto		Mejoramiento y ampliacion de los servicios del SENACSA.			
OEE		SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL			
Código SNIP N°		710			
Financiamiento		BID , LOCAL			
Costo del Proyecto		USD	16.306.294	GS.	116.189.956.446
Avance Financiero en Gs.		Saldo Financiero en Gs.		Porcentaje de Ejecución	
62.433.777.883		28.881.468.517		53,73 %	
Fecha de Inicio		Fecha de Fin		Fecha de Prórroga	
26/03/2020		27/03/2025		27/1/2027	
Ubicación Geográfica del Proyecto					
Nacional		N/A			
Avance Físico Reportado del Periodo			Avance Físico Acumulado Total		
6,44 %			80,28 %		
PGN Vigente en Gs.		Ejecución en Gs. al 31/08/ 2025		Porcentaje Ejecutado	
26.187.378.881		5.404.389.436		20,64 %	

AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO

Ejecución Física

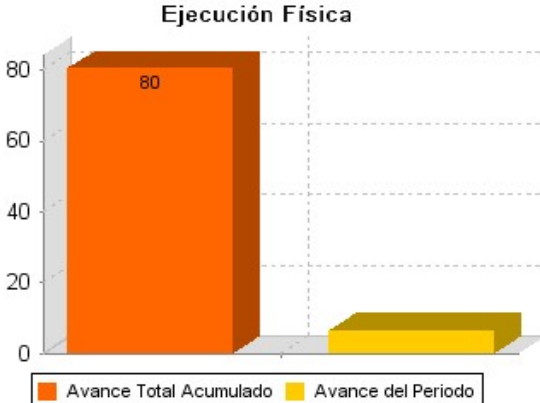

Avance Total Acumulado

Avance del Periodo



Ejecutado

Saldo Presupuestario

SITUACIÓN ACTUAL

A través de la Nota CEL N° 45 de fecha 10 de marzo del corriente, se solicitó la actualización del costo en guaraníes del proyecto, quedando el nuevo costo del proyecto es Gs. 116.180.606.446.

Durante el segundo cuatrimestre, la empresa IDEATI S.A presentó su plan de trabajo para la fase de soporte del sistema informático de sanidad animal 2.0, se entregaron las 100 tablets rutgerizadas con ID PAC N° 7274283 para el sistema de vigilancia sanitaria para las diferentes Direcciones Generales. Asi también,se definió el alcance de intervención de puntos de ingresos en diferentes zonas del pais como ser; Puerto Falcón, Itá Enramada, Ciudad del Este,Pedro Juan Caballero, Encarnación.En lo referente a la Construcción de la Unidad zonal en Neuland: se firmó el contrato con la empresa CONTEPAR S.R.L. para la construcción, la empresa presentó el certificado N° 2, los avances hacen referencia a movimiento de suelo, trabajos preliminares,limpieza de la zona de obra,marcación de implantación,zapatas y vigas de fundación,excavación para registros sanitarios, muralla perimetral,implantación de tanque elevado.Esta obra cuenta con la contratación de fiscales civil y ambiental para el monitoreo.En cuanto a la Construcción de la oficina de Punto de Ingreso/egreso y estación de vigilancia en el Aeropuerto Silvio Pettirossi (AISP): se firmó contrato con la empresa CONTEPAR S.R.L.para la construcción,la empresa presentó el certificado N° 1, que hace referencia a los trabajos preliminares como movimiento de suelo, excavación para registros sanitarios, desagues pluviales,colocación de pisos y zocalos,revestimiento de paredes en zona de oficina. Esta obra cuenta con la contratación de fiscales civil y ambiental para el monitoreo.

En lo que respecta a la Construcción de la Unidad zonal en Sargento José Félix López: se evaluó las ofertas presentadas y se cuenta con la No Objeción del BID a la adjudicación a la empresa del Ing.Julio César Gómez. para la firma del contrato.Esta obra cuenta con la contratación de fiscales civil y ambiental para el monitoreo que también se encuentra en gestión administrativa para la firma de los contratos. En lo referente a la Construcción de la Coordinación de Región en Carmelo Peralta se firmó el contrato de usufructo entre la municipalidad y el SENACSA, realización de la consulta pública y la elaboración del estudio de suelo para el proyecto ejecutivo, Construcción de puntos de ingresos,se realizaron visitas de relevamiento para el diseño del proyecto ejecutivo.

Se encuentra en proceso de implementación el Sistema de Identidad Animal que viene desarrollando la empresa NTS. con el informe N° 8 entregado y aprobado. Se realizaron capacitaciones referente a ganado menor a los productores, ganaderos y veterinarios oficiales. En cuanto a la tecnología se esta ejecutando la fase de soporte para el DATACENTER del SENACSA, el contrato de asesoría para implementación del Plan Maestro de TIC con la entrega del octavo informe, La empresa EXCELSIS viene desarrollando el soporte a la adquisición de licencias ORACLE, se remitió al MITIC para la No Objeción a las especificaciones técnicas para la adquisición de servidores para el SENACSA.
